

城院帮 G04 项目计划 | Microsoft Project 原生甘特图 | 青色王晨 蓝色刘景浩 紫色共同完成


标识号	名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	任务负责人	成本
1	**1 项目计划与评审**	**6日**	**26/10/8**	**26/10/15**		**按下级分配**	**¥27...**
2	**1.1 任务分解、排期与资源预算**	**1日**	**26/10/8**	**26/10/8**		**王晨、刘景浩**	**¥91...**
3	1.1.1 确认WBS、依赖与提交边界	0.5日	26/10/8	26/10/8		王晨、刘景浩	¥45....
4	1.1.2 建立资源预算与风险安排	0.5日	26/10/8	26/10/8	3	王晨、刘景浩	¥45....
5	**1.2 项目计划内部复核与汇报材料**	**1日**	**26/10/9**	**26/10/9**		**王晨、刘景浩**	**¥91...**
6	1.2.1 逐条检查评审要求与计划	0.5日	26/10/9	26/10/9	4	王晨、刘景浩	¥45....
7	1.2.2 确认汇报材料与提交清单	0.5日	26/10/9	26/10/9	6	王晨、刘景浩	¥45....
8	**1.3 项目计划评审反馈与修订**	**1日**	**26/10/15**	**26/10/15**		**王晨、刘景浩**	**¥91...**
9	1.3.1 登记课堂计划意见与影响	0.5日	26/10/15	26/10/15	7	王晨、刘景浩	¥45....
10	1.3.2 共同修订排期与计划基线	0.5日	26/10/15	26/10/15	9	王晨、刘景浩	¥45....
11	**2 可行性研究**	**6日**	**26/10/8**	**26/10/15**		**按下级分配**	**¥45...**
12	**2.1 关键技术与工具可行性验证**	**3日**	**26/10/8**	**26/10/12**		**王晨**	**¥20...**
13	**2.1.1 验证双端构建与邮箱条件**	**1日**	**26/10/8**	**26/10/8**		**王晨**	**¥10...**
14	**2.1.1.1 FS01 复查系统规模和目标**	**0.5日**	**26/10/8**	**26/10/8**		**王晨**	**¥45...**
15	2.1.1.1.1 FS01.1 明确使用者	0.1日	26/10/8	26/10/8		王晨	¥9.15
16	2.1.1.1.2 FS01.2 限定业务边界	0.1日	26/10/8	26/10/8	15	王晨	¥9.15
17	2.1.1.1.3 FS01.3 划分访问权限	0.1日	26/10/8	26/10/8	16	王晨	¥9.15
18	2.1.1.1.4 FS01.4 把目标写成检查项	0.1日	26/10/8	26/10/8	17	王晨	¥9.15
19	2.1.1.1.5 FS01.5 核对规模和约束	0.1日	26/10/8	26/10/8	18	王晨	¥9.15
20	**2.1.1.2 FS02 研究目前正在使用的系统**	**0.5日**	**26/10/8**	**26/10/8**	**14**	**王晨**	**¥57...**
21	2.1.1.2.1 FS02.1 列出当前渠道	0.1日	26/10/8	26/10/8	14	王晨	¥11....
22	2.1.1.2.2 FS02.2 保留已有有效能力	0.1日	26/10/8	26/10/8	21	王晨	¥11....
23	2.1.1.2.3 FS02.3 还原当前处理步骤	0.1日	26/10/8	26/10/8	22	王晨	¥11....
24	2.1.1.2.4 FS02.4 定位信息断点	0.1日	26/10/8	26/10/8	23	王晨	¥11....
25	2.1.1.2.5 FS02.5 把不足变成改进输入	0.1日	26/10/8	26/10/8	24	王晨	¥11....

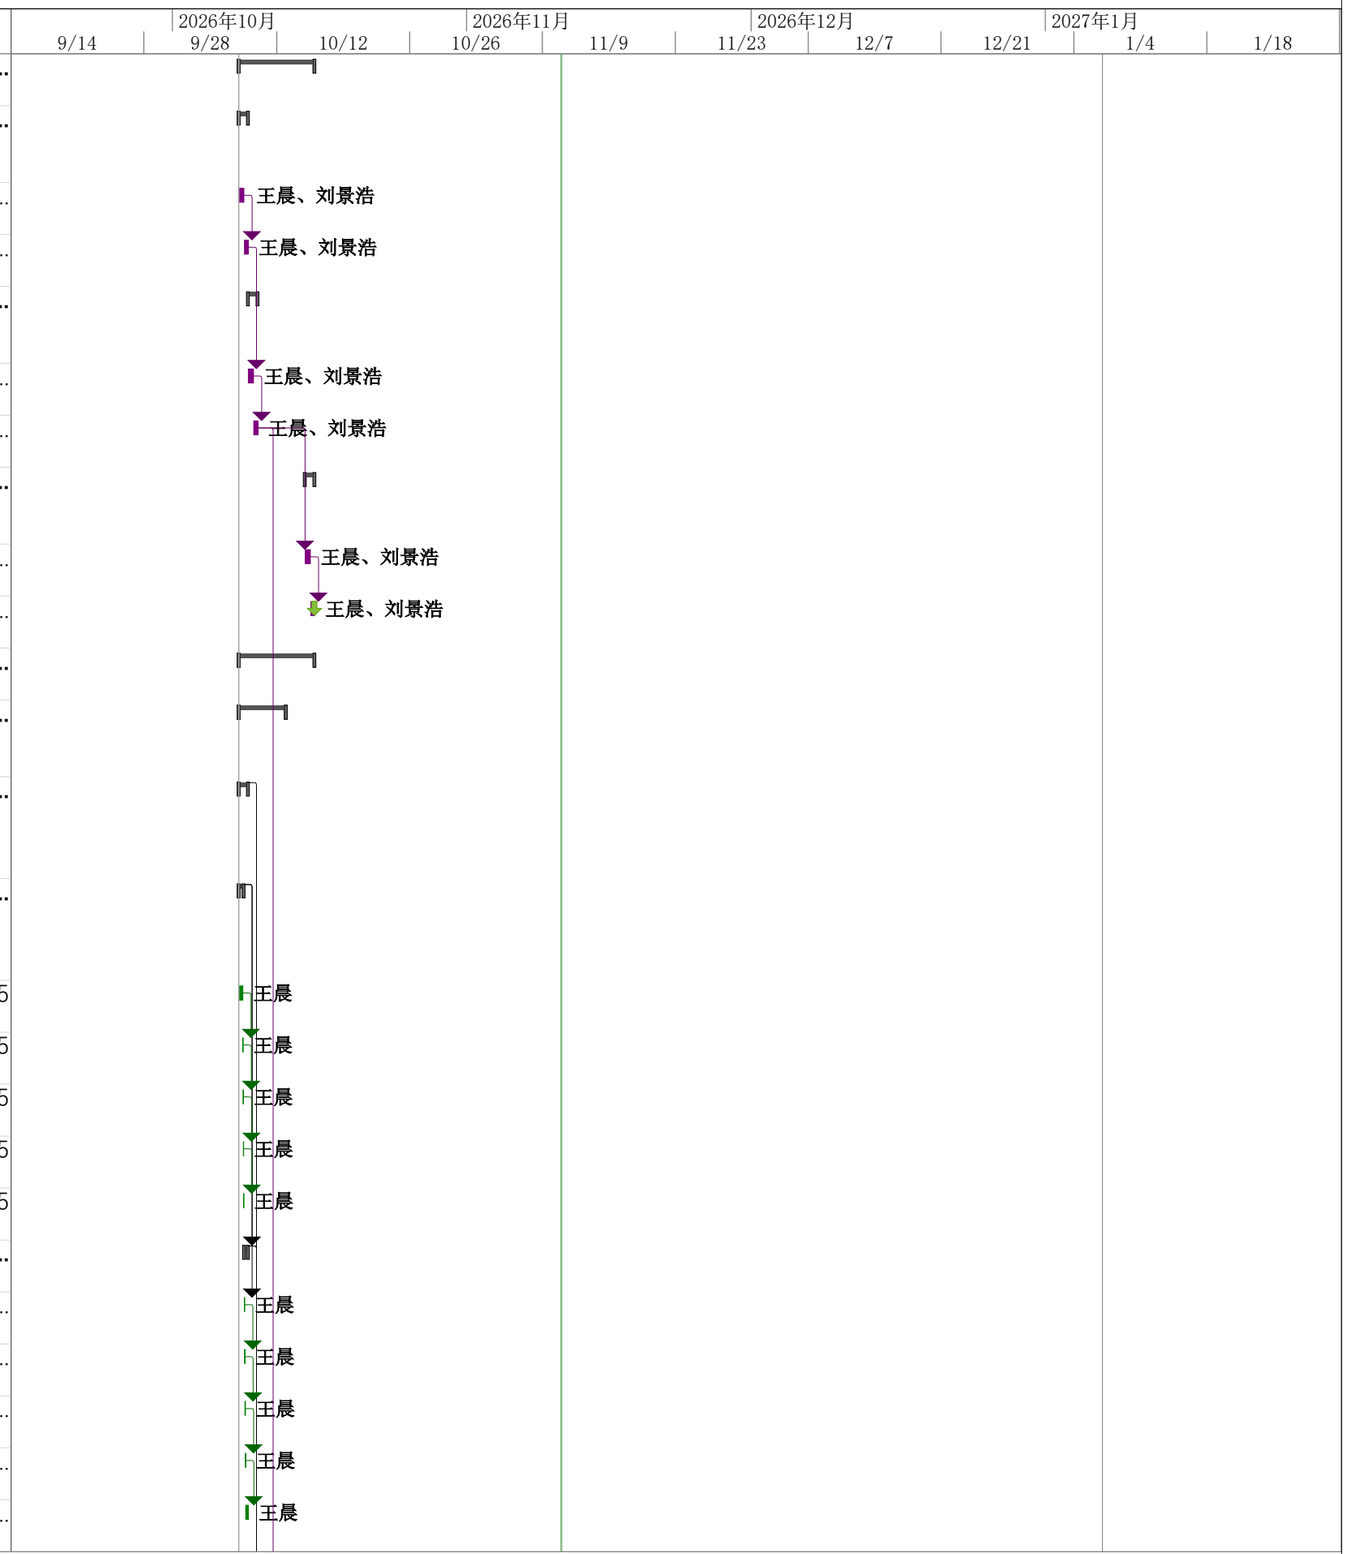


标识号	名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	任务负责人	成本
26	**2.1.2 核查独立运维、存储与恢复路径**	**2日**	**26/10/9**	**26/10/12**	**13**	**王晨**	**¥10...**
27	**2.1.2.1 FS03 导出新系统的高层逻辑模型**	**1日**	**26/10/9**	**26/10/9**	**20**	**王晨**	**¥57...**
28	2.1.2.1.1 FS03.1 抽去现状工具名称	0.2日	26/10/9	26/10/9	20	王晨	¥11....
29	2.1.2.1.2 FS03.2 定义系统边界	0.16日	26/10/9	26/10/9	28	王晨	¥9.15
30	2.1.2.1.3 FS03.3 明确输入与输出	0.16日	26/10/9	26/10/9	29	王晨	¥9.15
31	2.1.2.1.4 FS03.4 分解主要逻辑处理	0.16日	26/10/9	26/10/9	30	王晨	¥9.15
32	2.1.2.1.5 FS03.5 建立字典并检查平衡	0.16日	26/10/9	26/10/9	31	王晨	¥9.15
33	2.1.2.1.6 FS03.6 推导目标物理实现	0.16日	26/10/9	26/10/9	32	王晨	¥9.15
34	**2.1.2.2 FS04 进一步定义问题**	**1日**	**26/10/12**	**26/10/12**	**27**	**王晨**	**¥45...**
35	2.1.2.2.1 FS04.1 重写核心问题	0.2日	26/10/12	26/10/12	27	王晨	¥9.15
36	2.1.2.2.2 FS04.2 拆开问题与解决手段	0.2日	26/10/12	26/10/12	35	王晨	¥9.15
37	2.1.2.2.3 FS04.3 收紧本期范围	0.2日	26/10/12	26/10/12	36	王晨	¥9.15
38	2.1.2.2.4 FS04.4 补充反例和限制	0.2日	26/10/12	26/10/12	37	王晨	¥9.15
39	2.1.2.2.5 FS04.5 形成反馈和关闭方式	0.2日	26/10/12	26/10/12	38	王晨	¥9.15
40	**2.2 经济、操作及内容供给分析**	**2日**	**26/10/12**	**26/10/13**		**刘景浩**	**¥11...**
41	**2.2.1 核查工具、设备与现金费用**	**1日**	**26/10/12**	**26/10/12**	**7**	**刘景浩**	**¥57...**
42	**2.2.1.1 FS05 导出和评价供选择的解法**	**1日**	**26/10/12**	**26/10/12**	**27**	**刘景浩**	**¥57...**
43	2.2.1.1.1 FS05.1 形成六类解法	0.2日	26/10/12	26/10/12	27	刘景浩	¥11....
44	2.2.1.1.2 FS05.2 使用同一评价基准	0.16日	26/10/12	26/10/12	43	刘景浩	¥9.15
45	2.2.1.1.3 FS05.3 逐项比较小程序与App	0.16日	26/10/12	26/10/12	44	刘景浩	¥9.15
46	2.2.1.1.4 FS05.4 评估成员与工具能力	0.16日	26/10/12	26/10/12	45	刘景浩	¥9.15
47	2.2.1.1.5 FS05.5 换算工作量和人工成本	0.16日	26/10/12	26/10/12	46	刘景浩	¥9.15
48	2.2.1.1.6 FS05.6 计算并解释评分	0.16日	26/10/12	26/10/12	47	刘景浩	¥9.15
49	**2.2.2 分析资料来源、作者邀请与操作成本**	**1日**	**26/10/13**	**26/10/13**	**41**	**刘景浩**	**¥57...**
50	**2.2.2.1 FS06 推荐行动方针**	**1日**	**26/10/13**	**26/10/13**	**34,42**	**刘景浩**	**¥57...**
51	2.2.2.1.1 FS06.1 明确继续与否	0.2日	26/10/13	26/10/13	34,42	刘景浩	¥11....
52	2.2.2.1.2 FS06.2 给出推荐理由	0.2日	26/10/13	26/10/13	51	刘景浩	¥11....
53	2.2.2.1.3 FS06.3 说明备选方针	0.2日	26/10/13	26/10/13	52	刘景浩	¥11....
54	2.2.2.1.4 FS06.4 定义继续条件	0.2日	26/10/13	26/10/13	53	刘景浩	¥11....

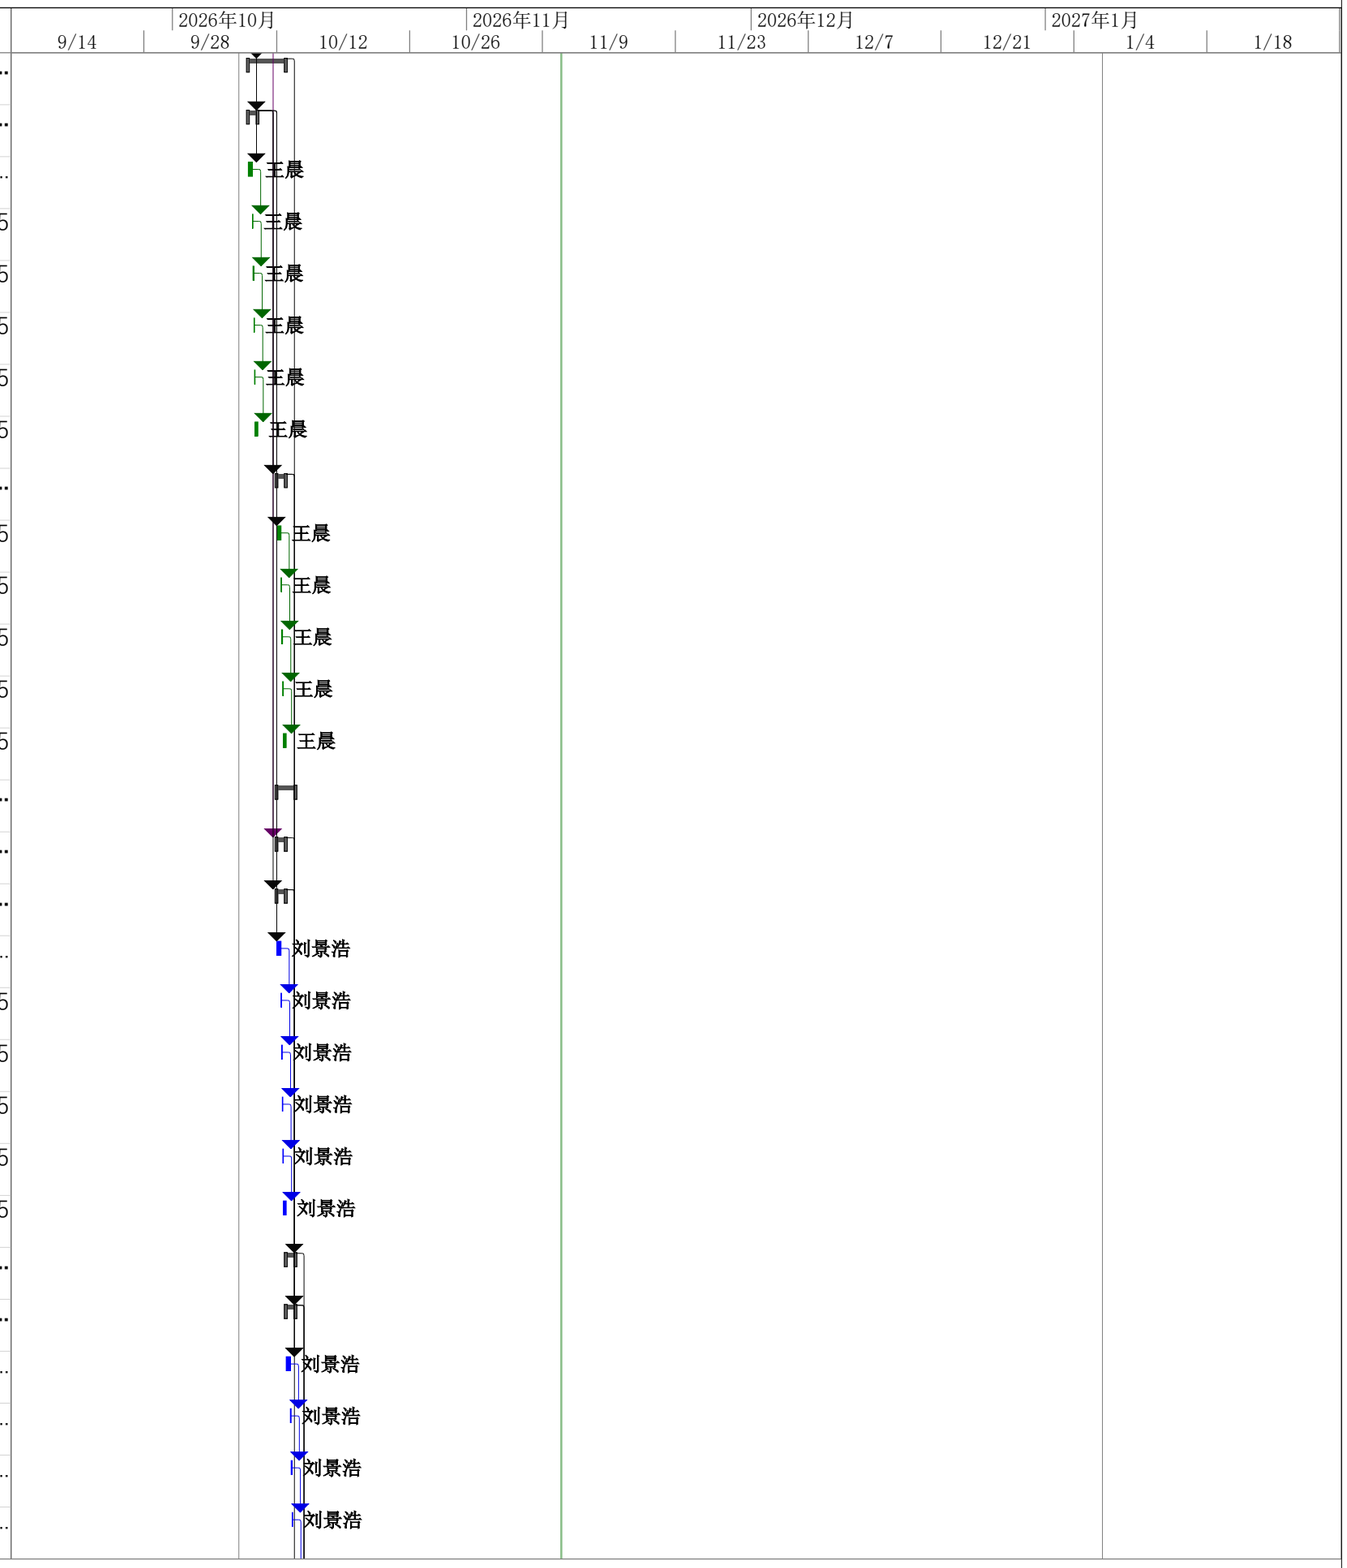


标识号	名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	任务负责人	成本
55	2.2.2.1.5 FS06.5 定义调整触发点	0.2日	26/10/13	26/10/13	54	刘景浩	¥11....
56	**2.3 可行性报告与内部评审**	**2日**	**26/10/14**	**26/10/15**		**王晨、刘景浩**	**¥13...**
57	**2.3.1 双方汇总技术与资源判断**	**1日**	**26/10/14**	**26/10/14**	**26,49**	**王晨、刘景浩**	**¥68...**
58	**2.3.1.1 FS07 草拟开发计划书**	**1日**	**26/10/14**	**26/10/14**	**50**	**王晨、刘景浩**	**¥68...**
59	2.3.1.1.1 FS07.1 分解交付工作	0.17日	26/10/14	26/10/14	50	王晨、刘景浩	¥11....
60	2.3.1.1.2 FS07.2 估算人时与人员分配	0.17日	26/10/14	26/10/14	59	王晨、刘景浩	¥11....
61	2.3.1.1.3 FS07.3 建立依赖与排期	0.17日	26/10/14	26/10/14	60	王晨、刘景浩	¥11....
62	2.3.1.1.4 FS07.4 核算成本与资源	0.17日	26/10/14	26/10/14	61	王晨、刘景浩	¥11....
63	2.3.1.1.5 FS07.5 细排下一需求阶段	0.17日	26/10/14	26/10/14	62	王晨、刘景浩	¥11....
64	2.3.1.1.6 FS07.6 安排监督与调整	0.17日	26/10/14	26/10/14	63	王晨、刘景浩	¥11....
65	**2.3.2 共同评审可行性结论与条件**	**1日**	**26/10/15**	**26/10/15**	**57**	**王晨、刘景浩**	**¥68...**
66	**2.3.2.1 FS08 写文档提交审查**	**1日**	**26/10/15**	**26/10/15**	**58**	**王晨、刘景浩**	**¥68...**
67	2.3.2.1.1 FS08.1 组织完整报告	0.17日	26/10/15	26/10/15	58	王晨、刘景浩	¥11....
68	2.3.2.1.2 FS08.2 标记版本及输入	0.17日	26/10/15	26/10/15	67	王晨、刘景浩	¥11....
69	2.3.2.1.3 FS08.3 核对图文一致	0.17日	26/10/15	26/10/15	68	王晨、刘景浩	¥11....
70	2.3.2.1.4 FS08.4 编制审查索引	0.17日	26/10/15	26/10/15	69	王晨、刘景浩	¥11....
71	2.3.2.1.5 FS08.5 区分记录与待办	0.17日	26/10/15	26/10/15	70	王晨、刘景浩	¥11....
72	2.3.2.1.6 FS08.6 接收决定并闭环	0.17日	26/10/15	26/10/15	71	王晨、刘景浩	¥11....
73	**3 需求分析**	**14日**	**26/10/16**	**26/11/4**		**按下级分配**	**¥1,...**
74	**3.1 用户场景、用例与权限边界**	**2日**	**26/10/16**	**26/10/19**		**王晨、刘景浩**	**¥18...**
75	**3.1.1 共同核对读者作者与管理场景**	**1日**	**26/10/16**	**26/10/16**	**65**	**王晨、刘景浩**	**¥91...**
76	3.1.1.1 RA01 确认用户类别与需求代表	0.5日	26/10/16	26/10/16	65	王晨、刘景浩	¥45....
77	3.1.1.2 RA02 整理需求来源与情景	0.5日	26/10/16	26/10/16	76	王晨、刘景浩	¥45....
78	**3.1.2 确认权限矩阵与核心用例**	**1日**	**26/10/19**	**26/10/19**	**75**	**王晨、刘景浩**	**¥91...**
79	3.1.2.1 RA02 描述用例主流程与异常	0.5日	26/10/19	26/10/19	75	王晨、刘景浩	¥45....
80	3.1.2.2 RA01 核对角色权限和边界	0.5日	26/10/19	26/10/19	79	王晨、刘景浩	¥45....
81	**3.2 功能、数据与非功能需求**	**2日**	**26/10/20**	**26/10/21**		**王晨**	**¥14...**
82	**3.2.1 细化文章交流、激励与治理规则**	**1日**	**26/10/20**	**26/10/20**	**78**	**王晨**	**¥73...**
83	3.2.1.1 RA01 拆分功能需求与本期范围	0.5日	26/10/20	26/10/20	78	王晨	¥36....

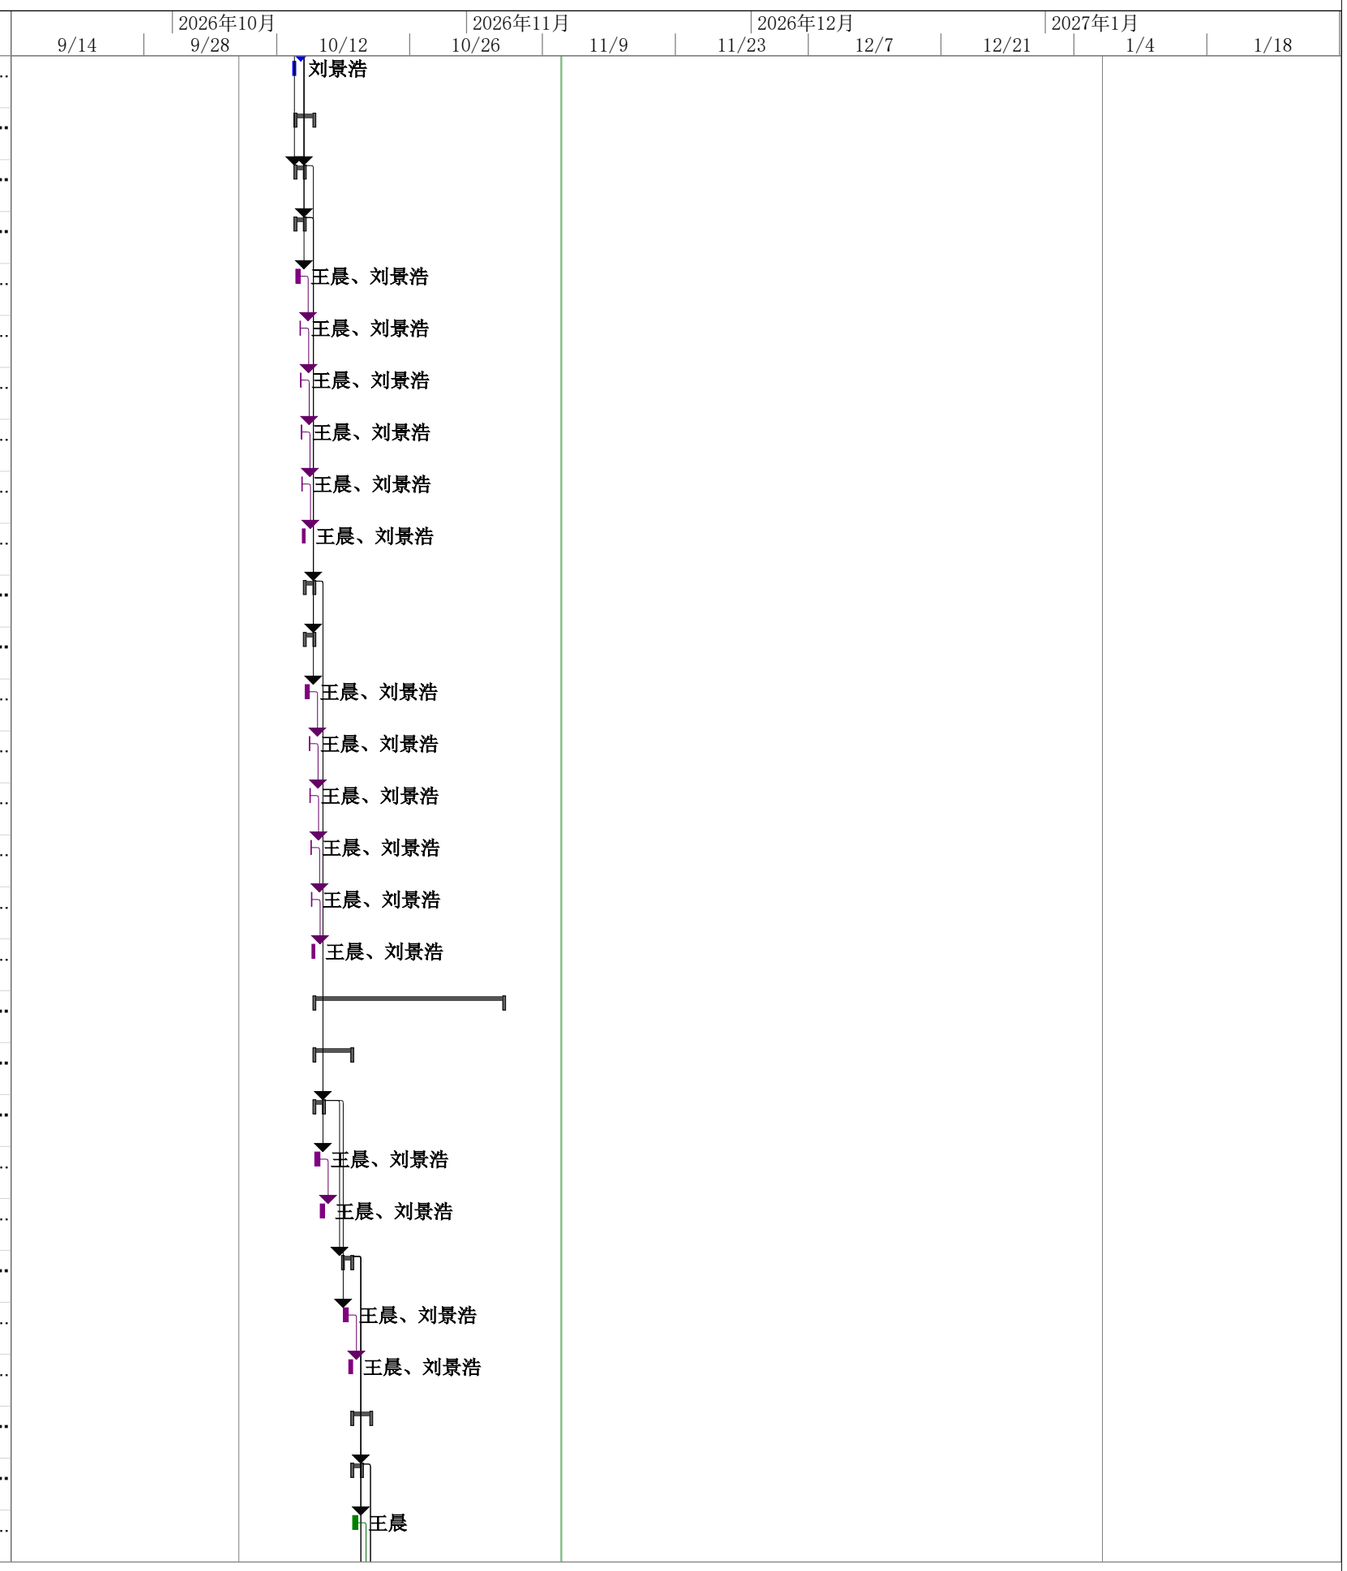


标识号	名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	任务负责人	成本
84	3.2.1.2 RA01 明确互动激励与治理规则	0.5日	26/10/20	26/10/20	83	王晨	¥36....
85	**3.2.2 定义数据、异常与非功能验收**	**1日**	**26/10/21**	**26/10/21**	**82**	**王晨**	**¥73...**
86	3.2.2.1 RA01 定义数据和接口约束	0.31日	26/10/21	26/10/21	82	王晨	¥22....
87	3.2.2.2 RA01 量化性能可靠性与安全指标	0.38日	26/10/21	26/10/21	86	王晨	¥27....
88	3.2.2.3 RA10 定义异常和验收场景	0.31日	26/10/21	26/10/21	87	王晨	¥22....
89	**3.3 双端原型与场景核对**	**2日**	**26/10/20**	**26/10/21**		**刘景浩**	**¥14...**
90	**3.3.1 绘制双端阅读创作原型**	**1日**	**26/10/20**	**26/10/20**	**78**	**刘景浩**	**¥73...**
91	3.3.1.1 RA03 整理小程序阅读与作者界面	0.5日	26/10/20	26/10/20	78	刘景浩	¥36....
92	3.3.1.2 RA03 整理网页创作与阅读线框	0.5日	26/10/20	26/10/20	91	刘景浩	¥36....
93	**3.3.2 核对社区和运维管理流程**	**1日**	**26/10/21**	**26/10/21**	**90**	**刘景浩**	**¥73...**
94	3.3.2.1 RA03 核对社区案件与关联定位	0.5日	26/10/21	26/10/21	90	刘景浩	¥36....
95	3.3.2.2 RA03 核对独立运维与执行确认	0.5日	26/10/21	26/10/21	94	刘景浩	¥36....
96	**3.4 SRS基线与需求评审材料**	**2日**	**26/10/22**	**26/10/23**		**王晨、刘景浩**	**¥18...**
97	**3.4.1 共同汇总SRS与需求追踪**	**1日**	**26/10/22**	**26/10/22**	**85,93**	**王晨、刘景浩**	**¥91...**
98	3.4.1.1 RA10 汇总功能非功能与SRS	0.5日	26/10/22	26/10/22	85,93	王晨、刘景浩	¥45....
99	3.4.1.2 RA10 关联追踪编号与输入版本	0.5日	26/10/22	26/10/22	98	王晨、刘景浩	¥45....
100	**3.4.2 内部复核并准备需求汇报**	**1日**	**26/10/23**	**26/10/23**	**97**	**王晨、刘景浩**	**¥91...**
101	3.4.2.1 RA10 组织内部需求评审	0.5日	26/10/23	26/10/23	97	王晨、刘景浩	¥45....
102	3.4.2.2 RA10 核对汇报与提交清单	0.5日	26/10/23	26/10/23	101	王晨、刘景浩	¥45....
103	**3.5 需求课堂评审反馈处理**	**0.5日**	**26/11/4**	**26/11/4**		**刘景浩**	**¥14...**
104	**3.5.1 记录需求复审意见**	**0.25日**	**26/11/4**	**26/11/4**	**141**	**刘景浩**	**¥73...**
105	3.5.1.1 RA10 登记课堂评审问题	0.13日	26/11/4	26/11/4	141	刘景浩	¥36....
106	3.5.1.2 RA10 分析范围接口和排期影响	0.13日	26/11/4	26/11/4	105	刘景浩	¥36....
107	**3.5.2 修订需求并同步设计影响**	**0.25日**	**26/11/4**	**26/11/4**	**104**	**刘景浩**	**¥73...**
108	3.5.2.1 RA10 修订需求与未关闭问题	0.13日	26/11/4	26/11/4	104	刘景浩	¥36....
109	3.5.2.2 RA10 向设计交接确认结果	0.13日	26/11/4	26/11/4	108	刘景浩	¥36....
110	**3.6 课件核对及三模型骨架**	**2日**	**26/10/28**	**26/10/29**		**王晨、刘景浩**	**¥27...**
111	**3.6.1 核对课件评审表、用户及范围**	**1日**	**26/10/28**	**26/10/28**	**100**	**王晨、刘景浩**	**¥13...**
112	3.6.1.1 RA01 核对综合要求与未来范围	0.33日	26/10/28	26/10/28	100	王晨、刘景浩	¥45....

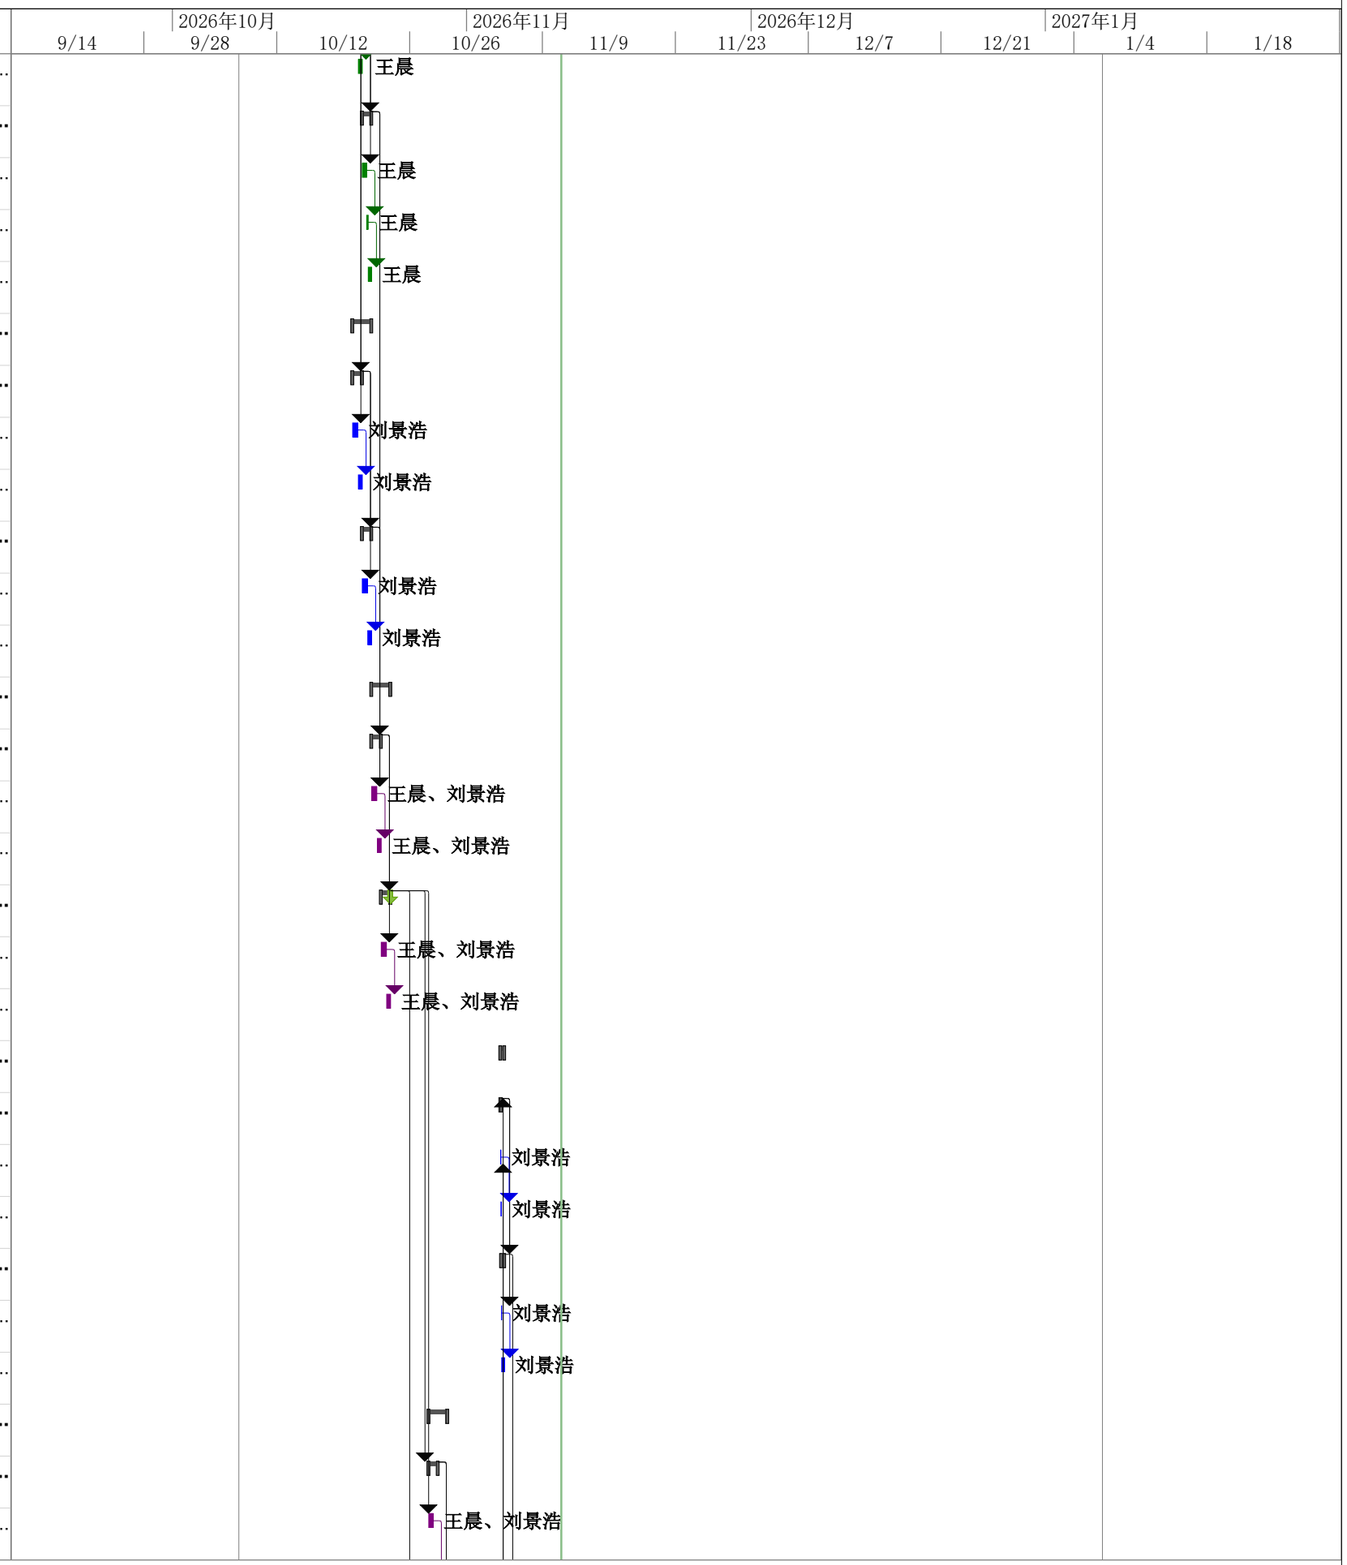


标识号	名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	任务负责人	成本
113	3.6.1.2 RA02 核对代表来源及获取方法	0.33日	26/10/28	26/10/28	112	王晨、刘景浩	¥45....
114	3.6.1.3 RA10 建立课件与评审覆盖索引	0.33日	26/10/28	26/10/28	113	王晨、刘景浩	¥45....
115	**3.6.2 建立ER与分层DFD并交叉核对**	**1日**	**26/10/29**	**26/10/29**	**111**	**王晨、刘景浩**	**¥13...**
116	3.6.2.1 RA04 建立ER实体属性与基数	0.33日	26/10/29	26/10/29	111	王晨、刘景浩	¥45....
117	3.6.2.2 RA05 建立上下文一级和关键二级DFD	0.42日	26/10/29	26/10/29	116	王晨、刘景浩	¥57....
118	3.6.2.3 RA05 核对父子流平衡与边界	0.25日	26/10/29	26/10/29	117	王晨、刘景浩	¥34....
119	**3.7 字典规范化及行为辅助模型**	**1日**	**26/10/30**	**26/10/30**		**王晨、刘景浩**	**¥22...**
120	**3.7.1 细化数据字典正则及规范化**	**0.5日**	**26/10/30**	**26/10/30**	**115**	**王晨、刘景浩**	**¥11...**
121	3.7.1.1 RA06 定义字典结构正则与语义	0.2日	26/10/30	26/10/30	115	王晨、刘景浩	¥45....
122	3.7.1.2 RA07 分析函数依赖及1NF至3NF	0.2日	26/10/30	26/10/30	121	王晨、刘景浩	¥45....
123	3.7.1.3 RA06 核对处理逻辑与反例约束	0.1日	26/10/30	26/10/30	122	王晨、刘景浩	¥22....
124	**3.7.2 核对状态转换及辅助图形**	**0.5日**	**26/10/30**	**26/10/30**	**120**	**王晨、刘景浩**	**¥11...**
125	3.7.2.1 RA08 绘制STD与状态转换表	0.2日	26/10/30	26/10/30	120	王晨、刘景浩	¥45....
126	3.7.2.2 RA09 绘制层次方框图	0.1日	26/10/30	26/10/30	125	王晨、刘景浩	¥22....
127	3.7.2.3 RA09 绘制Warnier图	0.1日	26/10/30	26/10/30	126	王晨、刘景浩	¥22....
128	3.7.2.4 RA09 编制IPO与改进IPO	0.1日	26/10/30	26/10/30	127	王晨、刘景浩	¥22....
129	**3.8 界面线框与真实用户走查**	**1日**	**26/11/2**	**26/11/2**		**王晨、刘景浩**	**¥18...**
130	**3.8.1 准备导航线框与用户代表任务**	**0.5日**	**26/11/2**	**26/11/2**	**124**	**王晨、刘景浩**	**¥91...**
131	3.8.1.1 RA03 整理青绿四页与W01至W14线框	0.25日	26/11/2	26/11/2	124	王晨、刘景浩	¥45....
132	3.8.1.2 RA03 准备代表和任务走查表	0.25日	26/11/2	26/11/2	131	王晨、刘景浩	¥45....
133	**3.8.2 执行代表走查并登记修改与确认**	**0.5日**	**26/11/2**	**26/11/2**	**130**	**王晨、刘景浩**	**¥91...**
134	3.8.2.1 RA03 执行任务并记录原话和问题	0.25日	26/11/2	26/11/2	130	王晨、刘景浩	¥45....
135	3.8.2.2 RA03 修改原型并取得复核确认	0.25日	26/11/2	26/11/2	134	王晨、刘景浩	¥45....
136	**3.9 需求验证追踪与阶段提交**	**1日**	**26/11/3**	**26/11/3**		**王晨、刘景浩**	**¥22...**
137	**3.9.1 同步SRS与四维验证及追踪**	**0.5日**	**26/11/3**	**26/11/3**	**133**	**王晨、刘景浩**	**¥11...**
138	3.9.1.1 RA10 执行一致完整现实有效检查	0.2日	26/11/3	26/11/3	133	王晨、刘景浩	¥45....
139	3.9.1.2 RA10 核对FR规则模型与验收追踪	0.2日	26/11/3	26/11/3	138	王晨、刘景浩	¥45....
140	3.9.1.3 RA10 形成SRS候选版本与问题表	0.1日	26/11/3	26/11/3	139	王晨、刘景浩	¥22....
141	**3.9.2 同步计划排期并核对评审提交包**	**0.5日**	**26/11/3**	**26/11/3**	**137**	**王晨、刘景浩**	**¥11...**

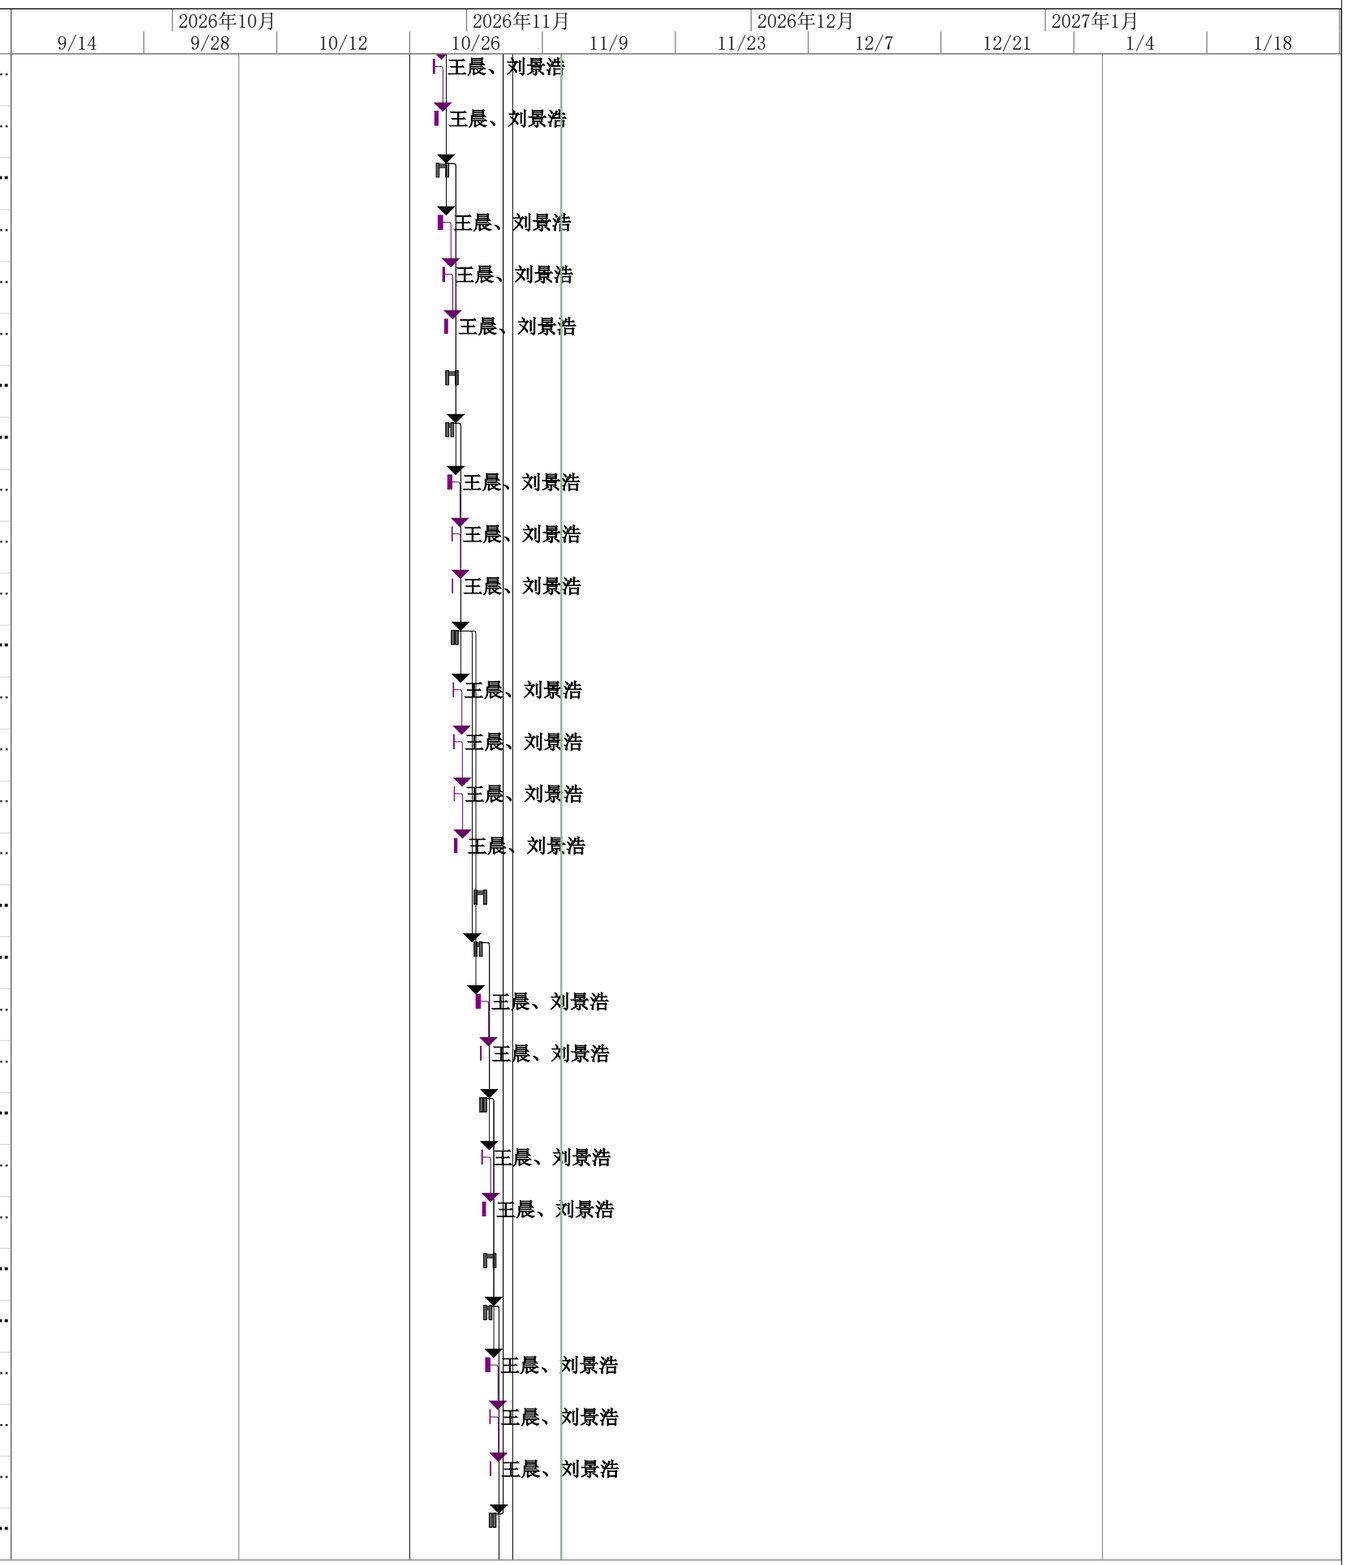


标识号	名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	任务负责人	成本
142	3.9.2.1 RA10 同步计划WBS与排期证据	0.2日	26/11/3	26/11/3	137	王晨、刘景浩	¥45....
143	3.9.2.2 RA10 按两张评审表核对交付包	0.2日	26/11/3	26/11/3	142	王晨、刘景浩	¥45....
144	3.9.2.3 RA10 准备讲稿与排练交接	0.1日	26/11/3	26/11/3	143	王晨、刘景浩	¥22....
145	**4 总体与详细设计**	**24日**	**26/10/26**	**26/11/26**		**按下级分配**	**¥1,...**
146	**4.1 设想供选择的方案**	**0.25日**	**26/10/26**	**26/10/26**			**¥36...**
147	4.1.1 梳理候选架构与数据方案	0.13日	26/10/26	26/10/26	100	王晨	¥18....
148	4.1.2 形成方案清单并判断技术可行性	0.13日	26/10/26	26/10/26	147	王晨	¥18....
149	**4.2 选取合理的方案**	**0.25日**	**26/10/26**	**26/10/26**			**¥36...**
150	4.2.1 编制低成本、中等与高成本方案	0.13日	26/10/26	26/10/26	148	王晨	¥18....
151	4.2.2 比较工程规模、成本效益与进度	0.13日	26/10/26	26/10/26	150	王晨	¥18....
152	**4.3 推荐最佳方案**	**0.25日**	**26/10/26**	**26/10/26**			**¥27...**
153	4.3.1 形成推荐方案与决策理由	0.13日	26/10/26	26/10/26	151	王晨	¥13....
154	4.3.2 记录被否方案与主要风险	0.13日	26/10/26	26/10/26	153	王晨	¥13....
155	**4.4 功能分解**	**0.25日**	**26/10/26**	**26/10/26**			**¥36...**
156	4.4.1 依据数据流图分解功能层次	0.13日	26/10/26	26/10/26	154	王晨	¥18....
157	4.4.2 建立功能与模块对应关系	0.13日	26/10/26	26/10/26	156	王晨	¥18....
158	**4.5 设计软件结构**	**0.25日**	**26/10/27**	**26/10/27**			**¥54...**
159	4.5.1 绘制层次图与结构图	0.13日	26/10/27	26/10/27	157	王晨	¥27....
160	4.5.2 检查扇入扇出、耦合与内聚	0.13日	26/10/27	26/10/27	159	王晨	¥27....
161	**4.6 设计数据库**	**0.25日**	**26/10/27**	**26/10/27**			**¥45...**
162	4.6.1 由ER图导出表结构与约束	0.13日	26/10/27	26/10/27	160	王晨	¥22....
163	4.6.2 核对索引、迁移与数据字典	0.13日	26/10/27	26/10/27	162	王晨	¥22....
164	**4.7 制定测试计划**	**0.25日**	**26/10/27**	**26/10/27**			**¥41...**
165	4.7.1 确定测试策略、范围与环境	0.13日	26/10/27	26/10/27	163	刘景浩	¥20....
166	4.7.2 编排测试进度与资源	0.13日	26/10/27	26/10/27	165	刘景浩	¥20....
167	**4.8 书写总体设计文档**	**0.25日**	**26/10/27**	**26/10/27**			**¥41...**
168	4.8.1 编写总体设计报告正文	0.13日	26/10/27	26/10/27	166	王晨	¥20....
169	4.8.2 整理结构图、接口与数据库设计	0.13日	26/10/27	26/10/27	168	王晨	¥20....
170	**4.9 审查和复审**	**1日**	**26/11/5**	**26/11/5**			**¥10...**

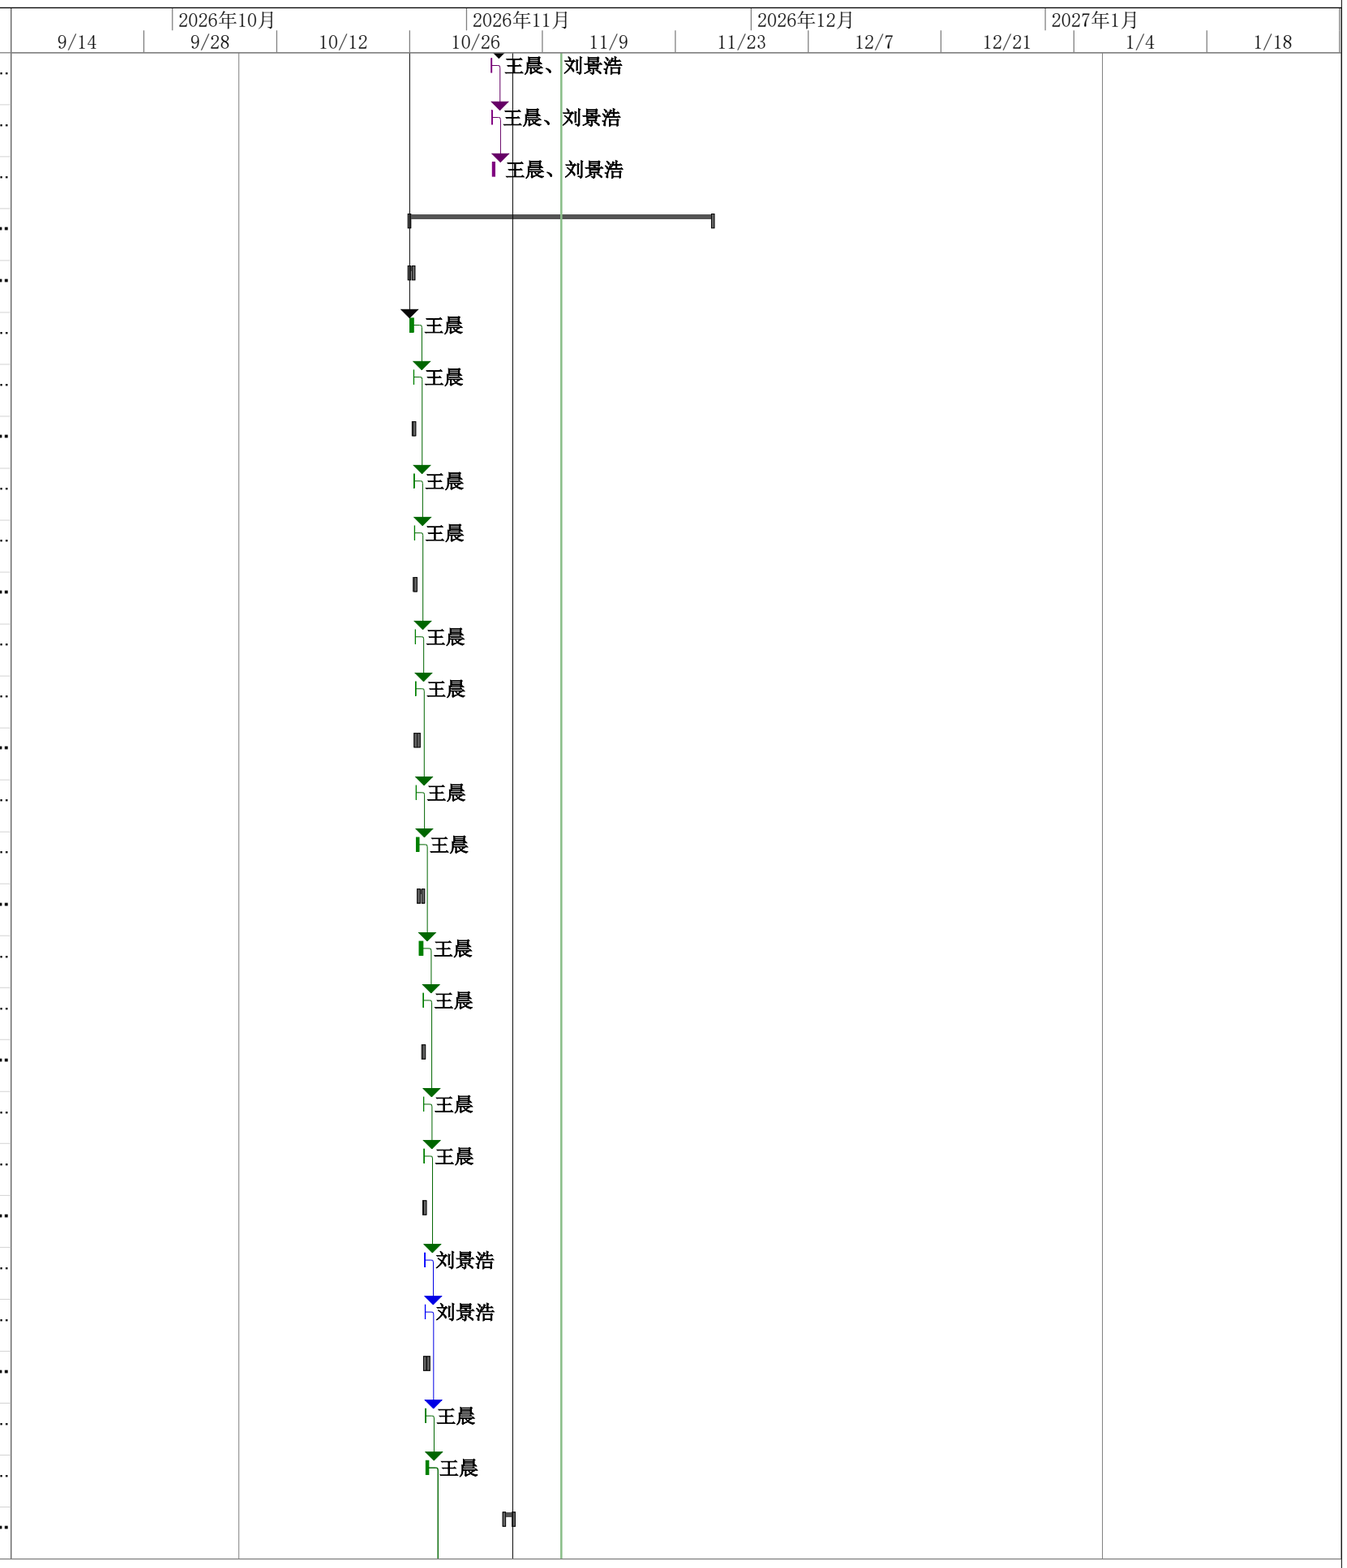


标识号	名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	任务负责人	成本
171	4.9.1 技术审查并登记设计问题	0.5日	26/11/5	26/11/5	178,181,18	王晨	¥36....
172	4.9.2 管理复审并确认内部设计基线	0.5日	26/11/5	26/11/5	171	刘景浩	¥68....
173	**4.10 认证、内容、激励与治理详细设计**	**1.5日**	**26/10/29**	**26/10/30**			**¥20...**
174	4.10.1 细化认证、文章与治理状态	0.5日	26/10/29	26/10/29	169	王晨	¥11...
175	4.10.2 细化币事务、隐私与异常处理	0.5日	26/10/30	26/10/30	174	王晨	¥91....
176	**4.11 双端浏览与创作详细设计**	**3日**	**26/10/29**	**26/11/2**			**¥20...**
177	4.11.1 设计网页Markdown与移动图文	1日	26/10/29	26/10/29	169	刘景浩	¥11...
178	4.11.2 设计图片、草稿与跨端编辑流程	2日	26/10/30	26/11/2	177	刘景浩	¥91....
179	**4.12 部署、备份与恢复详细设计**	**2日**	**26/11/2**	**26/11/3**			**¥20...**
180	4.12.1 定义运维接口、鉴权与白名单	1日	26/11/2	26/11/2	175	王晨	¥11...
181	4.12.2 设计备份一致性、恢复与失败保护	1日	26/11/3	26/11/3	180	王晨	¥91....
182	**4.13 测试用例设计与数据准备**	**1日**	**26/11/3**	**26/11/3**			**¥20...**
183	4.13.1 编制核心与异常验收用例	0.5日	26/11/3	26/11/3	178,175	刘景浩	¥11...
184	4.13.2 准备合成数据与性能脚本方案	0.5日	26/11/3	26/11/3	183	刘景浩、王晨	¥91....
185	**4.14 课堂设计反馈与模块调整**	**1日**	**26/11/26**	**26/11/26**			**¥21...**
186	4.14.1 共同登记课堂设计意见	0.5日	26/11/26	26/11/26	212,221	刘景浩、王晨	¥10...
187	4.14.2 分别调整模块并共同复核	0.5日	26/11/26	26/11/26	186	刘景浩、王晨	¥10...
188	**5 编码与单元测试**	**16日**	**26/11/6**	**26/11/27**		**按下级分配**	**¥2,...**
189	**5.1 项目骨架、配置与接口约定**	**1日**	**26/11/6**	**26/11/6**		**王晨**	**¥82...**
190	5.1.1 搭建模块骨架与环境配置	0.5日	26/11/6	26/11/6	172	王晨	¥36....
191	5.1.2 核对共享接口和错误格式	0.5日	26/11/6	26/11/6	190	王晨	¥45....
192	**5.2 登录、邮箱与材料认证**	**2日**	**26/11/9**	**26/11/10**		**王晨**	**¥13...**
193	5.2.1 实现登录与校园邮箱验证	1日	26/11/9	26/11/9	191	王晨	¥68....
194	5.2.2 实现材料认证接口和角色限制	1日	26/11/10	26/11/10	193	王晨	¥68....
195	**5.3 文章存储、岗位检索与筛选接口**	**3日**	**26/11/11**	**26/11/13**		**王晨**	**¥91...**
196	5.3.1 实现文章图片、草稿存储接口	1日	26/11/11	26/11/11	194	王晨	¥45....
197	5.3.2 实现岗位专业公司筛选与分页	2日	26/11/12	26/11/13	196	王晨	¥45....
198	**5.4 小程序与网页阅读页面**	**3日**	**26/11/6**	**26/11/10**		**刘景浩**	**¥25...**
199	5.4.1 实现双端筛选与阅读界面	1日	26/11/6	26/11/6	172	刘景浩	¥16...

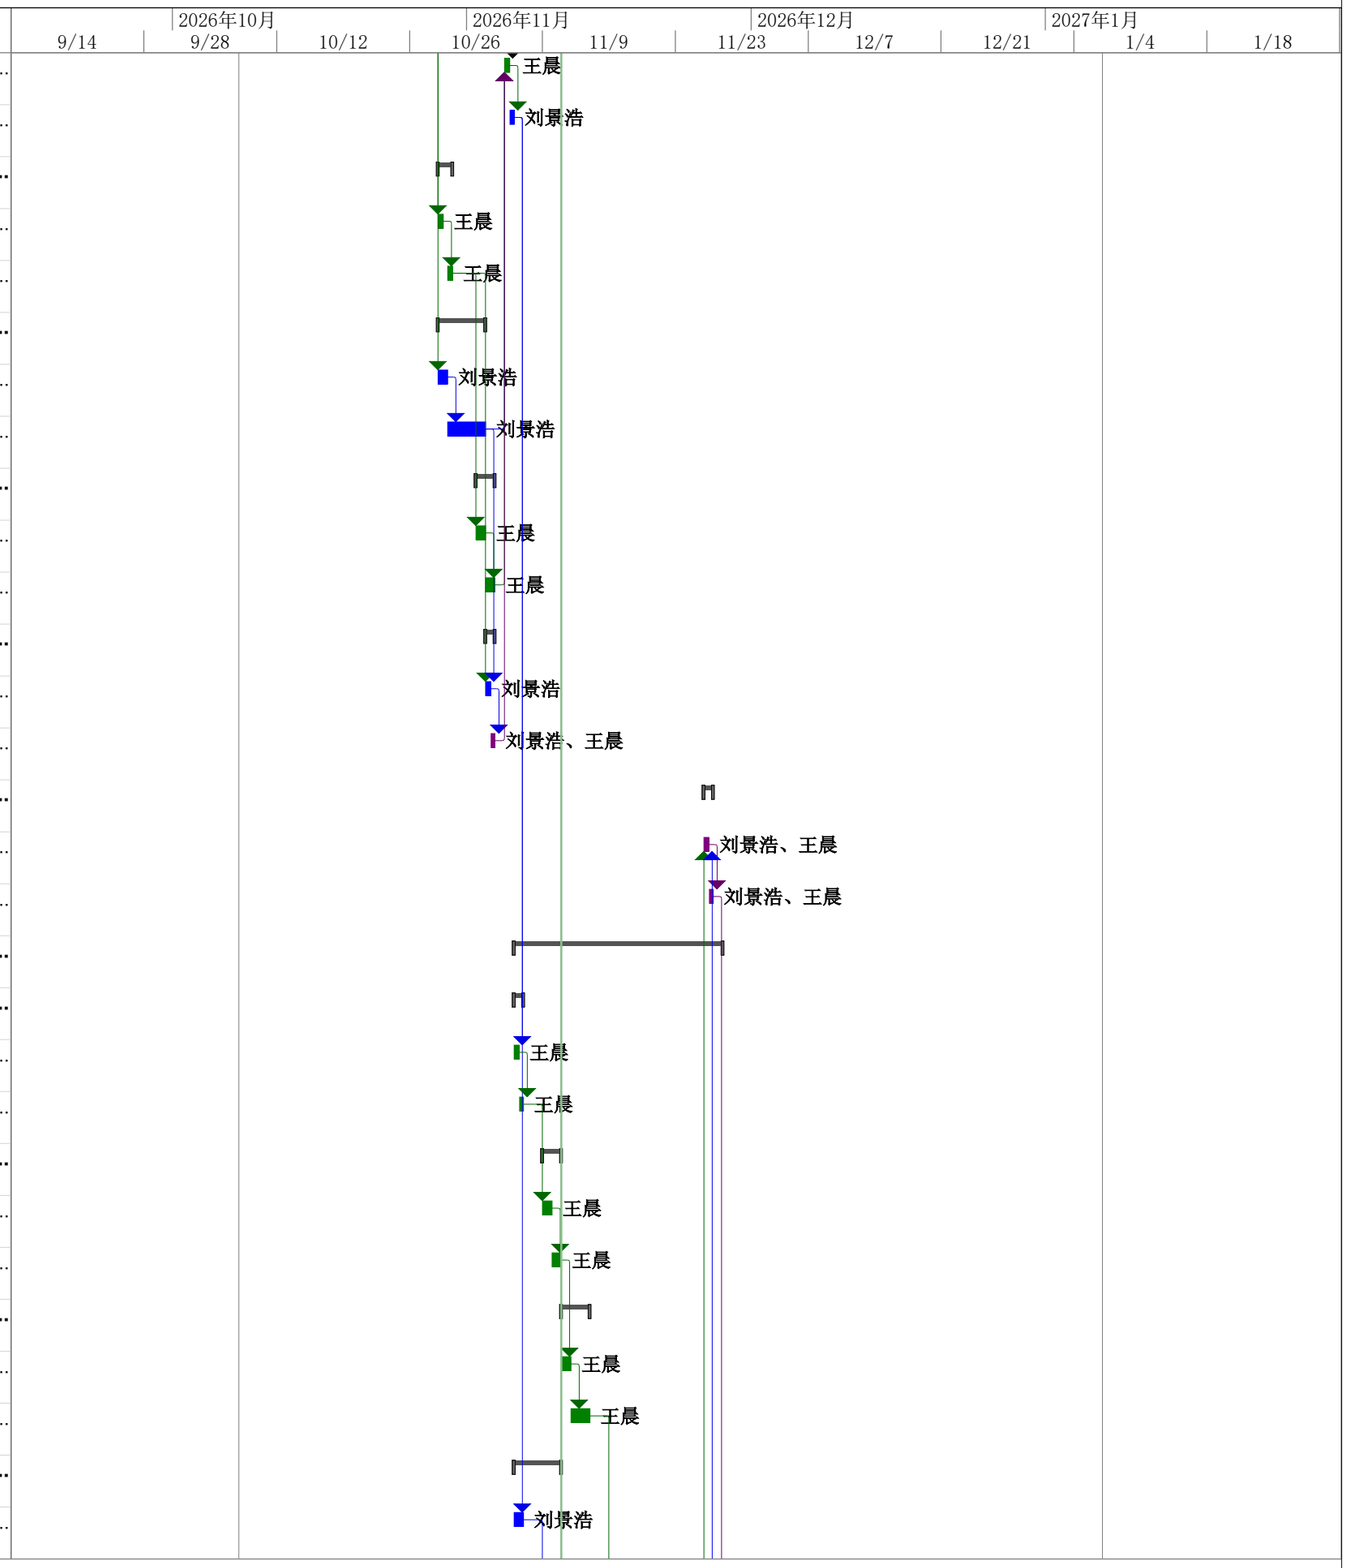


标识号	名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	任务负责人	成本
200	5.4.2 核对游客状态、失败和空结果	2日	26/11/9	26/11/10	199	刘景浩	¥91....
201	**5.5 网页Markdown创作与草稿**	**3日**	**26/11/11**	**26/11/13**		**刘景浩**	**¥25...**
202	5.5.1 实现Markdown、图片和资料链接	1日	26/11/11	26/11/11	200	刘景浩	¥16...
203	5.5.2 实现预览、保存与草稿恢复	2日	26/11/12	26/11/13	202	刘景浩	¥91....
204	**5.6 小程序文字与图片创作**	**2日**	**26/11/16**	**26/11/17**		**王晨**	**¥25...**
205	5.6.1 实现移动图文编辑和上传	1日	26/11/16	26/11/16	197	王晨	¥16...
206	5.6.2 实现移动草稿保存及恢复	1日	26/11/17	26/11/17	205	王晨	¥91....
207	**5.7 双端草稿、发布与文章管理**	**2日**	**26/11/18**	**26/11/19**		**王晨**	**¥25...**
208	5.7.1 实现发布、修改、下架和恢复接口	1日	26/11/18	26/11/18	206,203	王晨	¥16...
209	5.7.2 接通双端作者文章管理	1日	26/11/19	26/11/19	208	王晨	¥91....
210	**5.8 评论、点赞、投币、收藏与荣誉**	**3日**	**26/11/20**	**26/11/24**		**王晨**	**¥25...**
211	5.8.1 实现主页、评论图片及收藏交流	1日	26/11/20	26/11/20	209	王晨	¥16...
212	5.8.2 实现点赞、领取投币、荣誉排序与通知	2日	26/11/23	26/11/24	211	王晨	¥91....
213	**5.9 社区审核、反馈与举报网页**	**3日**	**26/11/16**	**26/11/18**		**刘景浩**	**¥25...**
214	5.9.1 实现认证审核与举报反馈处理接口	1日	26/11/16	26/11/16	203	刘景浩	¥16...
215	5.9.2 实现社区管理网页并联调	2日	26/11/17	26/11/18	214	刘景浩	¥91....
216	**5.10 独立运维执行与备份服务**	**3日**	**26/11/19**	**26/11/23**		**刘景浩**	**¥29...**
217	5.10.1 实现独立运维任务执行服务	1日	26/11/19	26/11/19	215	刘景浩	¥18...
218	5.10.2 实现部署重启、备份恢复及失败保护	2日	26/11/20	26/11/23	217	刘景浩	¥11...
219	**5.11 运维网页、状态与操作记录**	**2日**	**26/11/24**	**26/11/25**		**刘景浩**	**¥29...**
220	5.11.1 实现运维状态、日志和备份列表	1日	26/11/24	26/11/24	218	刘景浩	¥18...
221	5.11.2 联调网页部署重启与备份恢复	1日	26/11/25	26/11/25	220	刘景浩	¥11...
222	**5.12 系统联调、构建与实现基线**	**1日**	**26/11/27**	**26/11/27**		**王晨、刘景浩**	**¥27...**
223	5.12.1 双方接通真实接口与跨端链路	0.5日	26/11/27	26/11/27	187	王晨、刘景浩	¥13...
224	5.12.2 构建候选版本并归档实现证据	0.5日	26/11/27	26/11/27	223	王晨、刘景浩	¥13...
225	**6 综合测试**	**7日**	**26/11/30**	**26/12/8**		**按下级分配**	**¥1,...**
226	**6.1 功能、接口与集成测试**	**2日**	**26/11/30**	**26/12/1**		**刘景浩**	**¥12...**
227	6.1.1 执行角色及核心业务功能用例	1日	26/11/30	26/11/30	224	刘景浩	¥54....
228	6.1.2 执行接口、集成和失败场景	1日	26/12/1	26/12/1	227	刘景浩	¥68....

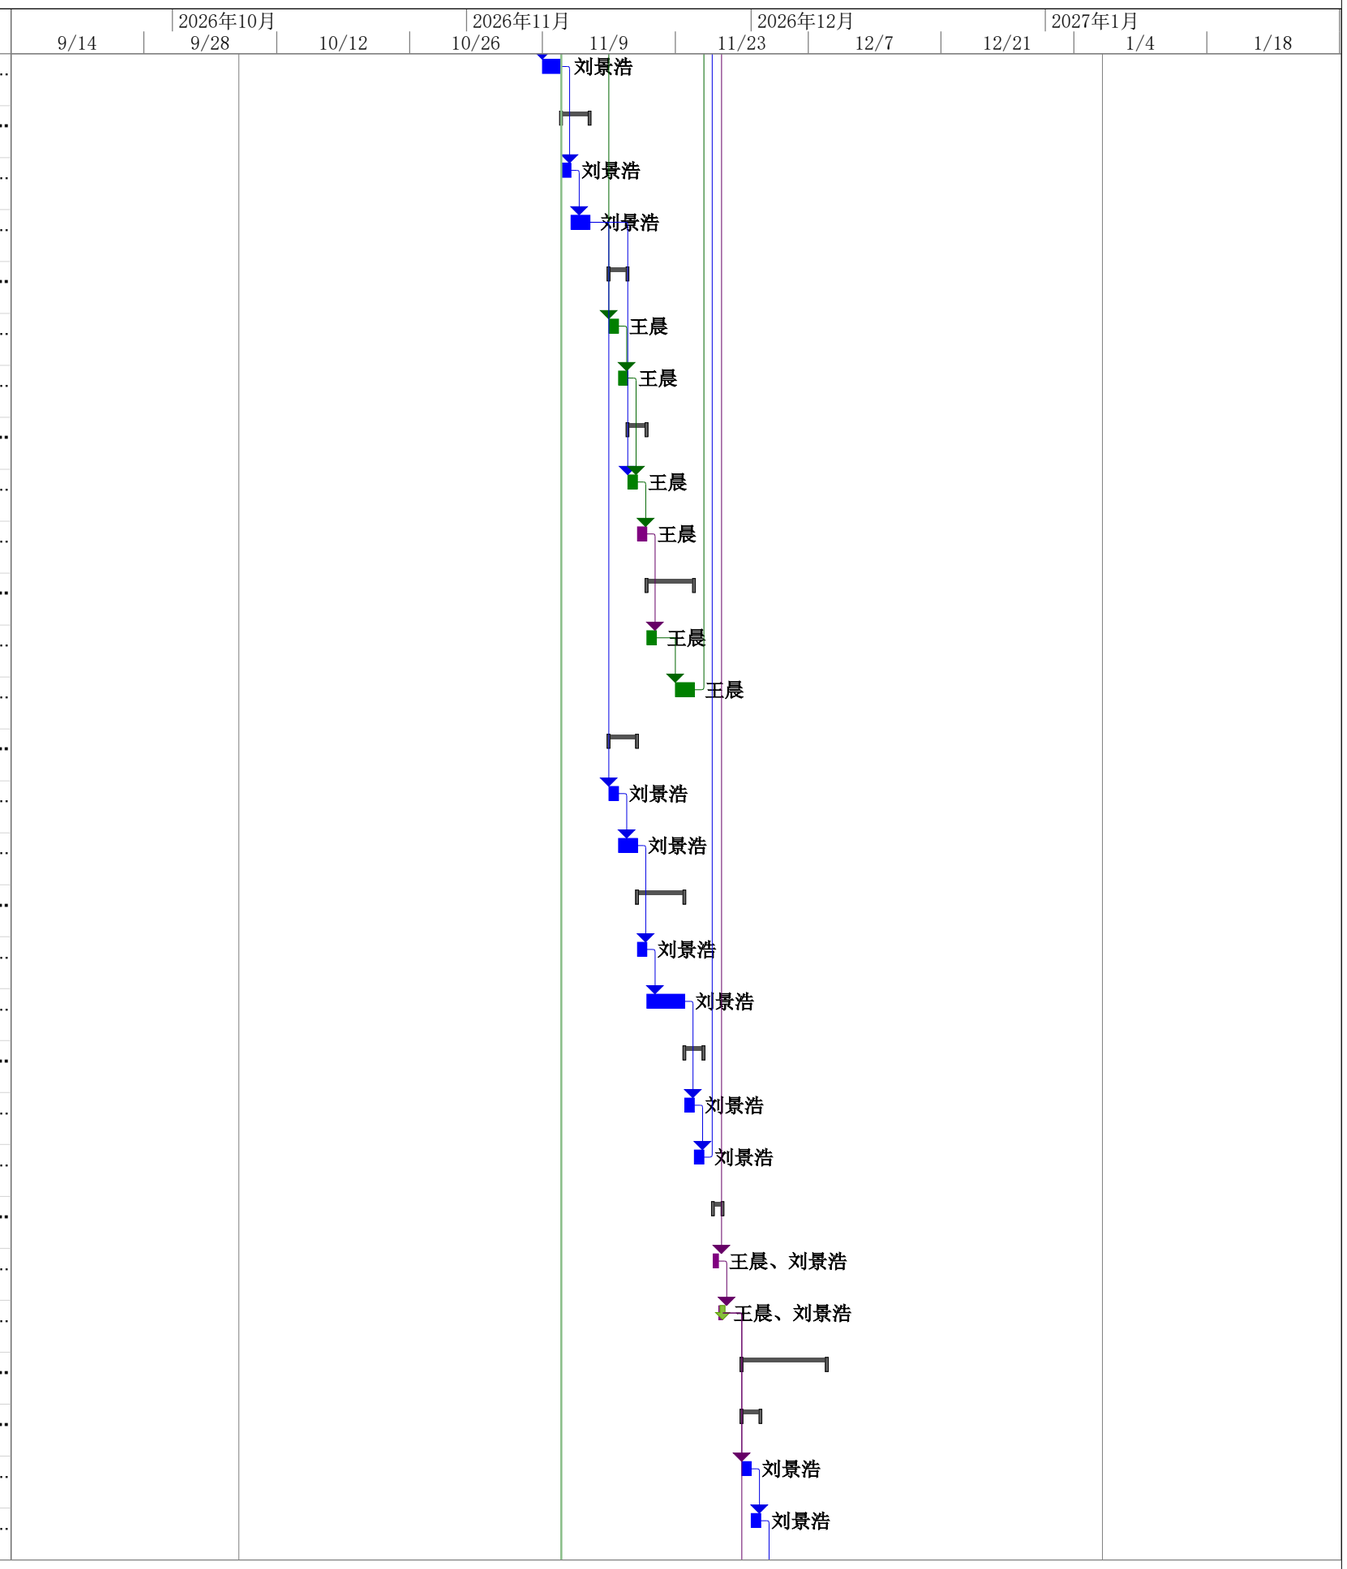


标识号	名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	任务负责人	成本
229	**6.2 性能与负载测试**	**2日**	**26/11/30**	**26/12/1**		**王晨**	**¥12...**
230	6.2.1 固定环境执行30并发负载	1日	26/11/30	26/11/30	224	王晨	¥54....
231	6.2.2 分析P95、错误率与资源占用	1日	26/12/1	26/12/1	230	王晨	¥68....
232	**6.3 压力与稳定性测试**	**1日**	**26/12/2**	**26/12/2**		**王晨**	**¥12...**
233	6.3.1 执行阶梯压力寻找容量边界	0.5日	26/12/2	26/12/2	231	王晨	¥54....
234	6.3.2 执行稳定性与降载恢复	0.5日	26/12/2	26/12/2	233	王晨	¥68....
235	**6.4 安全权限与双端兼容测试**	**1日**	**26/12/2**	**26/12/2**		**刘景浩**	**¥12...**
236	6.4.1 执行越权隐私与危险输入检查	0.5日	26/12/2	26/12/2	228	刘景浩	¥54....
237	6.4.2 执行双端浏览编辑与图片兼容	0.5日	26/12/2	26/12/2	236	刘景浩	¥68....
238	**6.5 部署、故障与备份恢复验证**	**1日**	**26/12/3**	**26/12/3**		**王晨**	**¥12...**
239	6.5.1 验证冷启动与网页运维操作	0.5日	26/12/3	26/12/3	234	王晨	¥54....
240	6.5.2 验证损坏备份、回退与恢复一致性	0.5日	26/12/3	26/12/3	239	王晨	¥68....
241	**6.6 缺陷修复、复测与回归**	**1.5日**	**26/12/3**	**26/12/4**		**刘景浩**	**¥18...**
242	6.6.1 按模块分派缺陷并修复	0.5日	26/12/3	26/12/3	237,234	王晨、刘景浩	¥11...
243	6.6.2 交叉复测原场景与相邻流程	1日	26/12/3	26/12/4	242	刘景浩	¥68....
244	**6.7 测试报告与系统内部验收**	**0.5日**	**26/12/4**	**26/12/4**		**王晨、刘景浩**	**¥10...**
245	6.7.1 双方确认测试结论与交付限制	0.5日	26/12/4	26/12/4	243,240	王晨、刘景浩	¥10...
246	**6.8 测试报告复核与提交准备**	**2日**	**26/12/7**	**26/12/8**		**王晨**	**¥12...**
247	6.8.1 复核测试报告与证据链	1日	26/12/7	26/12/7	245	王晨	¥54....
248	6.8.2 整理课堂测试汇报和已有修订	1日	26/12/8	26/12/8	247	王晨	¥68....
249	**7 部署与维护**	**7日**	**26/12/9**	**26/12/17**		**按下级分配**	**¥68...**
250	**7.1 安装包、用户与维护说明**	**2日**	**26/12/9**	**26/12/10**		**王晨**	**¥13...**
251	7.1.1 整理安装、用户及管理操作说明	1日	26/12/9	26/12/9	248	王晨	¥68....
252	7.1.2 整理运维、恢复与故障维护规程	1日	26/12/10	26/12/10	251	王晨	¥68....
253	**7.2 干净环境启动与课堂演示**	**1日**	**26/12/11**	**26/12/11**		**王晨**	**¥13...**
254	7.2.1 在干净配置核对冷启动	0.5日	26/12/11	26/12/11	252	王晨	¥68....
255	7.2.2 核对演示数据、认证与外网失败回退	0.5日	26/12/11	26/12/11	254	王晨	¥68....
256	**7.3 维护申请与变更演练**	**1日**	**26/12/14**	**26/12/14**		**刘景浩**	**¥13...**
257	7.3.1 登记维护申请和影响分析	0.5日	26/12/14	26/12/14	255	刘景浩	¥68....

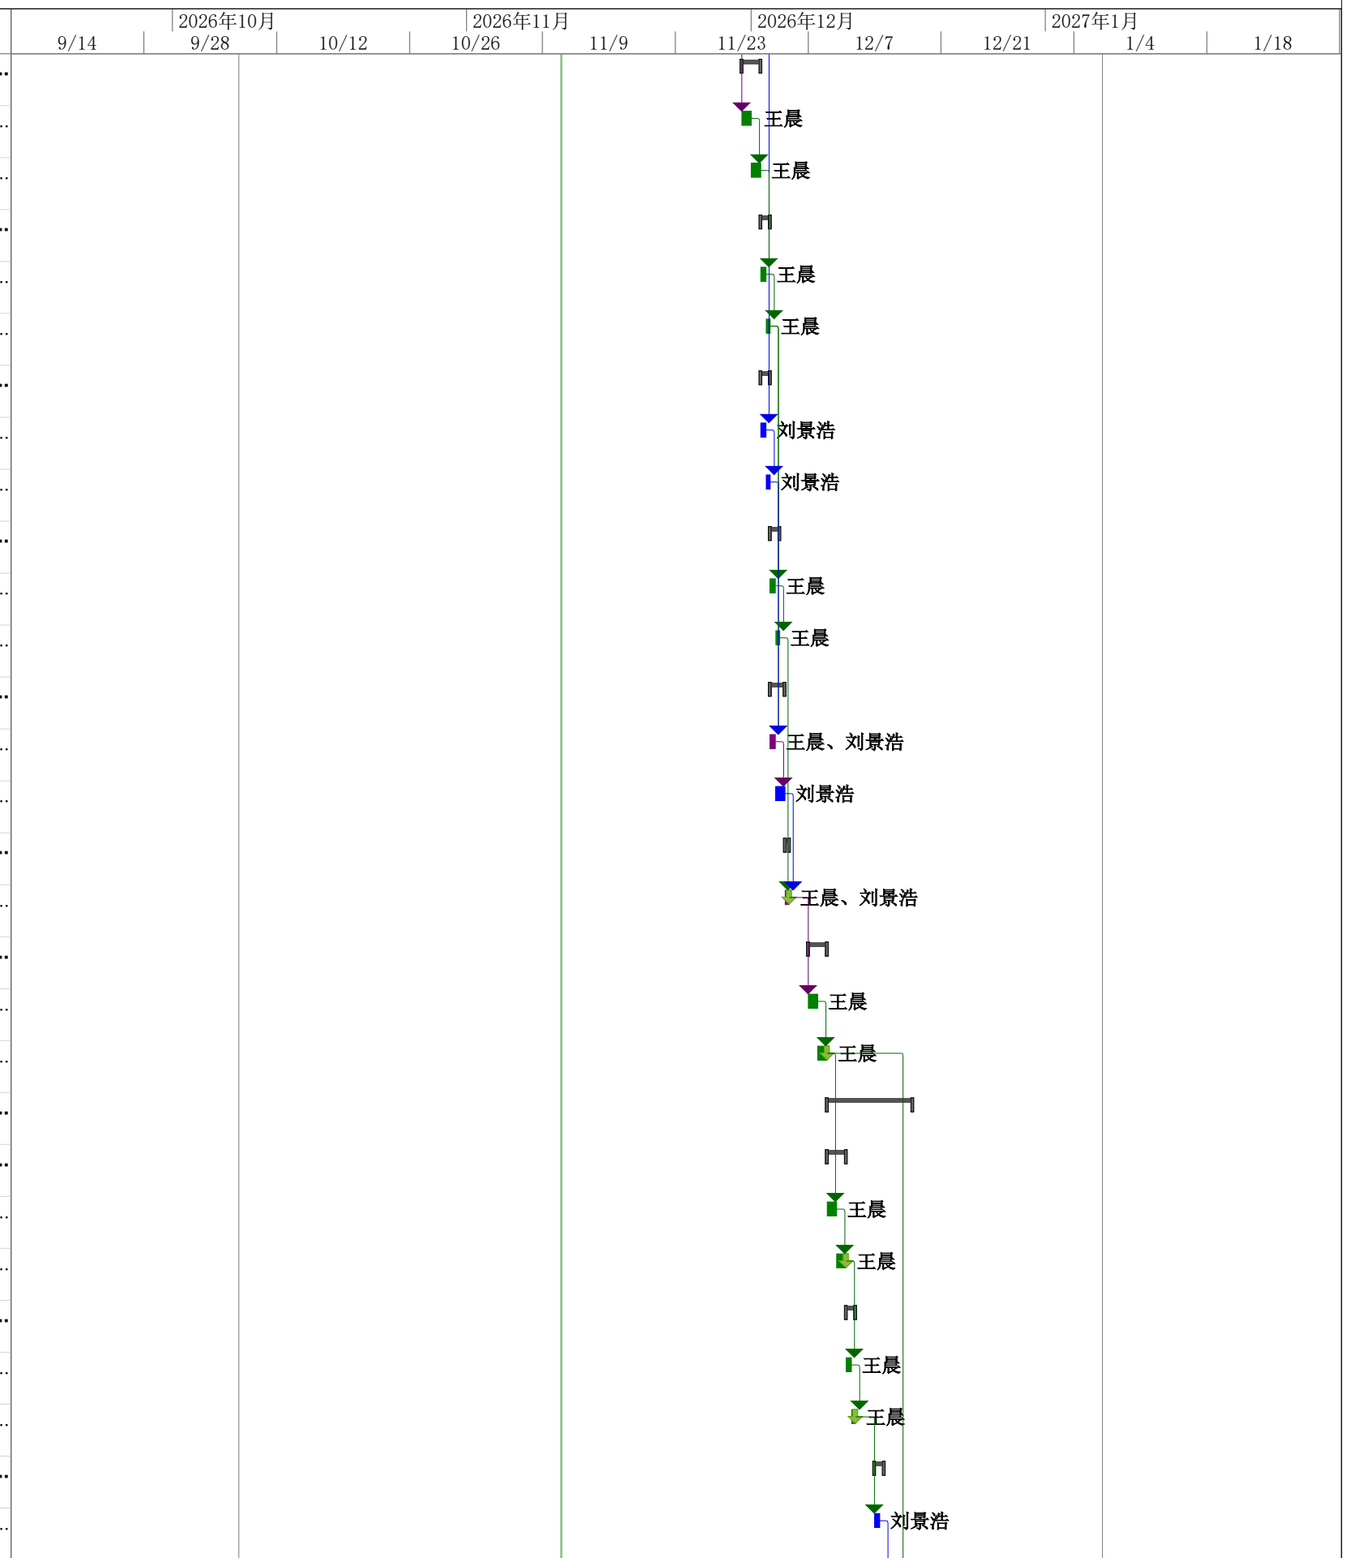

标识号	名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	任务负责人	成本
258	7.3.2 执行修改回退及回归演练	0.5日	26/12/14	26/12/14	257	刘景浩	¥68....
259	**7.4 运维交接与反馈整改**	**1日**	**26/12/15**	**26/12/15**		**王晨**	**¥13...**
260	7.4.1 核对备份、配置与维护资料	0.5日	26/12/15	26/12/15	258	王晨	¥68....
261	7.4.2 双方练习操作并确认交接	0.5日	26/12/15	26/12/15	260	王晨	¥68....
262	**7.5 课堂测试评审意见处理**	**1日**	**26/12/17**	**26/12/17**		**刘景浩**	**¥13...**
263	7.5.1 登记12月16日测试评审意见	0.5日	26/12/17	26/12/17	248	刘景浩	¥68....
264	7.5.2 修订报告及相关实现用例	0.5日	26/12/17	26/12/17	263	刘景浩	¥68....
265	**8 总结与收尾**	**13日**	**26/12/18**	**27/1/6**		**按下级分配**	**¥76...**
266	**8.1 项目总结与计划偏差分析**	**2日**	**26/12/18**	**26/12/21**		**王晨、刘景浩**	**¥16...**
267	8.1.1 共同核对计划实际与阶段成果	1日	26/12/18	26/12/18	261,264	王晨、刘景浩	¥82....
268	8.1.2 共同总结偏差风险和协作贡献	1日	26/12/21	26/12/21	267	王晨、刘景浩	¥82....
269	**8.2 总评材料与详细计划附录**	**2日**	**26/12/22**	**26/12/23**		**王晨**	**¥13...**
270	8.2.1 整理总评PPT资料和详细周计划	1日	26/12/22	26/12/22	268	王晨	¥68....
271	8.2.2 核对引用、图表与交付目录	1日	26/12/23	26/12/23	270	王晨	¥68....
272	**8.3 最终验收与汇报演练**	**1日**	**26/12/24**	**26/12/24**		**王晨、刘景浩**	**¥16...**
273	8.3.1 共同执行交付清单核查	0.5日	26/12/24	26/12/24	271	王晨、刘景浩	¥82....
274	8.3.2 共同预演并确认提交版本	0.5日	26/12/24	26/12/24	273	王晨、刘景浩	¥82....
275	**8.4 总评反馈处理与归档**	**2日**	**26/12/31**	**27/1/4**		**王晨**	**¥13...**
276	8.4.1 处理总评意见并准备提交基线	1日	26/12/31	26/12/31	274	王晨	¥68....
277	8.4.2 核对提交后尾项与最终归档	1日	27/1/4	27/1/4	276	王晨	¥68....
278	**8.5 课程收尾与交付确认**	**1日**	**27/1/6**	**27/1/6**		**王晨、刘景浩**	**¥16...**
279	8.5.1 共同核对课程收尾材料	0.5日	27/1/6	27/1/6	277	王晨、刘景浩	¥82....
280	8.5.2 共同确认交付与后续维护边界	0.5日	27/1/6	27/1/6	279	王晨、刘景浩	¥82....
281	**M 持续项目管理与交叉复核**	**64日**	**26/10/8**	**27/1/6**		**按下级分配**	**¥1,...**
282	M01 周进度风险与评审提交管理	2日	26/10/8	26/10/9		王晨	¥38....
283	M02 周进度风险与评审提交管理	5日	26/10/12	26/10/16		王晨	¥38....
284	M03 周进度风险与评审提交管理	5日	26/10/19	26/10/23		王晨	¥38....
285	M04 周进度风险与评审提交管理	5日	26/10/26	26/10/30		王晨	¥38....
286	M05 周进度风险与评审提交管理	5日	26/11/2	26/11/6		王晨	¥38....

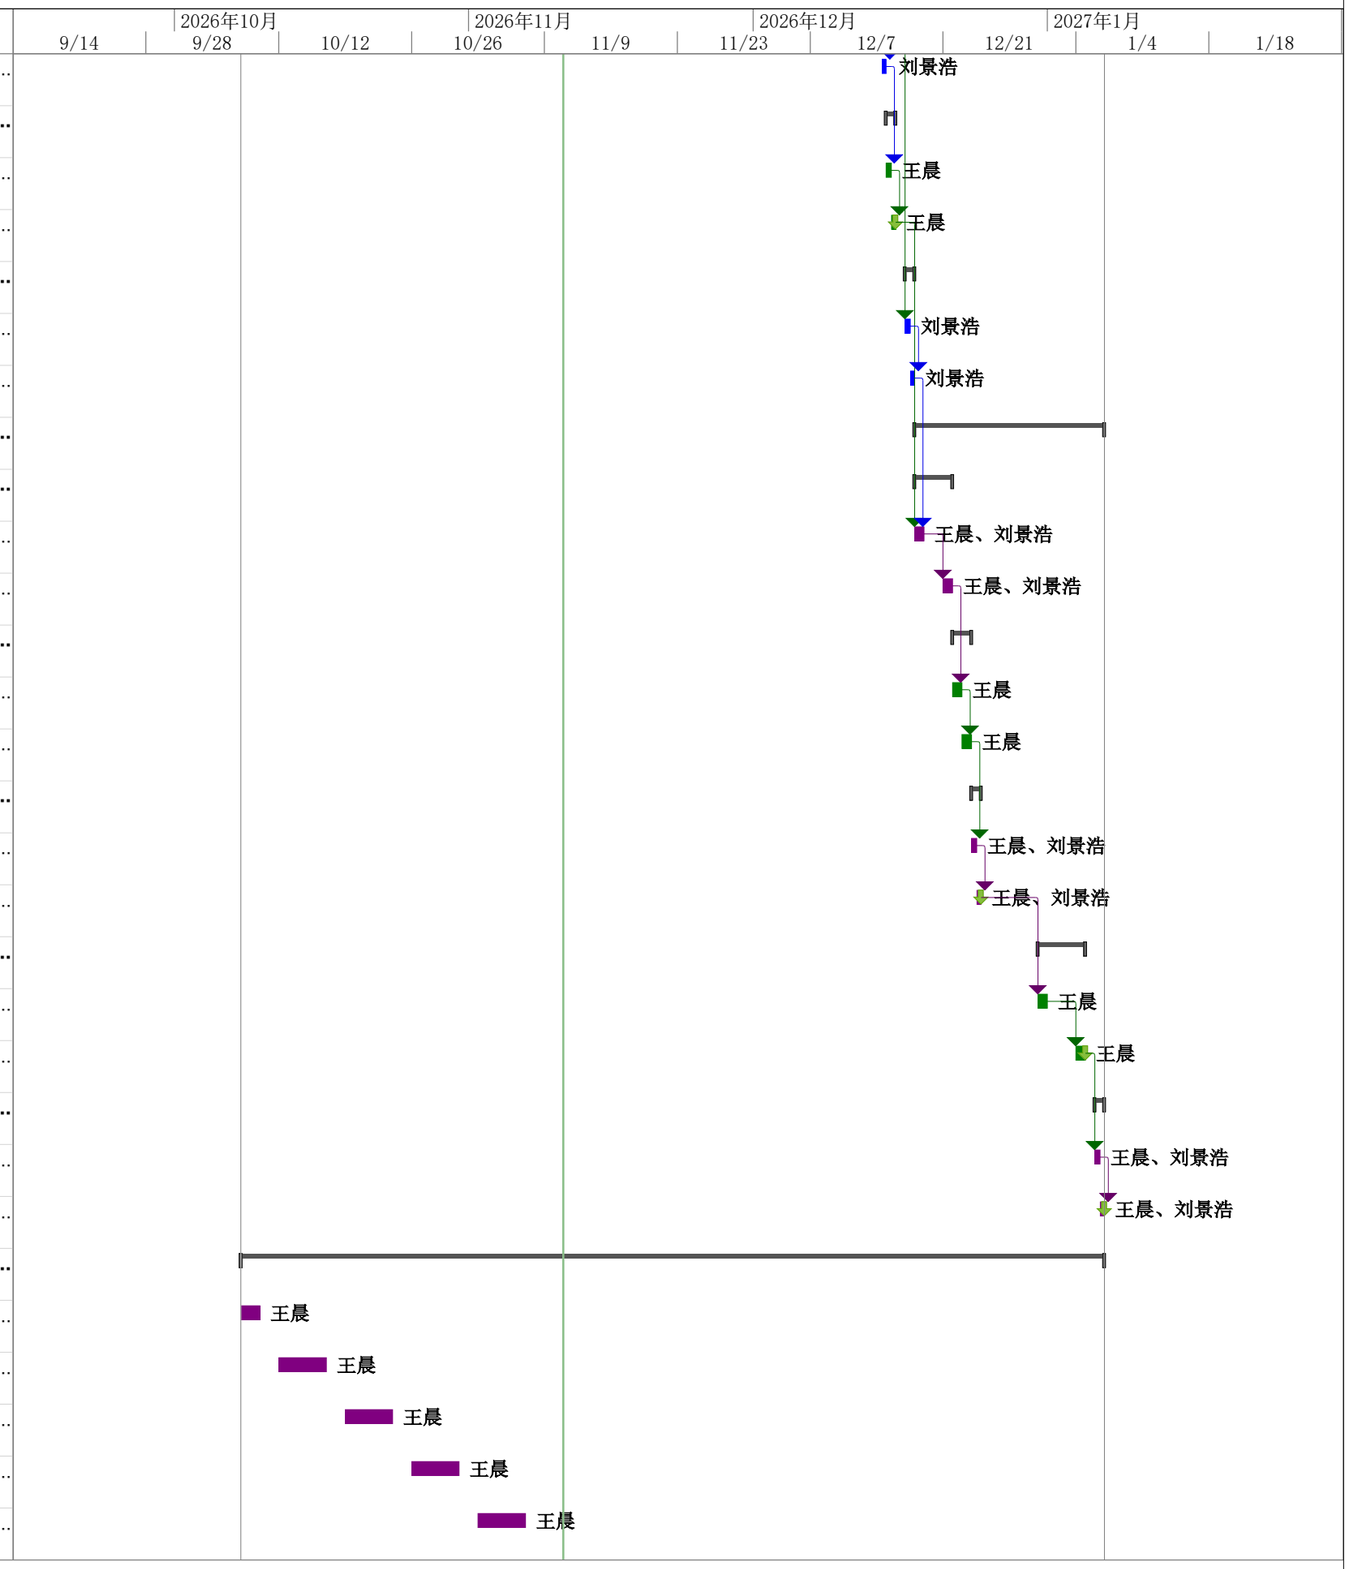


标识号	名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	任务负责人	成本
287	M06 周进度风险与评审提交管理	5日	26/11/9	26/11/13		王晨	¥38....
288	M07 周进度风险与评审提交管理	5日	26/11/16	26/11/20		王晨	¥38....
289	M08 周进度风险与评审提交管理	5日	26/11/23	26/11/27		王晨	¥38....
290	M09 周进度风险与评审提交管理	5日	26/11/30	26/12/4		王晨	¥38....
291	M10 周进度风险与评审提交管理	5日	26/12/7	26/12/11		王晨	¥38....
292	M11 周进度风险与评审提交管理	5日	26/12/14	26/12/18		王晨	¥38....
293	M12 周进度风险与评审提交管理	5日	26/12/21	26/12/25		王晨	¥38....
294	M13 周进度风险与评审提交管理	4日	26/12/28	26/12/31		王晨	¥38....
295	M14 周进度风险与评审提交管理	3日	27/1/4	27/1/6		王晨	¥38....
296	R2.1 复核与交接 关键技术与工具可行性验证	3日	26/10/8	26/10/12		刘景浩	¥20....
297	R2.2 复核与交接 经济、操作及内容供给分析	2日	26/10/12	26/10/13		王晨	¥20....
298	R3.2 复核与交接 功能、数据与非功能需求	2日	26/10/20	26/10/21		刘景浩	¥20....
299	R3.3 复核与交接 双端原型与场景核对	2日	26/10/20	26/10/21		王晨	¥20....
300	R3.5 复核与交接 需求课堂评审反馈处理	0.5日	26/11/4	26/11/4		王晨	¥20....
301	R4.1 复核与交接 系统架构、接口与数据库设计	3日	26/10/26	26/10/28		刘景浩	¥20....
302	R4.2 复核与交接 认证、内容、激励与治理设计	2日	26/10/29	26/10/30		刘景浩	¥20....
303	R4.3 复核与交接 双端浏览与创作详细设计	3日	26/10/29	26/11/2		王晨	¥20....
304	R4.4 复核与交接 部署、备份与恢复详细设计	2日	26/11/2	26/11/3		刘景浩	¥20....
305	R4.6 复核与交接 测试用例设计与数据准备	1日	26/11/3	26/11/3		王晨	¥20....
306	R5.1 复核与交接 项目骨架、配置与接口约定	1日	26/11/6	26/11/6		刘景浩	¥20....
307	R5.2 复核与交接 登录、邮箱与材料认证	2日	26/11/9	26/11/10		刘景浩	¥20....
308	R5.3 复核与交接 文章存储、岗位检索与筛选接口	3日	26/11/11	26/11/13		刘景浩	¥20....
309	R5.4 复核与交接 小程序与网页阅读页面	3日	26/11/6	26/11/10		王晨	¥20....
310	R5.5 复核与交接 网页Markdown创作与草稿	3日	26/11/11	26/11/13		王晨	¥20....
311	R5.6 复核与交接 小程序文字与图片创作	2日	26/11/16	26/11/17		刘景浩	¥20....
312	R5.7 复核与交接 双端草稿、发布与文章管理	2日	26/11/18	26/11/19		刘景浩	¥20....
313	R5.8 复核与交接 评论、点赞、投币、收藏与荣誉	3日	26/11/20	26/11/24		刘景浩	¥20....
314	R5.9 复核与交接 社区审核、反馈与举报网页	3日	26/11/16	26/11/18		王晨	¥20....
315	R5.10 复核与交接 独立运维执行与备份服务	3日	26/11/19	26/11/23		王晨	¥20....

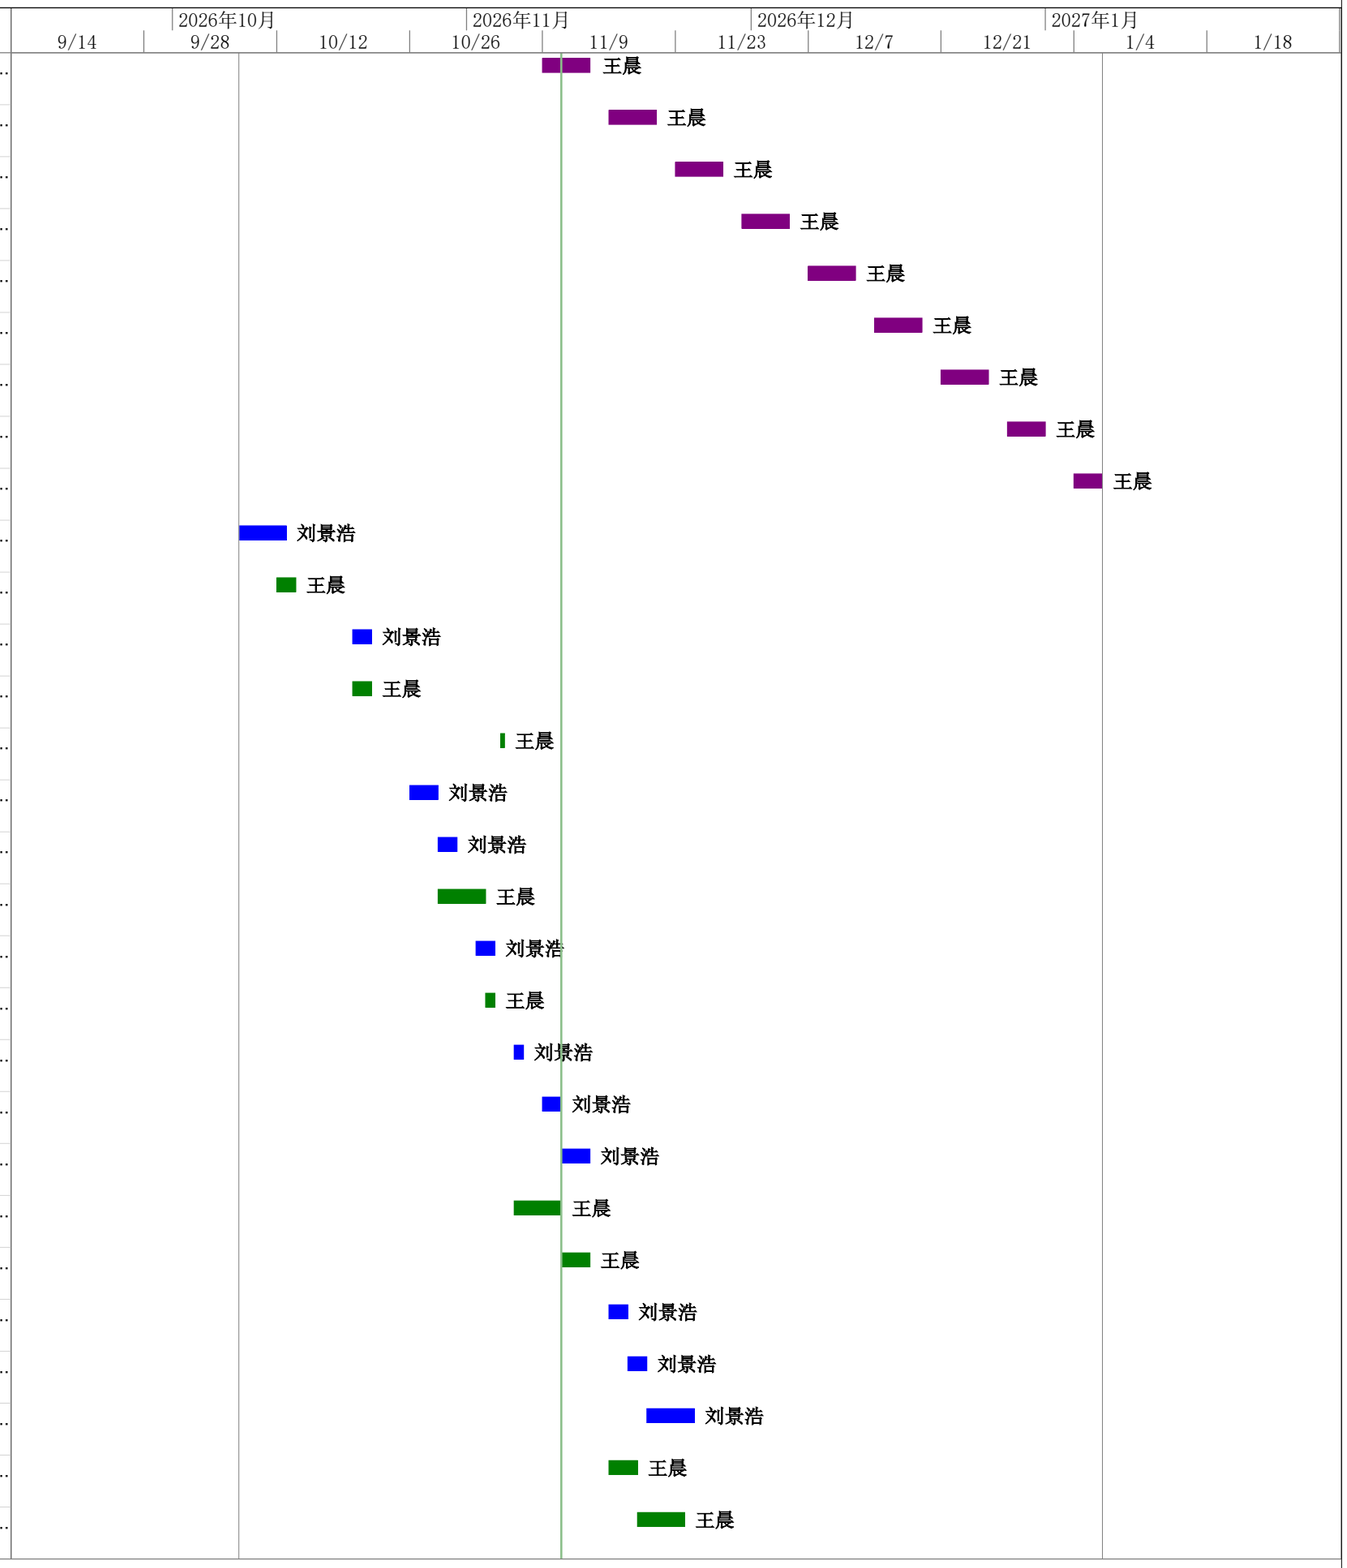

城院帮 G04 项目计划 | Microsoft Project 原生甘特图 | 青色王晨 蓝色刘景浩 紫色共同完成

标识号	名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	任务负责人	成本
316	R5.11 复核与交接 运维网页、状态与操作记录	2日	26/11/24	26/11/25		王晨	¥20....
317	R6.1 复核与交接 功能、接口与集成测试	2日	26/11/30	26/12/1		王晨	¥20....
318	R6.2 复核与交接 性能与负载测试	2日	26/11/30	26/12/1		刘景浩	¥20....
319	R6.3 复核与交接 压力与稳定性测试	1日	26/12/2	26/12/2		刘景浩	¥20....
320	R6.4 复核与交接 安全权限与双端兼容测试	1日	26/12/2	26/12/2		王晨	¥20....
321	R6.5 复核与交接 部署、故障与备份恢复验证	1日	26/12/3	26/12/3		刘景浩	¥20....
322	R6.6 复核与交接 缺陷修复、复测与回归	1.5日	26/12/3	26/12/4		王晨	¥20....
323	R6.8 复核与交接 测试报告复核与提交准备	2日	26/12/7	26/12/8		刘景浩	¥20....
324	R7.1 复核与交接 安装包、用户与维护说明	2日	26/12/9	26/12/10		刘景浩	¥20....
325	R7.2 复核与交接 干净环境启动与课堂演示	1日	26/12/11	26/12/11		刘景浩	¥20....
326	R7.3 复核与交接 维护申请与变更演练	1日	26/12/14	26/12/14		王晨	¥20....
327	R7.4 复核与交接 运维交接与反馈整改	1日	26/12/15	26/12/15		刘景浩	¥20....
328	R7.5 复核与交接 课堂测试评审意见处理	1日	26/12/17	26/12/17		王晨	¥20....
329	R8.2 复核与交接 总评材料与详细计划附录	2日	26/12/22	26/12/23		刘景浩	¥20....
330	R8.4 复核与交接 总评反馈处理与归档	2日	26/12/31	27/1/4		刘景浩	¥20....
331	**K 课程里程碑**	**59日**	**26/10/14**	**27/1/6**		**按下级分配**	**¥0.00**
332	K01 项目计划课堂评审	0日	26/10/14	26/10/14		按下级分配	¥0.00
333	K02 可行性报告课堂节点	0日	26/10/21	26/10/21		按下级分配	¥0.00
334	K03 SRS需求课堂评审	0日	26/10/28	26/10/28		按下级分配	¥0.00
335	K04 SRS修订与需求复审	0日	26/11/4	26/11/4		按下级分配	¥0.00
336	K05 总体设计课堂节点	0日	26/11/11	26/11/11		按下级分配	¥0.00
337	K06 详细设计课堂节点	0日	26/11/18	26/11/18		按下级分配	¥0.00
338	K07 设计评审与翻转PPT1	0日	26/11/25	26/11/25		按下级分配	¥0.00
339	K08 代码用例与翻转PPT2	0日	26/12/2	26/12/2		按下级分配	¥0.00
340	K09 系统测试报告课堂节点	0日	26/12/9	26/12/9		按下级分配	¥0.00
341	K10 测试报告修订课堂评审	0日	26/12/16	26/12/16		按下级分配	¥0.00
342	K11 项目总结与总评PPT	0日	26/12/30	26/12/30		按下级分配	¥0.00
343	K12 课程收尾与交付确认	0日	27/1/6	27/1/6		按下级分配	¥0.00

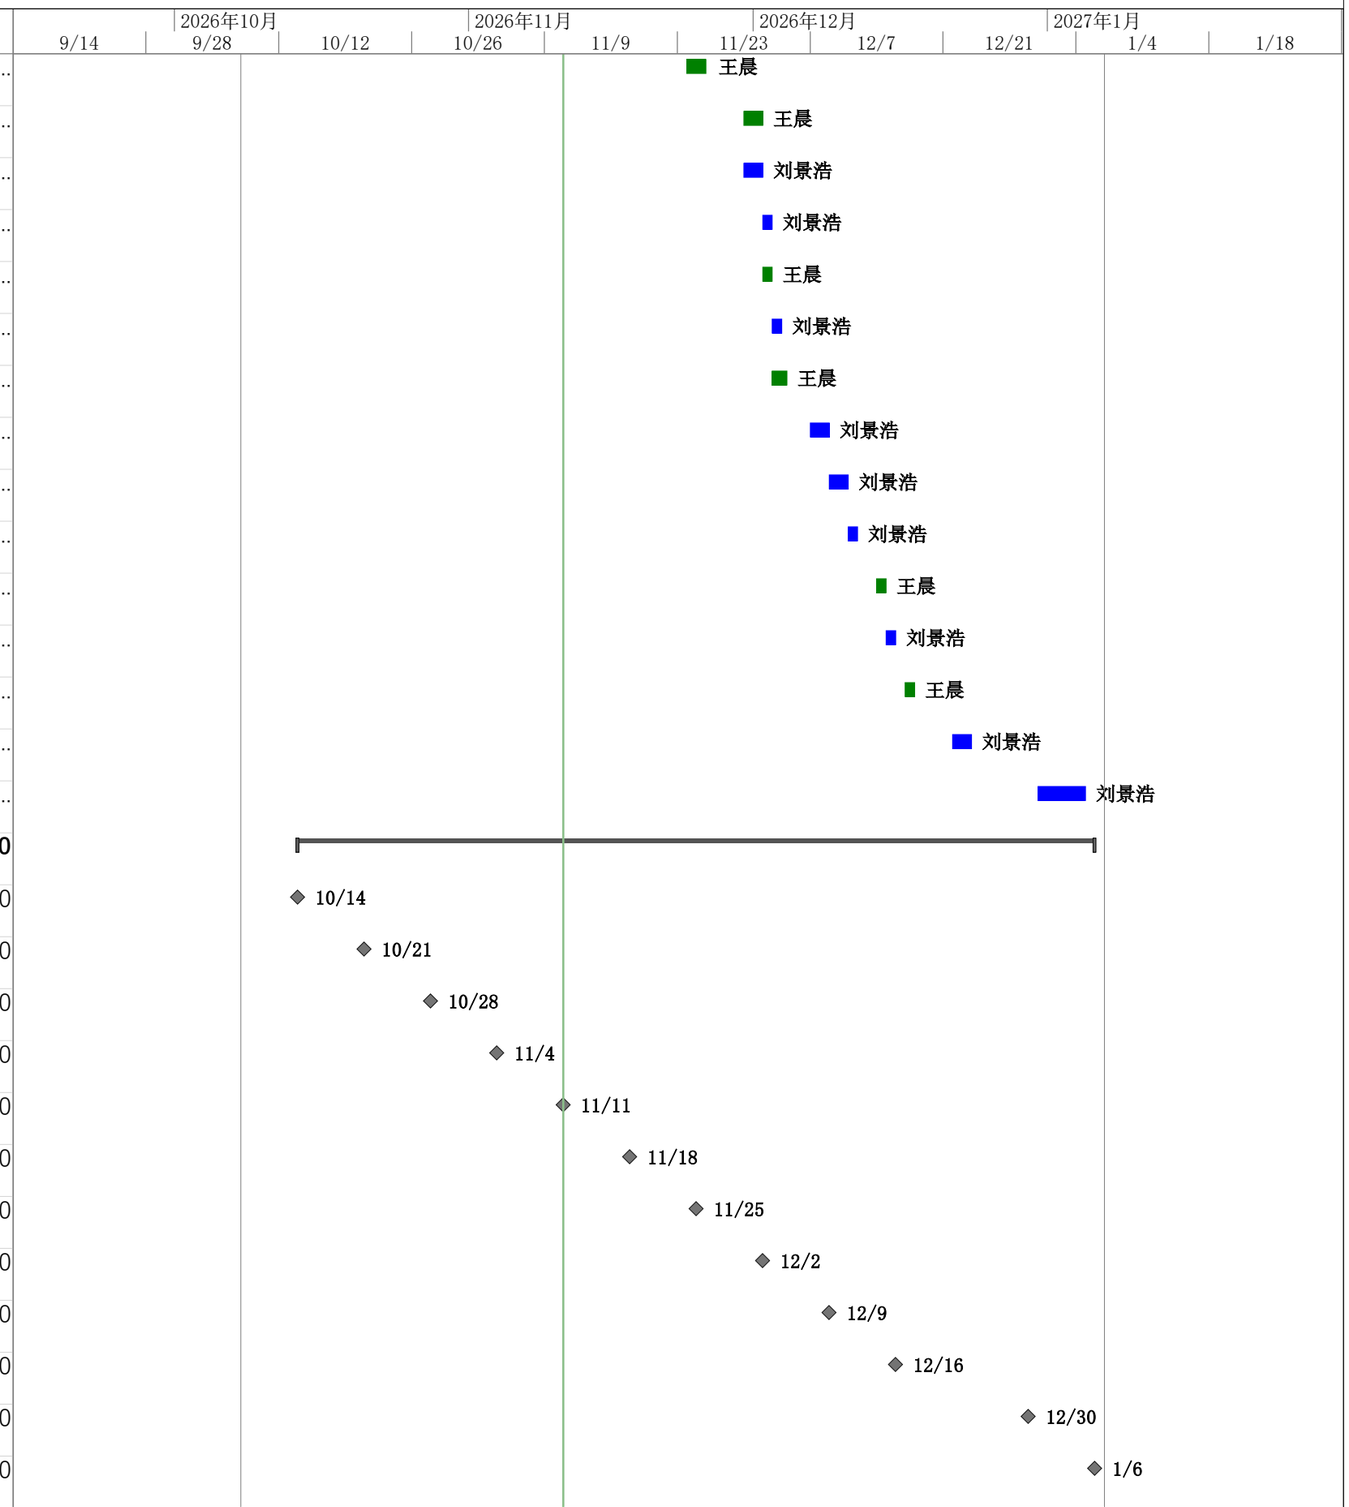

名称	最大单位	过度分配	基准日历
王晨	**9%**	**是**	**G04课程排期日历**
刘景浩	**9%**	**是**	**G04课程排期日历**
