

城院帮项目计划

编制依据 GB/T 8567—2006 第 7.2 节 软件开发计划 SDP

软件工程课程项目 G04

组长兼项目负责人 王晨 32401211

成员 刘景浩 32401205

课程周期 2026 年 9 月 16 日—2027 年 1 月 6 日

文档版本 V1.8 校订日期 2026 年 11 月 13 日

实习与求职经验分享社区

免费阅读 非现金激励 自愿站外联系

本计划覆盖从首堂课启动到课程作业评审收尾的完整周期。项目任务、人时和验收按同一排期基线核对。

文档控制

本次修订按课件第 5 章、第 6 章及总体设计报告重构设计任务，补充实现阶段测试与取证。课程提交节点按原要求安排。

字段	记录
文档标识	G04-SDP-20261112-01
标题	城院帮项目计划
小组与项目负责人	G04；王晨 32401211，组长兼项目负责人；刘景浩 32401205
修订日期与文档状态	2026 年 11 月 13 日，V1.8 课程排期及目录校订
输入与排期基准	软件工程课程计划第 18 页、总体设计报告 V1.2、SRS V1.5.1，排期基准 G04-BL-20261112-DT
修订说明	对齐 2026 年 9 月 16 日首堂课与 2027 年 1 月 6 日课程作业评审，更新 16 个课堂节点、二级目录与评审页码。59 个工作包、275.85 人时和 12622.90 元直接人工预算。
当前版本与交付标识	V1.8，G04-SDP-20261112-01，2026 年 11 月 13 日校订

正文按 GB/T 8567—2006 第 7.2 节的 13 章组织，详细活动见第 6 章。附录 A、B 提供任务分解、逐周安排与完成条件，附录 C 对应教师 16 项评审要求。[Q1]

项目计划 275.85 人时，直接人工预算 12622.90 元。原生 MPP 已重开核对 353 条人员分配、日期及前置。执行人时与完成证据按工作日志登记。

正文采用 GB/T 8567—2006 第 7.2 节 13 章。附录 A、B 提供工作包及逐周计划，附录 C 对应计划阶段 16 项评审。

目录

文档控制 2

1 引言 5

2 引用文件 7

3 交付产品 9

交付成果登记 9

里程碑准入与验收条件 11

3.6 课程里程碑与提交安排 11

09/16—09/30 课程启动与计划初稿 13

10/14 项目计划评审 13

10/21—11/04 可行性与需求评审 13

11/11—11/25 总体设计与详细设计评审 13

12/02—12/16 实现交付与测试评审 13

12/30—01/06 项目总评与课程收尾 13

4 所需工作概述 14

5 实施整个软件开发活动的计划 15

生命周期与 WBS 对应 16

6 实施详细软件开发活动的计划 20

6.4 总体设计与技术复审 21

6.6 详细设计与设计评审 22

6.7 实现成果与单元测试 23

6.11 系统测试与验收 23

6.18 联合评审与意见处理 29

7 进度表和活动网络图 29

目录（续）

阶段甘特图与人员投入 31

工程网络与关键路径 34

8 项目组织和资源 41

8.1 项目组织与成员分工 41

9 培训 43

10 项目估算 43

10.2 工作量估算 43

10.3 成本估算 45

11 风险管理 47

12 支持条件 48

13 注解 49

附录A 工作包时间责任与完成标准 50

附录B 详细任务分解与周安排 59

课程启动与预备阶段 09/16—09/30 59

附录C 计划阶段16项评审对照 81

附录D 会议与成员阶段评价 83

附录E 模板依据与量化管理 84

E2 每周负荷与实际记录 85

E3 成员贡献评分 86

附录F 人工预算与配套管理文件 89

附录G Git图形界面协作说明 91

附录H 日志需求与开发工作记录 93

附录I 可行性八步骤与需求分析任务安排 95

1 引言

1.1 标识

项目标识 HZCU-CampusHub，文档标识 G04-SDP-2026。文档 V1.8，修订 G04-SDP-20261112-01，日期 2026 年 11 月 12 日。 本轮按 2026 年 11 月 13 日课程日期与目录校订。

1.2 系统概述

城院帮面向已经明确求职岗位、正在准备投递与面试的大学生，提供实习与求职经验分享社区。重点服务大三、大四读者，鼓励已获得实习或工作经历的校内学生与校友分享亲历。平台结构支持全校，首批内容与演示案例聚焦计算机相关专业。

核心使用场景：读者选择目标岗位，并按公司、同专业等条件筛选经验，了解与自己起点接近的人如何准备投递和面试。阅读后可收藏、评论，必要时自愿查看作者联系方式并在站外联系。

项目总目标：在课程周期内完成微信小程序、读者与作者网页端、社区管理网页和运维管理网页，交付可运行的经验社区及配套工程文档。产品采用免费阅读、非现金激励和自愿站外联系的模式。

准备实习与求职的学生需要跨渠道搜集资料，判断经验与自身专业、基础和目标岗位的适用性，并找到相似起点的准备路径与交流渠道。项目按岗位、同专业筛选、经历背景和文章评论组织亲历经验，需求依据前期讨论与求职场景分析。[R5]

开发方为 G04 王晨与刘景浩，使用方为本校读者、作者及管理维护角色；本组承担课堂项目投入。教师和助教依课程要求评审，未设企业委托方。现阶段正式运行现场为个人电脑、Windows 及 WSL2 本地课堂演示环境。

1.3 文档概述

本文规定交付产品、开发活动、进度网络、组织资源、培训、估算、风险与支持条件，与可行性分析报告、WBS、周计划和系统测试计划配套使用。

1.4 与其他计划之间的关系

本计划统筹范围、进度与资源；可行性分析报告说明方案选择与实施依据；系统测试计划细化功能、性能、压力和恢复验证；工作日志、周会议纪要及问题变更记录支持执行检查。总体设计、详细设计和操作手册按对应工作包交付。

1.5 基线

排期基准 G04-BL-20261112-DT。课件的 2026 年 9 月 16 日课程启动与 2027 年 1 月 6 日收尾分别为项目起点和终点。9 月课堂节点按课件登记，10 月 8 日为有工时估算的任务起始日。

本计划采用下表所列范围、任务、排期、测试和课程资料作为输入，需求、设计及测试成果按相应里程碑形成受控版本。

本计划文档修订标识为 G04-SDP-20261112-01，日期为 2026 年 11 月 12 日；排期基准采用 G04-BL-20261112-DT。输入文件、版本及 SHA256 见《版本与输入基线 G04.json》。

输入编号	输入文件与版本日期	用途
IN01	城院帮软件需求规格说明书 G04.docx；V1.2，2026 年 10 月 28 日	初步范围、角色和需求输入；原 10 月 23 日需求目标保留历史；本轮 3.6—3.9 修订后登记内部确认。
IN02—IN04	任务数据.json、详细周计划 G04.md、任务人员工时明细 G04.csv；10 月 28 日修订登记	WBS、交接、负责人和 275.85 人时估算。
IN05—IN06	城院帮项目计划 G04.mpp、计划阶段评审原表.pdf；10 月 28 日修订登记	日期依赖与课程 16 项检查要求。
IN07—IN08	系统测试计划 G04.docx；10 月 18 日整理。10 月 17 日周会纪要；10 月 21 日整理	测试与恢复要求；会议 1.054 人时 / 人及 91.0、90.5 分评价。
IN10	第 2 章 可行性研究(1).pdf；课程提供版，58 页；2026 年 10 月 21 日接收	八步骤、系统流程图、DFD、数据字典与成本效益方法。
IN11	软件工程-课程项目评审表-需求阶段评审.pdf；课程提供版，2 页、11 项；2026 年 10 月 21 日接收	当前周需求交接与证据检查，不替代计划阶段 16 项原表。

输入编号	输入文件与版本日期	用途
IN12—IN14	第 3 章需求分析.pdf 70 页及需求评审表 2 页，10 月 28 日接收；SRS V1.2、模型说明 V1.1 及分析报告 V1.3	三模型、数据规范化、辅助图、四维验证及 11 项评审对照。
IN15—IN16	本周课程作业通知；10 月 31 日元宝会议纪要及组长评分补充	11 月 1 日 22 时提交要求；文档共同评审、协作环境与分支规范；本期评价 91.2/91.3。
IN09–IN11	总体设计 V1.2.1；课件第 5、6 章；实现阶段评审表	总体、详细设计、实现测试的结构与验收依据。

项目计划 V1.8 采用总体设计 V1.2.1 和统一 SRS V1.5.1。V1.7 计划 226.55 人时，作为本轮重估对照。

2 引用文件

[R1] 软件工程课程课件 第 13 章 软件项目管理，97 页。依据 13.1 软件规模、13.2 工作量估算、13.3 进度计划、13.4 人员组织、13.5 质量保证及 13.6 配置管理。

[R2] 软件工程课程课件 第 1 章 软件工程学概述，78 页。依据软件生命周期、瀑布模型、文档及阶段评审。

[R3] 软件工程课程计划与团队作业通知，2026 学年。课程节点、阶段成果及周日 22 时邮件提交要求。

[R4] 软件工程课程项目计划阶段评审检查表，2 页，16 项评审要求。

[R5] G04 初步需求与已确认产品范围，2026 年 10 月 18 日整理；对应 IN01 初步需求规格说明书，登记路径、版本及摘要见 1.5 与《版本与输入基线 G04.json》。

[R6] 张海藩、牟永敏 软件工程导论 第 6 版，清华大学出版社，2013，ISBN 9787302330981。教材结构参考；用于生命周期、可行性和项目管理方法对应。

[R7] Kathy Schwalbe．IT 项目管理 原书第 8 版．北京：机械工业出版社，2017。版次采用本组指定教材，出版年与上海交通大学在线课程教材目录核对：https://cnmooc.sjtu.cn/portal/course/5762/15509.mooc ，查阅 2026 年 10 月 21 日。

[R8] 工具官方参考文档，网页登记日期为 2026 年 10 月 21 日；网页文档与实际工具版本分别记录。

Microsoft．Learn more about resource units，Project 桌面版资源单位说明：https://support.microsoft.com/en-us/project/learn-more-about-resource-units 。

Apache Software Foundation．JMeter User Manual，在线手册：https://jmeter.apache.org/usermanual/index.html 。

JUnit Team．JUnit User Guide，参考文档版本 6.1.3：https://docs.junit.org/6.1.3/overview.html 。实际依赖由工程构建清单锁定。

Git 项目．Git Reference，在线参考：https://git-scm.com/docs 。实际 Git 版本在发布清单登记。

课件参考条目按资料名称、章节与课程来源列示。项目管理方法以所提供课件和评审表为直接依据，任务估算与技术方案由本组制定。

[F1] GB/T 8567—2006 第 7.2 节第 7、8 章。进度表、活动网络图、项目组织和资源为本组计划的编制依据；周计划字段和控制指标由本组结合课程要求制定。

[F2] GB/T 8567—2006 第 7.2 节。计划跟踪和更新、配置控制、进度与资源安排。完整 131 页 PDF 副本已保存，标准状态于 2026 年 10 月 16 日在国家标准公开系统核对为现行；实际与预测分开、预警阈值为本组控制规则。

[R11] GB/T 8567—2006 计算机软件文档编制规范，第 7.2 节软件开发计划。正文 13 章与标准章序对应；第 6 章按本项目规模说明适用及裁剪。

课程资料采用课程提供版本，以章节名称、页数和 2026 年 10 月 28 日修订登记日期识别；课件条目保留课程来源，不列教师作者姓名。已保存输入文件的路径和 SHA256 见《版本与输入基线 G04.json》，在线资料按版本或查阅日期登记。

[R9] 软件工程课程课件 第 2 章 可行性研究，58 页；2026 年 10 月 21 日接收。八步骤见 PDF 第 8—14 页，两类图见第 16—39 页，数据字典见第 41—49 页，成本效益见第 51—56 页。

[R10] 软件工程课程项目评审表 需求阶段评审，2 页、11 项，2026 年 10 月 21 日接收。作为需求阶段交接依据，计划阶段 16 项评审继续保留。

[R12] 第 3 章 需求分析，软件工程课程课件，70 页，2026 年 10 月 28 日接收。三模型见 25—26、69 页；实体联系、规范化、状态和辅助图见 29—57 页；验证见 60—68 页。

3 交付产品

3.1 程序

交付微信小程序源码及开发者工具可运行产物、读者作者网页、社区管理网页、独立运维网页与执行器、业务服务、数据库迁移和初始化脚本。各程序以发布清单中的版本、构建方式和运行条件标识。

3.2 文档

交付成果登记

下表为交付成果索引，计划形成日期来自 WBS。执行时在《交付成果登记 G04.csv》中记录实际日期、版本、证据与确认人，达到完成标准并经复核后登记验收结果。课堂日期和邮件截止见第 3.6 节。[F2]

成果与 WBS	计划形成日	责任与复核	交付及完成依据
D01 项目计划及排期 1.3	10/15	王晨组织，双方确认	正式计划、WBS、MPP、工程网络与预算。任务可分配、交接与验收；评审意见逐项登记
D02 可行性报告 2.3	10/15	双方编写，交叉确认	报告、方案比较及实施安排；技术、成本、资源、进度和验收要求明确
D03 需求修订基线 3.6—3.9 及 3.5	11/01 提交 11/03 复核 11/04 反馈	双方编写，交叉确认	SRS、三模型、字段字典、原型走查、追踪和 11 项对照。用户确认及内部审查有真实记录后登记验收，不把原 10/23 目标当实际完成。
D04 总体与详细设计 4.1–4.14	11/05 内部节点； 11/13 详细设计； 11/26 修订	王晨负责技术和管理，刘景浩负责交互及治理运维，两人复核	九步设计、配套文档、详细设计及课堂反馈，按证据登记

成果与 WBS	计划形成日	责任与复核	交付及完成依据
D05 集成候选版本 5.12	11/27	王晨集成，刘景浩核对端到端流程	真实接口联调、程序清单、代码走查与单元结果，11 月 29 日提交
D06 首轮内部验收 6.7	12/04	刘景浩汇总，王晨技术核对，双方确认	目标环境、真实用户、功能集成、性能及恢复，12 月 4 日封版并于 12 月 6 日提交
D07 运行维护与交接 7.3	12/14	王晨统稿，刘景浩复核运维操作，双方交接	运行手册、备份、回退及交接记录。双方可按手册冷启动并演练；失败能定位和回退
D08 总结与归档 8.5	01/06	王晨组织，刘景浩核查附件，双方确认	总结、最终包、清单与真实评价。1 月 3 日提交基线，1 月 4 日核对尾项，1 月 6 日确认收尾

3.3 服务

提供本机安装与冷启动演示、角色和操作说明、部署重启备份恢复演练，以及双方交接。课程后持续运营、云端服务等级和第三方咨询不作为本次承诺。

3.4 非移交产品

个人开发环境、AI 会话、缓存、临时预览、私人资料和实际账号密钥不作为交付产品；工具依赖以安装说明或版本清单提供。正式源码、工程文档与可复现的测试证据不因使用 AI 而排除。

3.5 验收标准

里程碑准入与验收条件

里程碑是检查成果和作出下一步决定的时点。内部形成、邮件提交、课堂评审分别登记；预计日期不能作为实际完成证明。教师反馈先分析影响，再回到对应需求、设计或实现任务处理。[F2]

检查点	必须具备的输入	通过条件与未通过处理
需求修订 11 月 3—4 日	课件、三模型、字典、原型及用户反馈	64 项需求追踪及四维验证；实际用户确认、未决项和评审意见有责任及期限，阻塞问题未关闭不得签署设计输入基线。
设计基线 11 月 5 日	SRS 与接口、数据、关键状态和恢复方案	关键设计问题关闭；测试条件可执行；未关闭阻塞项先处理
集成候选 11 月 27 日	模块产物、单元结果、接口与联调数据	双端和管理链路使用实际接口；失败明确责任并重排
首轮内部验收 12 月 4 日	固定版本、测试数据、用例、性能压力及恢复记录	核心流程执行且严重缺陷关闭；限制和剩余项有期限
最终归档 1 月 3 日至 6 日	运行包、文档、证据、已知问题与真实成员评价	1 月 3 日提交当时基线，1 月 4 日核对尾项，1 月 6 日完成收尾

核心流程全部执行，阻塞与严重缺陷关闭。未关闭的一般问题列影响、责任人与期限。必须需求有实际验收结果；本机网页部署、业务重启、备份恢复有真实记录；代码、安装包、报告和测试版本一致。公网部署及小程序正式发布不作为本次课堂条件。

3.6 课程里程碑与提交安排

课程日期和成果名称取自教师《课程计划》第 18 页。表中单列现有邮件截止与组内交接，课堂意见在课后登记并进入对应修订。9 月节点按课件记录，12 月 23 日为教学节点。

课堂日期	邮件截止 周日 22 时	课件里程碑	项目对应工作
09/16	—	学生分组信息、课程作业选择	课程项目起点，分组与选题按课堂要求登记。
09/23	—	提交预备作业、项目介绍及 PPT	预备作业和项目介绍节点。
09/30	—	项目计划及 PPT	初次项目计划及 PPT 节点；10 月 14 日安排计划评审与修订。
10/14	10/11	项目计划修订	1.2 评审材料；1.3 课后修订
10/21	10/18	可行性分析报告	2.3 内部结论与交叉确认
10/28	10/25	需求说明 SRS、需求评审 PPT	3.4 需求基线与完整用例
11/04	11/01	SRS 修订	先提交已有修订；3.5 处理当堂新意见
11/11	11/08	总体设计报告	4.9 内部设计基线
11/18	11/15	详细设计报告	4.13.3 详细设计与用例复核
11/25	11/22	总体及详细设计修订、翻转 PPT1	4.14.1 提交前修订；4.14.2–4.14.4 处理课堂意见
12/02	11/29	代码清单、测试用例、翻转 PPT2	5.12.3 代码清单、用例及候选版本
12/09	12/06	系统测试报告	6.7.2 12 月 4 日封版；6.8 属后续复核
12/16	12/13	测试报告修订	6.8 复核结果与已取得的修订；7.5 处理课堂意见
12/23	—	教学节点	课件仅列教学内容；本周项目任务仍按 WBS 8 执行。
12/30	12/27	项目总结报告、总评 PPT	8.3 交付核查与演练
01/06	01/03	课程收尾、课程作业评审	1 月 3 日提交归档基线，1 月 4 日核对尾项，1 月 6 日课程评审及交付确认。

09/16—09/30 课程启动与计划初稿

9 月 16 日首堂课为项目起点。9 月 23 日安排预备作业与项目介绍，9 月 30 日安排项目计划及 PPT。

10/14 项目计划评审

提交版、课堂评审及课后修订分别登记。计划评审的 16 项依据见附录 C。

10/21—11/04 可行性与需求评审

10 月 21 日对应可行性报告，10 月 28 日对应 SRS 与需求评审 PPT，11 月 4 日对应需求评审与 SRS 修订。

11/11—11/25 总体设计与详细设计评审

11 月 11 日对应总体设计报告，11 月 18 日对应详细设计报告，11 月 25 日进行设计评审，意见进入 4.14。

12/02—12/16 实现交付与测试评审

12 月 2 日对应代码清单与测试用例，12 月 9 日对应系统测试报告，12 月 16 日对应测试评审与报告修订。

12/30—01/06 项目总评与课程收尾

12 月 30 日对应项目总结及总评 PPT。2027 年 1 月 6 日课程作业评审并完成 8.5 交付确认，为项目终点。

组长使用学校邮箱提交，邮件主题为“SE2026-G04-作业名称”，按课程要求抄送助教和本组成员。收件、抄送、附件、来源及版本在发送前核对并保留发送记录。

最终收尾日为 2027 年 1 月 6 日；1 月 3 日提交当时确认的归档基线，1 月 4 日处理并核对尾项。周计划与附录 A、B 给出各项中间成果的截止和确认人。

4 所需工作概述

用户/参与者	核心功能与价值
访客、登录但未认证用户	浏览、检索、筛选、免费阅读文章及文章内资料链接；进行必要的登录与认证操作。
已认证读者	查看评论和作者主页；点赞、投币、收藏、评论与图片回复；举报/反馈；自愿站外联系。
已认证作者（与读者同账号）	网页 Markdown 与小程序基础图文创作；多草稿、预览、发布、修改、下架；可选联系方式；查看认可与荣誉。
社区管理员	网页端认证审核、巡查、举报/反馈/申诉处理、分类维护、必要的用户限制与操作留痕。
运维管理员	独立运维权限；网页查看服务状态、错误日志和备份记录，执行部署、重启、备份恢复，追踪任务结果。

内容范围包括求职准备、面试流程与复盘、实习资料、成长路径、岗位与公司体验。文章可关联岗位、公司、专业、经历阶段和发生时间，正文采用自由撰写与可跳过的写作提示。

身份与交流：本期仅校园邮箱注册并验证码认证，材料人工审核和微信绑定列后续扩展；主页显示昵称、专业、年级与认证状态，不公开真实邮箱。未认证用户只浏览和阅读文章，评论、作者主页和联系方式由认证用户访问。所有限制在服务端执行。

创作与激励：网页端支持 Markdown 和图片，小程序提供基础图文创作、草稿、预览、修改和下架。资料可附网盘链接。点赞表示认可，投币表示特别有帮助，收藏供以后查阅。币通过简单日常任务获得，每日设领取上限，不兑换现金；作者按收到的有效币累计获得称号与勋章。

治理原则：先发布、后管理。认证用户可以举报、反馈，社区管理员查看关联文章及评论、处理问题并保留操作记录。禁止广告及欺骗性内容。荣誉体现社区贡献，不作为经历真实性的保证。

本次交付不包含付费文章、支付、现金打赏、咨询订单、站内即时通信、任务悬赏、跑腿、招聘交易及独立考研考公板块。

交付目标与可检查结果

项目目标按读者使用、作者创作、管理维护和课程成果四类结果检查，并通过需求编号和验收用例建立追踪关系。交付、进度和资源按 GB/T 8567—2006 第 7.2 节组织，阶段产物与完成标准见下表。[Q1]

目标	预期结果	对应工作与检查
G1 找到并阅读经验	岗位为主入口，专业与公司辅助筛选；未认证权限在接口端执行	需求 3.1—3.4；文章与权限用例，报告第 6 章
G2 分享与交流	网页 Markdown、小程序图文、草稿发布、评论及非现金激励形成完整流程	实现 5.2—5.9、5.12；双端异常与账本证据
G3 管理与维护	社区与运维权限分开；网页部署、重启、备份恢复及失败保护可复核	设计 4.12、实现 5.10—5.11；验证 6.4—6.5、维护 7.1—7.3
G4 课程交付	本地可启动；核心用例执行、严重缺陷关闭，文档、版本与运行包一致	验收 6.7；归档 8.3—8.5，完整标准见第 3、6 章

实施假设与约束

本计划采用两人协作、现有电脑、本地课堂演示及免费经验社区的实施范围。集中开发与测试追加投入按周计划组织；校园邮箱、跨端内容、独立运维与恢复纳入技术验证。可研 C01—C05 与本计划任务、负责人和验收节点对应，范围或资源变更通过问题与变更登记管理。

5 实施整个软件开发活动的计划

5.1 软件开发过程

采用阶段成果与评审控制的开发过程，WBS 按软件工程阶段组织。需求和总体、详细设计分别交付报告；11 月 5 日完成内部设计评审后，11 月 6 日开始集中实现。课堂在 11 月 11 日、18 日和 25 日分别检查设计材料，新增意见通过影响分析进入模块调整，不将编码开始等同于课堂评审已通过。[R1][R2]

阶段	本项目工作与产物	阶段完成条件
项目计划与评审	WBS、周计划、Project、预算、风险与责任	每项任务可分配、可交接、可验收；评审意见有记录
可行性研究	技术、经济、操作、进度、资料与风险分析	关键技术有验证方法，失败有替代方案
需求分析	SRS、用例、原型、权限、数据与异常	需求有编号和明确验收条件；双方确认内部基线
总体与详细设计	架构、ER、接口、流程、状态及运行恢复设计	关键问题关闭；文档足以指导实现和测试
编码与单元测试	双端、业务和管理运维模块；单元与联调记录	AI 输出人工核验；真实接口联通，形成候选版本
综合测试	功能、接口、安全兼容、性能压力、稳定性与恢复证据	核心用例通过；阻塞和严重缺陷关闭；限制明确
部署与维护	本机发布包、操作规程、维护变更与交接	可冷启动、恢复、回退；双方可操作管理流程
总结与收尾	偏差分析、总结、真实评价、版本和最终交付	资料同版本，课程意见完成处理，交接有记录

生命周期与 WBS 对应

WBS 设 8 个顶层工作组，并保留管理、评审和收尾活动。教材的软件生命周期仍按问题定义、可行性研究、需求分析、总体设计、详细设计、编码与单元测试、综合测试、维护 8 阶段理解。总体与详细设计共用 WBS 第 4 组，但分别交付和评审；项目计划、部署和总结是管理及交付活动。[R2]

教材阶段	本项目工作包	阶段产物或当前处理
问题定义	前期范围与选题讨论	已过阶段作为历史依据，不重新列为本期待办
可行性研究	2.1—2.3	关键技术条件、方案比较及可行性报告
需求分析	3.1—3.5	SRS、原型、权限异常、追踪及反馈修订
总体设计	4.1–4.9	课件第 5 章九步，重点是从需求 DFD 推导候选与五步结构映射。产物为总体设计和五份配套文档。

教材阶段	本项目工作包	阶段产物或当前处理
详细设计	4.10–4.14	课件第 6 章，细化业务过程、界面、数据结构与复杂度，形成测试用例及反馈修订。
编码与单元测试	5.1—5.12	模块实现、单元验证、交叉复核与联调
综合测试	6.1—6.8	功能、安全、兼容、性能压力、稳定性与恢复
维护	7.1—7.5	部署交接、维护变更、缺陷修复与回归


采用带反馈的阶段控制：需求或设计评审意见进入问题和变更台账，先分析范围、接口、排期与测试影响，再回到受影响阶段修订。内部基线及课堂复核分别记录，关键问题未关闭时不扩大后续实现范围；执行中同步更新周计划和 Project。[R1][R2]

5.2 软件开发总体计划

系统架构与开发工具

微信原生小程序承担移动端阅读与基础创作；独立 Vue 3/TypeScript/Vite 网页承担长文、完整创作和管理。两端共用 Java/Spring Boot 接口、MySQL、内容结构与权限规则，页面组件和构建流程分别维护。独立运维执行器处理受控部署、重启、备份及恢复。

城院帮系统架构与部署边界

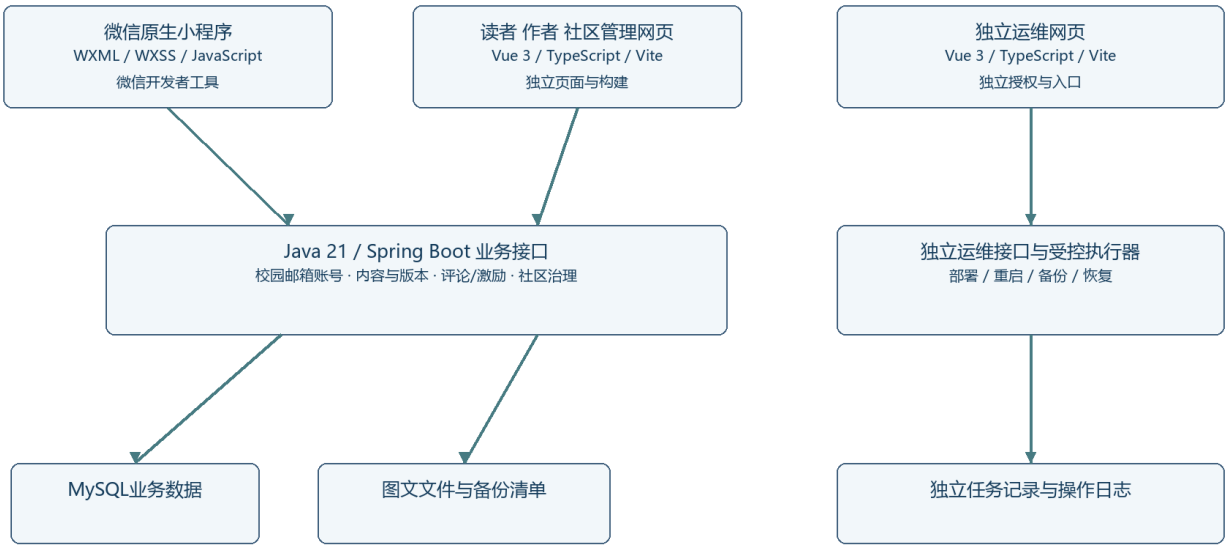

两端共享业务契约与数据；页面代码分别维护。业务停机不等于运维入口不可达。

系统架构与本机部署

工程活动	采用工具	主要产物
计划与正式文档	Microsoft Word、Excel	计划、SRS、可行性、测试维护报告与追踪表
项目排期	Microsoft Project	原生 MPP、阶段与详细甘特图、依赖、资源和关键任务
分析与设计	draw.io、Axure RP	架构、工程网络、ER、流程和交互原型；许可不足时用可用的同类原型工具
AI 辅助开发	Codex/GPT、WorkBuddy	框架、接口及具体代码由 Codex/GPT 辅助实现；小程序及相关页面使用 WorkBuddy；豆包用于 PPT。两人审查后入 Git。
前端	VS Code、微信开发者工具	微信原生小程序与 Vue 3 独立网页构建与双端调试、开发者工具演示
后端与数据库	IntelliJ IDEA、Java、Spring Boot、MySQL	接口代码、SQL、初始化和数据库版本
单元接口及集成	JUnit、Spring 测试支持、Postman	单元结果、接口集合、数据断言和集成证据
性能压力与稳定性	Apache JMeter	脚本、JTL、P95、错误率和资源趋势
缺陷跟踪	Bugzilla	复现、等级、指派、修复、复测和关闭记录

工程活动	采用工具	主要产物
配置与协作	Git、GitHub、SourceTree	版本历史、个人分支、合并复核与基线；组长创建维护项目仓库

工具按工程活动选择。JMeter 用于 HTTP 接口度量，浏览器和微信开发者工具用于页面与小程序体验检查。两位成员对各自任务的代码、文档及验证结果负责。[R1][R8]

软件开发方法以需求和设计基线、模块实现、单元验证、集成与综合测试为主；评审意见按影响返回相关阶段。代码与过程材料采用本章软件产品标准，接口字段及错误码在设计中细化，测试步骤和证据格式由系统测试计划承接。

复用框架、依赖及已有成果前，负责人核对版本、许可证、接口和测试覆盖。关键需求包括权限、草稿恢复、跨端版本、币账本与运维失败保护，均按本期验收场景复核。

现有电脑承载本地环境，性能记录包括实际配置及资源竞争情况。方案评审记录备选项、理由、限制和确认人；教师评审、内部复核及用户试用各自保存记录。

软件产品标准

本项目采用 G04-STD-2026 V1.0 软件产品标准，2026 年 10 月 21 日生效用于后续编写和复核。下表作为代码、接口、文档与测试记录的共同检查依据；具体字段和设计决策在需求及设计中按版本细化。

检查范围	采用标准	检查与记录
代码格式与命名	Java 统一 4 空格缩进、UTF-8；类用 UpperCamelCase，方法与变量用 lowerCamelCase，常量用 UPPER_SNAKE_CASE；前端统一 2 空格，组件用 UpperCamelCase；SQL 表和列用小写下划线。	任务负责人格式检查，另一成员复核差异。
注释与复杂逻辑	对外接口说明用途、输入输出和错误；事务、幂等、权限及恢复过程说明关键约束和失败处理；公共方法写必要参数与返回说明，避免复制无效注释。复杂分支拆分并列边界用例。	PR 说明关联 REQ 与 WBS，保存复杂逻辑检查和用例。
接口与错误	HTTP 接口传输 JSON 并采用 UTF-8；字段命名统一 lowerCamelCase；响应包含 code、message、data、traceId，分页明确页码与上限；状态码区分成功、输入错误、未认证、无权限、冲突和服务失败。	接口文档与 Postman 断言一致；兼容变化先评估调用端。

检查范围	采用标准	检查与记录
安全与配置	服务端执行权限校验、输入校验与参数化 SQL；密码、验证码、令牌和 SMTP 授权码不写日志和仓库；外部响应不暴露堆栈。Debug 与 Release 诊断按配置切换，默认 Release。	检查越权、危险输入、日志脱敏与配置样例。
文档与版本	使用统一文档编号、版本、日期及输入基线；正文 12 磅、表格 11 磅；图表注明编号与来源，长表重复表头；Word 刷新目录后导出 PDF；正文、附件与文件摘要清单同批发布。	封版时交叉复核目录、引用、图表、文件摘要和交付清单。
需求与测试记录	REQ 标识需求，TC 标识用例，DEF 标识缺陷，CR 标识变更；记录对象版本、环境、输入、步骤、预期、实际、结果及证据路径。功能、性能、压力、稳定性和恢复结果分别保存。	测试报告关联需求与缺陷；重测记录引用修复版本。
脚本与交付	运维脚本只执行已配置目标与固定动作，检查返回状态并保留任务编号；数据库迁移新增版本，不覆盖已发布迁移；发布清单列构建、依赖、配置项和校验摘要。	交叉复核后合并，发布前执行冷启动与失败恢复检查。

6 实施详细软件开发活动的计划

6.1 项目计划和监督

王晨组织周检查、风险与变更，刘景浩汇总任务及配置状态；双方核对产物、阻塞、预测完成与下周任务。跟踪表分别记录基线、预测、实际及证据，缺项登记补录责任。测试、安装及移交见系统测试计划和 6.12、6.13 节。

6.2 建立软件开发环境

对应工程基础与工具核查任务。两人分别核对开发、测试环境及依赖版本；统一 Git 开发库、数据库迁移、配置样例与文档目录。AI、编辑器和个人缓存属于辅助环境；密钥保存在本机忽略配置中。

6.3 系统需求分析

需求分析按课件建立数据、功能、行为三个模型：ER 图、分层 DFD 和状态转换图。3.1—3.4 保留原计划历史；新增 3.6—3.9 完成本轮课件核对、字典规范化、原型走查和四维验证，3.5 接收 11 月 4 日课堂意见。真实用户确认是设计输入基线的前提。

可行性研究与需求交接

可行性八步骤在 2.1—2.3 工作包下设 FS01—FS08，向下展开 44 项任务，合计 10.00 人时。需求分析在 3.1—3.9 下展开 44 项执行任务，覆盖课件 10 个主题；其中 3.6—3.9 仍为 20.00 人时。任务、责任、日期、人时和产物见附录 I，并与 WBS、甘特图及 Project 源对应。

6.3.1 需求与可行性方法的交付展示

分析成果	具体完成判断	展示位置
可行性八步骤	44 项分解，逐步有输入、动作、项目结果、完成标准和 WBS；不能只列八个名称	可研第 3.5 节；成果页码导航
两类流程图	物理程序/介质数据流与逻辑 DFD 明确区分；P1—P5、D1—D6 同名	可研第 5.2 节
三个分析模型	用投币案例显示 ER 对象联系、DFD 数据变换和 STD 状态条件；完整模型另附	需求分析第 3、4、7 章
字典与规范化	五类字典有实例；组合、正则和语义分开；展示同一例子 1NF→2NF→3NF	需求分析第 5、6 章
辅助工具	层次方框、带重复/选择的 Warnier、IPO 和课件表形改进 IPO 均有实际图	需求分析第 8 章
验证和审查	四类验证有场景与证据；11 项评审能定位；真实用户反馈与会议如实登记	需求分析第 9、10 章

可行性与需求细化的原始估算见附录 I。当前设计、实现交接和测试按 V1.8 排期，工作包与末级任务以当前 Project 核查为准。

6.4 总体设计与技术复审

总体设计以 SRS DFD00–03 为起点，按第 5 章九步骤确定架构、分解处理和导出软件结构。王晨负责 DFD、后端、数据库和项目管理，刘景浩负责双端、人机交互、治理与运维场景。两人分别完成和交叉复核各自的设计输入。

课件步骤与 WBS	计划活动	交付与验收
4.1 设想供选择的方案	引用 DFD00–03，检查 P1–P5 及 D1–D6，提出并筛除处理分组。	候选分组、共享数据及运行边界能回查需求模型。

课件步骤与 WBS	计划活动	交付与验收
4.2 选取合理的方案	A、B、C 各提供系统流程、物理清单、成本 / 效益和进度。	四项资料逐套完整，工作量及工期假设可追溯。
4.3 推荐最佳方案	比较工程约束、成本、用户体验和部署条件。	选型理由及风险有记录。
4.4 功能分解	将 18 个 DFD 处理分解到程序、数据和验证。	发布、投币、处置、恢复有过程设计输入和异常取证。
4.5 设计软件结构	4.5.1 精化 DFD，4.5.2 判定流类型和边界，4.5.3 变换 / 事务映射，4.5.4 启发规则精化，4.5.5 导出接口数据并复查。	HIPO、Yourdon、精化前后结构、接口和复查回路一一对应。
4.6 设计数据库	核对逻辑与物理关系、字段、约束、索引和迁移。	数据库设计结果和文件存储边界可定位。
4.7 制定测试计划	为三级测试编制策略、方案、预期结果和进度。	与 SRS、用例、环境和 WBS 一致。
4.8 书写文档	统稿总体设计、系统说明、用户手册、测试计划、详细实现计划和数据库设计结果。	技术内容与文档整编分别计时，图、表及目录同步。
4.9 审查和复审	技术审查登记问题，管理复审核对范围、工时和风险。	问题及结论可追踪，实际签认另登记。

6.5 软件需求分析

将系统要求分配到认证、内容、互动、社区和运维软件配置项，建立 REQ 到接口、数据和验收用例的追踪。未关闭的规则经双方确认后更新 SRS，不以代码行为替代需求确认。

6.6 详细设计与设计评审

详细设计按课件第 6 章开展。4.10 形成结构化业务过程、状态、判定表及 McCabe 复杂度。4.11 明确小程序和网页的人机交互、图片、草稿和错误反馈。4.12 形成运维任务、备份文件

结构和恢复过程。4.13 以过程设计输入编制三级用例、合成数据及复核。4.14 分别安排提交前修订、课堂意见、模块修订和联调交接。

6.7 实现成果与单元测试

WBS 5.1–5.11 按模块留存程序清单、规范、单元与白盒用例、工具执行结果和内部走查。5.12.2 交叉复核失败与修复，5.12.3 核对候选版本并封存 11 月 29 日提交材料。

6.8 配置项集成和测试

WBS 5.12.1 接通业务、双端、社区与独立运维的真实接口，前置包含 4.14.4 和各模块实现。6.1.2 以隔离 MySQL、接口工具和实际报告验证跨模块状态和事务。

6.9 CSCI 合格性测试

对软件配置项按对应需求与用例检查。在本地目标环境和微信开发者工具中执行；与实现者交叉复核，保留独立性限制。由另一成员验收不能称为独立第三方认证。

6.10 CSCI 与 HWCI 集成和测试

本项目不开发定制硬件配置项，不单设专用硬件集成工作包。现有电脑、WSL2、数据库及开发者工具的运行兼容和资源检查纳入环境核查、兼容及系统测试，不省略实际运行检查。

6.11 系统测试与验收

WBS 6.1–6.8 安排功能、性能、压力、稳定性、权限、目标设备、部署恢复、缺陷回归和报告。6.4.3 核对用户实际环境，6.7.1 记录最终用户任务走查。6.7.2 于 12 月 4 日封存 12 月 6 日提交报告，6.8 复核及课堂说明单列。

场景	需求/设计要规定的行为	计划验证证据
验证码错误、过期、发送失败	清晰反馈、可重新申请；次数与有效期在 SRS 确定	成功/失败/过期、不同邮箱资格及日志不泄密
未认证或普通账号请求受限数据	服务端拒绝；不返回隐藏资料与管理信息	直接接口请求及不同角色回归
断网、保存失败、图片部分上传失败	保留可恢复正文；标记失败图片；重试不重复发布	草稿/图片/重复提交场景记录

场景	需求/设计要规定的行为	计划验证证据
同一文章跨设备编辑	识别版本冲突，不静默覆盖另一端新内容	双端冲突与恢复结果
重复领取、并发投币、余额不足	奖励只发一次；投币记录与余额一致；不得透支	重复与并发请求后的余额/贡献一致性
文章/评论被下架、收藏链接失效	明确不可用状态，保留必要记录；不泄漏已隐藏内容	旧链接、通知跳转、收藏等相邻路径回归
举报、申诉、管理员处理失败	保留原状态或明确结果；理由与操作人可追踪	处理前后状态、通知、审计及失败回退
运维网页操作失败或重复提交	目标确认、权限校验、任务互斥与持久日志；业务停机可查询	部署/重启/恢复、越权、重复、失败与业务停机场景
外部网盘/联系方式失效	用户可反馈；平台不保证站外服务结果	文章资料与联系入口提示及反馈闭合

测试类别	对象与工具	责任与证据
单元	权限、状态、账本和筛选；JUnit 及 Spring 测试	各模块负责人；代码版本与单元结果
接口、功能和集成	五类角色、双端与完整链路；Postman	刘景浩统筹、双方修复；集合、断言和缺陷
安全与兼容	越权、隐私、危险输入、图片、双端编辑	刘景浩；直接 API、浏览器及开发者工具记录
性能与负载	查询、详情、发布与评论；JMeter	王晨；JTL、P95、错误率、吞吐与资源趋势
压力与稳定性	容量边界、持续运行与降载恢复	王晨；阶梯脚本、故障和一致性记录
部署与备份恢复	冷启动、部署重启、损坏备份、回退	王晨验证、刘景浩配合运维实现；恢复前后数据与执行日志

性能与恢复目标

以下是计划验收目标，最终结论必须注明执行环境、版本、数据与实际结果。同机施压需记录资源竞争；JMeter 结果不能替代页面渲染和小程序体验检查。

场景	计划目标	必须保留的证据
30 并发负载	合成 200 用户、2000 文章、5000 评论；60 秒升载、运行 10 分钟；读 P95≤1 秒、写≤2 秒，非预期错误率<1%	环境版本、脚本、原始 JTL 与统计结果
阶梯压力	10、30、50、100 并发，各运行 2 分钟，升载 30 秒；100 用于探测，不承诺此容量	吞吐、错误、CPU 内存、失效点与数据一致性

场景	计划目标	必须保留的证据
稳定性与恢复	10 并发运行 30 分钟；压力后降至 10 并发，2 分钟内恢复；账本与数据不发生不一致	持续运行结果、降载恢复及数据库断言
备份恢复	数据库、图片及版本清单一致；拒绝损坏或不兼容备份；恢复前保护当前状态	备份哈希、恢复日志、关键记录及失败保护结果

6.12 软件使用准备

课堂启动顺序：启动 WSL2 与数据库，启动网页和运维服务，再启动业务后端，检查接口后打开网页及小程序。演示前关闭无关软件、确认磁盘空间和备份、重置测试数据。邮箱发信与外部网盘需要网络；本机文章与主要交互流程使用预置数据演示。

演示邮箱 32401211@stu.hzcu.edu.cn 用于收件和认证场景。读者作者、社区管理员与运维管理员分别准备测试身份。邮箱及平台凭据分别存于受控本地配置，交付材料和日志仅保留脱敏信息。

运维网页提供服务状态、错误日志、备份记录，以及部署、业务服务重启、备份和恢复操作。部署使用已准备的发布包；重启对象为项目业务服务；恢复对象为演示数据库与关联文件。每次确认目标和版本或备份标识，生成持久化任务编号，展示排队、执行中、成功或失败状态。普通用户和社区管理员无运维执行权限。

部署流程：检查发布包及环境、保存必要备份、切换应用、执行健康检查、记录结果。失败保留证据并进入回退处理。执行服务对同一目标的冲突任务互斥，防止重复请求造成重复操作。

恢复流程：核对备份完整性、数据库与图片匹配、应用版本兼容性，保存当前状态，在维护状态执行恢复，验证后恢复访问。恢复会覆盖目标数据，备份时点之后的变更可能丢失，确认页明确显示影响。Git 代码回退与数据库恢复分别管理。

备份覆盖演示数据库与图片关联文件、版本及完整性清单。演示环境运行期间安排每日备份及重要部署前备份；不要求电脑关机时执行定时任务。备份放在应用目录之外，并在验收前制作离机副本。同一电脑内另一目录只用于操作恢复，不能视为整机故障保护。日志屏蔽密码、令牌和认证材料。课堂前先验证网页实际发起四类操作，以及越权、重复请求、失败和业务服务停机后的查询行为。

社区运营准备至少 8 篇示例文章，覆盖 4 类主题，标注来源，虚构内容标演示数据。管理员处理举报与反馈时可直接查看对应文章及评论，并将处理理由反馈给用户。

维护流程为问题登记、影响分析、修复安排、执行、回归、归档与反馈。王晨负责集成环境、运行架构核对及部署恢复验收；刘景浩负责独立执行服务、运维网页、操作手册和模块修复；双方完成维护交接。课程结束交付运行手册、已知问题、备份与交接记录。

6.13 软件移交准备

对应部署维护与 WBS 第 8 组收尾。交付可执行程序、源码、迁移脚本、文档、依赖版本、测试报告、已知限制、备份清单及操作说明；两人按手册完成冷启动与维护交接，核对版本、文件哈希和恢复证据。

6.14 软件配置管理

配置管理覆盖代码、文档和数据。Git 管理版本，GitHub 用于协作，王晨负责仓库创建、成员授权及合并协调。main 保持可交付；工作分支采用“类型/姓名缩写-任务名”，如 feat/wc-email-auth、feat/ljh-web-editor，双方交叉复核后合并。此为会后由组长授权完善的规则，会议原首字母方案保留在附录 D。密钥、认证材料与备份不提交仓库。细则见分支命名与协作约定 G04.md。[R1，第 74—85 页]

配置项	主责与核对内容	留存方式
需求与计划	刘景浩汇总；王晨复核技术/排期	文档标识、评审意见、影响范围和修订记录
原型、架构与接口	王晨技术设计；刘景浩页面流程	draw.io 源文件、接口约定与对应需求号
源码与数据库脚本	各模块主责；王晨集成	Git 提交、迁移版本、关键配置模板
用例、报告与演示数据	刘景浩汇总；王晨核对技术结果	需求关联、执行版本、结果及数据来源
发布包与工具版本	王晨发布清单；刘景浩核对交付	构建标识、依赖及工具版本、发布说明
密钥与身份材料	授权人员受控访问	独立受控保存，不纳入普通仓库或公开附件

提交与评审节点：11 月 1 日 22 时前提交初版项目计划、SRS 和评审 PPT；11 月 3 日按 3.9 工作包完成评审前复核与更新；11 月 4 日处理课堂评审反馈。设计 11 月 5 日、实现 11 月 27 日、首轮内部验收 12 月 4 日保持原计划。初版提交不等于需求已批准。

变更流程：提出请求、分析影响、双方确认、实施、验证、同步材料、登记状态。记录编号、理由、受影响需求与配置项、责任人、计划处理日期、实施版本和复核结论。涉及课程范围与截止日的变化按课程要求向教师说明。

刘景浩维护配置与变更记录，王晨核查技术版本。交付前双方核对文档、代码、数据库脚本、测试证据及发布包的一致性。收尾归档项目总结、最终交付包、运行手册、已知问题、阶段评价与课程反馈。

配置审计与状态报告

配置审计：每个阶段封版前，刘景浩按清单检查文件标识、版本、修改记录、相关图表及证据是否同步；王晨核对任务、接口、数据库脚本和运行包的一致性；双方确认遗漏及未关闭问题。产物为基线核查清单、文件摘要和问题处理记录。[R1，13.6.2，PDF 第 84 页]

状态报告：每周记录当前基线、提出/批准/实施/验证中的变更、缺陷、未决事项、责任人和处理期限，说明本周版本相对上一基线的变化。刘景浩汇总，王晨复核并在周会议中确认。配置审计与状态报告同标识、版本控制和变化控制一起纳入配置管理，属于计划安排，不预填实际完成记录。[R1，13.6.2，PDF 第 85 页]

版本同步清单

范围或验收变化同步需求、设计和测试；日期或依赖变化同步 Project、甘特、网络、周计划及交付登记；人时成本变化同步人工明细与预算。相关报告、图表和汇报材料采用同一版本清单。

6.15 软件产品评估

阶段成果由负责人先按完成标准自查，另一人复核需求覆盖、可运行性和证据；记录对象版本、场景、结论、限制及确认人。内部确认、教师评审与真实用户反馈分开，未达标项关联问题台账。

6.16 软件质量保证

质量保证从需求开始，REQ 需求编号、TC 用例编号、设计模块、WBS 工作包、代码版本及证据相互关联。完成标准用检查场景、预期结果和应保存证据描述，避免只写“功能完成”。[R1，13.5]

检查点	检查内容	责任与产物
计划及评审	范围、期限、预算、依赖、资源与 16 项材料	双方共同确认，王晨组织；问题与处理记录
需求与设计	角色、状态、异常、数据、非功能和可验收性	各自编写与交叉复核；追踪表与基线
模块实现与接入	契约、权限、事务、草稿冲突和错误处理	任务负责人自查，另一人复核；单元接口与评审证据
测试、维护与交付	实测结果、缺陷关闭、恢复与版本一致	双方提供证据与修复；报告、维护单和发布清单

6.17 问题解决过程

任务预计无法赶上交接即登记，由组长分析是否影响关键路径、测试和提交；另一成员承担可独立子任务或资料复核，重排后同步 Project、周计划、风险和变更。

进度预警与问题升级

以下为本计划的建议控制规则，双方在执行周会确认适用。已确认的历史会议不增加未发生的决定。负责人发现风险已发生时登记问题编号，关联 WBS、交付成果、处理动作和关闭证据；影响基线时另提变更。

触发条件	处理时限与负责人	保存记录
关键活动预测延期，或严重权限与恢复风险	发现当日由任务负责人告知王晨；暂停受影响放行，双方评估	问题、受影响交付、措施与重新检查日期

触发条件	处理时限与负责人	保存记录
一般任务预计延期 1 日以上，或任务人时预测偏差超过 20%	负责人登记；最近周会比较拆分、协作与后移；不得挤掉必要测试	原因、剩余人时、预测完成与容量变化
数据不足或未提交证据	缺项标记未登记或待复核，负责人登记补录期限	缺失项、补录责任和期限

每个问题关联对象、复现条件、影响、负责人、修复版本和重测证据；需要改基线时先评估变更，再实施及确认关闭。

6.18 联合评审与意见处理

双方在计划、可行性、需求、设计、系统验收和收尾节点共同复核。技术评审检查方案与证据，管理评审检查范围、期限、成本及风险；会议记录保存实际日期、参与人、结论和后续行动。

6.19 文档编制

报告由双方按任务协作，王晨统筹项目管理与技术一致性，刘景浩汇总相关测试、网页及运维材料。正式 Word 更新目录后同源导出 PDF，图表、周计划和台账与对应版本一起检查。文档清单见第 3 章，任务细分见附录 A、B。

6.20 其他软件开发活动

风险见第 11 章，进度、工时及问题指标按实际记录逐周更新。隐私材料与演示数据分开管理。本项目由两人协作完成，按模块交接并复盘工具、流程和估算偏差，必要时修订计划并留痕。

7 进度表和活动网络图

完整 WBS 树状图作为排期附件。资源容量按两名成员日常各 30—45 分钟及集中阶段追加投入检查，任务人时、周负荷和贡献评价规则见附录 E。

WBS 有 8 个生命周期及交付工作组，另设 M 持续管理和 K 课程里程碑。当前 59 个工作包、358 个 Project 条目和 257 个末级条目。零工期课程节点不累计人员工作量。

按目标组织的阶段路线

依据国标第 7.2 节第 7、8 章，将总体进度、活动依赖、任务负责人和资源逐项衔接。三段总览用于浏览，教材阶段与详细 WBS 另列；日期和验收标准采用本组计划数据。[Q1]

阶段	计划时间	主要产物与 WBS	进入下一段的条件
启动、分析与设计	9 月 16 日至 11 月 5 日	课程启动、预备作业、计划、可行性、需求和总体设计；K00–K00B、WBS 1–4	形成可验收的范围与设计，11 月 5 日双方核对后进入集中实现
实现与验证	11 月 6 日至 12 月 4 日	双端、共享接口、社区及运维；WBS 5—6	11 月 27 日联调；12 月 4 日按实际证据进行首轮内部验收
维护与收尾	12 月 7 日至 1 月 6 日	反馈修复、部署维护、总结归档；WBS 7—8	保护恢复和回退证据，1 月 3 日提交归档基线，1 月 6 日收尾

详细任务的准入与完成登记

每项任务使用现有 WBS 标识，同时记录角色、交付物、前置、排期、工期、计划及实际人时。开始前由负责人确认上游产物和环境；结束后保存产物版本、场景结果与复核结论。工期是进度跨度，人时是人员投入，两者不互换。[F2]

阶段甘特图与人员投入

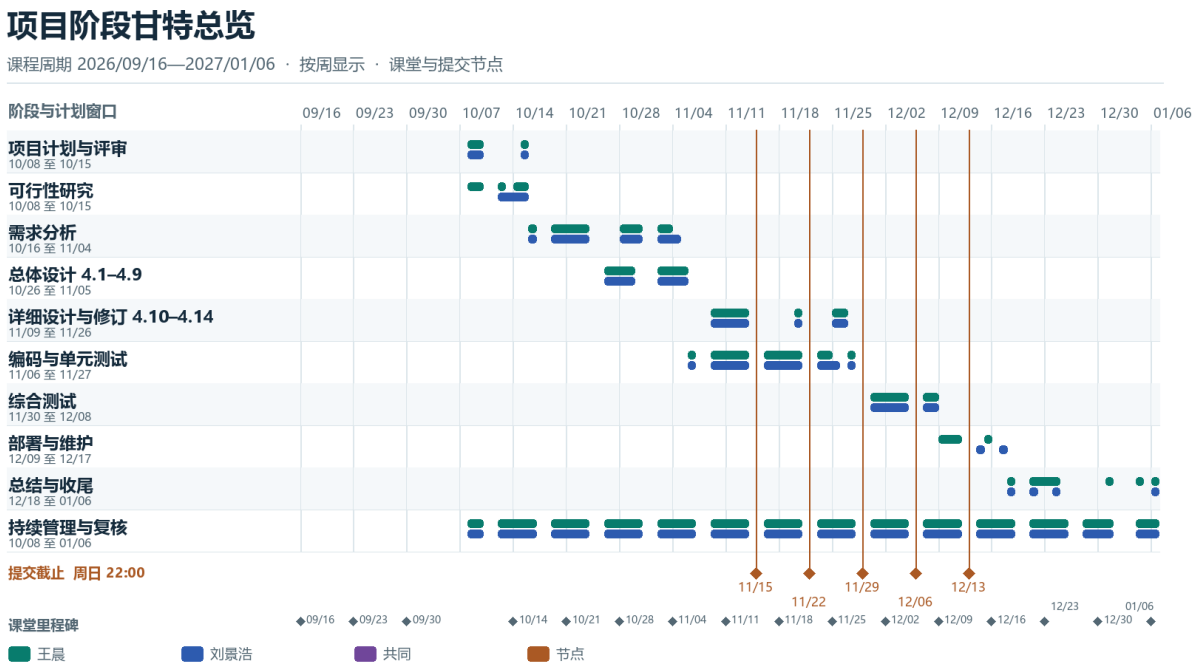


图 2 项目阶段甘特总览。绿蓝两轨分别展示王晨和刘景浩的分配日期，橙色为提交，灰色为课堂节点。

设计、实现和测试局部排期

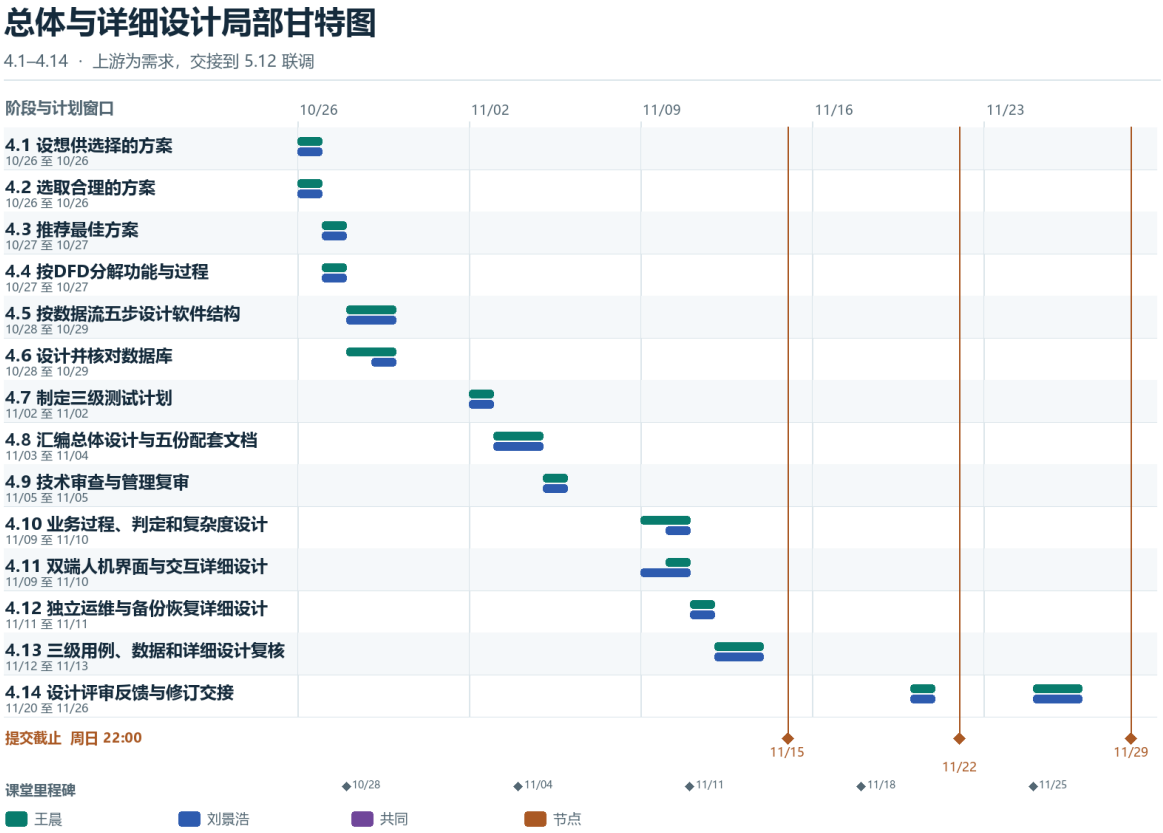


图 3 设计阶段局部甘特图。



图 4 实现与测试局部甘特图。

《任务执行跟踪 G04.csv》按执行任务登记计划日期、人时、实际开始与结束、预测完成、产物证据及复核结果。工作量按末级执行任务汇总，管理、文档及交叉复核统一纳入容量检查。

项目计划投入 275.85 人时、人工 12622.90 元。工作日历为周一至周五，上午 09:00–13:00、下午 14:00–18:00。周日 22:00 是课程提交截止，组内按工作日封版。

正文总览和两张局部图来自同一份 Project 排期。详细甘特图按阶段分页，前置和人员分配可用原生 MPP、XML 和分配核查表复查。

工程网络与关键路径

工程网络采用箭线表示法。五幅分图展示控制活动，前置完工事件编号跨页一致。完整活动、虚活动、事件时刻和日历约束见同版工程网络计算数据。

EET 与 LET 采用原生 Project 的最早、最迟时刻。实活动的持续期、总时差和人时分别核算。0 分钟虚活动表达完成到开始关系。五个提交任务设置原生 Deadline，课程节点独立列在 K 组。

控制链或节点	安排及管理含义
4.9.2	存在日历时差。总时差 480 分钟。
4.13.3	存在日历时差。总时差 240 分钟。
4.14.4	4.14.2 → 4.14.3 → 4.14.4。总时差 0 分钟。
5.12.3	4.14.2 → 4.14.3 → 4.14.4 → 5.12.1 → 5.12.2 → 5.12.3。总时差 0 分钟。
6.7.2	6.2.2 → 6.3.1 → 6.3.2 → 6.5.1 → 6.5.2 → 6.6.2 → 6.7.1 → 6.7.2。总时差 0 分钟。
6.8.2	存在日历时差。总时差 240 分钟。
8.5.2	7.1.1 → 7.1.2 → 7.2.1 → 7.2.2 → 7.3.1 → 7.3.2 → 7.4.1 → 7.4.2 → 8.1.1 → 8.1.2 → 8.2.1 → 8.2.2 → 8.3.1 → 8.3.2 → 8.4.1 → 8.4.2 → 8.5.1 → 8.5.2。总时差 0 分钟。

5.9–5.11 的部分前置来自人员实施顺序。预算和周负荷以两人分配为依据，涉及资源、技术或课程日期的限制均写入任务说明。

关键路径计算举例

活动	起止事件	起点 EET	终点 LET	持续期	总时差	结论
4.13.3	E350S → E350F	11-13 09:00	11-13 18:00	240	240	留有时差
4.14.4	E352S → E352F	11-26 14:00	11-26 18:00	240	0	零时差
5.12.3	E353S → E353F	11-27 14:00	11-27 18:00	240	0	零时差
6.7.2	E355S → E355F	12-04 14:00	12-04 18:00	240	0	零时差
6.8.2	E248S → E248F	12-08 09:00	12-08 18:00	240	240	留有时差

Project 在日历、前置和 Deadline 下计算总时差。控制节点按实际前置连接，零时差项应优先保护。

实现提交控制链与系统测试报告控制链如下。

4.14.2 → 4.14.3 → 4.14.4 → 5.12.1 → 5.12.2 → 5.12.3。

6.2.2 → 6.3.1 → 6.3.2 → 6.5.1 → 6.5.2 → 6.6.2 → 6.7.1 → 6.7.2。

两条控制链受提交约束。联调与测试报告的封版按实际证据确认，交接延期由组长登记。

工程网络图 计划可行性与需求

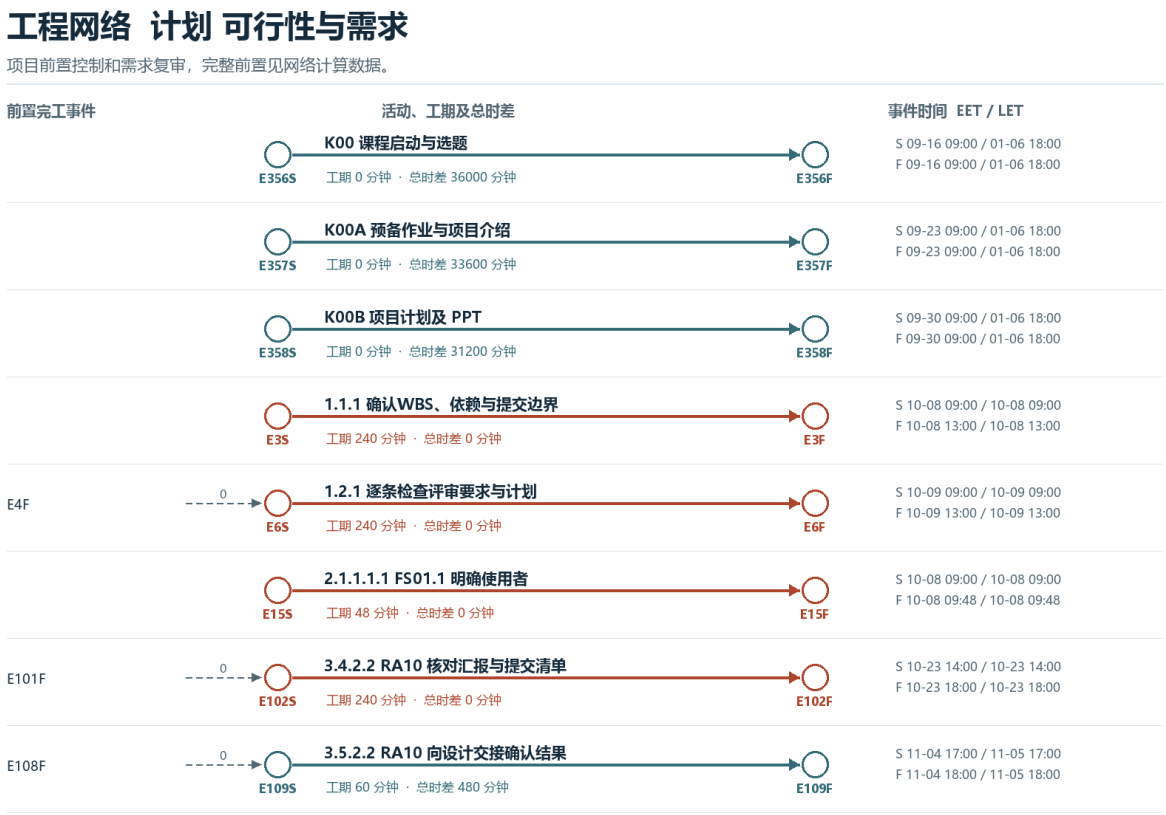


图 5 计划可行性与需求。S、F 分别为起止事件，单位为工作分钟。

工程网络图 总体设计

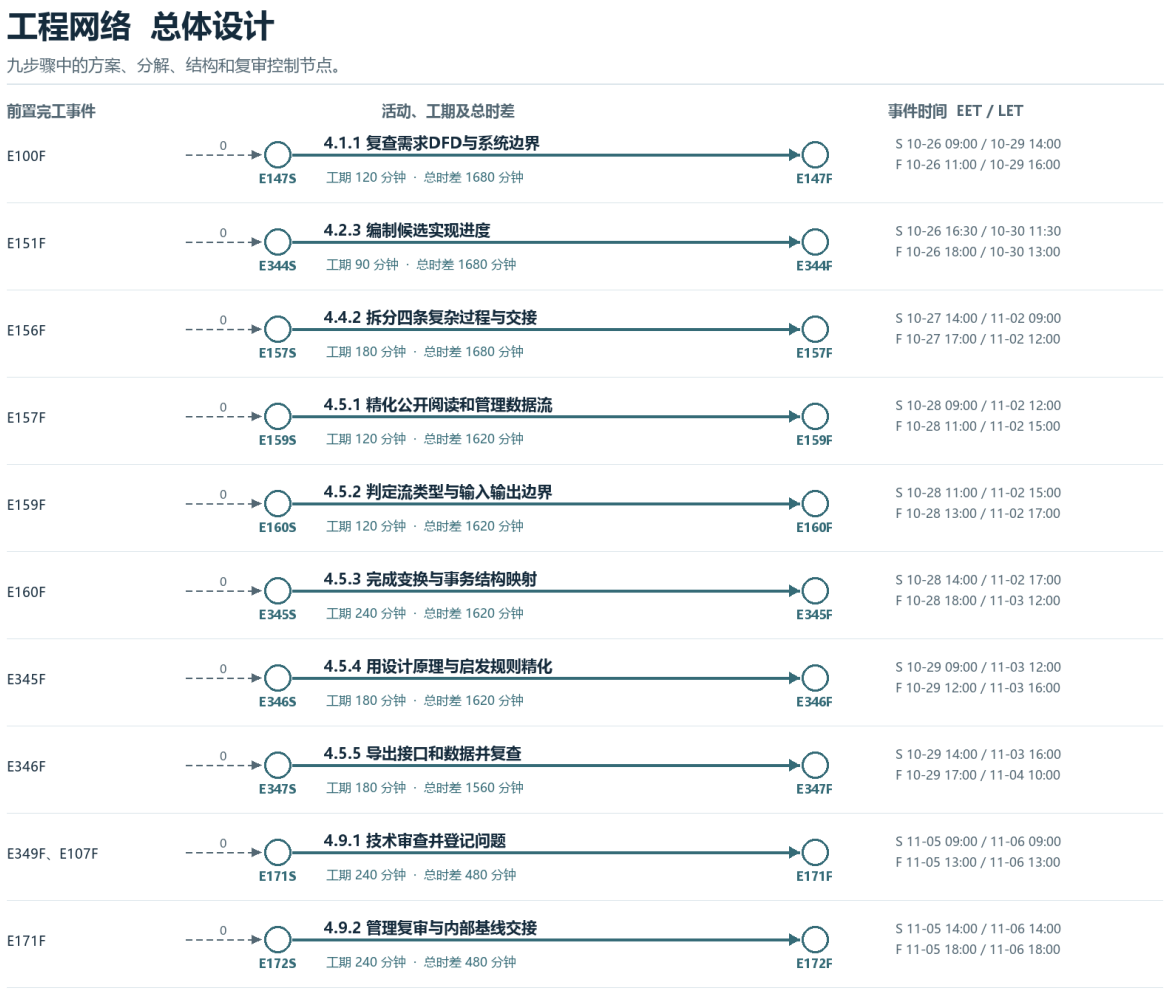


图 6 总体设计。S、F 分别为起止事件，单位为工作分钟。

工程网络图 详细设计与实现

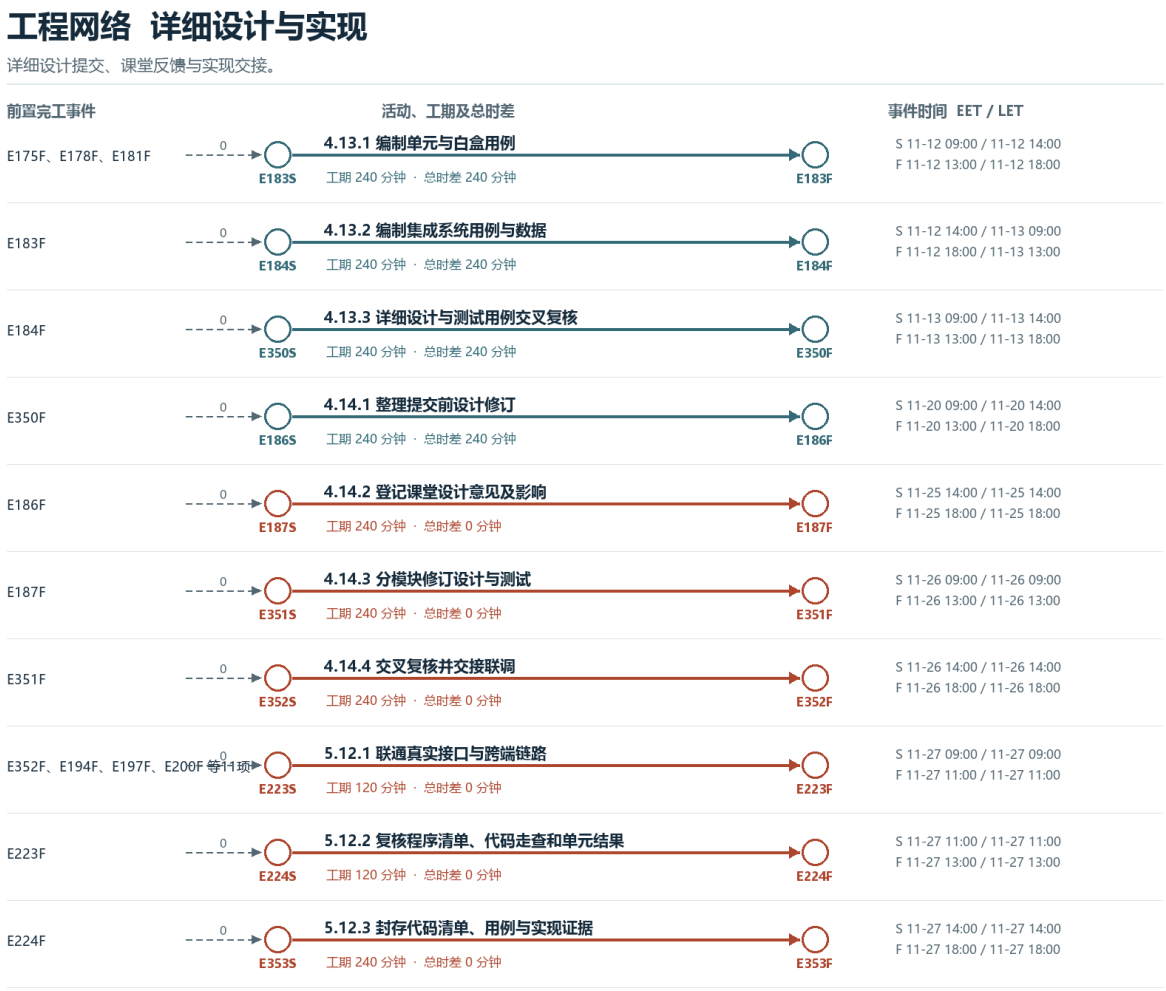


图 7 详细设计与实现。S、F 分别为起止事件，单位为工作分钟。

工程网络图 综合测试

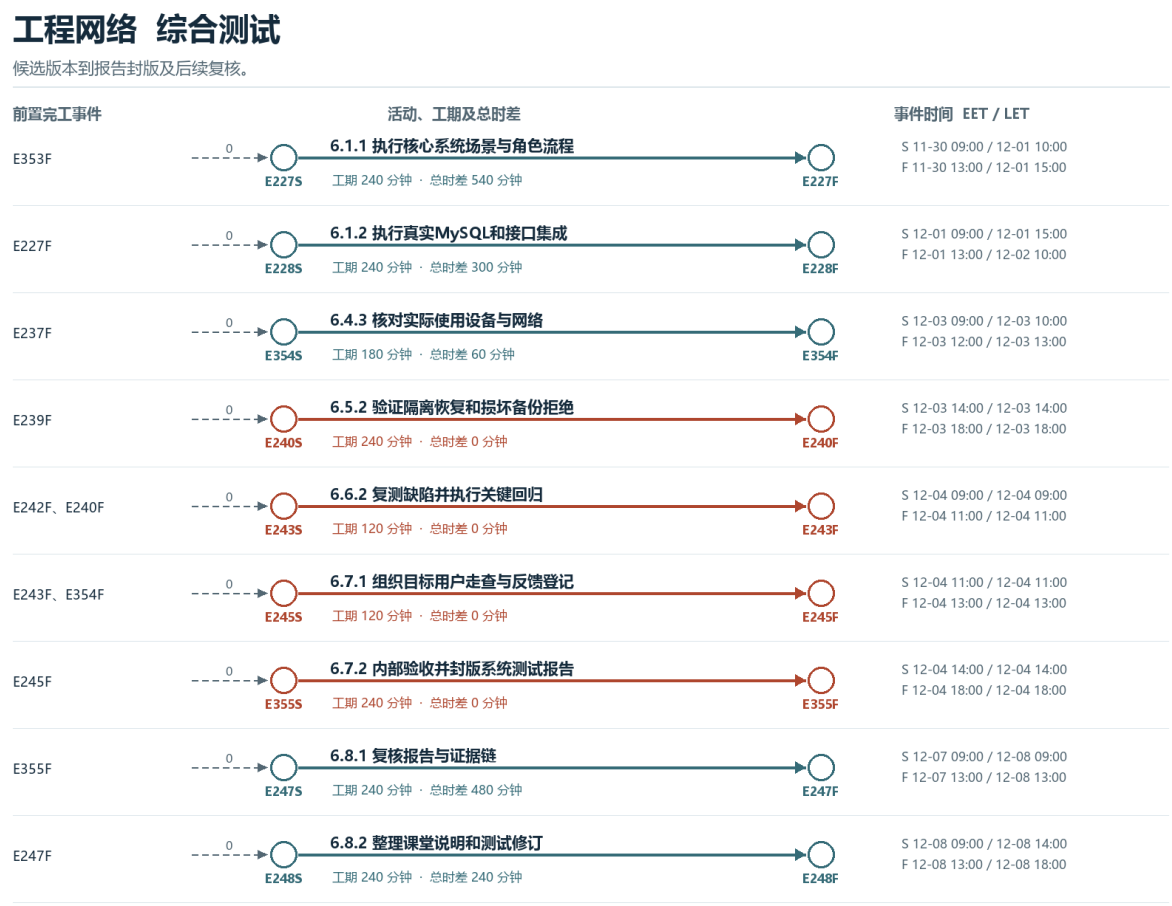


图 8 综合测试。S、F 分别为起止事件，单位为工作分钟。

工程网络图 维护与收尾



图 9 维护与收尾。S、F 分别为起止事件，单位为工作分钟。

8 项目组织和资源

8.1 项目组织与成员分工

王晨担任组长兼项目负责人，承担项目管理、共享后端、小程序、集成和性能验证，并统筹测试报告、交付手册与最终归档；计划 146.30 人时。刘景浩承担网页阅读创作、社区及独立运维开发、功能安全兼容验证和交叉复核；计划 129.55 人时。双方均参加需求、设计、开发、文档和验收，AI 作为工具，实际贡献依据验收成果记录。

成员	主要负责工作	共同与持续责任
王晨 32401211；组长兼项目负责人	项目管理；共享后端、认证、文章 API、移动创作、交流激励、集成与性能恢复验证；146.30 人时	双方共同完成需求设计与验收；主责测试报告、交付手册、总评和归档；刘景浩交叉复核
刘景浩 32401205	网页阅读与 Markdown、社区治理、独立运维执行及网页；功能安全兼容验证；129.55 人时	需求原型、测试数据和用例；提供模块说明及证据；独立复核王晨统稿，双方修复本人模块

人员组织采用两人协商的小型民主协作组：双方共同决定需求和重要技术方案，各自对模块负责并交叉复核；王晨作为组长承担进度、变更、风险及提交协调责任。该安排参考课件 13.4 民主制程序员组，管理责任和技术协商权分别明确。[R1，13.4]

共同任务明确双方工作

计划与可行性由双方共同确认：王晨整理范围、资源与关键技术，刘景浩整理操作、内容来源与原型；SRS 与设计分别提供业务规则和交互场景。开发按模块负责；6.6.1 两人各用 1.25 人时修复本人模块，刘景浩统筹缺陷台账。王晨主责 6.8 测试报告、7.1 交付手册、8.2 总评材料、8.4 整改归档，刘景浩独立复核；共同验收仍由双方确认。

工作包 6.6 由刘景浩统筹缺陷台账与回归。王晨修复后端、移动和激励模块，刘景浩修复网页、社区及运维模块。模块负责人完成修复，另一成员独立复核，共同处理跨模块问题。

10 月 11 日两人讨论 GitHub 账号、版本工具和初始分工，初看 AI 计划。王晨借助 GPT 制作 PDF、借助豆包制作 PPT；先按 AI 计划分工，后续根据老师意见和实际情况修订。会议原命名方案与会后完善的协作规则分别见附录 D、第 6.14 章。

决策与交接职责

事项	组织和执行	确认与留痕
周计划与资源安排	王晨汇总，刘景浩提供模块状态；双方核对容量	双方确认承诺任务、期限和交接；保留纪要
范围日期预算调整	提出人说明影响，王晨协调，刘景浩核对任务与材料	双方确认；涉及课程约束按要求请教师评审
模块完成与阶段放行	任务负责人自查，另一人交叉复核	通过证据记入交付登记；共同成果分别说明承担内容
文档和发布材料封版	王晨汇总和封版，刘景浩独立复核清单与版本	双方核对引用、版本及未决项；审核批准按实际填写

周会固定检查顺序

先核对上周承诺与验收证据，再分析偏差和阻塞，更新风险及变更，最后确认下周任务、交接和每人可用人时。王晨组织并检查课程截止，刘景浩汇总模块、文档和配置状态，双方确认。实际会议日期、地点、讨论与评分据实填写。周会模板及问题、变更登记表使用相同编号。

8.2 项目资源

资源使用现有电脑与已选开发工具，Windows 与 WSL2 Linux 为正式演示环境。现有腾讯云轻量服务器为 2 核 2GB，仅作可选部署验证资源，是否承载全部服务以实测为准，不列入课堂验收必需条件。现阶段不要求新增云服务器或公网域名。工具可用性和邮件发信条件按实际需要核查；10 月 12 日前核查本机资源、磁盘、邮箱渠道与工具条件。

计划工作量按任务和周安排管理，不将 AI 生成速度直接换算为固定效率提升。每周对照实际难度调整后续任务交接，保留计划与实际偏差说明。

资源与预算检查

Project 纳入 192 项核心子任务、14 项周管理与 35 项交叉复核，包含 353 条人员分配。王晨计划 146.30 人时，刘景浩 129.55 人时。按每工作日 45 分钟的日常容量核查，高峰阶段存在负荷超出；周计划据此安排集中投入和任务交接。进度、开发、文档和复核统一跟踪。

资源取得与可用时间按周计划检查。两名成员日常各 30—45 分钟，集中实现、联调和测试阶段追加投入。附录 E、F 记录计划、实际与追加需求；王晨组织每周容量检查，刘景浩核对本人任务及交接。

9 培训

9.1 项目的技术要求

两人需掌握 Git 分支与交叉复核、Java 业务接口、双端创作、数据库迁移、JMeter 结果判读及部署恢复。不熟悉的环节先进行最小验证，再结合结果安排实现与复核。

9.2 培训计划

培训融入原有环境准备、联调、测试和维护交接任务，不另虚增人时：实现前双方核对分支及环境步骤；综合测试前王晨说明负载脚本与结果，刘景浩说明功能与回归记录；维护交接时各自演示负责模块，另一人照手册复现。产物为步骤说明、复现记录和问题处理结果。

10 项目估算

10.1 规模估算

规模采用计划阶段平均复杂度估算：18×4＋4×5＋8×4＋9×10＋1×7＝221 个未调整功能点。14 项技术因素影响分合计 34，TCF＝0.65＋0.01×34＝0.99，调整后 FP＝218.79。规模与 WBS 工作量分别管理，因素明细见可行性报告附录 D3，需求变更时同步复核。[R1，13.1—13.2] 功能点为计划阶段规模初估，需求模型细化后在 3.9 复核范围；本轮图形和文档数量不计作新增软件功能点。

10.2 工作量估算

人时估算与排期修订依据

以末级任务估算修订、复用、复核、执行和取证。V1.7 对照为 226.55 人时，V1.8 为 275.85 人时，增加 49.30 人时。总体与详细设计 64.25 人时，综合测试 37.25 人时。

估算例子	计划工作量 人时	估算包含内容
4.5 按数据流五步设计软件结构	8.25	HLD12–14 与平衡记录；变换流与事务流判定；HLD07–09、HLD15 及 HIPO；HLD16–17 与规则对照；HLD11、接口与数据结构表
4.13 三级用例、数据和详细设计复核	8.00	单元用例与路径表；三级用例、合成数据与取证方案；详细设计交接与用例基线
5.12 联调、代码用例证据与候选版本	8.50	联调记录和候选版本；程序清单、走查记录及单元结果；11 月 29 日实现阶段提交材料
6.2 正常负载与性能指标	3.25	JMeter 配置、原始数据与资源趋势；负载结果与缺陷
6.5 部署、停机与备份恢复	5.00	部署及停机演练记录；恢复及回退记录
6.7 用户走查、内部验收及报告封版	4.75	用户走查和确认记录；12 月 6 日提交基线

每周复盘记录原估计、实际完成量和偏差原因；连续延期或交接不符时重新估算后续任务，优先拆分、调整顺序或协作处理。更新必须同步任务表、甘特图、网络计算、预算和变更记录，不以省略测试消除延期。

计划工作量按任务和周安排管理，不将 AI 生成速度直接换算为固定效率提升。每周对照实际难度调整后续任务交接，保留计划与实际偏差说明。

人时与人工折算控制总额

成员或成本项	计划数量	估算金额与口径
王晨	146.30 人时	6694.69 元
刘景浩	129.55 人时	5928.21 元
团队人工	275.85 人时	12622.90 元

成员或成本项	计划数量	估算金额与口径
人工估算与新增现金	现金 0 元	12622.90 元

直接人工与现金采购分别登记。计划人时和实际投入分别管理，每周比较人员负荷与可用容量。原生 MPP 采用 275.85 计划人时和 45.76 元 / 人时费率，高峰负荷通过集中投入、任务顺序及接口交接安排管理。

工作量交叉核验

按末级 WBS 和实际负责人汇总后，与 Project 原生分配交叉核对。原三点估计属于 V1.7 估算背景。V1.8 的变更依据、个人分钟及人工预算见《设计与测试估算变更 G04》。

10.3 成本估算

成本项目	数量及口径	计划金额
王晨人工折算	146.30 人时 × 45.76 元 / 人时	6694.69
刘景浩人工折算	129.55 人时 × 45.76 元 / 人时	5928.21
项目总估算	直接人工按未舍入值汇总	12622.90

本期复用现有电脑、可用开发工具与既有服务器资源，无新增现金采购预算；人工按 275.85 人时、45.76 元 / 人时估算。任何后续新增采购须先评估并经双方确认后调整计划。

10.4 关键计算机资源估算

2026 年 10 月 21 日核对演示电脑配置，按下列 CPU、内存、磁盘与备份预算组织部署和测试，并在环境清单中记录实际配置。

实测项目	2026 年 10 月 21 日记录
处理器	AMD Ryzen 7 8845H，8 个物理核心、16 个逻辑处理器
系统与物理内存	Windows 11 家庭中文版，10.0.26200；系统可用物理内存 31.29 GiB
磁盘	C 盘总 298.86 GiB、空闲 51.41 GiB；D 盘总 652.86 GiB、空闲 235.88 GiB
工程软件基准	Java 21、Spring Boot 4.1.1、MySQL 8；已存工程 pom.xml 及 README 记载。补丁版本、WSL2 发行版和工具版本在部署清单锁定。

内存与处理器预算

运行部分	计划资源	检查要求
WSL2 服务环境	4 个逻辑处理器、内存预算 8 GiB	作为本地部署的配置目标，实施时记录实际限制与占用。
业务与数据库	Spring Boot JVM 上限 512 MiB；MySQL 预算 1 GiB	共享认证、文章与互动接口；先检查索引、分页和连接池。
网页与独立运维	网页服务与执行器合计 512 MiB	执行器和任务记录独立于被维护业务进程。
WSL2 系统及缓冲	预算 4 GiB，另留 2 GiB 余量	服务分配合计不超过 8 GiB；运行数据缓存随实测调整。
Windows 客户端与施压	浏览器、开发者工具及编辑工具合计 4 GiB；JMeter JVM 上限 2 GiB	同机测量单独记录资源竞争，关闭无关构建和 AI 桌面任务。
宿主系统与余量	Windows 预算 8 GiB；上述预算合计 22 GiB	本机可用物理内存 31.29 GiB，计划余量约 9.29 GiB。

数据与备份空间估算

空间对象	计划容量	估算依据
业务数据库	2 GiB	200 用户、2000 文章、5000 评论；正文按 16 KiB、评论按 1 KiB 估算，另含用户、账本、索引及增长余量。
图片	6 GiB	估算 2000 篇×平均 3 张×平均 1 MiB，约 5.86 GiB；用于容量规划，不构成文章图片数量限制。
滚动备份	24 GiB	保留 3 份完整快照，每份按数据库 2 GiB＋图片 6 GiB 估算；按未压缩容量预留。
日志、包与临时空间	8 GiB	运行日志预算 1 GiB，发布与回退包 4 GiB，导出和临时处理 3 GiB。
本地数据合计	40 GiB	数据与备份计划使用 D 盘受控目录；C 盘另留 8 GiB 用于代码、依赖和构建。
离机备份	至少 8 GiB 可用	验收前将一份完整快照另存其他物理设备；同机另一目录不能替代离机保护。

本地部署预留 C 盘 8 GiB、D 盘 40 GiB。4.6、4.12 由双方确认目录与资源限制，5.10—5.11 由刘景浩实现受控目录和保留策略，6.2、6.3 由王晨记录资源趋势，6.5 核对备份容量与恢复一致性。腾讯云 2 核 2GB 服务器作为扩展验证资源。

10.5 管理预留

管理预留为 0 人时、0 元，基准工作量 275.85 人时、直接人工预算 12622.90 元。管理、交叉复核和测试已作为执行任务计入预算，超出基准的投入按变更流程处理。

当剩余工作预测超出人时或成本基线，任务负责人提出变更，说明原因、剩余投入、交接和质量影响；王晨组织分析，刘景浩复核，双方确认后更新任务、Project、预算及风险。涉及课程范围或截止变化时提交教师评审。未经确认不启用额外预算，不削减必要测试。

工作量增加 20%的情景为 331.02 人时，属于敏感性分析，不属于已批准管理预留，也不计入现有总预算。

11 风险管理

每周进行一次双人复盘，检查完成证据、阻塞、依赖变化与下周任务。关键活动延误时当周调整顺序、拆分任务或协作处理，影响范围及截止日的变化与教师沟通。[R1，第 22—44 页]

风险	优先级	负责人	应对措施
本机资源、邮箱或开发工具受限	高	王晨	10/12 前完成 WSL2、磁盘与工具访问，核查发信渠道；预置认证账号，准备离机备份。
11 月关键模块集中或接口交接延误	高	王晨	周复盘优先检查零时差活动，提供固定接口约定和示例，及时拆分移交。
恢复覆盖数据或备份不一致	高	王晨	恢复前校验与现状备份，独立控制服务，失败停止并记录。
认证资料越权或币记录不一致	高	王晨	服务端鉴权、事务及重复防护，验收覆盖权限与并发异常。
双端格式与编辑状态不一致	中	刘景浩	提前统一内容模型与接口，验证图片失败和编辑冲突。
文章或作者供给不足	中	刘景浩	用来源明确的示例完成演示，记录用户反馈，逐步邀请经历作者。
AI 输出错误或版本丢失	中	两人	关键内容交叉复核，Git 版本化并备份，答辩前解释自身模块。
需求扩大影响交付	中	两人	变更前分析范围、日期与成本影响，优先完成已确认社区范围。

进度预警与问题升级

以下为本计划的建议控制规则，双方在执行周会确认适用。已确认的历史会议不增加未发生的决定。负责人发现风险已发生时登记问题编号，关联 WBS、交付成果、处理动作和关闭证据；影响基线时另提变更。

触发条件	处理时限与负责人	保存记录
关键活动预测延期，或严重权限与恢复风险	发现当日由任务负责人告知王晨；暂停受影响放行，双方评估	问题、受影响交付、措施与重新检查日期
一般任务预计延期 1 日以上，或任务人时预测偏差超过 20%	负责人登记；最近周会比较拆分、协作与后移；不得挤掉必要测试	原因、剩余人时、预测完成与容量变化
数据不足或未提交证据	标记未登记或待复核，不以 0 或 100%代填；负责人补录	缺失项、补录责任和期限

周会固定检查顺序

先核对上周承诺与验收证据，再分析偏差和阻塞，更新风险及变更，最后确认下周任务、交接和每人可用人时。王晨组织并检查课程截止，刘景浩汇总模块、文档和配置状态，双方确认。实际会议日期、地点、讨论与评分据实填写。周会模板及问题、变更登记表使用相同编号。

12 支持条件

12.1 计算机系统支持

最终课堂演示与验收使用组长电脑。Windows 运行浏览器和微信开发者工具；WSL2 Linux 承载网页服务、Spring Boot 后端、MySQL 和独立运维执行服务。小程序以微信开发者工具演示为验收方式。本机部署方案已确定，环境安装、地址配置及启动验证按周计划执行，不能将方案确定视为已部署成功。

位置	部署或运行内容	边界与准备要求
Windows	浏览器、微信开发者工具、开发工具	小程序在开发者工具中演示，网页由浏览器访问
WSL2 Linux	网页服务、业务后端、MySQL、独立运维服务	按项目目录与服务名操作；数据库不向公共网络开放
本机数据目录	发布包、图片、认证材料、日志、备份	开发与演示配置、账号、数据分开；备份另存目录
离机副本	验收用数据库与文件备份	验收前另存一份，记录位置；可在 U 盘或另一设备保存
腾讯云轻量服务器	已有 2 核 2GB，可选验证	不承担必需演示流程，不要求扩容或额外云端开发

校园邮箱发信和外部链接依赖外部网络；离线演示应明确无法完成的场景，不冒称真实发送或公网部署。运行凭据通过本机配置取得，不写入报告。

12.2 需要需方承担的工作和提供的条件

本项目按课程安排接受教师与助教评审。小组准备校园账号、演示设备、合成数据和提交材料，用户试用遵循自愿原则。课堂交付为本地演示，全校持续运营须另行核对授权、资源和服务条件。

12.3 需要分包商承担的工作和提供的条件

本项目由 G04 两名成员承担，无分包任务。AI 软件作为辅助工具纳入资源管理；工具可用性变化由负责人登记、比较替代方案并按变更流程处理。

13 注解

SDP 为软件开发计划，FAR 为可行性分析报告，SRS 为软件需求规格说明，CSCI 为计算机软件配置项，HWCI 为计算机硬件配置项，WBS 为工作分解结构，EET 和 LET 为事件最早与最迟时刻。工期表示排期跨度，人时表示个人投入；两人同时各投入 1 小时合计 2 人时。

正文采用国标第 7.2 节 13 章，第 6 章覆盖 20 类活动并说明裁剪。专用硬件、分包与独立第三方验证不适用；安装、移交、配置和质量安排由正文及配套台账承接。WBS、图表、周会与成员评分按课程要求补充。

附录 A 工作包时间责任与完成标准

各执行任务均列人工预算，项目人工预算 12622.90 元见附录 F。192 项子任务在附录 B 按周展开，工作包负责人、复核人和依赖在 Project 使用同一数据。

1 项目计划与评审

工作包	日期、人时与人工预算	任务负责人及复核	前置产物与完成标准
1.1 任务分解、排期与资源预算	10/08；2.00 人时；人工预算 91.52 元	王晨、刘景浩；复核共同确认	无前置；WBS 与 Project 任务表；预算及风险清单。完成标准：每项任务写明负责人、计划人时、前置、产物与人工预算；管理活动单列
1.2 项目计划内部复核与汇报材料	10/09；2.00 人时；人工预算 91.52 元	王晨、刘景浩；复核共同确认	前置 1.1；计划评审记录；PPT 提示词与附件清单。完成标准：16 项要求有材料位置；图表、分工和提交节点一致
1.3 项目计划评审反馈与修订	10/15；2.00 人时；人工预算 91.52 元	王晨、刘景浩；复核共同确认	前置 1.2；问题单、修订稿和计划基线标签。完成标准：逐项记录处理人、修改内容和复核结果；未关闭问题有期限

2 可行性研究

工作包	日期、人时与人工预算	任务负责人及复核	前置产物与完成标准
2.1 关键技术与工具可行性验证	10/08—10/12；4.50 人时；人工预算 205.92 元	王晨；复核刘景浩	无前置；环境配置清单；关键技术验证记录。完成标准：真实发信、编译、权限和恢复条件有验证记录；失败说明替代措施
2.2 经济、操作及内容供给分析	10/12—10/13；2.50 人时；人工预算 114.40 元	刘景浩；复核王晨	前置 1.2；经济操作分析；内容来源与邀请方案。完成标准：现有资源与新增费用分别列明，资料来源可追溯，作者招募与供给条件明确
2.3 可行性报告与内部评审	10/14—10/15；3.00 人时；人工预算 137.28 元	王晨、刘景浩；复核共同确认	前置 2.1,2.2；可行性报告；条件结论及问题清单。完成标准：技术、经济、操作、进度及风险都有依据；高风险项明确验证和应对

3 需求分析

工作包	日期、人时与人工预算	任务负责人及复核	前置产物与完成标准
3.1 用户场景、用例与权限边界	10/16—10/19；4.00 人时；人工预算 183.04 元	王晨、刘景浩；复核共同确认	前置 2.3；用例清单；角色权限矩阵。完成标准：游客、未认证、认证、社区和运维角色分开；普通账号不能访问管理数据
3.2 功能、数据与非功能需求	10/20—10/21；3.20 人时；人工预算 146.43 元	王晨；复核刘景浩	前置 3.1；SRS 需求条目；数据字典与验收条件。完成标准：REQ 编号关联用例；认证资料、隐私、状态、冲突、币账本与恢复边界可验收
3.3 双端原型与场景核对	10/20—10/21；3.20 人时；人工预算 146.43 元	刘景浩；复核王晨	前置 3.1；可点击原型或线框；场景核对记录。完成标准：原型覆盖空结果、加载失败、认证提示、草稿保存和运维任务失败
3.4 SRS 基线与需求评审材料	10/22—10/23；4.00 人时；人工预算 183.04 元	王晨、刘景浩；复核共同确认	前置 3.2,3.3；内部需求基线；追踪表与汇报素材。完成标准：需求、原型、权限和异常一致；未决问题记录；10 月 25 日提交材料齐全
3.5 需求课堂评审反馈处理	11/04；3.20 人时；人工预算 146.43 元	刘景浩；复核王晨	前置 3.9；SRS 修订；需求变更与影响记录。完成标准：11 月 4 日新意见在课后完成登记与修订；变更有责任人和复核结论
3.6 课件核对及三模型骨架	10-28—10-29；6 人时；274.56 元	王晨、刘景浩；王晨协调	3.4；课件覆盖、ER 与 DFD 骨架。ER 有实体属性和基数；DFD 上下文、一级与关键二级对应，范围与权限一致
3.7 字典规范化及行为辅助模型	10-30—10-30；5 人时；228.8 元	王晨、刘景浩；王晨协调	3.6；字段字典、正则、状态及辅助图。字段约束完整；1NF 至 3NF 有实例；状态、层次、Warnier 和 IPO 可解释
3.8 界面线框与真实用户走查	11-02—11-02；4 人时；183.04 元	王晨、刘景浩；刘景浩协调	3.7；原型、代表与反馈记录。覆盖正常与异常；真实参与和反馈分别登记，未确认不得代签
3.9 需求验证追踪与阶段提交	11-03—11-03；5 人时；228.8 元	王晨、刘景浩；王晨协调	3.8；SRS、模型追踪、评审对照及阶段材料。一致完整现实有效四项检查；未关闭问题有责任期限；提交材料同版本

4 总体与详细设计

工作包	日期、人时与人工预算	任务负责人及复核	前置产物与完成标准
4.1 设想供选择的方案	10/26 2.00 人时 91.52 元	王晨 1.50、刘景浩 0.50	3.4.2。DFD00–03 引用表；候选处理分组表。末级产物逐项验收并归档，缺项有处理人及期限
4.2 选取合理的方案	10/26 3.00 人时 137.28 元	王晨 2.00、刘景浩 1.00	4.1.2。HLD01–03 与物理清单；三套成本效益表；三套方案进度表。末级产物逐项验收并归档，缺项有处理人及期限
4.3 推荐最佳方案	10/27 1.25 人时 57.20 元	王晨 0.75、刘景浩 0.50	4.2.3。推荐方案与风险记录。末级产物逐项验收并归档，缺项有处理人及期限
4.4 按 DFD 分解功能与过程	10/27 3.00 人时 137.28 元	王晨 2.25、刘景浩 0.75	4.3.1。DFD 处理分解表；四类过程判定表。末级产物逐项验收并归档，缺项有处理人及期限
4.5 按数据流五步设计软件结构	10/28–10/29 8.25 人时 377.52 元	王晨 6.25、刘景浩 2.00	4.4.2。HLD12–14 与平衡记录；变换流与事务流判定；HLD07–09、HLD15 及 HIPO；HLD16–17 与规则对照；HLD11、接口与数据结构表。末级产物逐项验收并归档，缺项有处理人及期限
4.6 设计并核对数据库	10/28–10/29 3.50 人时 160.16 元	王晨 3.00、刘景浩 0.50	4.4.2。ER01–04 与 HLD10；数据库设计结果技术内容。末级产物逐项验收并归档，缺项有处理人及期限
4.7 制定三级测试计划	11/02 3.50 人时 160.16 元	王晨 1.25、刘景浩 2.25	4.5.5、4.6.2。测试策略和场景；测试计划四项材料。末级产物逐项验收并归档，缺项有处理人及期限

工作包	日期、人时与人工预算	任务负责人及复核	前置产物与完成标准
4.8 汇编总体设计与五份配套文档	11/03–11/04 6.50 人时 297.44 元	王晨 3.25、刘景浩 3.25	4.5.5、4.7.2、4.6.2。系统说明、用户手册；测试计划、数据库设计结果；详细实现计划；总体设计和五份配套稿。末级产物逐项验收并归档，缺项有处理人及期限
4.9 技术审查与管理复审	11/05 3.75 人时 171.60 元	王晨 2.25、刘景浩 1.50	4.8.4、3.5.2。技术审查清单；管理复审与基线登记。末级产物逐项验收并归档，缺项有处理人及期限
4.10 业务过程、判定和复杂度设计	11/09–11/10 4.25 人时 194.48 元	王晨 3.50、刘景浩 0.75	4.9.2。认证与发布过程图；账本及治理详细设计。末级产物逐项验收并归档，缺项有处理人及期限
4.11 双端人机界面与交互详细设计	11/09–11/10 4.25 人时 194.48 元	王晨 0.50、刘景浩 3.75	4.9.2。双端界面详细设计；跨端流程与界面状态。末级产物逐项验收并归档，缺项有处理人及期限
4.12 独立运维与备份恢复详细设计	11/11 4.50 人时 205.92 元	王晨 1.50、刘景浩 3.00	4.9.2。运维过程图与状态定义；恢复过程与数据结构。末级产物逐项验收并归档，缺项有处理人及期限
4.13 三级用例、数据和详细设计复核	11/12–11/13 8.00 人时 366.08 元	王晨 4.00、刘景浩 4.00	4.10.2、4.11.2、4.12.2。单元用例与路径表；三级用例、合成数据与取证方案；详细设计交接与用例基线。末级产物逐项验收并归档，缺项有处理人及期限
4.14 设计评审反馈与修订交接	11/20–11/26 8.50 人时 388.96 元	王晨 4.25、刘景浩 4.25	4.13.3。11 月 22 日设计修订包；课堂反馈与责任清单；设计修订稿及变更记录；修订基线与联调输入。末级产物逐项验收并归档，缺项有处理人及期限

5 编码与单元测试

工作包	日期、人时与人工预算	任务负责人及复核	前置产物与完成标准
5.1 项目骨架、配置与接口约定	11/06 1.80 人时 82.37 元	王晨 1.80	4.9.2。工程框架与接口示例。双方按契约独立工作；配置与凭据分离；构建入口可复现
5.2 登录、邮箱与材料认证	11/09–11/10 3.00 人时 137.28 元	王晨 3.00	5.1.2。认证模块及单元用例。验证码错误、过期和发送失败有反馈；认证材料受控；审核有理由与通知
5.3 文章存储、岗位检索与筛选接口	11/11–11/13 2.00 人时 91.52 元	王晨 2.00	5.2.2。内容、检索接口及单元用例。草稿不公开；组合检索准确；图片关联正确；错误响应与版本字段符合契约
5.4 小程序与网页阅读页面	11/06–11/10 5.50 人时 251.68 元	刘景浩 5.50	4.9.2。双端阅读与筛选界面。此时按契约使用模拟数据并明确标注；真实 API 接入在 5.12 完成
5.5 网页 Markdown 创作与草稿	11/11–11/13 5.50 人时 251.68 元	刘景浩 5.50	5.4.2。编辑、预览、草稿及图片工具。正文图片保存一致；失败保留内容；危险脚本过滤；复杂正文格式保留
5.6 小程序文字与图片创作	11/16–11/17 5.50 人时 251.68 元	王晨 5.50	5.3.2。移动创作及上传模块。手机能完成图文创作；失败图片可逐项重试；不静默覆盖复杂正文
5.7 双端草稿、发布与文章管理	11/18–11/19 5.50 人时 251.68 元	王晨 4.50、刘景浩 1.00	5.6.2、5.5.2。发布、修改、下架与草稿接口。更新有版本冲突提示；管理员下架不可由作者自行恢复；删除不误删他人数据

工作包	日期、人时与人工预算	任务负责人及复核	前置产物与完成标准
5.8 评论、点赞、投币、收藏与荣誉	11/20–11/24 5.50 人时 251.68 元	王晨 5.50	5.7.2。交流与激励模块及单元用例。未认证不能取得评论主页联系方式；作者关闭联系立即生效；余额不负、不自投、不重复奖励；贡献与消费分开
5.9 社区审核、反馈与举报网页	11/16–11/18 5.50 人时 251.68 元	刘景浩 5.50	5.5.2。管理端与人工认证处理。刘景浩同时负责社区处理 API 与网页；复用认证契约；一键定位原文评论；理由、通知、限制申诉及审计可追溯
5.10 独立运维执行与备份服务	11/19–11/23 6.50 人时 297.44 元	刘景浩 6.50	5.9.2。固定部署、重启、备份恢复执行器。仅受控服务与目录；任务互斥且持久；恢复前备份；数据库与图片一致；业务停机仍可查任务
5.11 运维网页、状态与操作记录	11/24–11/25 6.50 人时 297.44 元	刘景浩 6.50	5.10.2。运维面板及操作反馈。各动作显示目标与影响并确认；显示运行、成功、失败状态和审计；不提供任意命令输入
5.12 联调、代码用例证据与候选版本	11/27 8.50 人时 388.96 元	王晨 4.25、刘景浩 4.25	4.14.4、5.2.2、5.3.2、5.4.2、5.5.2、5.6.2、5.7.2、5.8.2、5.9.2、5.10.2、5.11.2。联调记录和候选版本；程序清单、走查记录及单元结果；11 月 29 日实现阶段提交材料。末级产物逐项验收并归档，缺项有处理人及期限

6 综合测试

工作包	日期、人时与人工预算	任务负责人及复核	前置产物与完成标准
6.1 核心系统及真实 MySQL 集成测试	11/30–12/01 5.25 人时 240.24 元	王晨 2.25、刘景浩 3.00	5.12.3。系统用例记录；集成报告及接口证据。末级产物逐项验收并归档，缺项有处理人及期限

工作包	日期、人时与人工预算	任务负责人及复核	前置产物与完成标准
6.2 正常负载与性能指标	11/30–12/01 3.25 人时 148.72 元	王晨 3.25	5.12.3。JMeter 配置、原始数据与资源趋势；负载结果与缺陷。末级产物逐项验收并归档，缺项有处理人及期限
6.3 压力、稳定性及降载恢复	12/02 3.75 人时 171.60 元	王晨 3.75	6.2.2。压力记录；稳定性与降载证据。末级产物逐项验收并归档，缺项有处理人及期限
6.4 权限、双端兼容及目标环境	12/02–12/03 5.75 人时 263.12 元	王晨 0.50、刘景浩 5.25	6.1.2。权限及内容安全记录；双端兼容记录；目标设备测试登记。末级产物逐项验收并归档，缺项有处理人及期限
6.5 部署、停机与备份恢复	12/03 5.00 人时 228.80 元	王晨 3.75、刘景浩 1.25	6.3.2。部署及停机演练记录；恢复及回退记录。末级产物逐项验收并归档，缺项有处理人及期限
6.6 缺陷处理、复测和回归	12/03–12/04 5.25 人时 240.24 元	王晨 2.50、刘景浩 2.75	6.4.3、6.3.2、6.5.2。缺陷、修订提交与复测计划；复测与回归记录。末级产物逐项验收并归档，缺项有处理人及期限
6.7 用户走查、内部验收及报告封版	12/04 4.75 人时 217.36 元	王晨 2.00、刘景浩 2.75	6.6.2、6.4.3。用户走查和确认记录；12 月 6 日提交基线。末级产物逐项验收并归档，缺项有处理人及期限
6.8 测试报告复核及课堂说明	12/07–12/08 4.25 人时 194.48 元	王晨 2.75、刘景浩 1.50	6.7.2。报告复核记录；12 月 9 日课堂材料和 12 月 13 日修订准备。末级产物逐项验收并归档，缺项有处理人及期限

7 部署与维护

工作包	日期、人时与人工预算	任务负责人及复核	前置产物与完成标准
7.1 安装包、用户与维护说明	12/09—12/10；3.00 人时；人工预算 137.28 元	王晨；复核刘景浩	前置 6.8；发布包、安装用户管理运维说明。完成标准：指南包括版本、目录、冷启动、四类操作影响、离机备份和已知限制；对应同一安装包

工作包	日期、人时与人工预算	任务负责人及复核	前置产物与完成标准
7.2 干净环境启动与课堂演示	12/11；3.00 人时；人工预算 137.28 元	王晨；复核刘景浩	前置 7.1；干净环境启动及课堂演示核查记录。完成标准：按指南可复现；预认证演示与真实邮箱验证分开；测试账号不展示凭据
7.3 维护申请与变更演练	12/14；3.00 人时；人工预算 137.28 元	刘景浩；复核王晨	前置 7.2；维护变更单、回退与回归记录。完成标准：在隔离测试环境完成申请、评估、实施、回归及版本归档演练
7.4 运维交接与反馈整改	12/15；3.00 人时；人工预算 137.28 元	王晨；复核刘景浩	前置 7.3；交接清单、备份与权限配置记录。完成标准：双方能操作固定运维任务；离机副本有位置和完整性记录；私密配置独立交接
7.5 课堂测试评审意见处理	12/17；3.00 人时；人工预算 137.28 元	刘景浩；复核王晨	前置 6.8；测试评审修订和残留风险记录。完成标准：逐项处理、复核和记录；未解决问题明确责任及期限；同版本更新交付包

8 总结与收尾

工作包	日期、人时与人工预算	任务负责人及复核	前置产物与完成标准
8.1 项目总结与计划偏差分析	12/18—12/21；3.60 人时；人工预算 164.74 元	王晨、刘景浩；复核共同确认	前置 7.4,7.5；总结报告、偏差分析和实际贡献证据。完成标准：按工作包、提交和问题单总结管理、开发与文档成果，说明计划偏差及原因
8.2 总评材料与详细计划附录	12/22—12/23；3.00 人时；人工预算 137.28 元	王晨；复核刘景浩	前置 8.1；总评素材、完整周计划和引用。完成标准：PPT 由豆包制作；正文与附录范围分工日期一致；无旧范围截图与凭据
8.3 最终验收与汇报演练	12/24；3.60 人时；人工预算 164.74 元	王晨、刘景浩；复核共同确认	前置 8.2；交付基线、验收清单及演练记录。完成标准：源码、脚本、包、文档、测试与图表同版本；12 月 27 日提交、12 月 30 日汇报
8.4 总评反馈处理与归档	12/31—01/04；3.00 人时；人工预算 137.28 元	王晨；复核刘景浩	前置 8.3；总评修订、提交基线及归档尾项记录。完成标准：12 月 31 日准备 1 月 3 日提交基线；1 月 4 日核对尾项并追加归档记录
8.5 课程收尾与交付确认	01/06；3.60 人时；人工预算 164.74 元	王晨、刘景浩；复核共同确认	前置 8.4；收尾确认、最终清单与实际成员评价。完成标准：1 月 6 日课程收尾；实际互评由双方确认；后续运维范围另行约定

附录 B 按周列任务与交接。可行性与需求的完整末级分解另见附录 I，最新日期、工时、前置及产物以同版 Project 与任务明细核对。

附录 B 详细任务分解与周安排

周任务行列当周分摊人时与人工预算；跨周任务在各周分别计入投入，任务全量估算见附录 A 和任务分解 CSV。每行按所列子任务范围执行与检查，工作包整体完成标准见附录 A。工作量以人时列示，日期只表示交接边界。全部子任务、周管理与复核均列计划人时和按 45.76 元/人时计算的人工预算；项目合计 275.85 人时、12622.90 元，实际投入另记。双方每周按 Project 的 R 类任务检查对方产物，记录问题、修改和关闭结论；共同任务由双方确认。

课程启动与预备阶段 09/16—09/30

9 月 16 日课程启动与选题，9 月 23 日预备作业和项目介绍，9 月 30 日项目计划及 PPT。上述节点以课程日期登记。第 1—14 周为原有任务分解的执行周，工时从有分配的任务汇总。

第 1 周 10/05—10/11

本周目标：计划评审准备与关键条件核查。

交接与提交：10 月 9 日双方确认计划、图表和汇报；10 月 11 日 22 时提交评审材料。关键技术验证接续至 10 月 12 日。

持续管理 M01：10/08—10/09；0.85 人时；人工预算 38.90 元。负责人王晨，刘景浩提供状态。检查完成证据、阻塞、下周交接和提交节点；更新风险变更及实际差异；双方确认记录；保存周会议及变更记录。

编号	当周具体任务	任务负责人	前置与交接	产物与完成标准
1.1.1	确认 WBS、依赖与提交边界；10/08；1.00 人时；人工预算 45.76 元	王晨、刘景浩	无；按约定输入启动	形成确认 WBS、依赖与提交边界对应产物；按附录 A 核对内容与未决问题。证据：WBS 与 Project 任务表；预算及风险清单
1.1.2	建立资源预算与风险安排；10/08；1.00 人时；人工预算 45.76 元	王晨、刘景浩	1.1.1	完成建立资源预算与风险安排；记录交叉复核或双方确认结论。证据：WBS 与 Project 任务表；预算及风险清单
1.2.1	逐条检查评审要求与计划；10/09；1.00 人时；人工预算 45.76 元	王晨、刘景浩	1.1.2	形成逐条检查评审要求与计划对应产物；按附录 A 核对内容与未决问题。证据：计划评审记录；PPT 提示词与附件清单

编号	当周具体任务	任务负责人	前置与交接	产物与完成标准
1.2.2	确认汇报材料与提交清单；10/09；1.00 人时；人工预算 45.76 元	王晨、刘景浩	1.2.1	完成确认汇报材料与提交清单；记录交叉复核或双方确认结论。证据：计划评审记录；PPT 提示词与附件清单
2.1.1	验证双端构建与邮箱条件；10/08；2.25 人时；人工预算 102.96 元	王晨	无；按约定输入启动	形成验证双端构建与邮箱条件对应产物；按附录 A 核对内容与未决问题。证据：环境配置清单；关键技术验证记录
2.1.2	本周启动：核查独立运维、存储与恢复路径；10/09；本周 1.13 人时；人工预算 51.71 元	王晨	2.1.1	确认邮件渠道、运维独立执行和备份范围的配置条件。证据：环境配置清单；关键技术验证记录

第 2 周 10/12—10/18

本周目标：计划修订与可行性结论。

交接与提交：10 月 14 日课堂意见在 15 日修订；可行性结论由双方确认，10 月 18 日 22 时提交。

持续管理 M02：10/12—10/16；0.85 人时；人工预算 38.90 元。负责人王晨，刘景浩提供状态。检查完成证据、阻塞、下周交接和提交节点；更新风险变更及实际差异；双方确认记录；保存周会议及变更记录。

编号	当周具体任务	任务负责人	前置与交接	产物与完成标准
1.3.1	登记课堂计划意见与影响；10/15；1.00 人时；人工预算 45.76 元	王晨、刘景浩	1.2.2	形成登记课堂计划意见与影响对应产物；按附录 A 核对内容与未决问题。证据：问题单、修订稿和计划基线标签
1.3.2	共同修订排期与计划基线；10/15；1.00 人时；人工预算 45.76 元	王晨、刘景浩	1.3.1	完成共同修订排期与计划基线；记录交叉复核或双方确认结论。证据：问题单、修订稿和计划基线标签
2.1.2	本周收尾：核查独立运维、存储与恢复路径；10/12；本周 1.12 人时；人工预算 51.25 元	王晨	2.1.1	执行样例核查并记录真实结果、失败与替代措施。证据：环境配置清单；关键技术验证记录
2.2.1	核查工具、设备与现金费用；10/12；1.25 人时；人工预算 57.20 元	刘景浩	1.2.2	形成核查工具、设备与现金费用对应产物；按附录 A 核对内容与未决问题。证据：经济操作分析；内容来源与邀请方案

编号	当周具体任务	任务负责人	前置与交接	产物与完成标准
2.2.2	分析资料来源、作者邀请与操作成本；10/13；1.25 人时；人工预算 57.20 元	刘景浩	2.2.1	完成分析资料来源、作者邀请与操作成本；记录交叉复核或双方确认结论。证据：经济操作分析；内容来源与邀请方案
2.3.1	双方汇总技术与资源判断；10/14；1.50 人时；人工预算 68.64 元	王晨、刘景浩	2.1.2,2.2.2	形成双方汇总技术与资源判断对应产物；按附录 A 核对内容与未决问题。证据：可行性报告；条件结论及问题清单
2.3.2	共同评审可行性结论与条件；10/15；1.50 人时；人工预算 68.64 元	王晨、刘景浩	2.3.1	完成共同评审可行性结论与条件；记录交叉复核或双方确认结论。证据：可行性报告；条件结论及问题清单
3.1.1	共同核对读者作者与管理场景；10/16；2.00 人时；人工预算 91.52 元	王晨、刘景浩	2.3.2	形成共同核对读者作者与管理场景对应产物；按附录 A 核对内容与未决问题。证据：用例清单；角色权限矩阵

第 3 周 10/19—10/25

本周目标：补充可行性研究，完成需求、原型与验收条件。

交接与提交：需求、权限、原型与验收条件形成同一基线；10 月 25 日 22 时交 SRS 和需求 PPT。

持续管理 M03：10/19—10/23；0.85 人时；人工预算 38.90 元。负责人王晨，刘景浩提供状态。检查完成证据、阻塞、下周交接和提交节点；更新风险变更及实际差异；双方确认记录；保存周会议及变更记录。

编号	当周具体任务	任务负责人	前置与交接	产物与完成标准
3.1.2	确认权限矩阵与核心用例；10/19；2.00 人时；人工预算 91.52 元	王晨、刘景浩	3.1.1	完成确认权限矩阵与核心用例；记录交叉复核或双方确认结论。证据：用例清单；角色权限矩阵
3.2.1	细化文章交流、激励与治理规则；10/20；1.60 人时；人工预算 73.22 元	王晨	3.1.2	形成细化文章交流、激励与治理规则对应产物；按附录 A 核对内容与未决问题。证据：SRS 需求条目；数据字典与验收条件

编号	当周具体任务	任务负责人	前置与交接	产物与完成标准
3.2.2	定义数据、异常与非功能验收；10/21；1.60 人时；人工预算 73.22 元	王晨	3.2.1	完成定义数据、异常与非功能验收；记录交叉复核或双方确认结论。证据：SRS 需求条目；数据字典与验收条件
3.3.1	绘制双端阅读创作原型；10/20；1.60 人时；人工预算 73.22 元	刘景浩	3.1.2	形成绘制双端阅读创作原型对应产物；按附录 A 核对内容与未决问题。证据：可点击原型或线框；场景核对记录
3.3.2	核对社区和运维管理流程；10/21；1.60 人时；人工预算 73.22 元	刘景浩	3.3.1	完成核对社区和运维管理流程；记录交叉复核或双方确认结论。证据：可点击原型或线框；场景核对记录
3.4.1	共同汇总 SRS 与需求追踪，含 FS01—FS07 补充复核；10/22；2.00 人时；人工预算 91.52 元	王晨、刘景浩	3.2.2,3.3.2	补齐可行性八步骤输入、系统流程图与 DFD、数据字典定义及方案理由；衔接 SRS、ER 与追踪。王晨侧重逻辑、数据和计划，刘景浩侧重参照软件、终端及操作，两人交叉确认。证据：可研附录 F—I、需求追踪表。
3.4.2	内部复核并准备需求汇报；10/23；2.00 人时；人工预算 91.52 元	王晨、刘景浩	3.4.1	含 FS08 文档审查 0.50 人时，其余 1.50 人时用于需求 PPT 和提交核对；按需求评审 11 项登记真实证据与未关闭项，双方确认内容、引用和附件版本。

第 4 周 10/26—11/01

本周目标：总体设计方案、功能分解和五步结构映射。

交接与提交：根据本周课程要求和 10 月 31 日文档共同评审更新材料；11 月 1 日 22 时前提交项目计划、初版 SRS 及需求评审 PPT。11 月 3 日保留评审前复核，不作为本次作业截止。

持续管理 M04：10/26—10/30；0.85 人时；人工预算 38.90 元。负责人王晨，刘景浩提供状态。检查完成证据、阻塞、下周交接和提交节点；更新风险变更及实际差异；双方确认记录；保存周会议及变更记录。

编号	当周具体任务	任务负责人	前置与交接	产物与完成标准
3.6.1	核对课件评审表、用户及范围；10-28；3 人时；137.28 元	王晨、刘景浩（王晨 1.75、刘景浩 1.25 人时）	3.4.2	ER 有实体属性和基数；DFD 上下文、一级与关键二级对应，范围与权限一致；保存 课件覆盖、ER 与 DFD 骨架
3.6.2	建立 ER 与分层 DFD 并交叉核对；10-29；3 人时；137.28 元	王晨、刘景浩（王晨 1.75、刘景浩 1.25 人时）	3.6.1	ER 有实体属性和基数；DFD 上下文、一级与关键二级对应，范围与权限一致；保存 课件覆盖、ER 与 DFD 骨架
3.7.1	细化数据字典正则及规范化；10-30；2.5 人时；114.4 元	王晨、刘景浩（王晨 1.5、刘景浩 1 人时）	3.6.2	字段约束完整；1NF 至 3NF 有实例；状态、层次、Warnier 和 IPO 可解释；保存 字段字典、正则、状态及辅助图
3.7.2	核对状态转换及辅助图形；10-30；2.5 人时；114.4 元	王晨、刘景浩（王晨 1.5、刘景浩 1 人时）	3.7.1	字段约束完整；1NF 至 3NF 有实例；状态、层次、Warnier 和 IPO 可解释；保存 字段字典、正则、状态及辅助图
4.1.1	复查需求 DFD 与系统边界	王晨 0.75	10/26；3.4.2	DFD00–03 引用表。P1–P5 与 D1–D6 均可定位

编号	当周具体任务	任务负责人	前置与交接	产物与完成标准
4.1.2	形成处理分组与排除条件	王晨 0.75、刘景浩 0.50	10/26；4.1.1	候选处理分组表。每个候选说明授权、时序与数据共享；运维停机可达条件可查
4.2.1	整理三方案流程与物理元素	王晨 0.75、刘景浩 0.50	10/26；4.1.2	HLD01–03 与物理清单。A、B、C 均有终端、进程、存储和运维路径
4.2.2	估算成本和效益	王晨 0.75	10/26；4.2.1	三套成本效益表。人时乘以 45.76 元，假设与计划口径清晰
4.2.3	编制候选实现进度	王晨 0.50、刘景浩 0.50	10/26；4.2.2	三套方案进度表。每套写明前置、责任、估算和产物
4.3.1	推荐方案并记录取舍	王晨 0.75、刘景浩 0.50	10/27；4.2.3	推荐方案与风险记录。得分、权衡和选型理由能追到三档比较
4.4.1	逐项追踪 18 个 DFD 处理	王晨 1.25	10/27；4.3.1	DFD 处理分解表。18 个处理全部映射到程序及数据
4.4.2	拆分四条复杂过程与交接	王晨 1.00、刘景浩 0.75	10/27；4.4.1	四类过程判定表。发布、投币、处置、恢复都有失败和取证条件
4.5.1	精化公开阅读和管理数据流	王晨 1.00	10/28；4.4.2	HLD12–14 与平衡记录。原 DFD 与精化图相互定位
4.5.2	判定流类型与输入输出边界	王晨 0.75	10/28；4.5.1	变换流与事务流判定。输入、中心与输出及动作路径清楚
4.5.3	完成变换与事务结构映射	王晨 2.00、刘景浩 0.75	10/28；4.5.2	HLD07–09、HLD15 及 HIPO。可追踪 DFD 到两级结构与分派
4.5.4	用设计原理与启发规则精化	王晨 1.25、刘景浩 0.50	10/29；4.5.3	HLD16–17 与规则对照。核对模块独立性、扇入扇出、控制域与接口
4.5.5	导出接口和数据并复查	王晨 1.25、刘景浩 0.75	10/29；4.5.4	HLD11、接口与数据结构表。五步有输入输出，问题能回到精化 DFD
4.6.1	核对逻辑实体与物理关系	王晨 1.50	10/28；4.4.2	ER01–04 与 HLD10。业务库和运维文件边界完整

编号	当周具体任务	任务负责人	前置与交接	产物与完成标准
4.6.2	核对迁移、字段、约束与索引	王晨 1.50、刘景浩 0.50	10/29；4.6.1	数据库设计结果技术内容。字段、主外键、事务及迁移可追溯

第 5 周 11/02—11/08

本周目标：总体设计数据库、测试计划、文档及内部复审。

交接与提交：11 月 4 日课后处理需求复审意见；11 月 5 日内部设计评审；11 月 6 日开始实现；11 月 8 日交总体设计。

持续管理 M05：11/02—11/06；0.85 人时；人工预算 38.90 元。负责人王晨，刘景浩提供状态。检查完成证据、阻塞、下周交接和提交节点；更新风险变更及实际差异；双方确认记录；保存周会议及变更记录。

编号	当周具体任务	任务负责人	前置与交接	产物与完成标准
3.5.1	记录需求复审意见；11/04；1.60 人时；人工预算 73.22 元	刘景浩	3.9.2	形成记录需求复审意见对应产物；按附录 A 核对内容与未决问题。证据：SRS 修订；需求变更与影响记录
3.5.2	修订需求并同步设计影响；11/04；1.60 人时；人工预算 73.22 元	刘景浩	3.5.1	完成修订需求并同步设计影响；记录交叉复核或双方确认结论。证据：SRS 修订；需求变更与影响记录
5.1.1	搭建模块骨架与环境配置；11/06；0.80 人时；人工预算 36.61 元	王晨	4.9.2	骨架与配置可构建，凭据独立。证据：工程骨架、环境模板和接口示例
5.1.2	核对共享接口和错误格式；11/06；1.00 人时；人工预算 45.76 元	王晨	5.1.1	共享请求、错误格式与接口示例明确。证据：工程骨架、环境模板和接口示例

编号	当周具体任务	任务负责人	前置与交接	产物与完成标准
5.4.1	实现双端筛选与阅读界面；11/06；3.50 人时；人工预算 160.16 元	刘景浩	4.9.2	双端检索阅读按共享契约完成。证据：页面与交互记录；模拟数据说明
3.8.1	准备导航线框与用户代表任务；11-02；2 人时；91.52 元	王晨、刘景浩（王晨 0.75、刘景浩 1.25 人时）	3.7.2	覆盖正常与异常；真实参与和反馈分别登记，未确认不得代签；保存 原型、代表与反馈记录
3.8.2	执行代表走查并登记修改与确认；11-02；2 人时；91.52 元	王晨、刘景浩（王晨 0.75、刘景浩 1.25 人时）	3.8.1	覆盖正常与异常；真实参与和反馈分别登记，未确认不得代签；保存 原型、代表与反馈记录
3.9.1	同步 SRS 与四维验证及追踪；11-03；2.5 人时；114.4 元	王晨、刘景浩（王晨 1.5、刘景浩 1 人时）	3.8.2	一致完整现实有效四项检查；未关闭问题有责任期限；提交材料同版本；保存 SRS、模型追踪、评审对照及阶段材料
3.9.2	同步计划排期并核对评审提交包；11-03；2.5 人时；114.4 元	王晨、刘景浩（王晨 1.5、刘景浩 1 人时）	3.9.1	一致完整现实有效四项检查；未关闭问题有责任期限；提交材料同版本；保存 SRS、模型追踪、评审对照及阶段材料
4.7.1	编制三级测试策略与方案	王晨 0.50、刘景浩 1.25	11/02；4.5.5、4.6.2	测试策略和场景。单元、集成、系统的职责和准入明确
4.7.2	编制预期结果、取证与进度	王晨 0.75、刘景浩 1.00	11/02；4.7.1	测试计划四项材料。测试目标、工具、责任和 WBS 一致
4.8.1	汇编系统说明与用户手册	王晨 0.50、刘景浩 1.25	11/03；4.5.5	系统说明、用户手册。五类角色及运维停机边界清楚

编号	当周具体任务	任务负责人	前置与交接	产物与完成标准
4.8.2	汇编测试计划与数据库设计结果	王晨 1.00、刘景浩 0.75	11/03；4.7.2、4.6.2	测试计划、数据库设计结果。口径、图、字段和追踪附件一致
4.8.3	汇编详细实现计划	王晨 0.75、刘景浩 0.50	11/04；4.8.2	详细实现计划。日期、负责人、人时、前置与 Project 一致
4.8.4	统稿总体设计并核对配套材料	王晨 1.00、刘景浩 0.75	11/04；4.8.1、4.8.3	总体设计和五份配套稿。课件九步与数据流五步可定位
4.9.1	技术审查并登记问题	王晨 1.25、刘景浩 0.75	11/05；4.8.4、3.5.2	技术审查清单。阻断问题有责任、证据和处理时限
4.9.2	管理复审与内部基线交接	王晨 1.00、刘景浩 0.75	11/05；4.9.1	管理复审与基线登记。验收状态据实际记录，交接可定位

第 6 周 11/09—11/15

本周目标：详细过程、界面、运维和三级用例复核。

交接与提交：11 月 13 日完成详细设计和用例复核，11 月 15 日提交。

持续管理 M06：11/09—11/13；0.85 人时；人工预算 38.90 元。负责人王晨，刘景浩提供状态。检查完成证据、阻塞、下周交接和提交节点；更新风险变更及实际差异；双方确认记录；保存周会议及变更记录。

编号	当周具体任务	任务负责人	前置与交接	产物与完成标准
5.2.1	实现登录与校园邮箱验证；11/09；1.50 人时；人工预算 68.64 元	王晨	5.1.2	登录验证码错误、过期、发信失败可处理。证据：认证代码、单元结果与接口集合

编号	当周具体任务	任务负责人	前置与交接	产物与完成标准
5.2.2	实现材料认证接口和角色限制；11/10；1.50 人时；人工预算 68.64 元	王晨	5.2.1	材料受控；审核理由、结果和角色权限正确。证据：认证代码、单元结果与接口集合
5.3.1	实现文章图片、草稿存储接口；11/11；1.00 人时；人工预算 45.76 元	王晨	5.2.2	草稿不公开；正文、图片和版本关联正确。证据：内容 API、SQL、单元与接口结果
5.3.2	实现岗位专业公司筛选与分页；11/12—11/13；1.00 人时；人工预算 45.76 元	王晨	5.3.1	岗位专业公司组合筛选及分页正确。证据：内容 API、SQL、单元与接口结果
5.4.2	核对游客状态、失败和空结果；11/09—11/10；2.00 人时；人工预算 91.52 元	刘景浩	5.4.1	空结果与失败可恢复；模拟数据标注清楚。证据：页面与交互记录；模拟数据说明
5.5.1	实现 Markdown、图片和资料链接；11/11；3.50 人时；人工预算 160.16 元	刘景浩	5.4.2	Markdown 预览、图片和网盘链接可用。证据：编辑器模块；保存失败及预览检查
5.5.2	实现预览、保存与草稿恢复；11/12—11/13；2.00 人时；人工预算 91.52 元	刘景浩	5.5.1	保存失败保留正文，危险脚本受控，草稿可恢复。证据：编辑器模块；保存失败及预览检查
4.10.1	细化认证与发布状态和过程	王晨 1.75	11/09；4.9.2	认证与发布过程图。修订冲突、权限与回执可验证

编号	当周具体任务	任务负责人	前置与交接	产物与完成标准
4.10.2	细化账本及治理并计算复杂度	王晨 1.75、刘景浩 0.75	11/10；4.10.1	账本及治理详细设计。异常退出和独立路径能生成用例
4.11.1	细化小程序和网页交互	刘景浩 2.00	11/09；4.9.2	双端界面详细设计。正文、创作、加载与空态明确
4.11.2	细化图片、草稿和跨端冲突	王晨 0.50、刘景浩 1.75	11/10；4.11.1	跨端流程与界面状态。失败有提示，草稿可恢复
4.12.1	细化独立运维授权与任务状态	王晨 0.75、刘景浩 1.50	11/11；4.9.2	运维过程图与状态定义。业务停机可查，受理和成功分开
4.12.2	细化备份结构、恢复和回退	王晨 0.75、刘景浩 1.50	11/11；4.12.1	恢复过程与数据结构。损坏拒绝、版本核查、保护副本可检
4.13.1	编制单元与白盒用例	王晨 1.50、刘景浩 1.25	11/12；4.10.2、4.11.2、4.12.2	单元用例与路径表。需求、分支、预期及执行证据字段齐全
4.13.2	编制集成系统用例与数据	王晨 1.50、刘景浩 1.75	11/12；4.13.1	三级用例、合成数据与取证方案。62 条本期需求均有用例映射
4.13.3	详细设计与测试用例交叉复核	王晨 1.00、刘景浩 1.00	11/13；4.13.2	详细设计交接与用例基线。11 月 15 日提交材料可核对

第 7 周 11/16—11/22

本周目标：模块实现及提交前设计修订。

交接与提交：11 月 20 日备齐修订，11 月 22 日提交。

持续管理 M07：11/16—11/20；0.85 人时；人工预算 38.90 元。负责人王晨，刘景浩提供状态。检查完成证据、阻塞、下周交接和提交节点；更新风险变更及实际差异；双方确认记录；保存周会议及变更记录。

编号	当周具体任务	任务负责人	前置与交接	产物与完成标准
5.6.1	实现移动图文编辑和上传；11/16；3.50 人时；人工预算 160.16 元	王晨	5.3.2	手机图文与图片上传可独立完成。证据：移动创作代码；图片和草稿用例
5.6.2	实现移动草稿保存及恢复；11/17；2.00 人时；人工预算 91.52 元	王晨	5.6.1	失败图片可重试，草稿恢复不覆盖复杂正文。证据：移动创作代码；图片和草稿用例
5.7.1	实现发布、修改、下架和恢复接口；11/18；3.50 人时；人工预算 160.16 元	王晨	5.6.2,5.5.2	生命周期接口及冲突检测可用。证据：生命周期 API；双端文章管理与单元结果
5.7.2	接通双端作者文章管理；11/19；2.00 人时；人工预算 91.52 元	王晨	5.7.1	双端管理一致；管理下架不能自行恢复。证据：生命周期 API；双端文章管理与单元结果
5.8.1	实现主页、评论图片及收藏交流；11/20；3.50 人时；人工预算 160.16 元	王晨	5.7.2	评论图片、主页联系、收藏有认证边界。证据：交流激励模块；事务并发、权限与通知用例

编号	当周具体任务	任务负责人	前置与交接	产物与完成标准
5.9.1	实现认证审核与举报反馈处理接口；11/16；3.50 人时；人工预算 160.16 元	刘景浩	5.5.2	处理 API 复用认证，状态理由审计齐备。证据：社区管理 API 与网页；处理状态和权限记录
5.9.2	实现社区管理网页并联调；11/17—11/18；2.00 人时；人工预算 91.52 元	刘景浩	5.9.1	网页定位原文评论；处理、申诉和通知联通。证据：社区管理 API 与网页；处理状态和权限记录
5.10.1	实现独立运维任务执行服务；11/19；4.00 人时；人工预算 183.04 元	刘景浩	5.9.2	独立执行器鉴权、目标白名单及任务互斥可用。证据：执行器、备份清单与失败保护用例
5.10.2	本周启动：实现部署重启、备份恢复及失败保护；11/20；本周 1.25 人时；人工预算 57.20 元	刘景浩	5.10.1	四类操作留痕；数据库图片一致，恢复前保护当前状态。证据：执行器、备份清单与失败保护用例
4.14.1	整理提交前设计修订	王晨 1.00、刘景浩 1.00	11/20；4.13.3	11 月 22 日设计修订包。真实已取得的意见和剩余事项明确

第 8 周 11/23—11/29

本周目标：课堂反馈修订、真实联调与实现材料封版。

交接与提交：11 月 25 日登记课堂意见，26 日修订，27 日联调封版，29 日提交。

持续管理 M08：11/23—11/27；0.85 人时；人工预算 38.90 元。负责人王晨，刘景浩提供状态。检查完成证据、阻塞、下周交接和提交节点；更新风险变更及实际差异；双方确认记录；保存周会议及变更记录。

编号	当周具体任务	任务负责人	前置与交接	产物与完成标准
5.8.2	实现点赞、领取投币、荣誉排序与通知；11/23—11/24；2.00 人时；人工预算 91.52 元	王晨	5.8.1	余额不负、不重复奖励、不自投；荣誉及通知一致。证据：交流激励模块；事务并发、权限与通知用例
5.10.2	本周收尾：实现部署重启、备份恢复及失败保护；11/23；本周 1.25 人时；人工预算 57.20 元	刘景浩	5.10.1	四类操作留痕；数据库图片一致，恢复前保护当前状态。证据：执行器、备份清单与失败保护用例
5.11.1	实现运维状态、日志和备份列表；11/24；4.00 人时；人工预算 183.04 元	刘景浩	5.10.2	状态、日志及备份列表权限正确。证据：运维网页；四类操作与失败反馈记录
5.11.2	联调网页部署重启与备份恢复；11/25；2.50 人时；人工预算 114.40 元	刘景浩	5.11.1	网页确认目标和影响，失败及停机仍能查结果。证据：运维网页；四类操作与失败反馈记录

编号	当周具体任务	任务负责人	前置与交接	产物与完成标准
4.14.2	登记课堂设计意见及影响	王晨 0.75、刘景浩 0.75	11/25；4.14.1	课堂反馈与责任清单。每条意见有处理人和涉及产物
4.14.3	分模块修订设计与测试	王晨 1.50、刘景浩 1.50	11/26；4.14.2	设计修订稿及变更记录。接口、状态和用例一致
4.14.4	交叉复核并交接联调	王晨 1.00、刘景浩 1.00	11/26；4.14.3	修订基线与联调输入。风险、限制与联调责任明晰
5.12.1	联通真实接口与跨端链路	王晨 1.75、刘景浩 1.75	11/27；4.14.4、5.2.2、5.3.2、5.4.2、5.5.2、5.6.2、5.7.2、5.8.2、5.9.2、5.10.2、5.11.2	联调记录和候选版本。实际环境和受限功能可定位
5.12.2	复核程序清单、代码走查和单元结果	王晨 1.25、刘景浩 1.25	11/27；5.12.1	程序清单、走查记录及单元结果。按提交版本和实际证据分开登记
5.12.3	封存代码清单、用例与实现证据	王晨 1.25、刘景浩 1.25	11/27；5.12.2	11 月 29 日实现阶段提交材料。真实接口与测试入口可复现

第 9 周 11/30—12/06

本周目标：集成、系统、设备、用户走查与报告封版。

交接与提交：12 月 4 日封存报告基线，12 月 6 日提交。

持续管理 M09：11/30—12/04；0.85 人时；人工预算 38.90 元。负责人王晨，刘景浩提供状态。检查完成证据、阻塞、下周交接和提交节点；更新风险变更及实际差异；双方确认记录；保存周会议及变更记录。

编号	当周具体任务	任务负责人	前置与交接	产物与完成标准
6.1.1	执行核心系统场景与角色流程	王晨 0.50、刘景浩 2.00	11/30；5.12.3	系统用例记录。按版本、环境及预期逐项判定
6.1.2	执行真实 MySQL 和接口集成	王晨 1.75、刘景浩 1.00	12/01；6.1.1	集成报告及接口证据。记录实际工具、用例、失败与版本
6.2.1	固定环境执行 30 并发负载	王晨 2.00	11/30；5.12.3	JMeter 配置、原始数据与资源趋势。记录读写 P95、错误率和样本基线
6.2.2	分析常规负载并核对阈值	王晨 1.25	12/01；6.2.1	负载结果与缺陷。阈值和结果区分，异常进入台账
6.3.1	执行阶梯压力与边界探测	王晨 1.75	12/02；6.2.2	压力记录。100 并发标为探测，保留边界
6.3.2	执行稳定性与降载恢复	王晨 2.00	12/02；6.3.1	稳定性与降载证据。记录恢复时间和数据核验
6.4.1	验证角色隔离与隐私	王晨 0.50、刘景浩 1.50	12/02；6.1.2	权限及内容安全记录。认证、治理、运维角色边界可核对
6.4.2	验证双端浏览、编辑及图片	刘景浩 2.00	12/02；6.4.1	双端兼容记录。失败和草稿恢复可验证
6.4.3	核对实际使用设备与网络	刘景浩 1.75	12/03；6.4.2	目标设备测试登记。记录版本、设备、证据和局限

编号	当周具体任务	任务负责人	前置与交接	产物与完成标准
6.5.1	验证冷启动与停机运维入口	王晨 1.75、刘景浩 0.50	12/03；6.3.2	部署及停机演练记录。业务停止时独立入口可核查
6.5.2	验证隔离恢复和损坏备份拒绝	王晨 2.00、刘景浩 0.75	12/03；6.5.1	恢复及回退记录。按 RPO/RTO 和保护副本核对
6.6.1	按模块处理已登记缺陷	王晨 1.25、刘景浩 1.50	12/03；6.4.3、6.3.2	缺陷、修订提交与复测计划。每项有复现、修复版本及状态
6.6.2	复测缺陷并执行关键回归	王晨 1.25、刘景浩 1.25	12/04；6.6.1、6.5.2	复测与回归记录。严重缺陷及残留风险明确
6.7.1	组织目标用户走查与反馈登记	王晨 0.50、刘景浩 1.25	12/04；6.6.2、6.4.3	用户走查和确认记录。有角色、环境、实际结果及未确认项
6.7.2	内部验收并封版系统测试报告	王晨 1.50、刘景浩 1.50	12/04；6.7.1	12 月 6 日提交基线。只汇总已取证结果，缺项与影响单列

第 10 周 12/07—12/13

本周目标：测试证据复核、课堂说明与发布准备。

交接与提交：12 月 7–8 日复核，12 月 9 日课堂说明，12 月 13 日提交已有修订。

持续管理 M10：12/07—12/11；0.85 人时；人工预算 38.90 元。负责人王晨，刘景浩提供状态。检查完成证据、阻塞、下周交接和提交节点；更新风险变更及实际差异；双方确认记录；保存周会议及变更记录。

编号	当周具体任务	任务负责人	前置与交接	产物与完成标准
7.1.1	整理安装、用户及管理操作说明；12/09；1.50 人时；人工预算 68.64 元	王晨	6.8.2	形成整理安装、用户及管理操作说明对应产物；按附录 A 核对内容与未决问题。证据：发布包、安装用户管理运维说明
7.1.2	整理运维、恢复与故障维护规程；12/10；1.50 人时；人工预算 68.64 元	王晨	7.1.1	完成整理运维、恢复与故障维护规程；记录交叉复核或双方确认结论。证据：发布包、安装用户管理运维说明
7.2.1	在干净配置核对冷启动；12/11；1.50 人时；人工预算 68.64 元	王晨	7.1.2	形成在干净配置核对冷启动对应产物；按附录 A 核对内容与未决问题。证据：干净环境启动及课堂演示核查记录
7.2.2	核对演示数据、认证与外网失败回退；12/11；1.50 人时；人工预算 68.64 元	王晨	7.2.1	完成核对演示数据、认证与外网失败回退；记录交叉复核或双方确认结论。证据：干净环境启动及课堂演示核查记录
6.8.1	复核报告与证据链	王晨 1.50、刘景浩 0.75	12/07；6.7.2	报告复核记录。区分 12 月 6 日提交稿与复核稿
6.8.2	整理课堂说明和测试修订	王晨 1.25、刘景浩 0.75	12/08；6.8.1	12 月 9 日课堂材料和 12 月 13 日修订准备。确认使用最新证据和修订记录

第 11 周 12/14—12/20

本周目标：维护交接与课堂测试意见处理。

交接与提交：双方完成维护与备份交接；17 日处理测试课堂新意见；开始真实总结和偏差分析。

持续管理 M11：12/14—12/18；0.85 人时；人工预算 38.90 元。负责人王晨，刘景浩提供状态。检查完成证据、阻塞、下周交接和提交节点；更新风险变更及实际差异；双方确认记录；保存周会议及变更记录。

编号	当周具体任务	任务负责人	前置与交接	产物与完成标准
7.3.1	登记维护申请和影响分析；12/14；1.50 人时；人工预算 68.64 元	刘景浩	7.2.2	形成登记维护申请和影响分析对应产物；按附录 A 核对内容与未决问题。证据：维护变更单、回退与回归记录
7.3.2	执行修改回退及回归演练；12/14；1.50 人时；人工预算 68.64 元	刘景浩	7.3.1	完成执行修改回退及回归演练；记录交叉复核或双方确认结论。证据：维护变更单、回退与回归记录
7.4.1	核对备份、配置与维护资料；12/15；1.50 人时；人工预算 68.64 元	王晨	7.3.2	形成核对备份、配置与维护资料对应产物；按附录 A 核对内容与未决问题。证据：交接清单、备份与权限配置记录
7.4.2	双方练习操作并确认交接；12/15；1.50 人时；人工预算 68.64 元	王晨	7.4.1	完成双方练习操作并确认交接；记录交叉复核或双方确认结论。证据：交接清单、备份与权限配置记录
7.5.1	登记 12 月 16 日测试评审意见；12/17；1.50 人时；人工预算 68.64 元	刘景浩	6.8.2	形成登记 12 月 16 日测试评审意见对应产物；按附录 A 核对内容与未决问题。证据：测试评审修订和残留风险记录
7.5.2	修订报告及相关实现用例；12/17；1.50 人时；人工预算 68.64 元	刘景浩	7.5.1	完成修订报告及相关实现用例；记录交叉复核或双方确认结论。证据：测试评审修订和残留风险记录
8.1.1	共同核对计划实际与阶段成果；12/18；1.80 人时；人工预算 82.37 元	王晨、刘景浩	7.4.2,7.5.2	形成共同核对计划实际与阶段成果对应产物；按附录 A 核对内容与未决问题。证据：总结报告、偏差分析和实际贡献证据

第 12 周 12/21—12/27

本周目标：总结材料、交付核查与总评演练。

交接与提交：总结与总评素材相互核对；24 日共同验收演练；27 日 22 时交总结和总评 PPT。

持续管理 M12：12/21—12/25；0.85 人时；人工预算 38.90 元。负责人王晨，刘景浩提供状态。检查完成证据、阻塞、下周交接和提交节点；更新风险变更及实际差异；双方确认记录；保存周会议及变更记录。

编号	当周具体任务	任务负责人	前置与交接	产物与完成标准
8.1.2	共同总结偏差风险和协作贡献；12/21；1.80 人时；人工预算 82.37 元	王晨、刘景浩	8.1.1	完成共同总结偏差风险和协作贡献；记录交叉复核或双方确认结论。证据：总结报告、偏差分析和实际贡献证据
8.2.1	整理总评 PPT 资料和详细周计划；12/22；1.50 人时；人工预算 68.64 元	王晨	8.1.2	形成整理总评 PPT 资料和详细周计划对应产物；按附录 A 核对内容与未决问题。证据：总评素材、完整周计划和引用
8.2.2	核对引用、图表与交付目录；12/23；1.50 人时；人工预算 68.64 元	王晨	8.2.1	完成核对引用、图表与交付目录；记录交叉复核或双方确认结论。证据：总评素材、完整周计划和引用
8.3.1	共同执行交付清单核查；12/24；1.80 人时；人工预算 82.37 元	王晨、刘景浩	8.2.2	形成共同执行交付清单核查对应产物；按附录 A 核对内容与未决问题。证据：交付基线、验收清单及演练记录
8.3.2	共同预演并确认提交版本；12/24；1.80 人时；人工预算 82.37 元	王晨、刘景浩	8.3.1	完成共同预演并确认提交版本；记录交叉复核或双方确认结论。证据：交付基线、验收清单及演练记录

第 13 周 12/28—01/03

本周目标：总评反馈与 1 月 3 日归档基线。

交接与提交：参与 12 月 30 日总评；31 日准备 1 月 3 日提交基线，未完成尾项另列；元旦不排正常任务。

持续管理 M13：12/28—12/31；0.85 人时；人工预算 38.90 元。负责人王晨，刘景浩提供状态。检查完成证据、阻塞、下周交接和提交节点；更新风险变更及实际差异；双方确认记录；保存周会议及变更记录。

编号	当周具体任务	任务负责人	前置与交接	产物与完成标准
8.4.1	处理总评意见并准备提交基线；12/31；1.50 人时；人工预算 68.64 元	王晨	8.3.2	12 月 31 日形成 1 月 3 日待提交基线。证据：总评修订、提交基线及归档尾项记录

第 14 周 01/04—01/06

本周目标：归档尾项核对与课程收尾。

交接与提交：1 月 4 日核对归档尾项；6 日双方确认课程收尾和最终交付。

持续管理 M14：01/04—01/06；0.85 人时；人工预算 38.90 元。负责人王晨，刘景浩提供状态。检查完成证据、阻塞、下周交接和提交节点；更新风险变更及实际差异；双方确认记录；保存周会议及变更记录。

编号	当周具体任务	任务负责人	前置与交接	产物与完成标准
8.4.2	核对提交后尾项与最终归档；01/04；1.50 人时；人工预算 68.64 元	王晨	8.4.1	1 月 4 日核对尾项，以补充记录归档。证据：总评修订、提交基线及归档尾项记录
8.5.1	共同核对课程收尾材料；01/06；1.80 人时；人工预算 82.37 元	王晨、刘景浩	8.4.2	形成共同核对课程收尾材料对应产物；按附录 A 核对内容与未决问题。证据：收尾确认、最终清单与实际成员评价

编号	当周具体任务	任务负责人	前置与交接	产物与完成标准
8.5.2	共同确认交付与后续维护边界；01/06；1.80 人时；人工预算 82.37 元	王晨、刘景浩	8.5.1	完成共同确认交付与后续维护边界；记录交叉复核或双方确认结论。证据：收尾确认、最终清单与实际成员评价

附录 C 计划阶段 16 项评审对照

条目	教师检查要求	材料位置	核查口径
1	项目演示 PPT 与效果	项目介绍第 1、4、5 章；实际汇报 PPT	项目定位、核心功能、计划、可行性和成员工作完整，图表与正文清晰
2	按进度提交全部阶段成果	项目计划第 3、6、7 章；附录 B；交付成果登记	内部形成、邮件提交、课堂反馈分开，实际记录另补
3	可行性报告及关键技术	可行性报告第 7、10 章；条件 C01—C05	方案选择、实施责任、验证产物及变更触发条件清楚
4	计划模板是否合适	国标第 7.2 节 13 章；国标与评审对照	直接采用国标章序和内容，另保留课程 16 项要求；不以企业资料为编制依据。
5	成员任务贯穿全程及甘特图	项目计划第 7、8 章；附录 A、B；甘特图	两人均有开发、文档、验证与评审任务
6	Project 绘制 GANTT 且准确	第 7 章、原生 MPP、阶段与详细甘特图、重开核验	353 条分配、五个 Deadline 与任务链重新核对。资源表保留过载提示。
7	每位组员明确合理分工	项目计划第 8 章；附录 A、B	明确主责、共同工作、交接及复核责任
8	WBS 合理并体现瀑布阶段	项目计划第 5、7 章；WBS 和网络	九步总体设计、详细设计和实施测试分别交付，反馈回到相关设计及用例。

条目	教师检查要求	材料位置	核查口径
9	完成时间估计合理	项目计划第 7、10 章；任务执行跟踪	工期、工作日历、依赖、人时和实际分别说明
10	每项任务指定负责人	项目计划第 8 章；附录 A、B；任务登记	学生负责执行与复核，AI 为工具
11	结合课程进度调整计划	项目计划第 3、6.1、6.14 章；附录 B	课堂与提交日期区分；变更批准后同步基线
12	整体及每项预算合理	项目计划第 10 章；附录 E、F；预算工作簿	人工 12622.90 元，现金采购 0 元，使用末级分配逐项汇总。
13	配置工具与文档版本管理	项目计划第 6.14 章；Git 说明和变更登记	标识、版本、变化控制、配置审计和状态报告
14	负荷与过载说明	项目计划第 8、10、11 章；附录 E	MPP 采用 275.85 人时；每周检查日常容量与集中投入，实际投入记入日志
15	合理及时的项目会议记录	项目计划第 8 章、附录 D；真实会议及周会模板	历史事实保留；后续按上周检查、问题、下周分工填写
16	有效的成员绩效评价	项目计划第 8 章、附录 D、E；成员评分表	按实际成果、整改和协作记录形成阶段评价

附录 D 会议与成员阶段评价

本附录汇总阶段讨论、文档修订及成员评价。10 月 11 日和 17 日记录按历史阶段保留；10 月 31 日需求阶段记录见本附录及本期周会附件。

日期与记录	讨论内容	形成决定
2026 年 10 月 11 日；会议纪要	GitHub 账号、Git 版本控制、AI 生成计划初看与初始职责。	采用 Git/GitHub 协作，设置个人任务分支；初始分工按计划执行，结合教师意见和实际工作调整。
2026 年 10 月 17 日；腾讯会议，本地录制 63 分 14 秒	计划评审整改、国标与本校模板、人时工资预算、测试、SourceTree 与 Logo。	统一报告结构与图表，按任务细分人时和人工预算，选用 SourceTree 及小组 Logo，测试覆盖功能、性能、压力和恢复。
2026 年 10 月 31 日；线上会议，会议号 434440602	本周文档任务、SRS 与评审表、WorkBuddy/GitHub、主对话与执行对话、分支提交。	双方共同评审文档；按课程要求更新计划并准备 SRS 及 PPT；王晨统筹提交，刘景浩协助环境与材料核对。

10 月 17 日周会由王晨组织，王晨与刘景浩共同参加。会议投入按录制时间登记，两人各 1.054 人时、团队 2.108 人时，计入 M02 周会活动。

成员评价采用百分制，下表为 10 月 17 日计划修订与周会阶段评价，由组长于 10 月 18 日评定。后续里程碑评价结合对应阶段的实际成果、质量、进度和协作记录执行。

成员	本阶段实际承担	阶段评分
王晨；组长兼项目负责人	组织计划评审整改讨论，汇总报告与配套材料，借助 GPT 制作计划文档、豆包制作 PPT；统筹人时预算、排期与提交。	91.0 分
刘景浩	参与计划修订和评审问题核对，讨论并试用 Git 图形工具，比较 Logo 方案，对资料、分工、预算及后续安排提出检查反馈。	90.5 分

配套记录：20261011 会议纪要 G04、20261017 周会议纪要与成员评价 G04、20261031 需求阶段周会议纪要与成员评价 G04。10 月 31 日评分为王晨 91.2、刘景浩 91.3；本期工作为文档共同评审和协作环境讨论，计划人时不替代实际投入。

附录 E 模板依据与量化管理

E1 人员工时估算

人员投入按执行任务自下而上估算，分为准备理解、交互实施、验证修复和文档交接四类。[Q3][Q4][Q6] 执行任务作为人时累计层，工作包和阶段汇总下级投入。日常每人每天 30—45 分钟，集中开发及测试按周确认额外投入。

单人时长建议为需求子任务 1.6 小时，设计主作业 2.5 小时、核对 2 小时，普通模块主作业 3.5 小时、核对 2 小时，运维主作业 4 小时、核对 2.5 小时，测试准备 1.2 小时、执行结果核对 1.5 小时、缺陷修复 2.5 小时。周管理王晨 0.6 小时、刘景浩参与进度沟通 0.25 小时，交叉复核每项 0.45 小时。共同任务分别估计个人投入，不将整项工作重复给双方。

5.1 工程基础、5.2 邮箱账号与 5.3 公开检索已有局部实现及验证记录，后续复核适配按子任务 0.8—1.5 人时估计。计入人员实际参与的准备、交互、检查、修复和交接时间；两人同时各投入 1 小时计 2 人时。

详细设计和测试准备按 4.10–4.13 拆分。4.13 的单元与白盒、集成系统用例和交叉复核分别估算。执行中以实际记录核对偏差。

阶段	王晨人时	刘景浩人时	团队人时	人工预算 元
1 项目计划与评审	3.00	3.00	6.00	274.56
2 可行性研究	6.00	4.00	10.00	457.60
3 需求分析	18.20	19.40	37.60	1720.58
4 总体与详细设计	36.25	28.00	64.25	2940.08
5 编码与单元测试	26.55	34.75	61.30	2805.09
6 综合测试	20.75	16.50	37.25	1704.56
7 部署与维护	9.00	6.00	15.00	686.40

阶段	王晨人时	刘景浩人时	团队人时	人工预算 元
8 总结与收尾	11.40	5.40	16.80	768.77
M 持续项目管理与交叉复核	15.15	12.50	27.65	1265.26
合计	146.30	129.55	275.85	12622.90

当前计划合计 275.85 人时，王晨 146.30、刘景浩 129.55 人时，直接人工 12622.90 元。

工时以有人员分配的末级任务累计。工作包和阶段作汇总，零工期课堂节点只登记计划和实际状态。

集中投入按每周工作窗口与责任核对；审查工期可行性时先处理人员冲突，再确定范围与交接调整。

E2 每周负荷与实际记录

日常按每人每天 30–45 分钟。周表以工作日 45 分钟作为容量上限，周末提交由阶段封版保障。

设计、实现和测试高峰需集中投入。按周分别登记计划、额外需求、已确认容量与实际人时。

周表按工作日窗口分摊任务投入，含管理和交叉复核。课程截止不增加日历工时。

人时展示两位小数，汇总使用未舍入分钟。

周	日期	王晨人时	刘景浩人时	每人日常容量	王晨加时	刘景浩加时
1	10/05–10/11	6.10	2.55	1.50	4.60	1.05
2	10/12–10/18	5.55	6.40	3.75	1.80	2.65
3	10/19–10/25	7.25	6.90	3.75	3.50	3.15
4	10/26–11/01	23.15	10.90	3.75	19.40	7.15
5	11/02–11/08	14.85	19.35	3.75	11.10	15.60

周	日期	王晨人时	刘景浩人时	每人日常容量	王晨加时	刘景浩加时
6	11/09–11/15	15.85	20.15	3.75	12.10	16.40
7	11/16–11/22	15.85	14.05	3.75	12.10	10.30
8	11/23–11/29	10.70	15.80	3.75	6.95	12.05
9	11/30–12/06	19.95	16.60	3.75	16.20	12.85
10	12/07–12/13	9.35	3.10	3.75	5.60	0.00
11	12/14–12/20	5.40	7.60	3.75	1.65	3.85
12	12/21–12/27	6.30	3.40	3.75	2.55	0.00
13	12/28–01/03	2.10	0.47	3.00	0.00	0.00
14	01/04–01/06	3.90	2.27	2.25	1.65	0.03

峰值为王晨第 4 周 23.15 人时、刘景浩第 6 周 20.15 人时。第 9 周对应首轮系统测试封版，集中投入由周会核对。

Project 按 202 条人员分配记录 275.85 人时。日常资源上限按 45 分钟 / 8 小时工作日设为 9.375%，两人均出现超载。周末容量单独核查，分配明细按周精确到 0.01 人时，个人与任务汇总一致。集中加时落实前，维持资源超载风险并逐周重排。

跟踪字段为任务编号、成员、日期、实际人时、成果、证据、剩余人时和复核人。偏差率 =（实际人时 - 计划人时）÷计划人时，计划为 0 的项目单列说明。阶段成果以验收记录为依据，投入与成果分别统计。

E3 成员贡献评分

成员评价采用百分制。10 月 17 日计划修订和 10 月 31 日需求阶段均保留组内综合评分；后续可按成果完成 50 分、质量 25 分、进度履约 15 分、协作 10 分细化并保存证据。当前总分与对应会议、实际工作一并登记。[Q4][Q5][Q6]

维度	满分	定量规则	证据
成果完成	50	按当期事先约定的任务权重累计已验收成果。共同任务记录各自具体部分；无证据项不默认完成。	成果清单、文件、提交或验收记录
成果质量	25	按合格检查项 / 适用检查项×25 计算，记录问题及关闭证据；不得用工时或提交数量代替质量。	交叉复核表、缺陷关闭和验收记录
进度履约	15	按按期验收任务权重 / 到期任务总权重×15 计算；批准延期使用调整后的日期。	任务基线、完成时间、变更记录
协作参与	10	本阶段采用出席并参与实际讨论 5 分、参与共同决定 5 分；依据会议记录核对。后续阶段重新约定适用事件。	实际会议及共同决定记录

分项评价根据阶段任务和验收范围确定权重，共同任务分别登记各自承担，记录分项依据、复核意见和总分。

评价阶段	王晨	刘景浩	依据
2026 年 10 月 17 日计划修订与周会	91.0 分	90.5 分	10 月 18 日组长综合评定；实际承担及会议记录见附录 D。
2026 年 10 月 31 日需求阶段文档共同评审	91.2 分	91.3 分	组内提供综合总分；双方参与本期文档评审和协作规范讨论，详见本期周会。

评价记录按阶段区分：10 月 17 日王晨 91.0、刘景浩 90.5；10 月 31 日需求阶段王晨 91.2、刘景浩 91.3。本期总分依据组内提供的综合评价记录，不反推未提供的分项得分。10 月 17 日会议人时继续仅计入对应历史活动。

E4 计划阶段材料核查

教师计划阶段评审共 16 项，逐项材料位置和完成标准见附录 C。提交前按以下四组检查文档、图表、排期与过程记录的一致性。

核查范围	对应条目	检查内容
成果与研究依据	1—4	核对汇报、阶段成果、可行性报告、项目计划及国标结构。

核查范围	对应条目	检查内容
任务与进度	5—11	核对 WBS、任务负责人、人时、课程节点、甘特图、工程网络及原生 MPP。
预算与配置资源	12—14	复算任务及项目预算，核对 Git 版本登记、人员负荷和集中投入安排。
会议与成员评价	15—16	核对会议议题、进度问题、下一周分工、评分和实际成果依据。

E5 引用与估算记录

[Q1] GB/T 8567—2006 计算机软件文档编制规范。第 7.1 节印刷页 14—16、第 7.2 节印刷页 16—23；完整规范及摘页见“国内模板与国标依据”。国家标准公开系统：https://openstd.samr.gov.cn/bzgk/std/newGbInfo?hcno=84C42B6277D2714B7176B10C6E6B1A44 。

[Q2] 软件工程课程团队作业要求及本组周会管理规则。周会记录时间地点、上周进度、问题原因、下周任务与负责人；此表为 G04 课程适配模板，不是 GB/T 8567 统一表单。

[Q3] Microsoft．Learn more about resource units，Project 桌面版资源单位说明。https://support.microsoft.com/en-us/project/learn-more-about-resource-units ，查阅 2026 年 10 月 21 日。

[Q4] 软件工程课程 第 13 章 软件项目管理，97 页。PDF 第 6—8 页规模、第 10—16 页工作量、第 17—43 页进度、第 44—57 页组织。课程资料。

[Q5] 软件工程课程项目计划阶段评审检查表，2 页，16 项，等级分 0—5。课程资料。

[Q6] 本组 Project 任务、WBS 估算及 2026 年 10 月 11 日已确认会议记录；估算与评分为编制建议。

附录 F 人工预算与配套管理文件

人工预算与现金支出分别管理

人工预算统一采用 45.76 元 / 人时的项目核算费率。费率测算输入为年度人工参考参数 95,545 元，按 12 个月、每月 21.75 个计薪日、每日 8 小时折算。该参数用于课程项目直接人工预算。[B1][B3]

小时费率 = 95,545÷12÷21.75÷8 = 45.7590996，预算取 45.76 元 / 人时。日常与集中投入采用同一费率，预算覆盖开发、文档、管理和复核的直接人工，实际支出另行登记。[B3]

成本项目	计划数量	单价及口径	金额 元
王晨人工折算	146.30 人时	45.76 元 / 人时	6694.69
刘景浩人工折算	129.55 人时	45.76 元 / 人时	5928.21
人工折算合计	275.85 人时	完整精度汇总	12622.90
项目总估算成本	人工及新增现金	现金采购 0 元	12622.90

各执行任务人工预算＝计划人时×45.76 元 / 人时，项目合计 12622.90 元。设备与既有工具复用，新增采购预算为 0 元。工作包、阶段及项目按下级明细汇总，实际人时与现金支出另行登记。

人工成本按人时乘以 45.76 元 / 人时计算，采用完整精度汇总，报表展示保留两位小数；实际投入通过工作日志登记。

费率敏感性分析另采用年度人工参数 168,604 元和 173,817 元，分别折合 80.75 元 / 人时、83.25 元 / 人时。计算方法见预算工作簿，任务工作量及排期使用原控制基准。

周会议与独立测试计划

使用《周会议纪要模板 G04》记录时间地点、上一周任务与人时实际、问题原因、处理动作和下一周分工。两人共同任务分别确认职责、投入和交接，集中加时逐周确认。历史 2026 年 10 月 11 日记录单独保留，不以空白模板替代。

系统测试计划与四份测试文档按评审项登记。第 6 组 37.25 人时已计入团队总量。历史、待执行和实际通过分别记录。

附录 G Git 图形界面协作说明

项目版本控制采用 Git，协作托管使用 GitHub，仓库名 HZCU-CampusHub。SourceTree 用于图形化查看差异、暂存、提交、分支、获取、推送与历史记录；协作操作按任务保存提交和复核记录。[B4]

步骤	图形界面操作	完成依据
获取任务	先同步远端，核对当前分支与任务	分支和远端记录
创建任务分支	Branch 中创建，例如 feat/wc-email-auth 或 docs/ljh-test-plan	分支名称与任务对应
检查改动	查看未暂存与已暂存差异，只选择当前任务文件	不包含密码、缓存和无关报告
提交	输入能说明目的的提交信息，创建提交	提交编号与 WBS 或问题号
推送协作	在 SourceTree 推送当前任务分支，在 GitHub 发起 PR	PR 链接、另一人复核意见
审核归档	另一人复核并解决意见，按规则合并	合并记录、交付标签与配置清单

协作流程：任务登记、建立个人任务分支、检查差异、提交推送、交叉复核 PR、合并并标识基线。代码和交付资料分别按既定仓库管理，凭据及本地配置保持忽略，提交前检查暂存清单。

配置管理应同时覆盖标识、版本控制、变更控制、配置审计和状态报告。王晨在周检查中核对需求、程序、数据库迁移、测试与文档版本；刘景浩提供模块清单和差异，双方复核基线一致性。状态报告列新增、已合并、待审和阻塞，不能只列累计提交数作为贡献评分。

本附录引用

[B1] G04 人工成本估算参数表，2026 年 10 月 15 日。年度人工参数 95,545 元用于预算基准，168,604 元和 173,817 元用于费率敏感性比较；计算结果见人时人工预算工作簿。

[B2] 人工费用背景资料登记，2026 年 10 月 15 日。预算计算采用[B1]项目参数及[B3]计薪折算方法。

[B3] 人力资源社会保障部。关于职工全年月平均工作时间和工资折算问题的通知，人社部发〔2025〕2 号。中国政府网，2025 年 1 月 2 日。月计薪 21.75 天、每天 8 小时。https://app.www.gov.cn/govdata/gov/202501/02/523227/article.html 。

[B4] Atlassian．SourceTree 产品介绍与入门文档。https://www.atlassian.com/software/sourcetree；https://support.atlassian.com/sourcetree/kb/commit-push-and-pull-a-repository-on-sourcetree/ 。用于 Git 图形化协作工具选择和操作方法。

附录 H 日志需求与开发工作记录

H1 系统日志功能

日志需求关联 FR-M07、FR-001、FR-003 至 FR-007 及 NFR10 至 NFR11。4.1、4.4 确定字段、权限与保存策略；5.1、5.9—5.11 实现；6.1、6.4、6.5 验证；7.1 交接。当前 275.85 人时已包含相关工作，细化产生的额外投入按变更流程评估。

日志类别	必须记录	查看与保护	负责人及交付	完成标准
运行与异常	时间、级别、模块、版本、请求关联编号、结果或错误码；必要时记录耗时	仅授权维护角色查看；对外错误不暴露堆栈及内部配置	王晨负责业务基础，刘景浩负责运维查看；字段字典与失败样例	一次失败可由关联编号定位原因，界面与日志结果一致
业务与社区审计	操作人标识、时间、动作、对象标识、前后状态、理由、结果、关联编号	社区管理按授权查看；不能用删除文章抹去治理审计	刘景浩负责治理，王晨复核关键状态；审计样例与权限矩阵	声明覆盖的关键动作逐项留痕，状态与实际业务一致
独立运维任务	部署、重启、备份、恢复的任务编号、目标、版本、阶段、发起人及结果	业务服务停机仍可查；不依赖被维护业务库才能查询	刘景浩实现执行记录，王晨验证；成功失败与中断样例	成功状态与实际执行结果一致；失败和中断可追踪
保存与清理	按配置分段、轮转、保留与清理；关键审计按保留规则保护	密码、验证码、令牌、SMTP 授权码及认证证件不入普通日志	双方在设计评审确定参数，交付配置说明与清理记录	验证配置生效、日志空间可控；写入失败有处置结果

H2 日志界面与验收

独立运维网页提供按时间、级别、关联编号或任务编号查询必要日志的入口，分批展示，访问角色与社区管理权限分离。日志内容按文本安全显示，拒绝通过参数读取任意服务器文件；保留天数、分段大小和总量上限在设计评审确定并形成配置清单，不在计划中虚构已经批准的数值。

TC-LOG01—05 分别检查脱敏定位、角色与停机查询、治理审计、任务执行结果、轮转清理及写入失败处理。各项保存步骤、输入、预期、实际和脱敏证据；按对应工作包执行并记录结果。

H3 开发工作日志

两人按实际投入填写“模板与量化/开发工作日志 G04.csv”，记录日期、WBS、成员、当日目标、成果证据、实际人时、问题处理、下一步及复核状态。实际人时按工作日志记录；周会从日志核对前一周进度、问题原因和下一周分工。日志与 SourceTree 提交、问题单和验收记录互相引用，不用提交数量替代成员贡献。

附录 I 可行性八步骤与需求分析任务安排

本附录把方法步骤细化成可分配、可交接、可核对的任务。日历窗口沿用原工作包计划，实际完成日期和投入根据工作日志、用户任务记录和阶段验收填写。上层任务汇总下层人时，不重复累计。

I1 八步骤负责人和计划窗口

FS01—FS08 对应可行性研究的八个方法步骤，44 项分析任务作为末级活动进入原工作包。每个细项均给出负责人、计划人时、输入、产物与完成标准，汇总只计末级活动。

步骤与 WBS	负责人	计划日期	计划人时	交付成果
FS01 复查系统规模和目标 2.1.1.1	王晨	10/08—10/08	1.00	输出：用户—权限表、范围清单、目标与约束。完成标准：每项目标能找到需求和验收场景，范围外功能明确列出。
FS02 研究目前正在使用的系统 2.1.1.2	王晨	10/08—10/08	1.25	输出：现状流程和问题—改进对应表。完成标准：每个改进点有具体信息断点，已有渠道中可复用的能力得到保留。
FS03 导出新系统的高层逻辑模型 2.1.2.1	王晨	10/09—10/09	1.25	输出：推导图、系统流程图、上下文 DFD、处理/存储表和字典。完成标准：物理载体图与逻辑数据流图用途分明，编号与需求模型一致。
FS04 进一步定义问题 2.1.2.2	王晨	10/12—10/12	1.00	输出：修订后的问题陈述、范围和追踪链。完成标准：目标能够通过结果判断；未把实现方式写成用户问题。
FS05 导出和评价供选择的解法 2.2.1.1	刘景浩	10/12—10/12	1.25	输出：候选方案表、优缺点、量化评分和成本区间。完成标准：至少两个可比较方案；推荐理由能追溯到共同标准。
FS06 推荐行动方针 2.2.2.1	刘景浩	10/13—10/13	1.25	输出：推荐结论、条件、备选和变更入口。完成标准：说明为何继续、选什么、在何种情况下调整。

步骤与 WBS	负责人	计划日期	计划人时	交付成果
FS07 草拟开发计划书 2.3.1.1	王晨、刘景浩	10/14—10/14	1.50	输出：正式项目计划、WBS、周安排、甘特、网络、预算和测试安排。完成标准：同一任务在各文件中的责任、日期和人时一致。
FS08 写文档提交审查 2.3.2.1	王晨、刘景浩	10/15—10/15	1.50	输出：可阅读、可追踪、可审查的资料包。完成标准：图表可辨认、页码可定位、关键结论有依据，实际审查决定另行留痕。

FS04 进一步定义问题与 FS05 方案比较在 10 月 12 日并行迭代，FS06 汇总两者结果。范围、技术条件或方案结论发生变化时，返回相应步骤修订。

FS01 复查系统规模和目标　2.1.1.1

WBS	具体任务	任务负责人	日期与投入	产物及完成标准
2.1.1.1.1	FS01.1 明确使用者	王晨	10/08 0.20 人时 9.15 元	主要读者是已明确目标岗位、准备投递和面试的校内学生；分享者是认证用户，重点邀请有实习或工作经历者。；输出：用户—权限表、范围清单、目标与约束。完成标准：每项目标能找到需求和验收场景，范围外功能明确列出。
2.1.1.1.2	FS01.2 限定业务边界	王晨	10/08 0.20 人时 9.15 元	本期提供经验文章、评论、非现金认可、自愿站外联系、社区治理和独立运维；不建立咨询订单、现金交易和站内即时通信。；输出：用户—权限表、范围清单、目标与约束。完成标准：每项目标能找到需求和验收场景，范围外功能明确列出。
2.1.1.1.3	FS01.3 划分访问权限	王晨	10/08 0.20 人时 9.15 元	未登录和未认证者阅读公开文章；作者主页、评论、联系方式与互动要求校园认证；社区管理与运维权限分别授予。；输出：用户—权限表、范围清单、目标与约束。完成标准：每项目标能找到需求和验收场景，范围外功能明确列出。

WBS	具体任务	任务负责人	日期与投入	产物及完成标准
2.1.1.1.4	FS01.4 把目标写成检查项	王晨	10/08 0.20 人时 9.15 元	按岗位检索，并组合公司、经历专业筛选；同一账号跨端使用；重复投币请求不重复记账；管理人员能定位举报对象。；输出：用户—权限表、范围清单、目标与约束。完成标准：每项目标能找到需求和验收场景，范围外功能明确列出。
2.1.1.1.5	FS01.5 核对规模和约束	王晨	10/08 0.20 人时 9.15 元	按 52 项功能标识管理，其中 50 项本期、2 项未来；12 项非功能要求。两名成员，课堂本机演示，275.85 人时控制额。；输出：用户—权限表、范围清单、目标与约束。完成标准：每项目标能找到需求和验收场景，范围外功能明确列出。

FS02 研究目前正在使用的系统　2.1.1.2

WBS	具体任务	任务负责人	日期与投入	产物及完成标准
2.1.1.2.1	FS02.1 列出当前渠道	王晨	10/08 0.25 人时 11.44 元	招聘网站提供职位与公司入口；内容平台提供经验；群聊和个人联系用于补充；文档、收藏及网盘保存资料。；输出：现状流程和问题—改进对应表。完成标准：每个改进点有具体信息断点，已有渠道中可复用的能力得到保留。
2.1.1.2.2	FS02.2 保留已有有效能力	王晨	10/08 0.25 人时 11.44 元	保留招聘网站查岗位和外部资料链接；平台不重复建设企业招聘系统、网盘和社交通信服务。；输出：现状流程和问题—改进对应表。完成标准：每个改进点有具体信息断点，已有渠道中可复用的能力得到保留。

WBS	具体任务	任务负责人	日期与投入	产物及完成标准
2.1.1.2.3	FS02.3 还原当前处理步骤	王晨	10/08 0.25 人时 11.44 元	先看岗位要求，再检索经验、人工判断适用性、分别收藏，剩余问题另找人询问。下图展示数据经过哪些载体。；输出：现状流程和问题—改进对应表。完成标准：每个改进点有具体信息断点，已有渠道中可复用的能力得到保留。
2.1.1.2.4	FS02.4 定位信息断点	王晨	10/08 0.25 人时 11.44 元	经历起点难比较；同专业和同岗位信息分散；评论答复难持续复用；公开联系意愿不清楚。；输出：现状流程和问题—改进对应表。完成标准：每个改进点有具体信息断点，已有渠道中可复用的能力得到保留。
2.1.1.2.5	FS02.5 把不足变成改进输入	王晨	10/08 0.25 人时 11.44 元	增加经历背景、岗位与专业筛选、稳定文章链接及评论上下文；联系由作者开关控制。后续走查核对实际使用效果。；输出：现状流程和问题—改进对应表。完成标准：每个改进点有具体信息断点，已有渠道中可复用的能力得到保留。

FS03 导出新系统的高层逻辑模型　2.1.2.1

WBS	具体任务	任务负责人	日期与投入	产物及完成标准
2.1.2.1.1	FS03.1 抽去现状工具名称	王晨	10/09 0.25 人时 11.44 元	将“网站、群聊、网盘”等物理载体抽象为信息检索、适用性比较、经验保存和问题补充。；输出：推导图、系统流程图、上下文 DFD、处理/存储表和字典。完成标准：物理载体图与逻辑数据流图用途分明，编号与需求模型一致。

WBS	具体任务	任务负责人	日期与投入	产物及完成标准
2.1.2.1.2	FS03.2 定义系统边界	王晨	10/09 0.20 人时 9.15 元	外部实体 E1 用户、E2 社区管理员、E3 运维管理员、E4 邮件服务、E5 受控运行环境；系统为 P0。；输出：推导图、系统流程图、上下文 DFD、处理/存储表和字典。完成标准：物理载体图与逻辑数据流图用途分明，编号与需求模型一致。
2.1.2.1.3	FS03.3 明确输入与输出	王晨	10/09 0.20 人时 9.15 元	以 F01—F10 记录用户、治理、运维、邮件和执行请求及结果，逐一给出方向、名称及数据组成。；输出：推导图、系统流程图、上下文 DFD、处理/存储表和字典。完成标准：物理载体图与逻辑数据流图用途分明，编号与需求模型一致。
2.1.2.1.4	FS03.4 分解主要逻辑处理	王晨	10/09 0.20 人时 9.15 元	P1 身份与权限、P2 经验内容、P3 交流与激励、P4 社区治理、P5 独立运维；分别关联 D1—D6 逻辑存储。；输出：推导图、系统流程图、上下文 DFD、处理/存储表和字典。完成标准：物理载体图与逻辑数据流图用途分明，编号与需求模型一致。
2.1.2.1.5	FS03.5 建立字典并检查平衡	王晨	10/09 0.20 人时 9.15 元	父层外部输入输出在下层分配，名称与结构可追踪；原子字段、组合结构和语义约束分别定义。；输出：推导图、系统流程图、上下文 DFD、处理/存储表和字典。完成标准：物理载体图与逻辑数据流图用途分明，编号与需求模型一致。
2.1.2.1.6	FS03.6 推导目标物理实现	王晨	10/09 0.20 人时 9.15 元	在逻辑模型稳定后选择微信原生小程序与独立 Vue 网页、共享 Java 服务、MySQL、文件和独立运维执行器。系统流程图与 DFD 分开绘制。；输出：推导图、系统流程图、上下文 DFD、处理/存储表和字典。完成标准：物理载体图与逻辑数据流图用途分明，编号与需求模型一致。

FS04 进一步定义问题 2.1.2.2

WBS	具体任务	任务负责人	日期与投入	产物及完成标准
2.1.2.2.1	FS04.1 重写核心问题	王晨	10/12 0.20 人时 9.15 元	准备投递和面试的学生难以快速找到与目标岗位、专业和基础相近的亲历经验，并继续围绕内容交流。；输出：修订后的问题陈述、范围和追踪链。完成标准：目标能够通过结果判断；未把实现方式写成用户问题。
2.1.2.2.2	FS04.2 拆开问题与解决手段	王晨	10/12 0.20 人时 9.15 元	问题是经验适用性、可检索和可复用性；“小程序”“投币”是候选手段，不能直接代替问题描述。；输出：修订后的问题陈述、范围和追踪链。完成标准：目标能够通过结果判断；未把实现方式写成用户问题。
2.1.2.2.3	FS04.3 收紧本期范围	王晨	10/12 0.20 人时 9.15 元	招聘投递、咨询担保、付费阅读、考研考公、校园跑腿不纳入；毕业材料认证和微信绑定转后续需求。；输出：修订后的问题陈述、范围和追踪链。完成标准：目标能够通过结果判断；未把实现方式写成用户问题。
2.1.2.2.4	FS04.4 补充反例和限制	王晨	10/12 0.20 人时 9.15 元	同专业筛选依据作者分享经历对应的专业；公开邮箱不出现；作者关闭联系入口后不再提供联系方式。；输出：修订后的问题陈述、范围和追踪链。完成标准：目标能够通过结果判断；未把实现方式写成用户问题。
2.1.2.2.5	FS04.5 形成反馈和关闭方式	王晨	10/12 0.20 人时 9.15 元	范围、权限或用户目标有冲突时回到FS01—FS03；变更进入需求参数与决定表，经双方评审后更新基准。；输出：修订后的问题陈述、范围和追踪链。完成标准：目标能够通过结果判断；未把实现方式写成用户问题。

FS05 导出和评价供选择的解法　2.2.1.1

WBS	具体任务	任务负责人	日期与投入	产物及完成标准
2.2.1.1.1	FS05.1 形成六类解法	刘景浩	10/12 0.25 人时 11.44 元	A 微信原生小程序＋独立 Vue 网页；B 原生微信小程序＋独立网页；C 响应式网页；D 跨平台 App＋网页；E 原生双移动端＋网页；F 现有工具组合。；输出：候选方案表、优缺点、量化评分和成本区间。完成标准：至少两个可比较方案；推荐理由能追溯到共同标准。
2.2.1.1.2	FS05.2 使用同一评价基准	刘景浩	10/12 0.20 人时 9.15 元	按需求覆盖 25%、接触便利 20%、团队能力 20%、周期成本 20%、维护扩展 15%比较，不为某一解法单独改变范围。；输出：候选方案表、优缺点、量化评分和成本区间。完成标准：至少两个可比较方案；推荐理由能追溯到共同标准。
2.2.1.1.3	FS05.3 逐项比较小程序与 App	刘景浩	10/12 0.20 人时 9.15 元	比较进入方式、移动创作、审核发布、设备能力、维护量和双端复用；网页补充桌面长文创作。；输出：候选方案表、优缺点、量化评分和成本区间。完成标准：至少两个可比较方案；推荐理由能追溯到共同标准。
2.2.1.1.4	FS05.4 评估成员与工具能力	刘景浩	10/12 0.20 人时 9.15 元	两人协作；WorkBuddy 承担前端辅助，Codex/GPT 辅助后端；学生负责需求、复核、测试及交付，AI 生成不等于完成。；输出：候选方案表、优缺点、量化评分和成本区间。完成标准：至少两个可比较方案；推荐理由能追溯到共同标准。

WBS	具体任务	任务负责人	日期与投入	产物及完成标准
2.2.1.1.5	FS05.5 换算工作量和人工成本	刘景浩	10/12 0.20 人时 9.15 元	A 按 275.85 人时、45.76 元/人时测算 12622.90 元；其他解法采用相同单价按工作量增减比较，详见第 4 章。；输出：候选方案表、优缺点、量化评分和成本区间。完成标准：至少两个可比较方案；推荐理由能追溯到共同标准。
2.2.1.1.6	FS05.6 计算并解释评分	刘景浩	10/12 0.20 人时 9.15 元	A89、B78、C84、D66、E47、F72 分。评分是本项目约束下的方案判断，附录 D 列出权重、原始分和理由。；输出：候选方案表、优缺点、量化评分和成本区间。完成标准：至少两个可比较方案；推荐理由能追溯到共同标准。

FS06 推荐行动方针　2.2.2.1

WBS	具体任务	任务负责人	日期与投入	产物及完成标准
2.2.2.1.1	FS06.1 明确继续与否	刘景浩	10/13 0.25 人时 11.44 元	建议按限定范围继续推进需求和设计，以微信原生小程序＋独立 Vue 网页共享 Java 后端为推荐方案。；输出：推荐结论、条件、备选和变更入口。完成标准：说明为何继续、选什么、在何种情况下调整。
2.2.2.1.2	FS06.2 给出推荐理由	刘景浩	10/13 0.25 人时 11.44 元	移动入口适合随时阅读和基础创作；网页适合 Markdown 长文；共享身份、内容和治理规则，减少重复实现。；输出：推荐结论、条件、备选和变更入口。完成标准：说明为何继续、选什么、在何种情况下调整。

WBS	具体任务	任务负责人	日期与投入	产物及完成标准
2.2.2.1.3	FS06.3 说明备选方针	刘景浩	10/13 0.25 人时 11.44 元	若发布或双端投入显著超出控制额，保留响应式网页作为缩减方案；须经变更确认，不能直接替换交付范围。；输出：推荐结论、条件、备选和变更入口。完成标准：说明为何继续、选什么、在何种情况下调整。
2.2.2.1.4	FS06.4 定义继续条件	刘景浩	10/13 0.25 人时 11.44 元	需求模型与验收可追踪、跨端编辑不破坏正文、权限拒绝有效、投币一致性及受控恢复有可执行验证方案。；输出：推荐结论、条件、备选和变更入口。完成标准：说明为何继续、选什么、在何种情况下调整。
2.2.2.1.5	FS06.5 定义调整触发点	刘景浩	10/13 0.25 人时 11.44 元	真实用户走查出现关键任务失败、邮箱链路不可用、核心资源超负荷、测试发现阻断风险时，组织评审并修订计划。；输出：推荐结论、条件、备选和变更入口。完成标准：说明为何继续、选什么、在何种情况下调整。

FS07 草拟开发计划书 2.3.1.1

WBS	具体任务	任务负责人	日期与投入	产物及完成标准
2.3.1.1.1	FS07.1 分解交付工作	王晨、刘景浩	10/14 0.25 人时 11.44 元	以 8 个工程工作域、59 个工作包管理；工作包继续分到具体任务、负责人、起止日期、前置与完成标准。；输出：正式项目计划、WBS、周安排、甘特、网络、预算和测试安排。完成标准：同一任务在各文件中的责任、日期和人时一致。

WBS	具体任务	任务负责人	日期与投入	产物及完成标准
2.3.1.1.2	FS07.2 估算人时与人员分配	王晨、刘景浩	10/14 0.25 人时 11.44 元	项目 275.85 人时：王晨 146.30、刘景浩 129.55；开发、文档、管理和交叉复核均计入，不只计算编程。；输出：正式项目计划、WBS、周安排、甘特、网络、预算和测试安排。完成标准：同一任务在各文件中的责任、日期和人时一致。
2.3.1.1.3	FS07.3 建立依赖与排期	王晨、刘景浩	10/14 0.25 人时 11.44 元	使用原生 Project 维护依赖、阶段甘特和工程网络；总日历 64 个工作日，2027 年 1 月 6 日收尾。；输出：正式项目计划、WBS、周安排、甘特、网络、预算和测试安排。完成标准：同一任务在各文件中的责任、日期和人时一致。
2.3.1.1.4	FS07.4 核算成本与资源	王晨、刘景浩	10/14 0.25 人时 11.44 元	人工估算按 45.76 元/人时，总 12622.90 元；复用现有设备，不另列 AI 订阅。资源、风险和管理预留按计划管理。；输出：正式项目计划、WBS、周安排、甘特、网络、预算和测试安排。完成标准：同一任务在各文件中的责任、日期和人时一致。
2.3.1.1.5	FS07.5 细排下一需求阶段	王晨、刘景浩	10/14 0.25 人时 11.44 元	3.6 在 10/28—29 完成范围与三模型；3.7 在 10/30 完成字典及辅助图；3.8 在 11/2 走查；3.9 在 11/3 闭环材料。合计 20 人时。；输出：正式项目计划、WBS、周安排、甘特、网络、预算和测试安排。完成标准：同一任务在各文件中的责任、日期和人时一致。

WBS	具体任务	任务负责人	日期与投入	产物及完成标准
2.3.1.1.6	FS07.6 安排监督与调整	王晨、刘景浩	10/14 0.25 人时 11.44 元	组长周检查进度、风险和变更；双方评审交接、分支合并与测试证据；课堂意见在后续工作包处理。；输出：正式项目计划、WBS、周安排、甘特、网络、预算和测试安排。完成标准：同一任务在各文件中的责任、日期和人时一致。

FS08 写文档提交审查　2.3.2.1

WBS	具体任务	任务负责人	日期与投入	产物及完成标准
2.3.2.1.1	FS08.1 组织完整报告	王晨、刘景浩	10/15 0.25 人时 11.44 元	保留 GB/T 8567—2006 可行性研究报告的正文结构，在第 3.5 节逐步展示八步；项目计划列在材料包前。；输出：可阅读、可追踪、可审查的资料包。完成标准：图表可辨认、页码可定位、关键结论有依据，实际审查决定另行留痕。
2.3.2.1.2	FS08.2 标记版本及输入	王晨、刘景浩	10/15 0.25 人时 11.44 元	报告 V1.4、G04-FAR-20261028-02；引用 70 页需求课件、58 页可行性课件、评审表及现行计划和 SRS。；输出：可阅读、可追踪、可审查的资料包。完成标准：图表可辨认、页码可定位、关键结论有依据，实际审查决定另行留痕。
2.3.2.1.3	FS08.3 核对图文一致	王晨、刘景浩	10/15 0.25 人时 11.44 元	检查 P1—P5、D1—D6、F01—F10、需求编号、当前预算及版本；三模型、字典和案例同用一套数据规则。；输出：可阅读、可追踪、可审查的资料包。完成标准：图表可辨认、页码可定位、关键结论有依据，实际审查决定另行留痕。

WBS	具体任务	任务负责人	日期与投入	产物及完成标准
2.3.2.1.4	FS08.4 编制审查索引	王晨、刘景浩	10/15 0.25 人时 11.44 元	八步成果导航给出正文页码；课件主题给出图号；计划 16 项与需求 11 项评审分别列位置与材料。；输出：可阅读、可追踪、可审查的资料包。完成标准：图表可辨认、页码可定位、关键结论有依据，实际审查决定另行留痕。
2.3.2.1.5	FS08.5 区分记录与待办	王晨、刘景浩	10/15 0.25 人时 11.44 元	历史会议和评分保留原日期；当前代表用户走查、需求周会和签认由实际参与者完成后填写。；输出：可阅读、可追踪、可审查的资料包。完成标准：图表可辨认、页码可定位、关键结论有依据，实际审查决定另行留痕。
2.3.2.1.6	FS08.6 接收决定并闭环	王晨、刘景浩	10/15 0.25 人时 11.44 元	评审意见进入问题单，注明负责人、修改文件、关闭证据和确认日期；影响范围、人时或日期时提交变更并同步计划。；输出：可阅读、可追踪、可审查的资料包。完成标准：图表可辨认、页码可定位、关键结论有依据，实际审查决定另行留痕。

I2 需求分析课件主题与工作分解

课件主题	对应 WBS 细项	任务负责人	人时	计划窗口
RA01 综合要求与用户边界	3.1.1.1；3.1.2.2；3.2.1.1；3.2.1.2；3.2.2.1；3.2.2.2；3.6.1.1	王晨；王晨、刘景浩	5.70	10/16—10/28
RA02 获取需求与用例	3.1.1.2；3.1.2.1；3.6.1.2	王晨、刘景浩	3.00	10/16—10/28
RA03 界面原型与用户确认	3.3.1.1；3.3.1.2；3.3.2.1；3.3.2.2；3.8.1.1；3.8.1.2；3.8.2.1；3.8.2.2	刘景浩；王晨、刘景浩	7.20	10/20—11/02
RA04 数据模型 ER	3.6.2.1	王晨、刘景浩	1.00	10/29—10/29
RA05 功能模型 DFD	3.6.2.2；3.6.2.3	王晨、刘景浩	2.00	10/29—10/29
RA06 数据字典与正则	3.7.1.1；3.7.1.3	王晨、刘景浩	1.50	10/30—10/30
RA07 数据规范化	3.7.1.2	王晨、刘景浩	1.00	10/30—10/30
RA08 行为模型 STD	3.7.2.1	王晨、刘景浩	1.00	10/30—10/30
RA09 辅助分析图	3.7.2.2；3.7.2.3；3.7.2.4	王晨、刘景浩	1.50	10/30—10/30
RA10 验证追踪与需求评审	3.2.2.3；3.4.1.1；3.4.1.2；3.4.2.1；3.4.2.2；3.5.1.1；3.5.1.2；3.5.2.1；3.5.2.2；3.6.1.3；3.9.1.1；3.9.1.2；3.9.1.3；3.9.2.1；3.9.2.2；3.9.2.3	刘景浩；王晨；王晨、刘景浩	13.70	10/21—11/04

需求分析 44 项执行任务合计 37.60 人时。ER、DFD、STD 分别作为数据、功能、行为模型；数据字典、正则与语义约束、规范化及辅助图均有独立任务；原型走查、问题修改与确认分别保存实际记录。

3.1.1 共同核对读者作者与管理场景

WBS	具体任务	任务负责人	日期与投入	产物及完成标准
3.1.1.1	RA01 确认用户类别与需求代表	王晨、刘景浩	10/16 1.00 人时 45.76 元	确认用户类别与需求代表的文档、图表或记录；游客、未认证、认证、社区和运维角色分开；普通账号不能访问管理数据
3.1.1.2	RA02 整理需求来源与情景	王晨、刘景浩	10/16 1.00 人时 45.76 元	整理需求来源与情景的文档、图表或记录；游客、未认证、认证、社区和运维角色分开；普通账号不能访问管理数据

3.1.2 确认权限矩阵与核心用例

WBS	具体任务	任务负责人	日期与投入	产物及完成标准
3.1.2.1	RA02 描述用例主流程与异常	王晨、刘景浩	10/19 1.00 人时 45.76 元	描述用例主流程与异常的文档、图表或记录；游客、未认证、认证、社区和运维角色分开；普通账号不能访问管理数据
3.1.2.2	RA01 核对角色权限和边界	王晨、刘景浩	10/19 1.00 人时 45.76 元	核对角色权限和边界的文档、图表或记录；游客、未认证、认证、社区和运维角色分开；普通账号不能访问管理数据

3.2.1 细化文章交流、激励与治理规则

WBS	具体任务	任务负责人	日期与投入	产物及完成标准
3.2.1.1	RA01 拆分功能需求与本期范围	王晨	10/20 0.80 人时 36.61 元	拆分功能需求与本期范围的文档、图表或记录；REQ 编号关联用例；认证资料、隐私、状态、冲突、币账本与恢复边界可验收
3.2.1.2	RA01 明确互动激励与治理规则	王晨	10/20 0.80 人时 36.61 元	明确互动激励与治理规则的文档、图表或记录；REQ 编号关联用例；认证资料、隐私、状态、冲突、币账本与恢复边界可验收

3.2.2 定义数据、异常与非功能验收

WBS	具体任务	任务负责人	日期与投入	产物及完成标准
3.2.2.1	RA01 定义数据和接口约束	王晨	10/21 0.50 人时 22.88 元	定义数据和接口约束的文档、图表或记录；REQ 编号关联用例；认证资料、隐私、状态、冲突、币账本与恢复边界可验收
3.2.2.2	RA01 量化性能可靠性与安全指标	王晨	10/21 0.60 人时 27.46 元	量化性能可靠性与安全指标的文档、图表或记录；REQ 编号关联用例；认证资料、隐私、状态、冲突、币账本与恢复边界可验收
3.2.2.3	RA10 定义异常和验收场景	王晨	10/21 0.50 人时 22.88 元	定义异常和验收场景的文档、图表或记录；REQ 编号关联用例；认证资料、隐私、状态、冲突、币账本与恢复边界可验收

3.3.1 绘制双端阅读创作原型

WBS	具体任务	任务负责人	日期与投入	产物及完成标准
3.3.1.1	RA03 整理小程序阅读与作者界面	刘景浩	10/20 0.80 人时 36.61 元	整理小程序阅读与作者界面的文档、图表或记录；原型覆盖空结果、加载失败、认证提示、草稿保存和运维任务失败
3.3.1.2	RA03 整理网页创作与阅读线框	刘景浩	10/20 0.80 人时 36.61 元	整理网页创作与阅读线框的文档、图表或记录；原型覆盖空结果、加载失败、认证提示、草稿保存和运维任务失败

3.3.2 核对社区和运维管理流程

WBS	具体任务	任务负责人	日期与投入	产物及完成标准
3.3.2.1	RA03 核对社区案件与关联定位	刘景浩	10/21 0.80 人时 36.61 元	核对社区案件与关联定位的文档、图表或记录；原型覆盖空结果、加载失败、认证提示、草稿保存和运维任务失败

WBS	具体任务	任务负责人	日期与投入	产物及完成标准
3.3.2.2	RA03 核对独立运维与执行确认	刘景浩	10/21 0.80 人时 36.61 元	核对独立运维与执行确认的文档、图表或记录；原型覆盖空结果、加载失败、认证提示、草稿保存和运维任务失败

3.4.1 共同汇总 SRS 与需求追踪

WBS	具体任务	任务负责人	日期与投入	产物及完成标准
3.4.1.1	RA10 汇总功能非功能与 SRS	王晨、刘景浩	10/22 1.00 人时 45.76 元	汇总功能非功能与 SRS 的文档、图表或记录；补齐 FS01—FS07 可行性输入及 SRS 追踪；两图符号、数据字典结构式与正则、方案及能力理由和成本效益可解释；各问题有需求或验证归属。
3.4.1.2	RA10 关联追踪编号与输入版本	王晨、刘景浩	10/22 1.00 人时 45.76 元	关联追踪编号与输入版本的文档、图表或记录；补齐 FS01—FS07 可行性输入及 SRS 追踪；两图符号、数据字典结构式与正则、方案及能力理由和成本效益可解释；各问题有需求或验证归属。

3.4.2 内部复核并准备需求汇报

WBS	具体任务	任务负责人	日期与投入	产物及完成标准
3.4.2.1	RA10 组织内部需求评审	王晨、刘景浩	10/23 1.00 人时 45.76 元	组织内部需求评审的文档、图表或记录；FS08 文档审查 0.50 人时纳入本任务，其余 1.50 人时用于需求 PPT 和提交；按 11 项登记实际证据和未关闭项，双方确认。
3.4.2.2	RA10 核对汇报与提交清单	王晨、刘景浩	10/23 1.00 人时 45.76 元	核对汇报与提交清单的文档、图表或记录；FS08 文档审查 0.50 人时纳入本任务，其余 1.50 人时用于需求 PPT 和提交；按 11 项登记实际证据和未关闭项，双方确认。

3.5.1 记录需求复审意见

WBS	具体任务	任务负责人	日期与投入	产物及完成标准
3.5.1.1	RA10 登记课堂评审问题	刘景浩	11/04 0.80 人时 36.61 元	登记课堂评审问题的文档、图表或记录；11 月 4 日新意见在课后完成登记与修订；变更有责任人和复核结论
3.5.1.2	RA10 分析范围接口和排期影响	刘景浩	11/04 0.80 人时 36.61 元	分析范围接口和排期影响的文档、图表或记录；11 月 4 日新意见在课后完成登记与修订；变更有责任人和复核结论

3.5.2 修订需求并同步设计影响

WBS	具体任务	任务负责人	日期与投入	产物及完成标准
3.5.2.1	RA10 修订需求与未关闭问题	刘景浩	11/04 0.80 人时 36.61 元	修订需求与未关闭问题的文档、图表或记录；11 月 4 日新意见在课后完成登记与修订；变更有责任人和复核结论
3.5.2.2	RA10 向设计交接确认结果	刘景浩	11/04 0.80 人时 36.61 元	向设计交接确认结果的文档、图表或记录；11 月 4 日新意见在课后完成登记与修订；变更有责任人和复核结论

3.6.1 核对课件评审表、用户及范围

WBS	具体任务	任务负责人	日期与投入	产物及完成标准
3.6.1.1	RA01 核对综合要求与未来范围	王晨、刘景浩	10/28 1.00 人时 45.76 元	核对综合要求与未来范围的文档、图表或记录；ER 有实体属性和基数；DFD 上下文、一级与关键二级对应，范围与权限一致
3.6.1.2	RA02 核对代表来源及获取方法	王晨、刘景浩	10/28 1.00 人时 45.76 元	核对代表来源及获取方法的文档、图表或记录；ER 有实体属性和基数；DFD 上下文、一级与关键二级对应，范围与权限一致

WBS	具体任务	任务负责人	日期与投入	产物及完成标准
3.6.1.3	RA10 建立课件与评审覆盖索引	王晨、刘景浩	10/28 1.00 人时 45.76 元	建立课件与评审覆盖索引的文档、图表或记录；ER 有实体属性和基数；DFD 上下文、一级与关键二级对应，范围与权限一致

3.6.2 建立 ER 与分层 DFD 并交叉核对

WBS	具体任务	任务负责人	日期与投入	产物及完成标准
3.6.2.1	RA04 建立 ER 实体属性与基数	王晨、刘景浩	10/29 1.00 人时 45.76 元	建立 ER 实体属性与基数的文档、图表或记录；ER 有实体属性和基数；DFD 上下文、一级与关键二级对应，范围与权限一致
3.6.2.2	RA05 建立上下文一级和关键二级 DFD	王晨、刘景浩	10/29 1.25 人时 57.20 元	建立上下文一级和关键二级 DFD 的文档、图表或记录；ER 有实体属性和基数；DFD 上下文、一级与关键二级对应，范围与权限一致
3.6.2.3	RA05 核对父子流平衡与边界	王晨、刘景浩	10/29 0.75 人时 34.32 元	核对父子流平衡与边界的文档、图表或记录；ER 有实体属性和基数；DFD 上下文、一级与关键二级对应，范围与权限一致

3.7.1 细化数据字典正则及规范化

WBS	具体任务	任务负责人	日期与投入	产物及完成标准
3.7.1.1	RA06 定义字典结构正则与语义	王晨、刘景浩	10/30 1.00 人时 45.76 元	定义字典结构正则与语义的文档、图表或记录；字段约束完整；1NF 至 3NF 有实例；状态、层次、Warnier 和 IPO 可解释
3.7.1.2	RA07 分析函数依赖及 1NF 至 3NF	王晨、刘景浩	10/30 1.00 人时 45.76 元	分析函数依赖及 1NF 至 3NF 的文档、图表或记录；字段约束完整；1NF 至 3NF 有实例；状态、层次、Warnier 和 IPO 可解释
3.7.1.3	RA06 核对处理逻辑与反例约束	王晨、刘景浩	10/30 0.50 人时 22.88 元	核对处理逻辑与反例约束的文档、图表或记录；字段约束完整；1NF 至 3NF 有实例；状态、层次、Warnier 和 IPO 可解释

3.7.2 核对状态转换及辅助图形

WBS	具体任务	任务负责人	日期与投入	产物及完成标准
3.7.2.1	RA08 绘制 STD 与状态转换表	王晨、刘景浩	10/30 1.00 人时 45.76 元	绘制 STD 与状态转换表的文档、图表或记录；字段约束完整；1NF 至 3NF 有实例；状态、层次、Warnier 和 IPO 可解释
3.7.2.2	RA09 绘制层次方框图	王晨、刘景浩	10/30 0.50 人时 22.88 元	绘制层次方框图的文档、图表或记录；字段约束完整；1NF 至 3NF 有实例；状态、层次、Warnier 和 IPO 可解释
3.7.2.3	RA09 绘制 Warnier 图	王晨、刘景浩	10/30 0.50 人时 22.88 元	绘制 Warnier 图的文档、图表或记录；字段约束完整；1NF 至 3NF 有实例；状态、层次、Warnier 和 IPO 可解释
3.7.2.4	RA09 编制 IPO 与改进 IPO	王晨、刘景浩	10/30 0.50 人时 22.88 元	编制 IPO 与改进 IPO 的文档、图表或记录；字段约束完整；1NF 至 3NF 有实例；状态、层次、Warnier 和 IPO 可解释

3.8.1 准备导航线框与用户代表任务

WBS	具体任务	任务负责人	日期与投入	产物及完成标准
3.8.1.1	RA03 整理青绿四页与 W01 至 W14 线框	王晨、刘景浩	11/02 1.00 人时 45.76 元	整理青绿四页与 W01 至 W14 线框的文档、图表或记录；覆盖正常与异常；真实参与和反馈分别登记，未确认不得代签
3.8.1.2	RA03 准备代表和任务走查表	王晨、刘景浩	11/02 1.00 人时 45.76 元	准备代表和任务走查表的文档、图表或记录；覆盖正常与异常；真实参与和反馈分别登记，未确认不得代签

3.8.2 执行代表走查并登记修改与确认

WBS	具体任务	任务负责人	日期与投入	产物及完成标准
3.8.2.1	RA03 执行任务并记录原话和问题	王晨、刘景浩	11/02 1.00 人时 45.76 元	执行任务并记录原话和问题的文档、图表或记录；覆盖正常与异常；真实参与和反馈分别登记，未确认不得代签
3.8.2.2	RA03 修改原型并取得复核确认	王晨、刘景浩	11/02 1.00 人时 45.76 元	修改原型并取得复核确认的文档、图表或记录；覆盖正常与异常；真实参与和反馈分别登记，未确认不得代签

3.9.1 同步 SRS 与四维验证及追踪

WBS	具体任务	任务负责人	日期与投入	产物及完成标准
3.9.1.1	RA10 执行一致完整现实有效检查	王晨、刘景浩	11/03 1.00 人时 45.76 元	执行一致完整现实有效检查的文档、图表或记录；一致完整现实有效四项检查；未关闭问题有责任期限；提交材料同版本
3.9.1.2	RA10 核对 FR 规则模型与验收追踪	王晨、刘景浩	11/03 1.00 人时 45.76 元	核对 FR 规则模型与验收追踪的文档、图表或记录；一致完整现实有效四项检查；未关闭问题有责任期限；提交材料同版本
3.9.1.3	RA10 形成 SRS 候选版本与问题表	王晨、刘景浩	11/03 0.50 人时 22.88 元	形成 SRS 候选版本与问题表的文档、图表或记录；一致完整现实有效四项检查；未关闭问题有责任期限；提交材料同版本

3.9.2 同步计划排期并核对评审提交包

WBS	具体任务	任务负责人	日期与投入	产物及完成标准
3.9.2.1	RA10 同步计划 WBS 与排期证据	王晨、刘景浩	11/03 1.00 人时 45.76 元	同步计划 WBS 与排期证据的文档、图表或记录；一致完整现实有效四项检查；未关闭问题有责任期限；提交材料同版本


WBS	具体任务	任务负责人	日期与投入	产物及完成标准
3.9.2.2	RA10 按两张评审表核对交付包	王晨、刘景浩	11/03 1.00 人时 45.76 元	按两张评审表核对交付包的文档、图表或记录；一致完整现实有效四项检查；未关闭问题有责任期限；提交材料同版本
3.9.2.3	RA10 准备讲稿与排练交接	王晨、刘景浩	11/03 0.50 人时 22.88 元	准备讲稿与排练交接的文档、图表或记录；一致完整现实有效四项检查；未关闭问题有责任期限；提交材料同版本

I3 排期图及过程交接

可行性八步骤和需求分析甘特图采用同一份 Project 任务数据，图表只展示过程汇总；全部末级任务、前置及人员分配见原生 MPP、MSPDI XML 及任务明细。



可行性八步骤计划

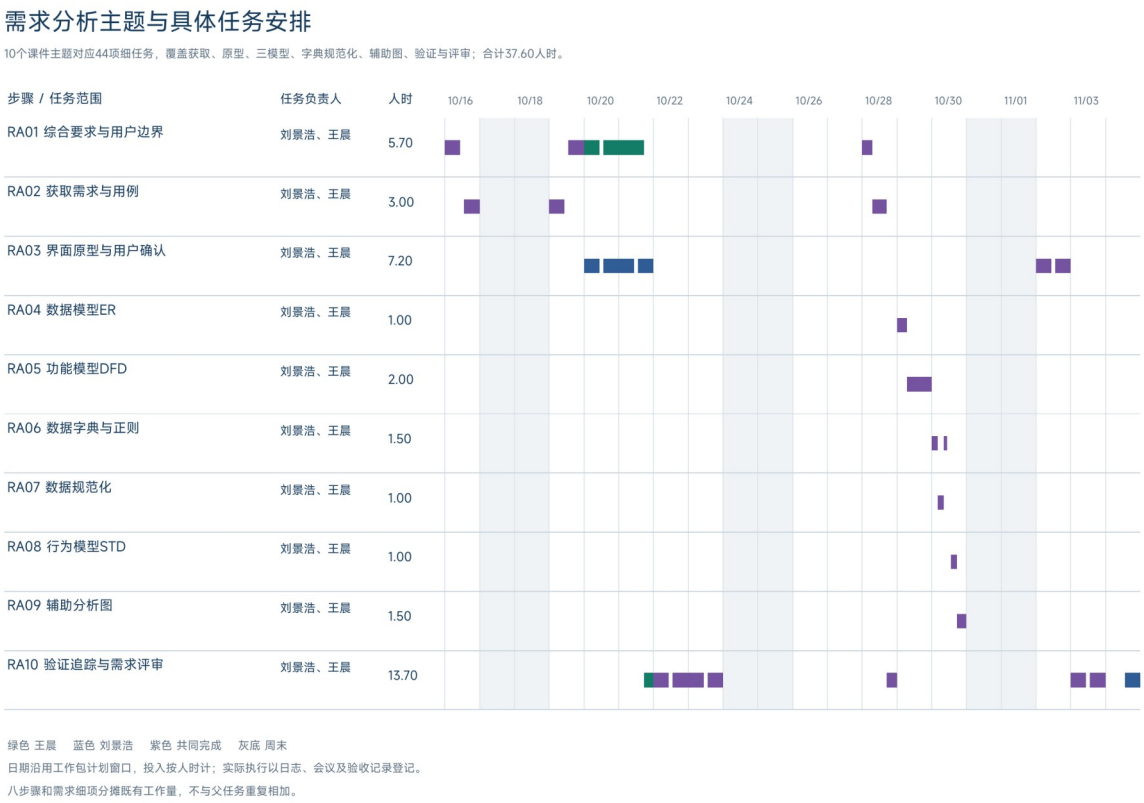

需求分析主题计划

阶段会议中检查已完成证据、遗留问题、下一周任务与责任调整。当前最近的已确认会议为2026 年 10 月 31 日腾讯会议 434440602；本次两名成员组内评分为 91.2、91.3，不将计划细化转记为新会议或新的实际完成。

会议与用户研究状态（2026 年 11 月 4 日核对）：10 月 31 日双方共同评审文档，阶段综合评分王晨 91.2、刘景浩 91.3。独立任务完成证据未留存；真实用户访谈和原型任务走查尚未开展，原定任务日期不作为实际完成证明。后续按当前 WBS 执行并保存问题、修改和确认记录。
