

城院帮 G04 项目计划 | V1.8 设计与测试排期 | Microsoft Project 原生甘特图 | 绿色王晨 蓝色刘景浩 紫色共同完成


WBS	名称	计划人时	开始时间	完成时间	前置任务	任务负责人	成本
1	**1 项目计划与评审**	**6人时**	**26/10/8**	**26/10/15**		**按下级分配**	**¥274.56**
1.1	**1.1 任务分解、排期与资源预算**	**2人时**	**26/10/8**	**26/10/8**		**王晨、刘景浩**	**¥91.52**
1.1.1	1.1.1 确认WBS、依赖与提交边界	1人时	26/10/8	26/10/8		王晨、刘景浩	¥45.76
1.1.2	1.1.2 建立资源预算与风险安排	1人时	26/10/8	26/10/8	3	王晨、刘景浩	¥45.76
1.2	**1.2 项目计划内部复核与汇报材料**	**2人时**	**26/10/9**	**26/10/9**		**王晨、刘景浩**	**¥91.52**
1.2.1	1.2.1 逐条检查评审要求与计划	1人时	26/10/9	26/10/9	4	王晨、刘景浩	¥45.76
1.2.2	1.2.2 确认汇报材料与提交清单	1人时	26/10/9	26/10/9	6	王晨、刘景浩	¥45.76
1.3	**1.3 项目计划评审反馈与修订**	**2人时**	**26/10/15**	**26/10/15**		**王晨、刘景浩**	**¥91.52**
1.3.1	1.3.1 登记课堂计划意见与影响	1人时	26/10/15	26/10/15	7	王晨、刘景浩	¥45.76
1.3.2	1.3.2 共同修订排期与计划基线	1人时	26/10/15	26/10/15	9	王晨、刘景浩	¥45.76
2	**2 可行性研究**	**10人时**	**26/10/8**	**26/10/15**		**按下级分配**	**¥457.60**
2.1	**2.1 关键技术与工具可行性验证**	**4.5人时**	**26/10/8**	**26/10/12**		**王晨**	**¥205.92**
2.1.1	**2.1.1 验证双端构建与邮箱条件**	**2.25人时**	**26/10/8**	**26/10/8**		**王晨**	**¥102.96**
2.1.1.1	**2.1.1.1 FS01 复查系统规模和目标**	**1人时**	**26/10/8**	**26/10/8**		**王晨**	**¥45.76**
2.1.1.1.1	2.1.1.1.1 FS01.1 明确使用者	0.2人时	26/10/8	26/10/8		王晨	¥9.15
2.1.1.1.2	2.1.1.1.2 FS01.2 限定业务边界	0.2人时	26/10/8	26/10/8	15	王晨	¥9.15
2.1.1.1.3	2.1.1.1.3 FS01.3 划分访问权限	0.2人时	26/10/8	26/10/8	16	王晨	¥9.15
2.1.1.1.4	2.1.1.1.4 FS01.4 把目标写成检查项	0.2人时	26/10/8	26/10/8	17	王晨	¥9.15
2.1.1.1.5	2.1.1.1.5 FS01.5 核对规模和约束	0.2人时	26/10/8	26/10/8	18	王晨	¥9.15

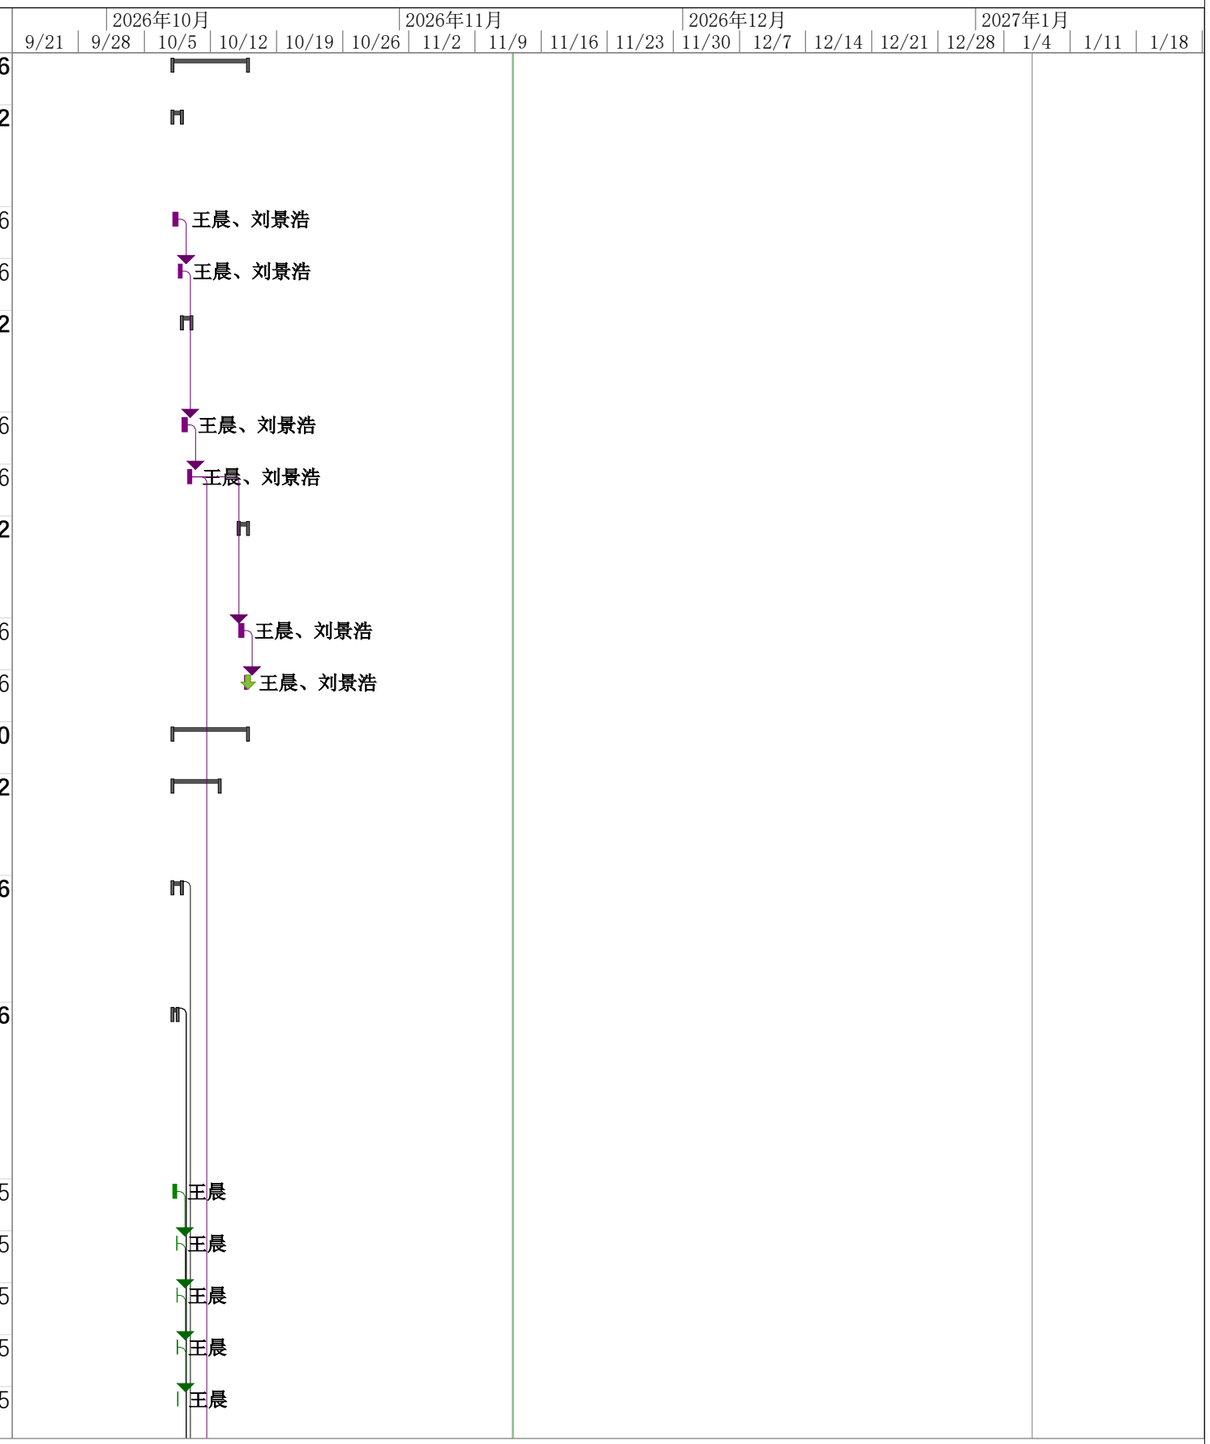


WBS	名称	计划人时	开始时间	完成时间	前置任务	任务负责人	成本
2.1.1.2	**2.1.1.2 FS02 研究目前正在使用的系统**	**1.25人时**	**26/10/8**	**26/10/8**	**14**	**王晨**	**¥57.20**
2.1.1.2.1	2.1.1.2.1 FS02.1 列出当前渠道	0.25人时	26/10/8	26/10/8	14	王晨	¥11.44
2.1.1.2.2	2.1.1.2.2 FS02.2 保留已有有效能力	0.25人时	26/10/8	26/10/8	21	王晨	¥11.44
2.1.1.2.3	2.1.1.2.3 FS02.3 还原当前处理步骤	0.25人时	26/10/8	26/10/8	22	王晨	¥11.44
2.1.1.2.4	2.1.1.2.4 FS02.4 定位信息断点	0.25人时	26/10/8	26/10/8	23	王晨	¥11.44
2.1.1.2.5	2.1.1.2.5 FS02.5 把不足变成改进输入	0.25人时	26/10/8	26/10/8	24	王晨	¥11.44
2.1.2	**2.1.2 核查独立运维、存储与恢复路径**	**2.25人时**	**26/10/9**	**26/10/12**	**13**	**王晨**	**¥102.96**
2.1.2.1	**2.1.2.1 FS03 导出新系统的高层逻辑模型**	**1.25人时**	**26/10/9**	**26/10/9**	**20**	**王晨**	**¥57.20**
2.1.2.1.1	2.1.2.1.1 FS03.1 抽去现状工具名称	0.25人时	26/10/9	26/10/9	20	王晨	¥11.44
2.1.2.1.2	2.1.2.1.2 FS03.2 定义系统边界	0.2人时	26/10/9	26/10/9	28	王晨	¥9.15
2.1.2.1.3	2.1.2.1.3 FS03.3 明确输入与输出	0.2人时	26/10/9	26/10/9	29	王晨	¥9.15
2.1.2.1.4	2.1.2.1.4 FS03.4 分解主要逻辑处理	0.2人时	26/10/9	26/10/9	30	王晨	¥9.15
2.1.2.1.5	2.1.2.1.5 FS03.5 建立字典并检查平衡	0.2人时	26/10/9	26/10/9	31	王晨	¥9.15
2.1.2.1.6	2.1.2.1.6 FS03.6 推导目标物理实现	0.2人时	26/10/9	26/10/9	32	王晨	¥9.15
2.1.2.2	**2.1.2.2 FS04 进一步定义问题**	**1人时**	**26/10/12**	**26/10/12**	**27**	**王晨**	**¥45.76**
2.1.2.2.1	2.1.2.2.1 FS04.1 重写核心问题	0.2人时	26/10/12	26/10/12	27	王晨	¥9.15
2.1.2.2.2	2.1.2.2.2 FS04.2 拆开问题与解决手段	0.2人时	26/10/12	26/10/12	35	王晨	¥9.15
2.1.2.2.3	2.1.2.2.3 FS04.3 收紧本期范围	0.2人时	26/10/12	26/10/12	36	王晨	¥9.15
2.1.2.2.4	2.1.2.2.4 FS04.4 补充反例和限制	0.2人时	26/10/12	26/10/12	37	王晨	¥9.15

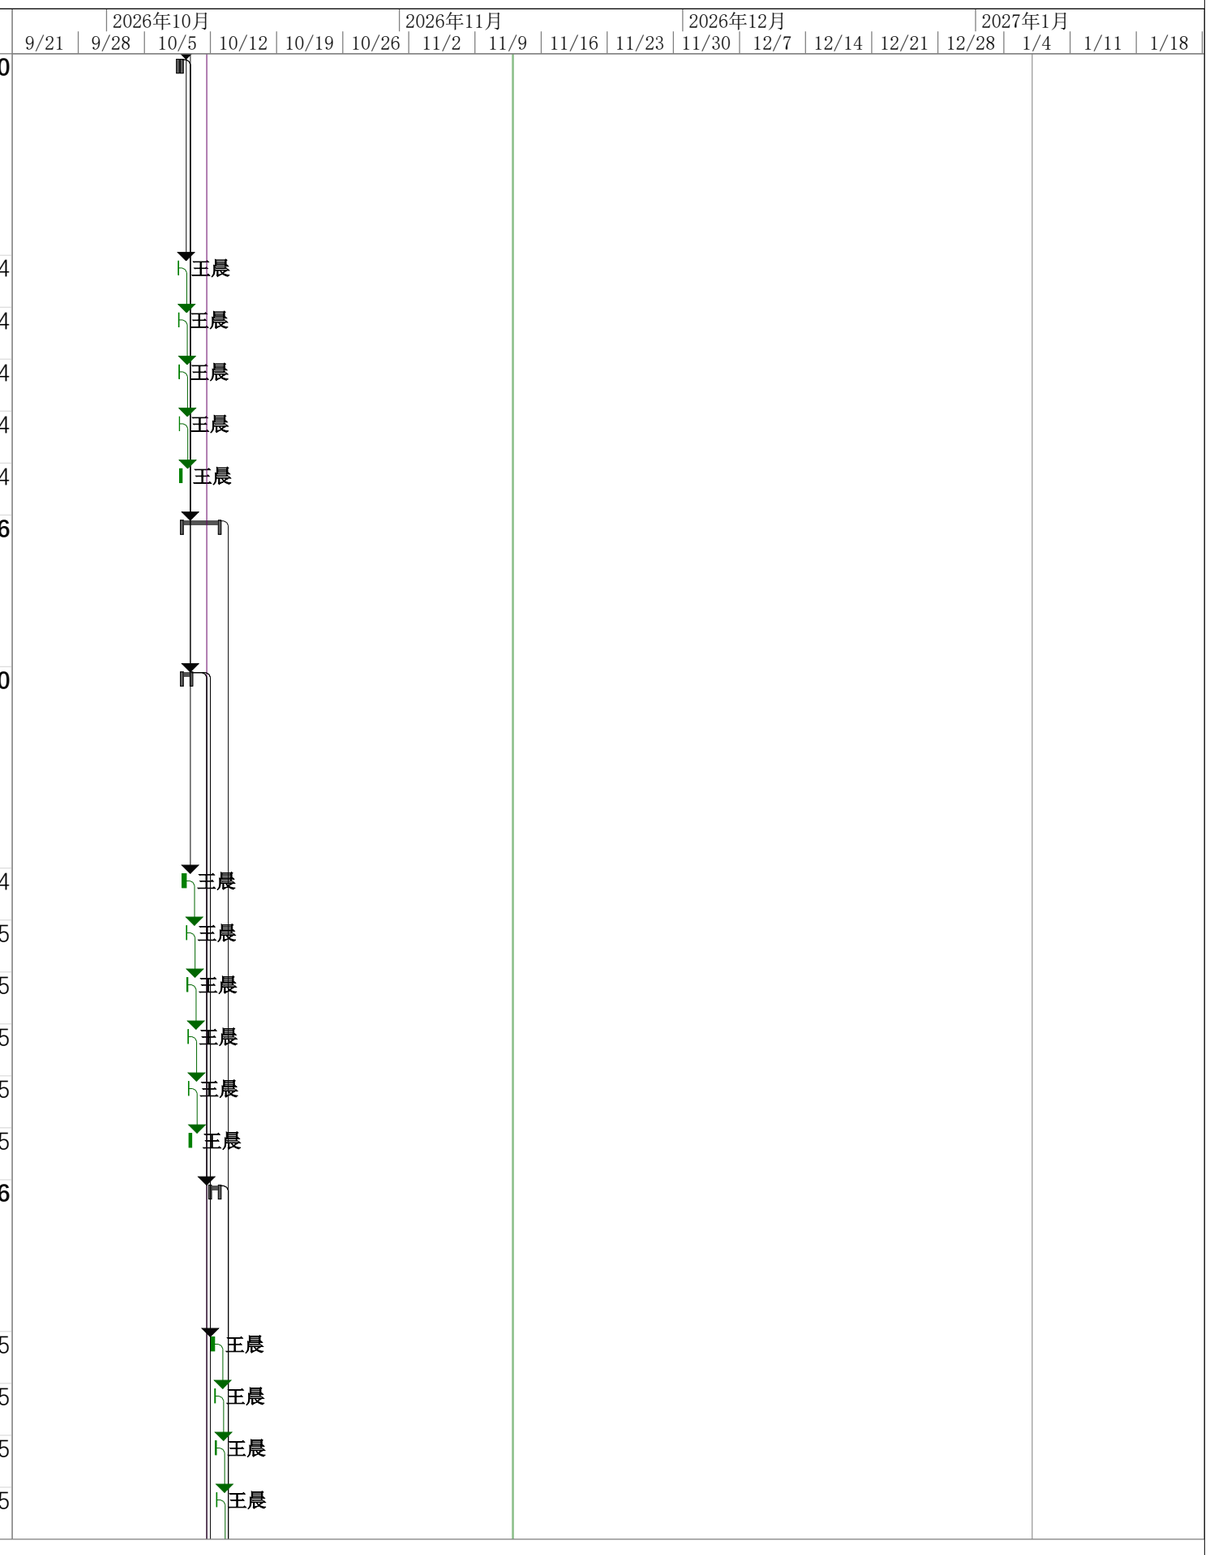


WBS	名称	计划人时	开始时间	完成时间	前置任务	任务负责人	成本
2.1.2.2.5	2.1.2.2.5 FS04.5 形成反馈和关闭方式	0.2人时	26/10/12	26/10/12	38	王晨	¥9.15
2.2	**2.2 经济、操作及内容供给分析**	**2.5人时**	**26/10/12**	**26/10/13**		**刘景浩**	**¥114.40**
2.2.1	**2.2.1 核查工具、设备与现金费用**	**1.25人时**	**26/10/12**	**26/10/12**	**7**	**刘景浩**	**¥57.20**
2.2.1.1	**2.2.1.1 FS05 导出和评价供选择的解法**	**1.25人时**	**26/10/12**	**26/10/12**	**27**	**刘景浩**	**¥57.20**
2.2.1.1.1	2.2.1.1.1 FS05.1 形成六类解法	0.25人时	26/10/12	26/10/12	27	刘景浩	¥11.44
2.2.1.1.2	2.2.1.1.2 FS05.2 使用同一评价基准	0.2人时	26/10/12	26/10/12	43	刘景浩	¥9.15
2.2.1.1.3	2.2.1.1.3 FS05.3 逐项比较小程序与App	0.2人时	26/10/12	26/10/12	44	刘景浩	¥9.15
2.2.1.1.4	2.2.1.1.4 FS05.4 评估成员与工具能力	0.2人时	26/10/12	26/10/12	45	刘景浩	¥9.15
2.2.1.1.5	2.2.1.1.5 FS05.5 换算工作量和人工成本	0.2人时	26/10/12	26/10/12	46	刘景浩	¥9.15
2.2.1.1.6	2.2.1.1.6 FS05.6 计算并解释评分	0.2人时	26/10/12	26/10/12	47	刘景浩	¥9.15
2.2.2	**2.2.2 分析资料来源、作者邀请与操作成本**	**1.25人时**	**26/10/13**	**26/10/13**	**41**	**刘景浩**	**¥57.20**
2.2.2.1	**2.2.2.1 FS06 推荐行动方针**	**1.25人时**	**26/10/13**	**26/10/13**	**34,42**	**刘景浩**	**¥57.20**
2.2.2.1.1	2.2.2.1.1 FS06.1 明确继续与否	0.25人时	26/10/13	26/10/13	34,42	刘景浩	¥11.44
2.2.2.1.2	2.2.2.1.2 FS06.2 给出推荐理由	0.25人时	26/10/13	26/10/13	51	刘景浩	¥11.44
2.2.2.1.3	2.2.2.1.3 FS06.3 说明备选方针	0.25人时	26/10/13	26/10/13	52	刘景浩	¥11.44
2.2.2.1.4	2.2.2.1.4 FS06.4 定义继续条件	0.25人时	26/10/13	26/10/13	53	刘景浩	¥11.44
2.2.2.1.5	2.2.2.1.5 FS06.5 定义调整触发点	0.25人时	26/10/13	26/10/13	54	刘景浩	¥11.44
2.3	**2.3 可行性报告与内部评审**	**3人时**	**26/10/14**	**26/10/15**		**王晨、刘景浩**	**¥137.28**
2.3.1	**2.3.1 双方汇总技术与资源判断**	**1.5人时**	**26/10/14**	**26/10/14**	**26,49**	**王晨、刘景浩**	**¥68.64**
2.3.1.1	**2.3.1.1 FS07 草拟开发计划书**	**1.5人时**	**26/10/14**	**26/10/14**	**50**	**王晨、刘景浩**	**¥68.64**
2.3.1.1.1	2.3.1.1.1 FS07.1 分解交付工作	0.25人时	26/10/14	26/10/14	50	王晨、刘景浩	¥11.44
2.3.1.1.2	2.3.1.1.2 FS07.2 估算人时与人员分配	0.25人时	26/10/14	26/10/14	59	王晨、刘景浩	¥11.44
2.3.1.1.3	2.3.1.1.3 FS07.3 建立依赖与排期	0.25人时	26/10/14	26/10/14	60	王晨、刘景浩	¥11.44
2.3.1.1.4	2.3.1.1.4 FS07.4 核算成本与资源	0.25人时	26/10/14	26/10/14	61	王晨、刘景浩	¥11.44

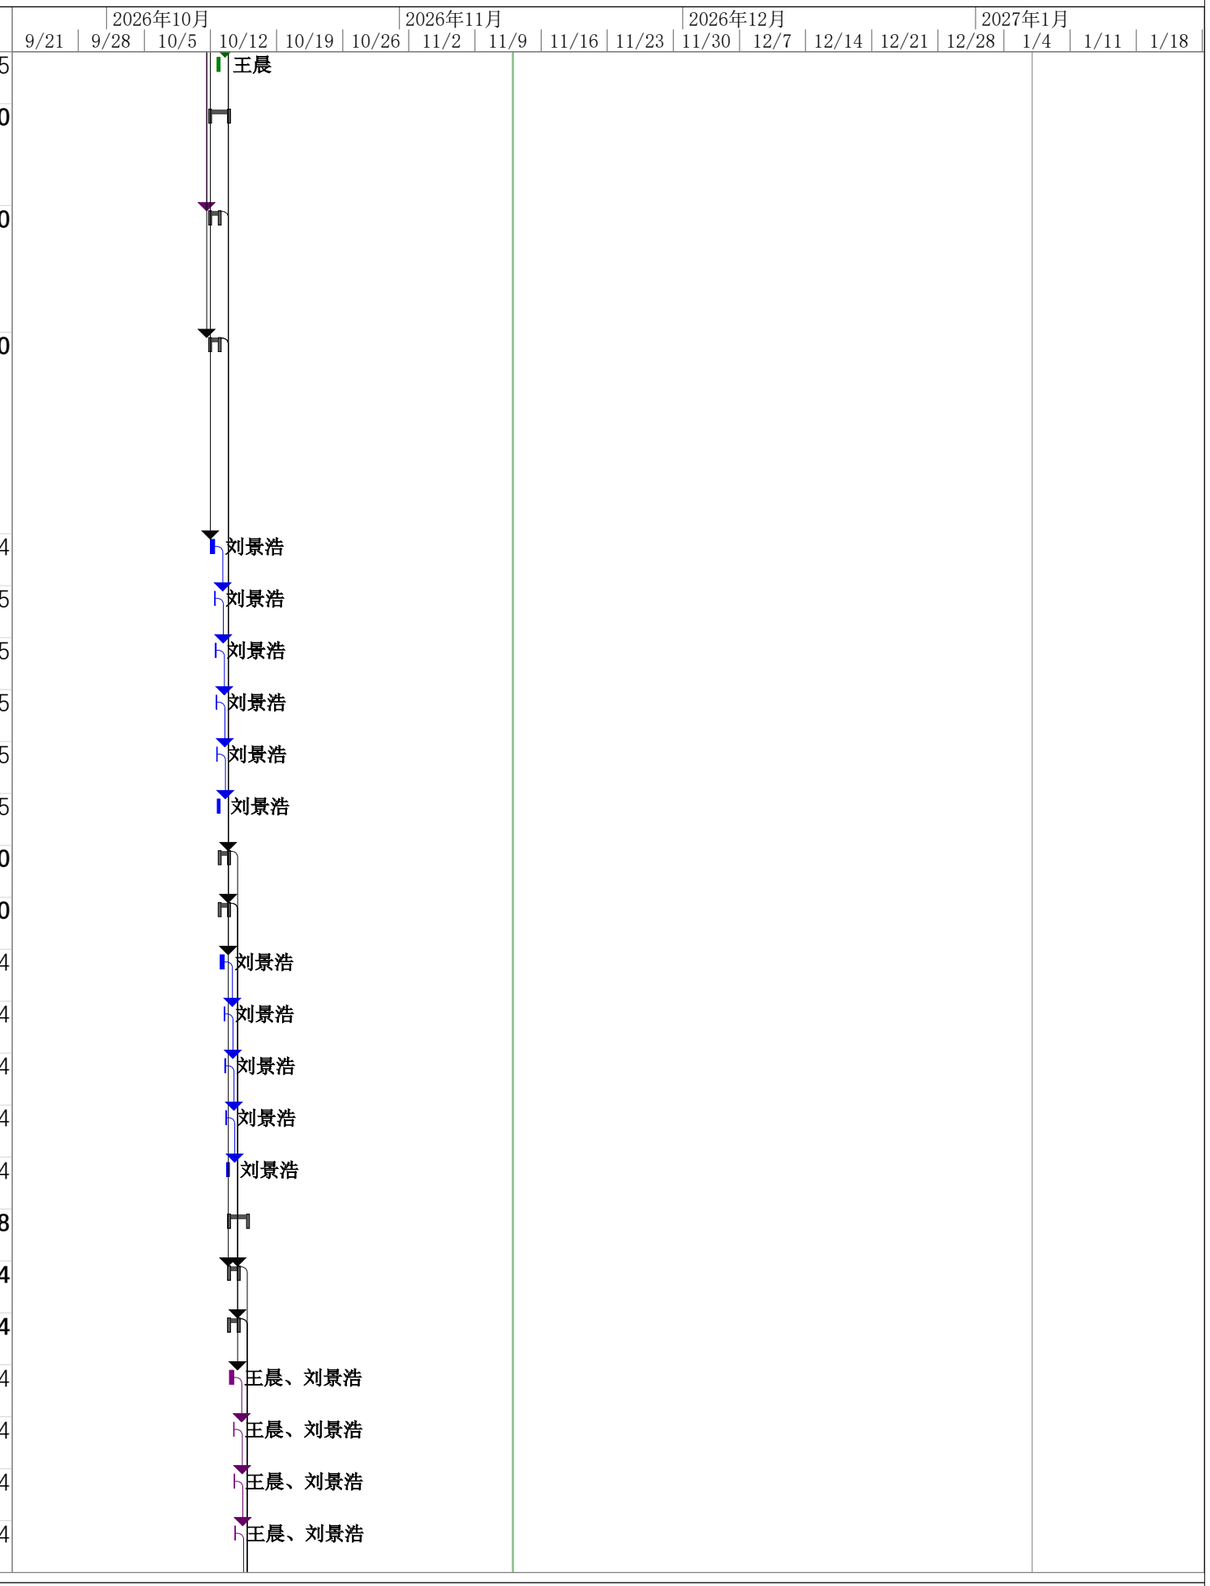


WBS	名称	计划人时	开始时间	完成时间	前置任务	任务负责人	成本
2.3.1.1.5	2.3.1.1.5 FS07.5 细排下一需求阶段	0.25人时	26/10/14	26/10/14	62	王晨、刘景浩	¥11.44
2.3.1.1.6	2.3.1.1.6 FS07.6 安排监督与调整	0.25人时	26/10/14	26/10/14	63	王晨、刘景浩	¥11.44
2.3.2	**2.3.2 共同评审可行性结论与条件**	**1.5人时**	**26/10/15**	**26/10/15**	**57**	**王晨、刘景浩**	**¥68.64**
2.3.2.1	**2.3.2.1 FS08 写文档提交审查**	**1.5人时**	**26/10/15**	**26/10/15**	**58**	**王晨、刘景浩**	**¥68.64**
2.3.2.1.1	2.3.2.1.1 FS08.1 组织完整报告	0.25人时	26/10/15	26/10/15	58	王晨、刘景浩	¥11.44
2.3.2.1.2	2.3.2.1.2 FS08.2 标记版本及输入	0.25人时	26/10/15	26/10/15	67	王晨、刘景浩	¥11.44
2.3.2.1.3	2.3.2.1.3 FS08.3 核对图文一致	0.25人时	26/10/15	26/10/15	68	王晨、刘景浩	¥11.44
2.3.2.1.4	2.3.2.1.4 FS08.4 编制审查索引	0.25人时	26/10/15	26/10/15	69	王晨、刘景浩	¥11.44
2.3.2.1.5	2.3.2.1.5 FS08.5 区分记录与待办	0.25人时	26/10/15	26/10/15	70	王晨、刘景浩	¥11.44
2.3.2.1.6	2.3.2.1.6 FS08.6 接收决定并闭环	0.25人时	26/10/15	26/10/15	71	王晨、刘景浩	¥11.44
3	**3 需求分析**	**37.6人时**	**26/10/16**	**26/11/4**		**按下级分配**	**¥1,72...**
3.1	**3.1 用户场景、用例与权限边界**	**4人时**	**26/10/16**	**26/10/19**		**王晨、刘景浩**	**¥183.04**
3.1.1	**3.1.1 共同核对读者作者与管理场景**	**2人时**	**26/10/16**	**26/10/16**	**65**	**王晨、刘景浩**	**¥91.52**
3.1.1.1	3.1.1.1 RA01 确认用户类别与需求代表	1人时	26/10/16	26/10/16	65	王晨、刘景浩	¥45.76
3.1.1.2	3.1.1.2 RA02 整理需求来源与情景	1人时	26/10/16	26/10/16	76	王晨、刘景浩	¥45.76
3.1.2	**3.1.2 确认权限矩阵与核心用例**	**2人时**	**26/10/19**	**26/10/19**	**75**	**王晨、刘景浩**	**¥91.52**
3.1.2.1	3.1.2.1 RA02 描述用例主流程与异常	1人时	26/10/19	26/10/19	75	王晨、刘景浩	¥45.76
3.1.2.2	3.1.2.2 RA01 核对角色权限和边界	1人时	26/10/19	26/10/19	79	王晨、刘景浩	¥45.76
3.2	**3.2 功能、数据与非功能需求**	**3.2人时**	**26/10/20**	**26/10/21**		**王晨**	**¥146.43**
3.2.1	**3.2.1 细化文章交流、激励与治理规则**	**1.6人时**	**26/10/20**	**26/10/20**	**78**	**王晨**	**¥73.22**
3.2.1.1	3.2.1.1 RA01 拆分功能需求与本期范围	0.8人时	26/10/20	26/10/20	78	王晨	¥36.61
3.2.1.2	3.2.1.2 RA01 明确互动激励与治理规则	0.8人时	26/10/20	26/10/20	83	王晨	¥36.61
3.2.2	**3.2.2 定义数据、异常与非功能验收**	**1.6人时**	**26/10/21**	**26/10/21**	**82**	**王晨**	**¥73.22**
3.2.2.1	3.2.2.1 RA01 定义数据和接口约束	0.5人时	26/10/21	26/10/21	82	王晨	¥22.88
3.2.2.2	3.2.2.2 RA01 量化性能可靠性与安全指标	0.6人时	26/10/21	26/10/21	86	王晨	¥27.46
3.2.2.3	3.2.2.3 RA10 定义异常和验收场景	0.5人时	26/10/21	26/10/21	87	王晨	¥22.88
3.3	**3.3 双端原型与场景核对**	**3.2人时**	**26/10/20**	**26/10/21**		**刘景浩**	**¥146.43**
3.3.1	**3.3.1 绘制双端阅读创作原型**	**1.6人时**	**26/10/20**	**26/10/20**	**78**	**刘景浩**	**¥73.22**
3.3.1.1	3.3.1.1 RA03 整理小程序阅读与作者界面	0.8人时	26/10/20	26/10/20	78	刘景浩	¥36.61

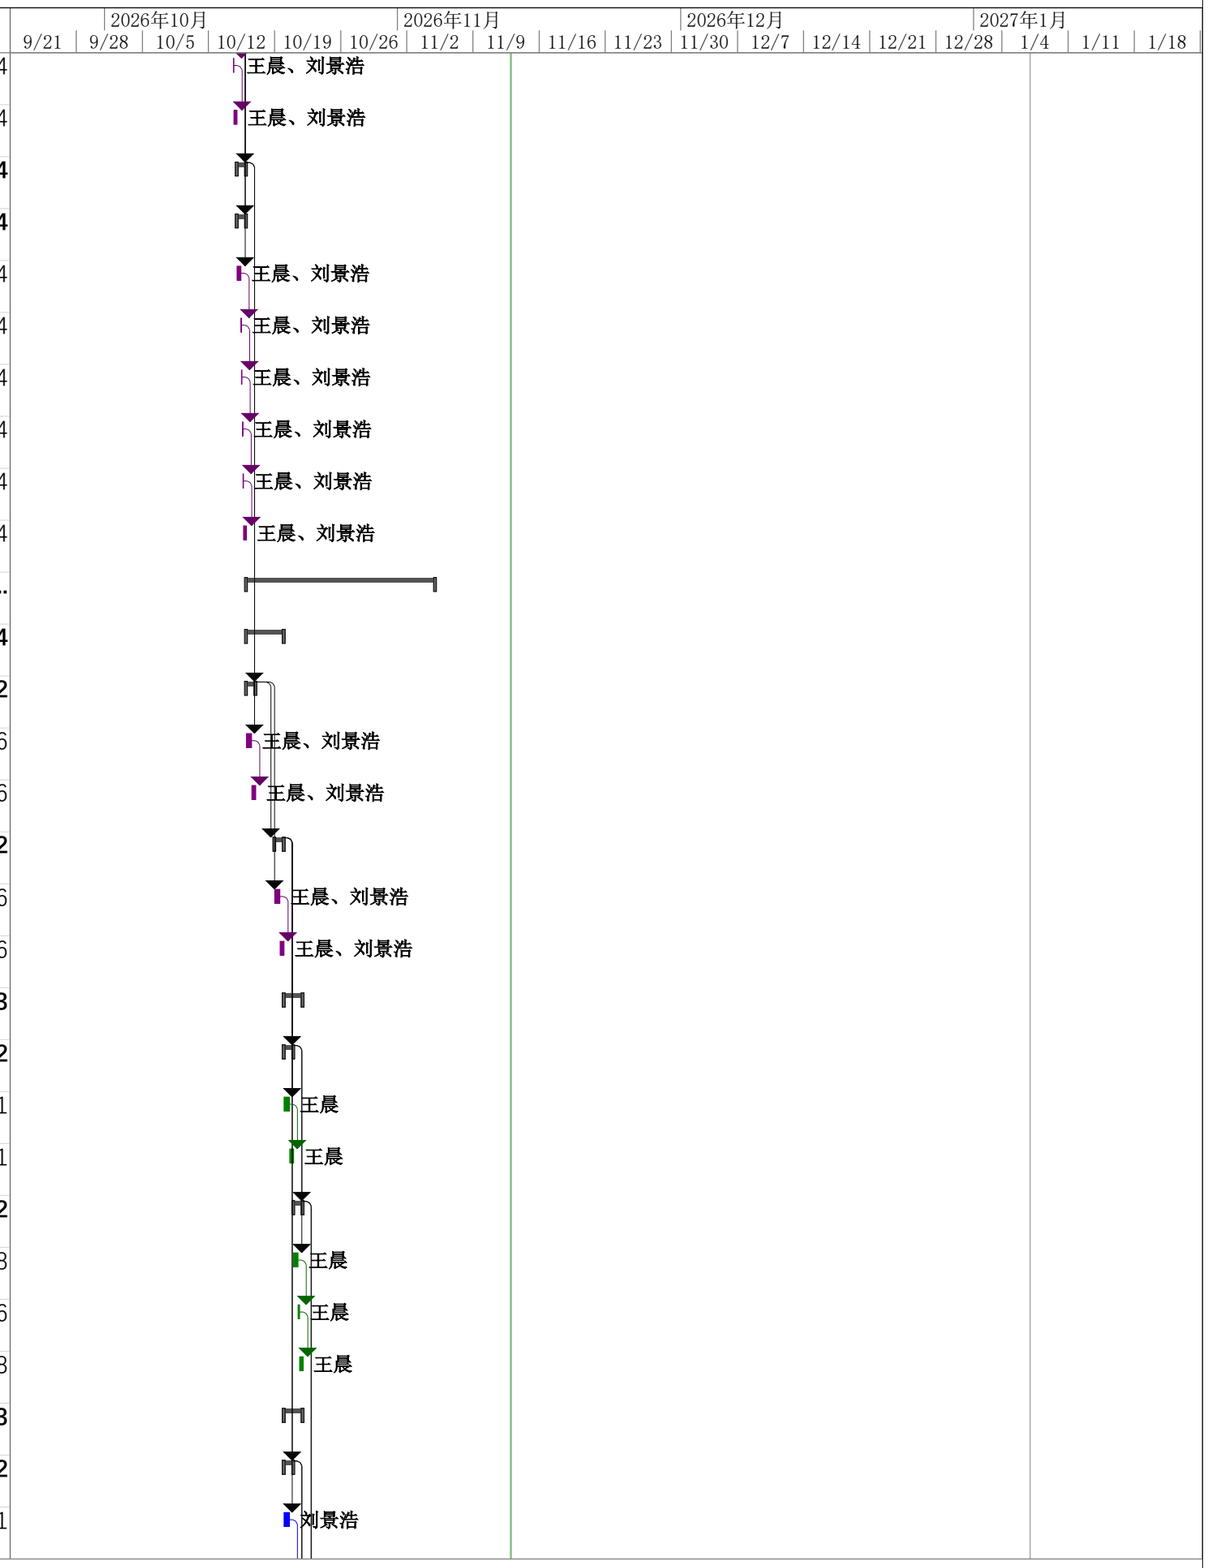


WBS	名称	计划人时	开始时间	完成时间	前置任务	任务负责人	成本
3.3.1.2	3.3.1.2 RA03 整理网页创作与阅读线框	0.8人时	26/10/20	26/10/20	91	刘景浩	¥36.61
3.3.2	**3.3.2 核对社区和运维管理流程**	**1.6人时**	**26/10/21**	**26/10/21**	**90**	**刘景浩**	**¥73.22**
3.3.2.1	3.3.2.1 RA03 核对社区案件与关联定位	0.8人时	26/10/21	26/10/21	90	刘景浩	¥36.61
3.3.2.2	3.3.2.2 RA03 核对独立运维与执行确认	0.8人时	26/10/21	26/10/21	94	刘景浩	¥36.61
3.4	**3.4 SRS基线与需求评审材料**	**4人时**	**26/10/22**	**26/10/23**		**王晨、刘景浩**	**¥183.04**
3.4.1	**3.4.1 共同汇总SRS与需求追踪**	**2人时**	**26/10/22**	**26/10/22**	**85,93**	**王晨、刘景浩**	**¥91.52**
3.4.1.1	3.4.1.1 RA10 汇总功能非功能与SRS	1人时	26/10/22	26/10/22	85,93	王晨、刘景浩	¥45.76
3.4.1.2	3.4.1.2 RA10 关联追踪编号与输入版本	1人时	26/10/22	26/10/22	98	王晨、刘景浩	¥45.76
3.4.2	**3.4.2 内部复核并准备需求汇报**	**2人时**	**26/10/23**	**26/10/23**	**97**	**王晨、刘景浩**	**¥91.52**
3.4.2.1	3.4.2.1 RA10 组织内部需求评审	1人时	26/10/23	26/10/23	97	王晨、刘景浩	¥45.76
3.4.2.2	3.4.2.2 RA10 核对汇报与提交清单	1人时	26/10/23	26/10/23	101	王晨、刘景浩	¥45.76
3.5	**3.5 需求课堂评审反馈处理**	**3.2人时**	**26/11/4**	**26/11/4**		**刘景浩**	**¥146.43**
3.5.1	**3.5.1 记录需求复审意见**	**1.6人时**	**26/11/4**	**26/11/4**	**141**	**刘景浩**	**¥73.22**
3.5.1.1	3.5.1.1 RA10 登记课堂评审问题	0.8人时	26/11/4	26/11/4	141	刘景浩	¥36.61
3.5.1.2	3.5.1.2 RA10 分析范围接口和排期影响	0.8人时	26/11/4	26/11/4	105	刘景浩	¥36.61
3.5.2	**3.5.2 修订需求并同步设计影响**	**1.6人时**	**26/11/4**	**26/11/4**	**104**	**刘景浩**	**¥73.22**
3.5.2.1	3.5.2.1 RA10 修订需求与未关闭问题	0.8人时	26/11/4	26/11/4	104	刘景浩	¥36.61
3.5.2.2	3.5.2.2 RA10 向设计交接确认结果	0.8人时	26/11/4	26/11/4	108	刘景浩	¥36.61
3.6	**3.6 课件核对及三模型骨架**	**6人时**	**26/10/28**	**26/10/29**		**王晨、刘景浩**	**¥274.56**
3.6.1	**3.6.1 核对课件评审表、用户及范围**	**3人时**	**26/10/28**	**26/10/28**	**100**	**王晨、刘景浩**	**¥137.28**
3.6.1.1	3.6.1.1 RA01 核对综合要求与未来范围	1人时	26/10/28	26/10/28	100	王晨、刘景浩	¥45.76
3.6.1.2	3.6.1.2 RA02 核对代表来源及获取方法	1人时	26/10/28	26/10/28	112	王晨、刘景浩	¥45.76
3.6.1.3	3.6.1.3 RA10 建立课件与评审覆盖索引	1人时	26/10/28	26/10/28	113	王晨、刘景浩	¥45.76
3.6.2	**3.6.2 建立ER与分层DFD并交叉核对**	**3人时**	**26/10/29**	**26/10/29**	**111**	**王晨、刘景浩**	**¥137.28**
3.6.2.1	3.6.2.1 RA04 建立ER实体属性与基数	1人时	26/10/29	26/10/29	111	王晨、刘景浩	¥45.76
3.6.2.2	3.6.2.2 RA05 建立上下文一级和关键二级DFD	1.25人时	26/10/29	26/10/29	116	王晨、刘景浩	¥57.20
3.6.2.3	3.6.2.3 RA05 核对父子流平衡与边界	0.75人时	26/10/29	26/10/29	117	王晨、刘景浩	¥34.32
3.7	**3.7 字典规范化及行为辅助模型**	**5人时**	**26/10/30**	**26/10/30**		**王晨、刘景浩**	**¥228.80**
3.7.1	**3.7.1 细化数据字典正则及规范化**	**2.5人时**	**26/10/30**	**26/10/30**	**115**	**王晨、刘景浩**	**¥114.40**

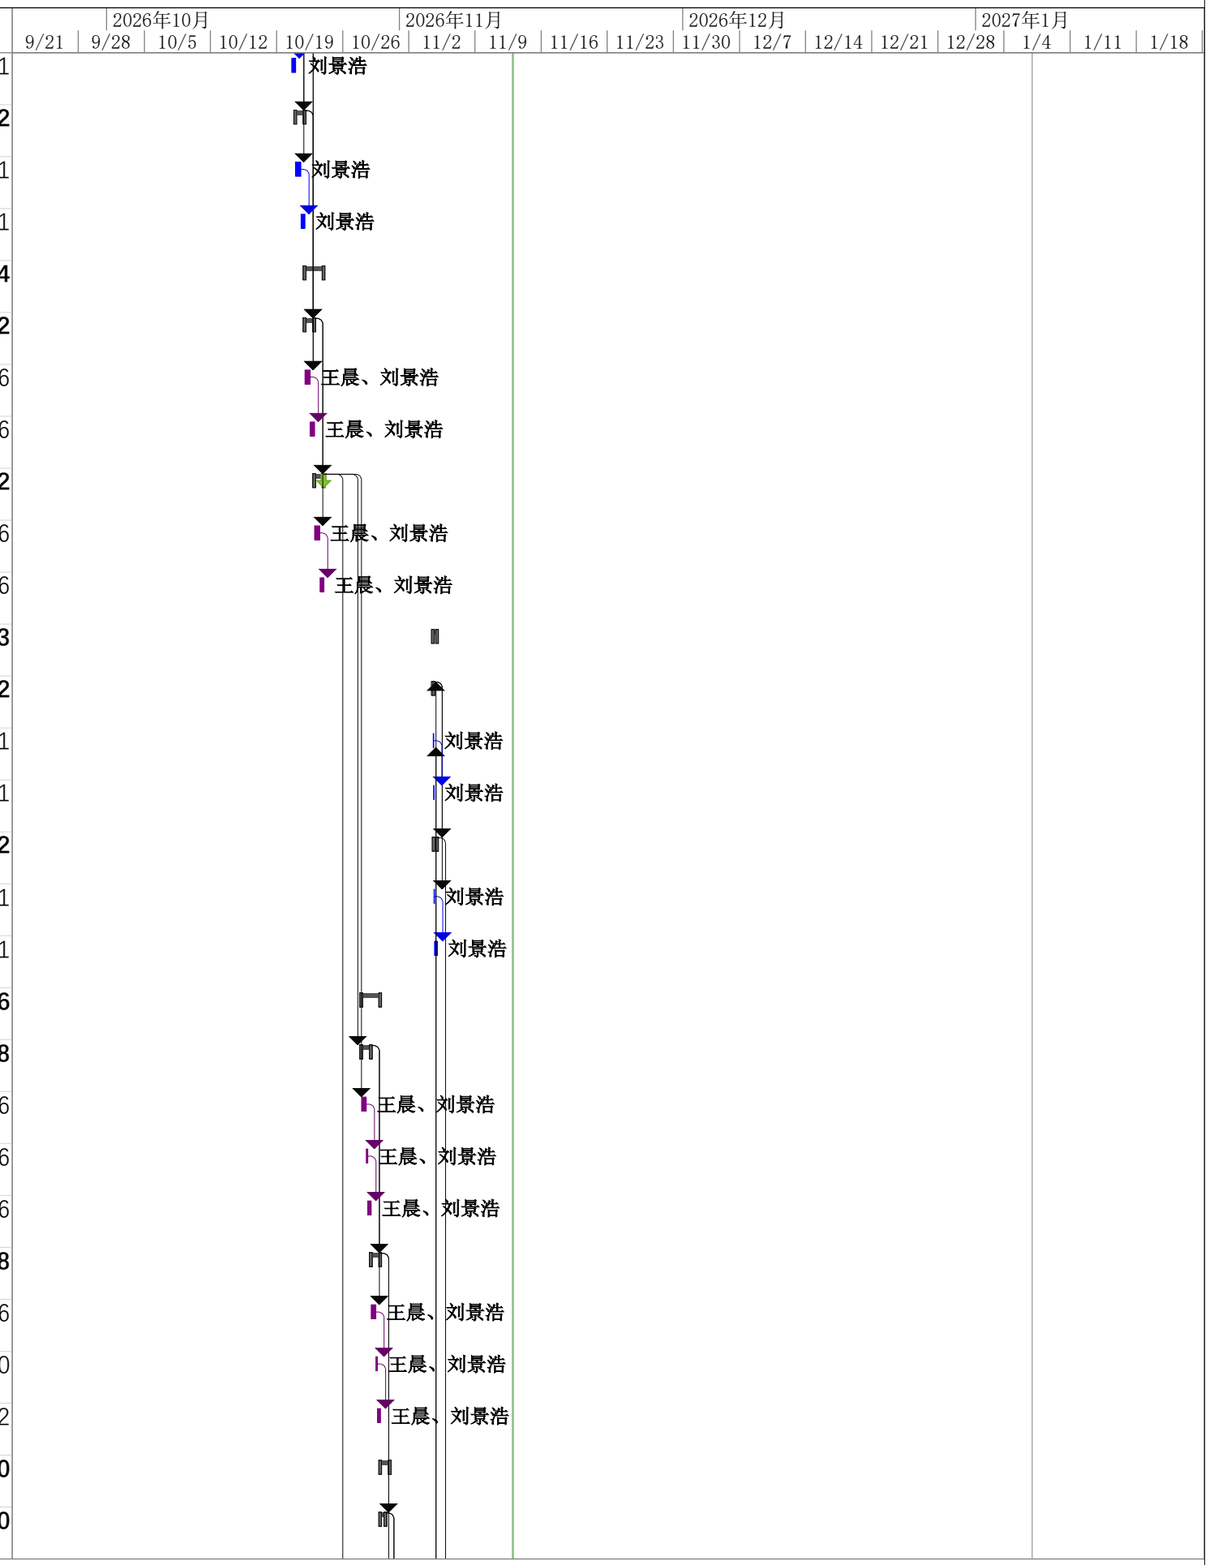


WBS	名称	计划人时	开始时间	完成时间	前置任务	任务负责人	成本
3.7.1.1	3.7.1.1 RA06 定义字典结构正则与语义	1人时	26/10/30	26/10/30	115	王晨、刘景浩	¥45.76
3.7.1.2	3.7.1.2 RA07 分析函数依赖及1NF至3NF	1人时	26/10/30	26/10/30	121	王晨、刘景浩	¥45.76
3.7.1.3	3.7.1.3 RA06 核对处理逻辑与反例约束	0.5人时	26/10/30	26/10/30	122	王晨、刘景浩	¥22.88
3.7.2	**3.7.2 核对状态转换及辅助图形**	**2.5人时**	**26/10/30**	**26/10/30**	**120**	**王晨、刘景浩**	**¥114.40**
3.7.2.1	3.7.2.1 RA08 绘制STD与状态转换表	1人时	26/10/30	26/10/30	120	王晨、刘景浩	¥45.76
3.7.2.2	3.7.2.2 RA09 绘制层次方框图	0.5人时	26/10/30	26/10/30	125	王晨、刘景浩	¥22.88
3.7.2.3	3.7.2.3 RA09 绘制Warnier图	0.5人时	26/10/30	26/10/30	126	王晨、刘景浩	¥22.88
3.7.2.4	3.7.2.4 RA09 编制IPO与改进IPO	0.5人时	26/10/30	26/10/30	127	王晨、刘景浩	¥22.88
3.8	**3.8 界面线框与真实用户走查**	**4人时**	**26/11/2**	**26/11/2**		**王晨、刘景浩**	**¥183.04**
3.8.1	**3.8.1 准备导航线框与用户代表任务**	**2人时**	**26/11/2**	**26/11/2**	**124**	**王晨、刘景浩**	**¥91.52**
3.8.1.1	3.8.1.1 RA03 整理青绿四页与W01至W14线框	1人时	26/11/2	26/11/2	124	王晨、刘景浩	¥45.76
3.8.1.2	3.8.1.2 RA03 准备代表和任务走查表	1人时	26/11/2	26/11/2	131	王晨、刘景浩	¥45.76
3.8.2	**3.8.2 执行代表走查并登记修改与确认**	**2人时**	**26/11/2**	**26/11/2**	**130**	**王晨、刘景浩**	**¥91.52**
3.8.2.1	3.8.2.1 RA03 执行任务并记录原话和问题	1人时	26/11/2	26/11/2	130	王晨、刘景浩	¥45.76
3.8.2.2	3.8.2.2 RA03 修改原型并取得复核确认	1人时	26/11/2	26/11/2	134	王晨、刘景浩	¥45.76
3.9	**3.9 需求验证追踪与阶段提交**	**5人时**	**26/11/3**	**26/11/3**		**王晨、刘景浩**	**¥228.80**
3.9.1	**3.9.1 同步SRS与四维验证及追踪**	**2.5人时**	**26/11/3**	**26/11/3**	**133**	**王晨、刘景浩**	**¥114.40**
3.9.1.1	3.9.1.1 RA10 执行一致完整现实有效检查	1人时	26/11/3	26/11/3	133	王晨、刘景浩	¥45.76
3.9.1.2	3.9.1.2 RA10 核对FR规则模型与验收追踪	1人时	26/11/3	26/11/3	138	王晨、刘景浩	¥45.76
3.9.1.3	3.9.1.3 RA10 形成SRS候选版本与问题表	0.5人时	26/11/3	26/11/3	139	王晨、刘景浩	¥22.88
3.9.2	**3.9.2 同步计划排期并核对评审提交包**	**2.5人时**	**26/11/3**	**26/11/3**	**137**	**王晨、刘景浩**	**¥114.40**
3.9.2.1	3.9.2.1 RA10 同步计划WBS与排期证据	1人时	26/11/3	26/11/3	137	王晨、刘景浩	¥45.76
3.9.2.2	3.9.2.2 RA10 按两张评审表核对交付包	1人时	26/11/3	26/11/3	142	王晨、刘景浩	¥45.76
3.9.2.3	3.9.2.3 RA10 准备讲稿与排练交接	0.5人时	26/11/3	26/11/3	143	王晨、刘景浩	¥22.88
4	**4 总体与详细设计**	**64.25人时**	**26/10/26**	**26/11/26**		**按下级分配**	**¥2,94...**
4.1	**4.1 设想供选择的方案**	**2人时**	**26/10/26**	**26/10/26**		**王晨、刘景浩**	**¥91.52**
4.1.1	4.1.1 复查需求DFD与系统边界	0.75人时	26/10/26	26/10/26	100	王晨	¥34.32
4.1.2	4.1.2 形成处理分组与排除条件	1.25人时	26/10/26	26/10/26	147	王晨、刘景浩	¥57.20
4.2	**4.2 选取合理的方案**	**3人时**	**26/10/26**	**26/10/26**		**王晨、刘景浩**	**¥137.28**

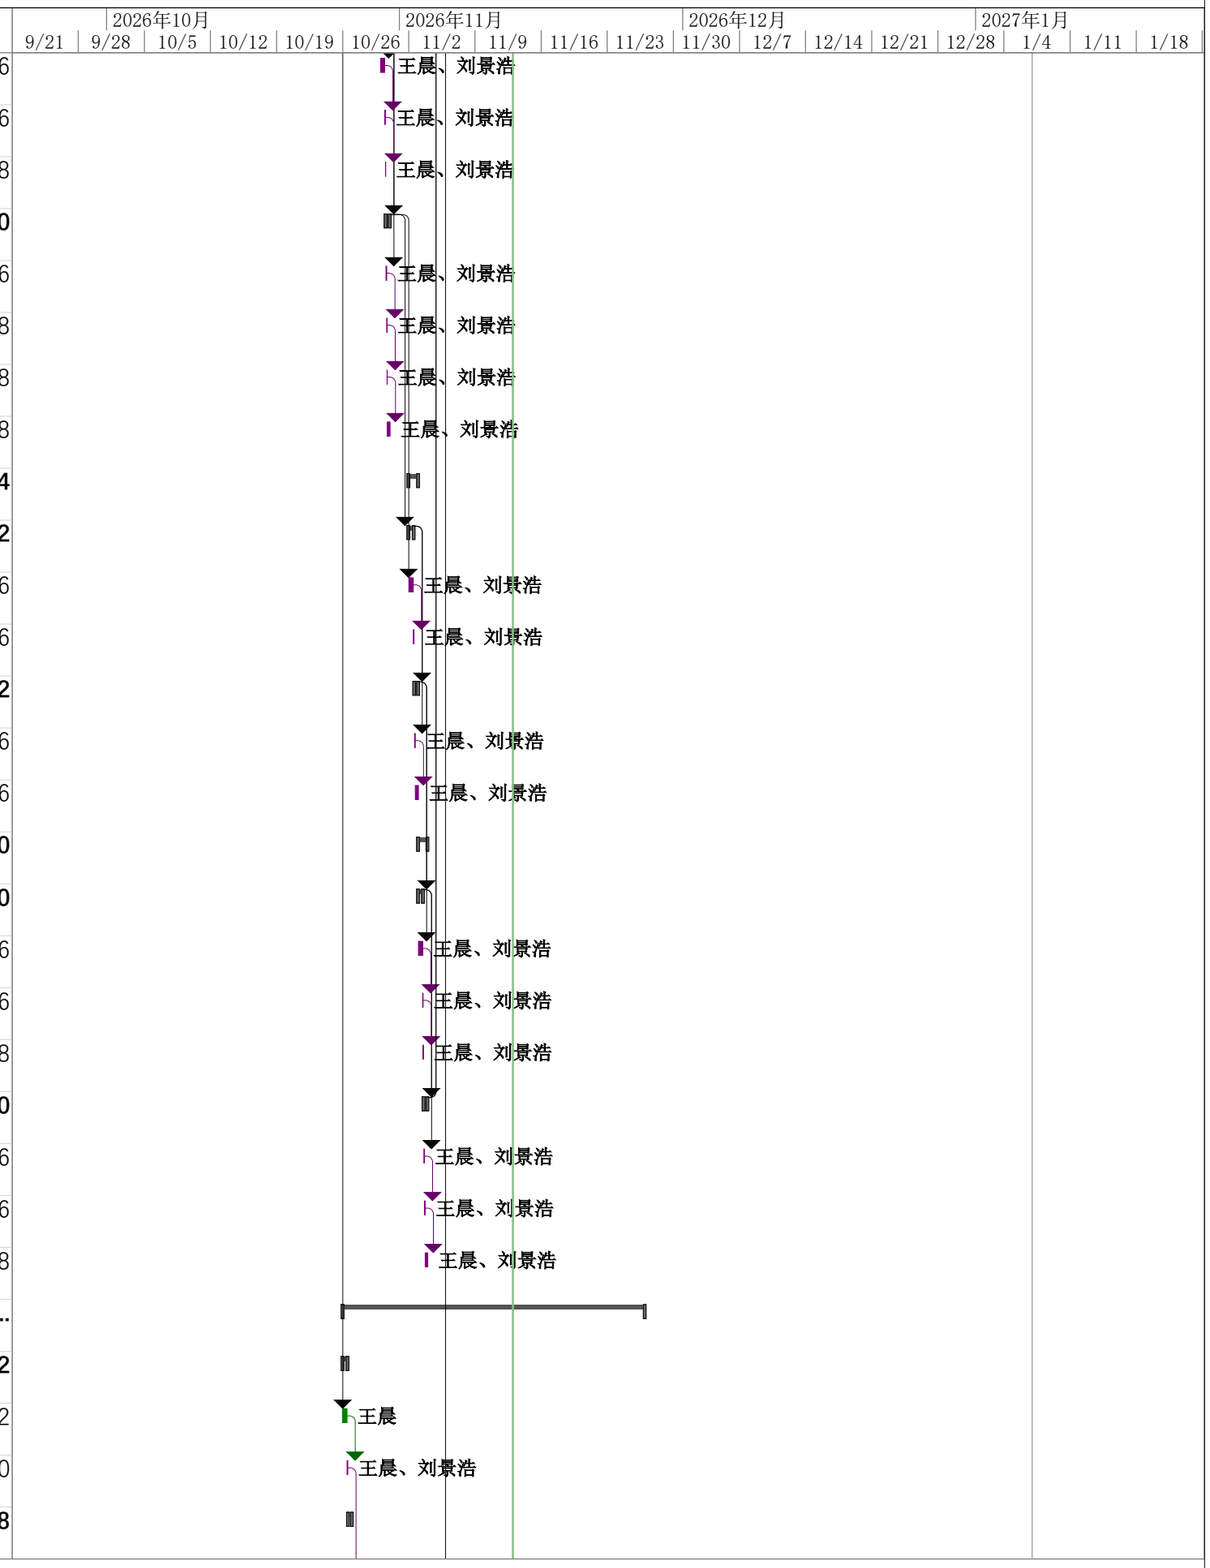


WBS	名称	计划人时	开始时间	完成时间	前置任务	任务负责人	成本
4.2.1	4.2.1 整理三方案流程与物理元素	1.25人时	26/10/26	26/10/26	148	王晨、刘景浩	¥57.20
4.2.2	4.2.2 估算成本和效益	0.75人时	26/10/26	26/10/26	150	王晨	¥34.32
4.2.3	4.2.3 编制候选实现进度	1人时	26/10/26	26/10/26	151	王晨、刘景浩	¥45.76
4.3	**4.3 推荐最佳方案**	**1.25人时**	**26/10/27**	**26/10/27**		**王晨、刘景浩**	**¥57.20**
4.3.1	4.3.1 推荐方案并记录取舍	1.25人时	26/10/27	26/10/27	152	王晨、刘景浩	¥57.20
4.4	**4.4 按DFD分解功能与过程**	**3人时**	**26/10/27**	**26/10/27**		**王晨、刘景浩**	**¥137.28**
4.4.1	4.4.1 逐项追踪18个DFD处理	1.25人时	26/10/27	26/10/27	154	王晨	¥57.20
4.4.2	4.4.2 拆分四条复杂过程与交接	1.75人时	26/10/27	26/10/27	156	王晨、刘景浩	¥80.08
4.5	**4.5 按数据流五步设计软件结构**	**8.25人时**	**26/10/28**	**26/10/29**		**王晨、刘景浩**	**¥377.52**
4.5.1	4.5.1 精化公开阅读和管理数据流	1人时	26/10/28	26/10/28	157	王晨	¥45.76
4.5.2	4.5.2 判定流类型与输入输出边界	0.75人时	26/10/28	26/10/28	159	王晨	¥34.32
4.5.3	4.5.3 完成变换与事务结构映射	2.75人时	26/10/28	26/10/28	160	王晨、刘景浩	¥125.84
4.5.4	4.5.4 用设计原理与启发规则精化	1.75人时	26/10/29	26/10/29	161	王晨、刘景浩	¥80.08
4.5.5	4.5.5 导出接口和数据并复查	2人时	26/10/29	26/10/29	162	王晨、刘景浩	¥91.52
4.6	**4.6 设计并核对数据库**	**3.5人时**	**26/10/28**	**26/10/29**		**王晨、刘景浩**	**¥160.16**
4.6.1	4.6.1 核对逻辑实体与物理关系	1.5人时	26/10/28	26/10/28	157	王晨	¥68.64
4.6.2	4.6.2 核对迁移、字段、约束与索引	2人时	26/10/29	26/10/29	165	王晨、刘景浩	¥91.52
4.7	**4.7 制定三级测试计划**	**3.5人时**	**26/11/2**	**26/11/2**		**王晨、刘景浩**	**¥160.16**
4.7.1	4.7.1 编制三级测试策略与方案	1.75人时	26/11/2	26/11/2	163,166	王晨、刘景浩	¥80.08
4.7.2	4.7.2 编制预期结果、取证与进度	1.75人时	26/11/2	26/11/2	168	王晨、刘景浩	¥80.08
4.8	**4.8 汇编总体设计与五份配套文档**	**6.5人时**	**26/11/3**	**26/11/4**		**王晨、刘景浩**	**¥297.44**
4.8.1	4.8.1 汇编系统说明与用户手册	1.75人时	26/11/3	26/11/3	163	王晨、刘景浩	¥80.08
4.8.2	4.8.2 汇编测试计划与数据库设计结果	1.75人时	26/11/3	26/11/3	169,166	王晨、刘景浩	¥80.08
4.8.3	4.8.3 汇编详细实现计划	1.25人时	26/11/4	26/11/4	172	王晨、刘景浩	¥57.20
4.8.4	4.8.4 统稿总体设计并核对配套材料	1.75人时	26/11/4	26/11/4	171,173	王晨、刘景浩	¥80.08
4.9	**4.9 技术审查与管理复审**	**3.75人时**	**26/11/5**	**26/11/5**		**王晨、刘景浩**	**¥171.60**
4.9.1	4.9.1 技术审查并登记问题	2人时	26/11/5	26/11/5	174,107	王晨、刘景浩	¥91.52
4.9.2	4.9.2 管理复审与内部基线交接	1.75人时	26/11/5	26/11/5	176	王晨、刘景浩	¥80.08
4.10	**4.10 业务过程、判定和复杂度设计**	**4.25人时**	**26/11/9**	**26/11/10**		**王晨、刘景浩**	**¥194.48**

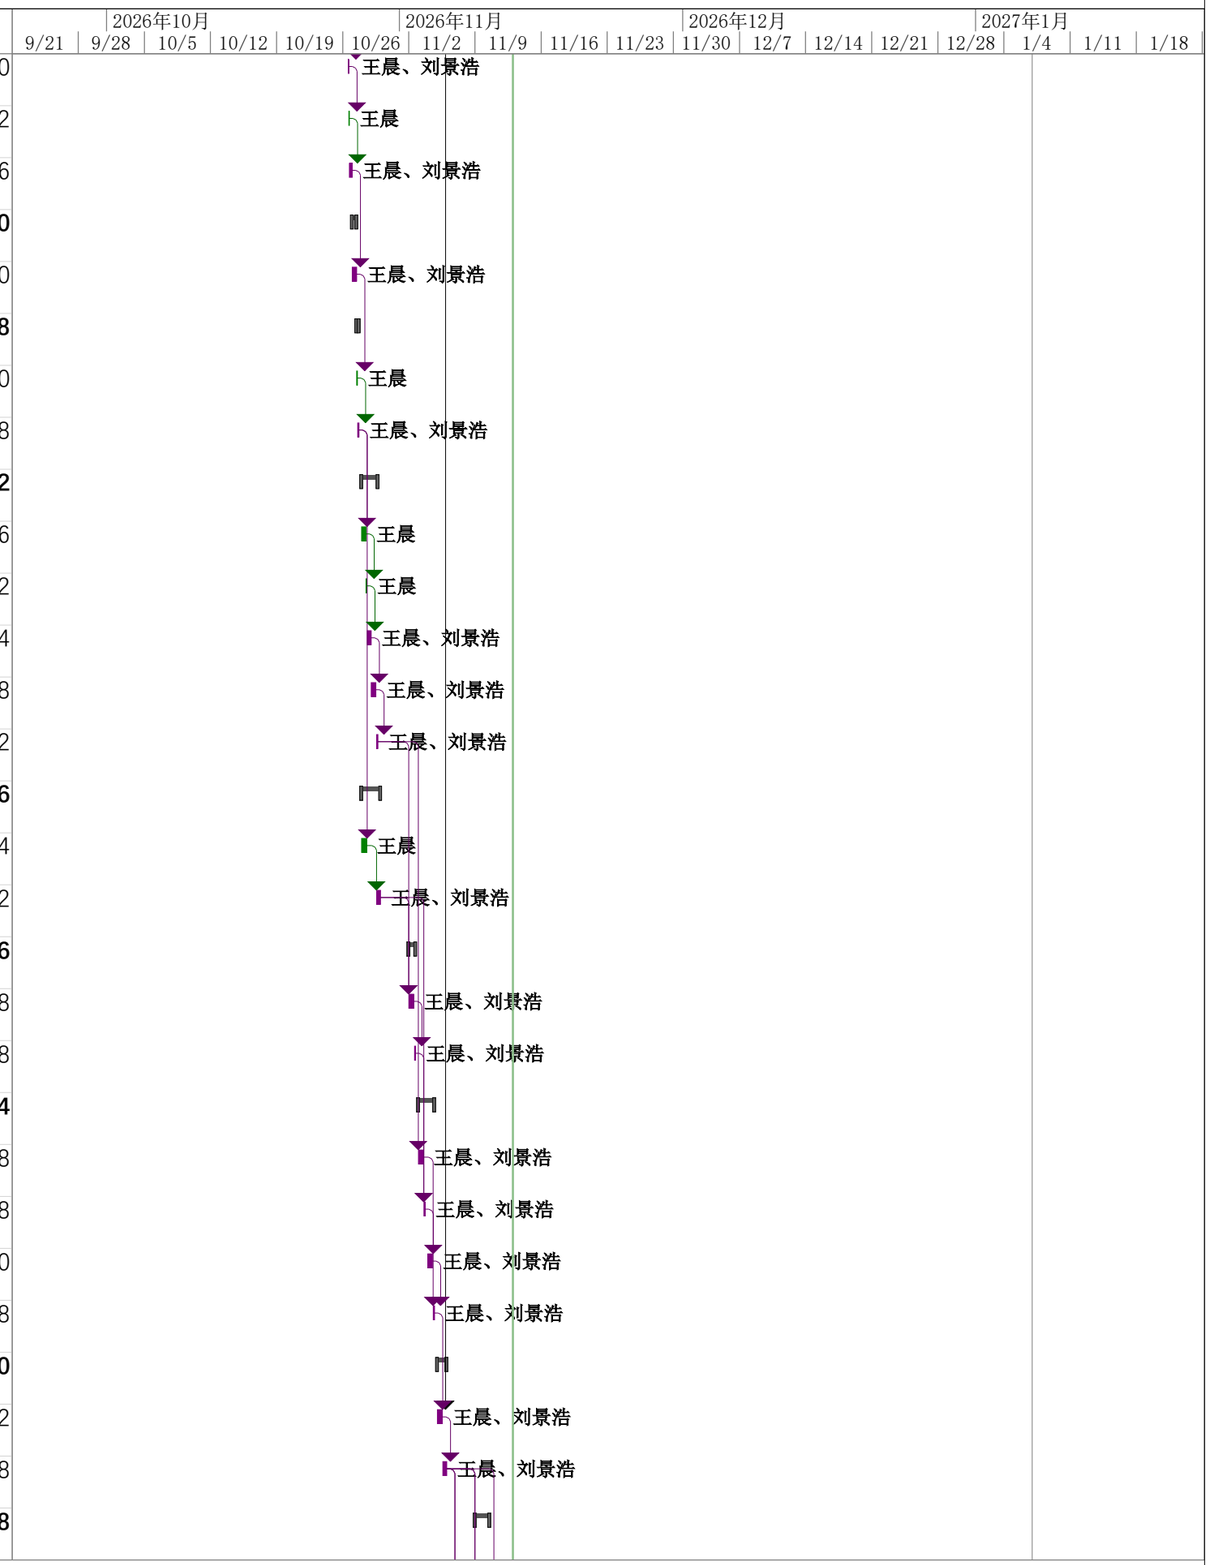


WBS	名称	计划人时	开始时间	完成时间	前置任务	任务负责人	成本
4.10.1	4.10.1 细化认证与发布状态和过程	1.75人时	26/11/9	26/11/9	177	王晨	¥80.08
4.10.2	4.10.2 细化账本及治理并计算复杂度	2.5人时	26/11/10	26/11/10	179	王晨、刘景浩	¥114.40
4.11	**4.11 双端人机界面与交互详细设计**	**4.25人时**	**26/11/9**	**26/11/10**		**王晨、刘景浩**	**¥194.48**
4.11.1	4.11.1 细化小程序和网页交互	2人时	26/11/9	26/11/9	177	刘景浩	¥91.52
4.11.2	4.11.2 细化图片、草稿和跨端冲突	2.25人时	26/11/10	26/11/10	182	王晨、刘景浩	¥102.96
4.12	**4.12 独立运维与备份恢复详细设计**	**4.5人时**	**26/11/11**	**26/11/11**		**王晨、刘景浩**	**¥205.92**
4.12.1	4.12.1 细化独立运维授权与任务状态	2.25人时	26/11/11	26/11/11	177	王晨、刘景浩	¥102.96
4.12.2	4.12.2 细化备份结构、恢复和回退	2.25人时	26/11/11	26/11/11	185	王晨、刘景浩	¥102.96
4.13	**4.13 三级用例、数据和详细设计复核**	**8人时**	**26/11/12**	**26/11/13**		**王晨、刘景浩**	**¥366.08**
4.13.1	4.13.1 编制单元与白盒用例	2.75人时	26/11/12	26/11/12	180,183,18	王晨、刘景浩	¥125.84
4.13.2	4.13.2 编制集成系统用例与数据	3.25人时	26/11/12	26/11/12	188	王晨、刘景浩	¥148.72
4.13.3	4.13.3 详细设计与测试用例交叉复核	2人时	26/11/13	26/11/13	189	王晨、刘景浩	¥91.52
4.14	**4.14 设计评审反馈与修订交接**	**8.5人时**	**26/11/20**	**26/11/26**		**王晨、刘景浩**	**¥388.96**
4.14.1	4.14.1 整理提交前设计修订	2人时	26/11/20	26/11/20	190	王晨、刘景浩	¥91.52
4.14.2	4.14.2 登记课堂设计意见及影响	1.5人时	26/11/25	26/11/25	192	王晨、刘景浩	¥68.64
4.14.3	4.14.3 分模块修订设计与测试	3人时	26/11/26	26/11/26	193	王晨、刘景浩	¥137.28
4.14.4	4.14.4 交叉复核并交接联调	2人时	26/11/26	26/11/26	194	王晨、刘景浩	¥91.52
5	**5 编码与单元测试**	**61.3人时**	**26/11/6**	**26/11/27**		**按下级分配**	**¥2,80...**
5.1	**5.1 项目骨架、配置与接口约定**	**1.8人时**	**26/11/6**	**26/11/6**		**王晨**	**¥82.37**
5.1.1	5.1.1 搭建模块骨架与环境配置	0.8人时	26/11/6	26/11/6	177	王晨	¥36.61
5.1.2	5.1.2 核对共享接口和错误格式	1人时	26/11/6	26/11/6	198	王晨	¥45.76
5.2	**5.2 登录、邮箱与材料认证**	**3人时**	**26/11/9**	**26/11/10**		**王晨**	**¥137.28**
5.2.1	5.2.1 实现登录与校园邮箱验证	1.5人时	26/11/9	26/11/9	199	王晨	¥68.64
5.2.2	5.2.2 实现材料认证接口和角色限制	1.5人时	26/11/10	26/11/10	201	王晨	¥68.64
5.3	**5.3 文章存储、岗位检索与筛选接口**	**2人时**	**26/11/11**	**26/11/13**		**王晨**	**¥91.52**
5.3.1	5.3.1 实现文章图片、草稿存储接口	1人时	26/11/11	26/11/11	202	王晨	¥45.76
5.3.2	5.3.2 实现岗位专业公司筛选与分页	1人时	26/11/12	26/11/13	204	王晨	¥45.76
5.4	**5.4 小程序与网页阅读页面**	**5.5人时**	**26/11/6**	**26/11/10**		**刘景浩**	**¥251.68**
5.4.1	5.4.1 实现双端筛选与阅读界面	3.5人时	26/11/6	26/11/6	177	刘景浩	¥160.16

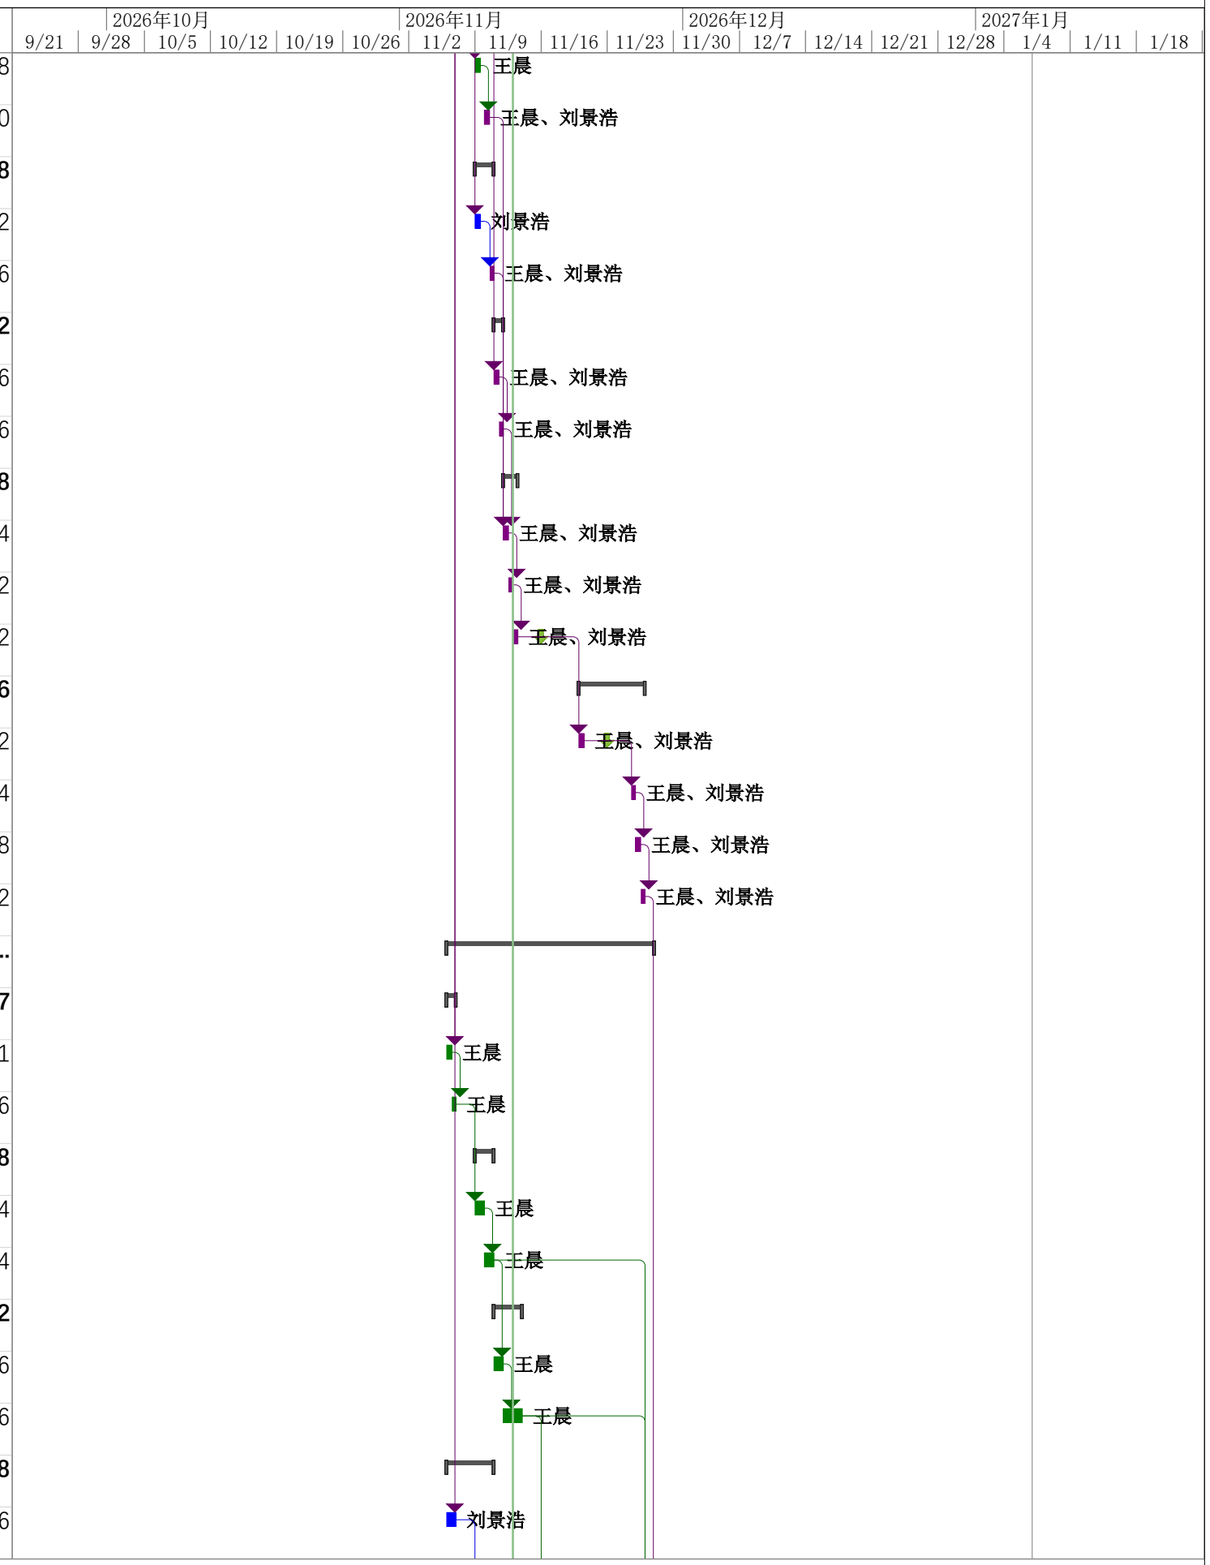


WBS	名称	计划人时	开始时间	完成时间	前置任务	任务负责人	成本
5.4.2	5.4.2 核对游客状态、失败和空结果	2人时	26/11/9	26/11/10	207	刘景浩	¥91.52
5.5	**5.5 网页Markdown创作与草稿**	**5.5人时**	**26/11/11**	**26/11/13**		**刘景浩**	**¥251.68**
5.5.1	5.5.1 实现Markdown、图片和资料链接	3.5人时	26/11/11	26/11/11	208	刘景浩	¥160.16
5.5.2	5.5.2 实现预览、保存与草稿恢复	2人时	26/11/12	26/11/13	210	刘景浩	¥91.52
5.6	**5.6 小程序文字与图片创作**	**5.5人时**	**26/11/16**	**26/11/17**		**王晨**	**¥251.68**
5.6.1	5.6.1 实现移动图文编辑和上传	3.5人时	26/11/16	26/11/16	205	王晨	¥160.16
5.6.2	5.6.2 实现移动草稿保存及恢复	2人时	26/11/17	26/11/17	213	王晨	¥91.52
5.7	**5.7 双端草稿、发布与文章管理**	**5.5人时**	**26/11/18**	**26/11/19**		**王晨**	**¥251.68**
5.7.1	5.7.1 实现发布、修改、下架和恢复接口	3.5人时	26/11/18	26/11/18	214,211	王晨	¥160.16
5.7.2	5.7.2 接通双端作者文章管理	2人时	26/11/19	26/11/19	216	王晨	¥91.52
5.8	**5.8 评论、点赞、投币、收藏与荣誉**	**5.5人时**	**26/11/20**	**26/11/24**		**王晨**	**¥251.68**
5.8.1	5.8.1 实现主页、评论图片及收藏交流	3.5人时	26/11/20	26/11/20	217	王晨	¥160.16
5.8.2	5.8.2 实现点赞、领取投币、荣誉排序与通知	2人时	26/11/23	26/11/24	219	王晨	¥91.52
5.9	**5.9 社区审核、反馈与举报网页**	**5.5人时**	**26/11/16**	**26/11/18**		**刘景浩**	**¥251.68**
5.9.1	5.9.1 实现认证审核与举报反馈处理接口	3.5人时	26/11/16	26/11/16	211	刘景浩	¥160.16
5.9.2	5.9.2 实现社区管理网页并联调	2人时	26/11/17	26/11/18	222	刘景浩	¥91.52
5.10	**5.10 独立运维执行与备份服务**	**6.5人时**	**26/11/19**	**26/11/23**		**刘景浩**	**¥297.44**
5.10.1	5.10.1 实现独立运维任务执行服务	4人时	26/11/19	26/11/19	223	刘景浩	¥183.04
5.10.2	5.10.2 实现部署重启、备份恢复及失败保护	2.5人时	26/11/20	26/11/23	225	刘景浩	¥114.40
5.11	**5.11 运维网页、状态与操作记录**	**6.5人时**	**26/11/24**	**26/11/25**		**刘景浩**	**¥297.44**
5.11.1	5.11.1 实现运维状态、日志和备份列表	4人时	26/11/24	26/11/24	226	刘景浩	¥183.04
5.11.2	5.11.2 联调网页部署重启与备份恢复	2.5人时	26/11/25	26/11/25	228	刘景浩	¥114.40
5.12	**5.12 联调、代码用例证据与候选版本**	**8.5人时**	**26/11/27**	**26/11/27**		**王晨、刘景浩**	**¥388.96**
5.12.1	5.12.1 联通真实接口与跨端链路	3.5人时	26/11/27	26/11/27	195,202,20	王晨、刘景浩	¥160.16
5.12.2	5.12.2 复核程序清单、代码走查和单元结果	2.5人时	26/11/27	26/11/27	231	王晨、刘景浩	¥114.40
5.12.3	5.12.3 封存代码清单、用例与实现证据	2.5人时	26/11/27	26/11/27	232	王晨、刘景浩	¥114.40
6	**6 综合测试**	**37.25人时**	**26/11/30**	**26/12/8**		**按下级分配**	**¥1,70...**
6.1	**6.1 核心系统及真实MySQL集成测试**	**5.25人时**	**26/11/30**	**26/12/1**		**王晨、刘景浩**	**¥240.24**
6.1.1	6.1.1 执行核心系统场景与角色流程	2.5人时	26/11/30	26/11/30	233	王晨、刘景浩	¥114.40

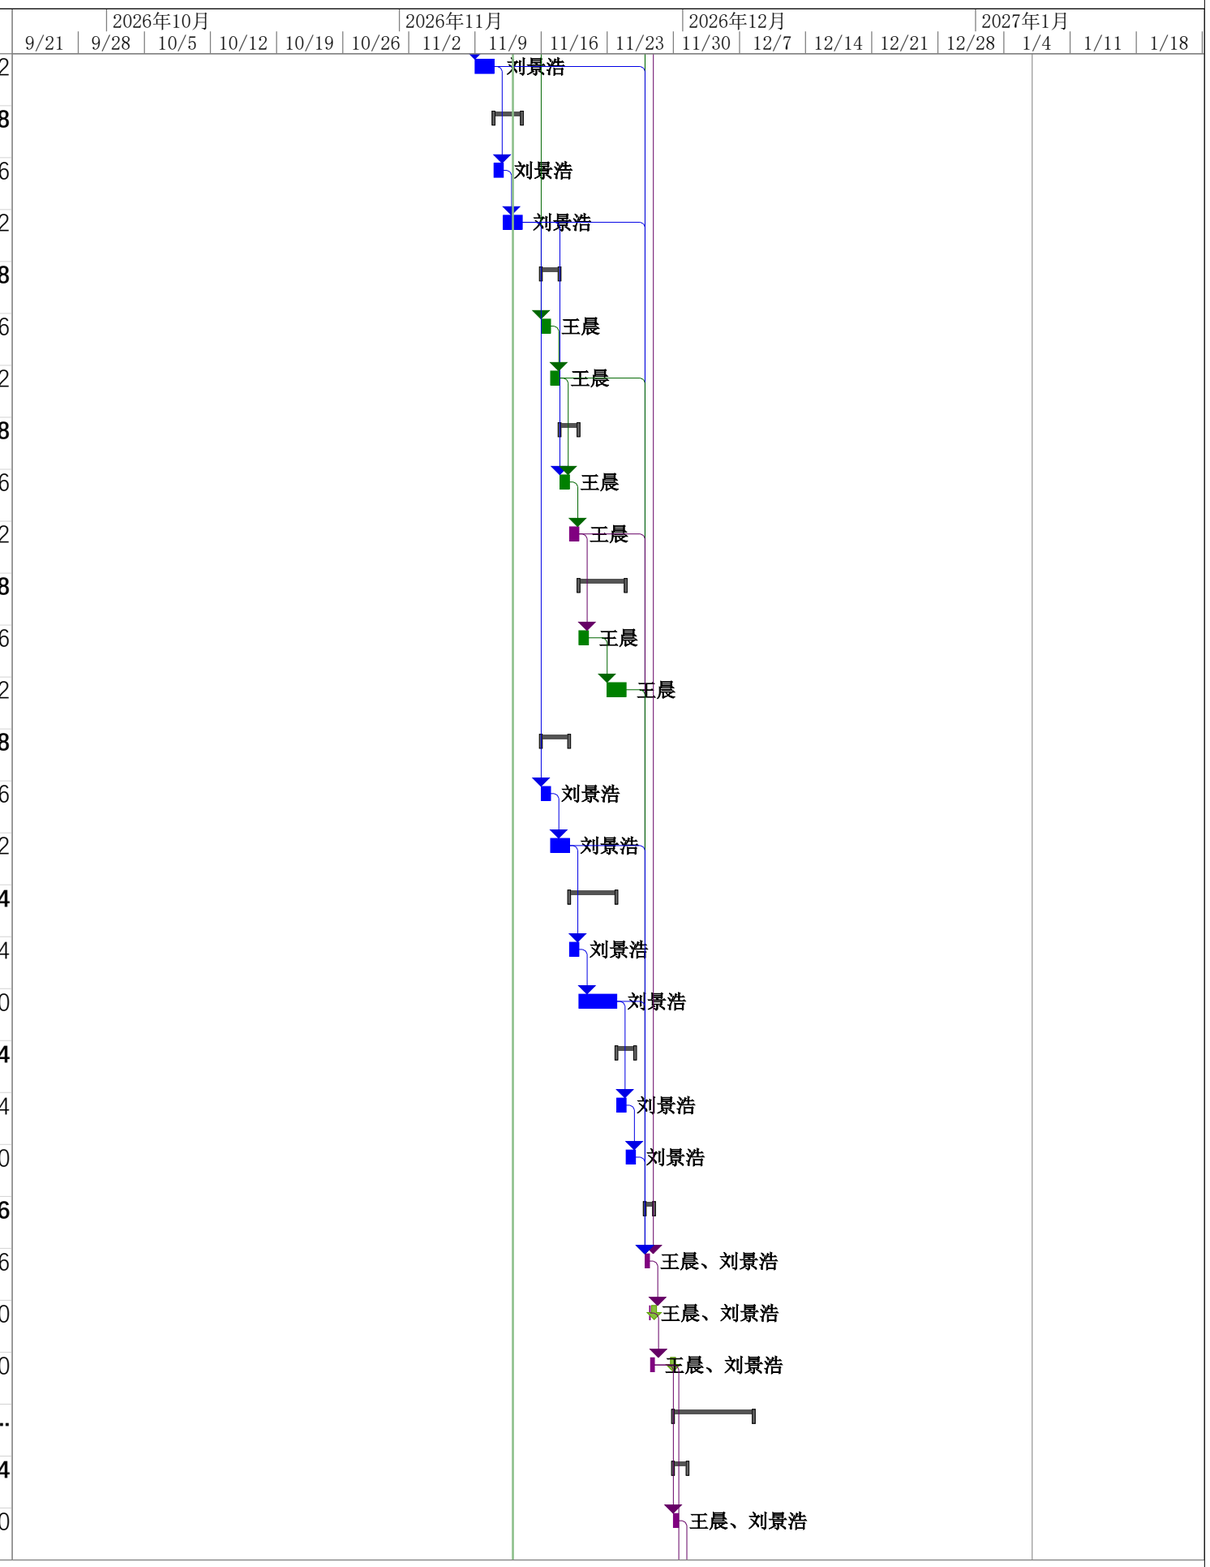


WBS	名称	计划人时	开始时间	完成时间	前置任务	任务负责人	成本
6.1.2	6.1.2 执行真实MySQL和接口集成	2.75人时	26/12/1	26/12/1	236	王晨、刘景浩	¥125.84
6.2	**6.2 正常负载与性能指标**	**3.25人时**	**26/11/30**	**26/12/1**		**王晨**	**¥148.72**
6.2.1	6.2.1 固定环境执行30并发负载	2人时	26/11/30	26/11/30	233	王晨	¥91.52
6.2.2	6.2.2 分析常规负载并核对阈值	1.25人时	26/12/1	26/12/1	239	王晨	¥57.20
6.3	**6.3 压力、稳定性及降载恢复**	**3.75人时**	**26/12/2**	**26/12/2**		**王晨**	**¥171.60**
6.3.1	6.3.1 执行阶梯压力与边界探测	1.75人时	26/12/2	26/12/2	240	王晨	¥80.08
6.3.2	6.3.2 执行稳定性与降载恢复	2人时	26/12/2	26/12/2	242	王晨	¥91.52
6.4	**6.4 权限、双端兼容及目标环境**	**5.75人时**	**26/12/2**	**26/12/3**		**王晨、刘景浩**	**¥263.12**
6.4.1	6.4.1 验证角色隔离与隐私	2人时	26/12/2	26/12/2	237	王晨、刘景浩	¥91.52
6.4.2	6.4.2 验证双端浏览、编辑及图片	2人时	26/12/2	26/12/2	245	刘景浩	¥91.52
6.4.3	6.4.3 核对实际使用设备与网络	1.75人时	26/12/3	26/12/3	246	刘景浩	¥80.08
6.5	**6.5 部署、停机与备份恢复**	**5人时**	**26/12/3**	**26/12/3**		**王晨、刘景浩**	**¥228.80**
6.5.1	6.5.1 验证冷启动与停机运维入口	2.25人时	26/12/3	26/12/3	243	王晨、刘景浩	¥102.96
6.5.2	6.5.2 验证隔离恢复和损坏备份拒绝	2.75人时	26/12/3	26/12/3	249	王晨、刘景浩	¥125.84
6.6	**6.6 缺陷处理、复测和回归**	**5.25人时**	**26/12/3**	**26/12/4**		**王晨、刘景浩**	**¥240.24**
6.6.1	6.6.1 按模块处理已登记缺陷	2.75人时	26/12/3	26/12/3	247,243	王晨、刘景浩	¥125.84
6.6.2	6.6.2 复测缺陷并执行关键回归	2.5人时	26/12/4	26/12/4	252,250	王晨、刘景浩	¥114.40
6.7	**6.7 用户走查、内部验收及报告封版**	**4.75人时**	**26/12/4**	**26/12/4**		**王晨、刘景浩**	**¥217.36**
6.7.1	6.7.1 组织目标用户走查与反馈登记	1.75人时	26/12/4	26/12/4	253,247	王晨、刘景浩	¥80.08
6.7.2	6.7.2 内部验收并封版系统测试报告	3人时	26/12/4	26/12/4	255	王晨、刘景浩	¥137.28
6.8	**6.8 测试报告复核及课堂说明**	**4.25人时**	**26/12/7**	**26/12/8**		**王晨、刘景浩**	**¥194.48**
6.8.1	6.8.1 复核报告与证据链	2.25人时	26/12/7	26/12/7	256	王晨、刘景浩	¥102.96
6.8.2	6.8.2 整理课堂说明和测试修订	2人时	26/12/8	26/12/8	258	王晨、刘景浩	¥91.52
7	**7 部署与维护**	**15人时**	**26/12/9**	**26/12/17**		**按下级分配**	**¥686.40**
7.1	**7.1 安装包、用户与维护说明**	**3人时**	**26/12/9**	**26/12/10**		**王晨**	**¥137.28**
7.1.1	7.1.1 整理安装、用户及管理操作说明	1.5人时	26/12/9	26/12/9	259	王晨	¥68.64
7.1.2	7.1.2 整理运维、恢复与故障维护规程	1.5人时	26/12/10	26/12/10	262	王晨	¥68.64
7.2	**7.2 干净环境启动与课堂演示**	**3人时**	**26/12/11**	**26/12/11**		**王晨**	**¥137.28**
7.2.1	7.2.1 在干净配置核对冷启动	1.5人时	26/12/11	26/12/11	263	王晨	¥68.64

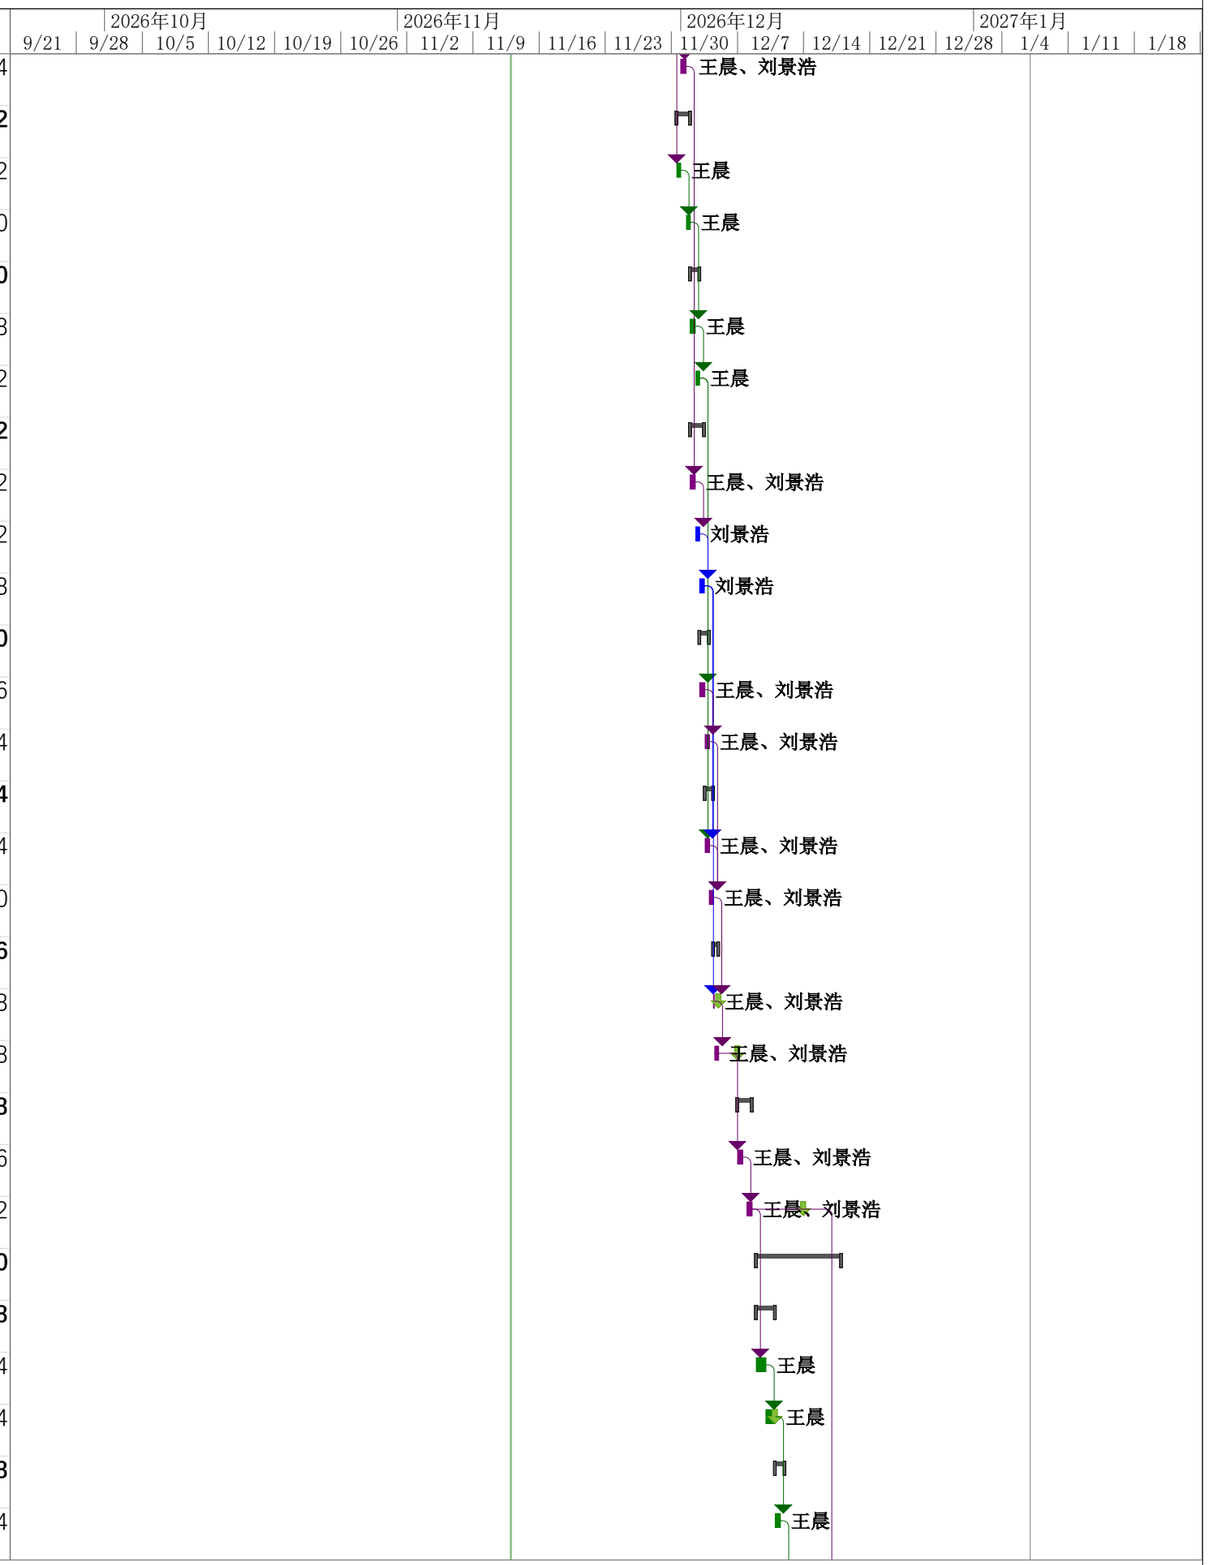


WBS	名称	计划人时	开始时间	完成时间	前置任务	任务负责人	成本
7.2.2	7.2.2 核对演示数据、认证与外网失败回退	1.5人时	26/12/11	26/12/11	265	王晨	¥68.64
7.3	**7.3 维护申请与变更演练**	**3人时**	**26/12/14**	**26/12/14**		**刘景浩**	**¥137.28**
7.3.1	7.3.1 登记维护申请和影响分析	1.5人时	26/12/14	26/12/14	266	刘景浩	¥68.64
7.3.2	7.3.2 执行修改回退及回归演练	1.5人时	26/12/14	26/12/14	268	刘景浩	¥68.64
7.4	**7.4 运维交接与反馈整改**	**3人时**	**26/12/15**	**26/12/15**		**王晨**	**¥137.28**
7.4.1	7.4.1 核对备份、配置与维护资料	1.5人时	26/12/15	26/12/15	269	王晨	¥68.64
7.4.2	7.4.2 双方练习操作并确认交接	1.5人时	26/12/15	26/12/15	271	王晨	¥68.64
7.5	**7.5 课堂测试评审意见处理**	**3人时**	**26/12/17**	**26/12/17**		**刘景浩**	**¥137.28**
7.5.1	7.5.1 登记12月16日测试评审意见	1.5人时	26/12/17	26/12/17	259	刘景浩	¥68.64
7.5.2	7.5.2 修订报告及相关实现用例	1.5人时	26/12/17	26/12/17	274	刘景浩	¥68.64
8	**8 总结与收尾**	**16.8人时**	**26/12/18**	**27/1/6**		**按下级分配**	**¥768.77**
8.1	**8.1 项目总结与计划偏差分析**	**3.6人时**	**26/12/18**	**26/12/21**		**王晨、刘景浩**	**¥164.74**
8.1.1	8.1.1 共同核对计划实际与阶段成果	1.8人时	26/12/18	26/12/18	272,275	王晨、刘景浩	¥82.37
8.1.2	8.1.2 共同总结偏差风险和协作贡献	1.8人时	26/12/21	26/12/21	278	王晨、刘景浩	¥82.37
8.2	**8.2 总评材料与详细计划附录**	**3人时**	**26/12/22**	**26/12/23**		**王晨**	**¥137.28**
8.2.1	8.2.1 整理总评PPT资料和详细周计划	1.5人时	26/12/22	26/12/22	279	王晨	¥68.64
8.2.2	8.2.2 核对引用、图表与交付目录	1.5人时	26/12/23	26/12/23	281	王晨	¥68.64
8.3	**8.3 最终验收与汇报演练**	**3.6人时**	**26/12/24**	**26/12/24**		**王晨、刘景浩**	**¥164.74**
8.3.1	8.3.1 共同执行交付清单核查	1.8人时	26/12/24	26/12/24	282	王晨、刘景浩	¥82.37
8.3.2	8.3.2 共同预演并确认提交版本	1.8人时	26/12/24	26/12/24	284	王晨、刘景浩	¥82.37
8.4	**8.4 总评反馈处理与归档**	**3人时**	**26/12/31**	**27/1/4**		**王晨**	**¥137.28**
8.4.1	8.4.1 处理总评意见并准备提交基线	1.5人时	26/12/31	26/12/31	285	王晨	¥68.64
8.4.2	8.4.2 核对提交后尾项与最终归档	1.5人时	27/1/4	27/1/4	287	王晨	¥68.64
8.5	**8.5 课程收尾与交付确认**	**3.6人时**	**27/1/6**	**27/1/6**		**王晨、刘景浩**	**¥164.74**
8.5.1	8.5.1 共同核对课程收尾材料	1.8人时	27/1/6	27/1/6	288	王晨、刘景浩	¥82.37
8.5.2	8.5.2 共同确认交付与后续维护边界	1.8人时	27/1/6	27/1/6	290	王晨、刘景浩	¥82.37
M	**M 持续项目管理与交叉复核**	**27.65人时**	**26/10/8**	**27/1/6**		**按下级分配**	**¥1,26...**
M01	M01 周进度风险与评审提交管理	0.85人时	26/10/8	26/10/9		王晨	¥38.90
M02	M02 周进度风险与评审提交管理	0.85人时	26/10/12	26/10/16		王晨	¥38.90

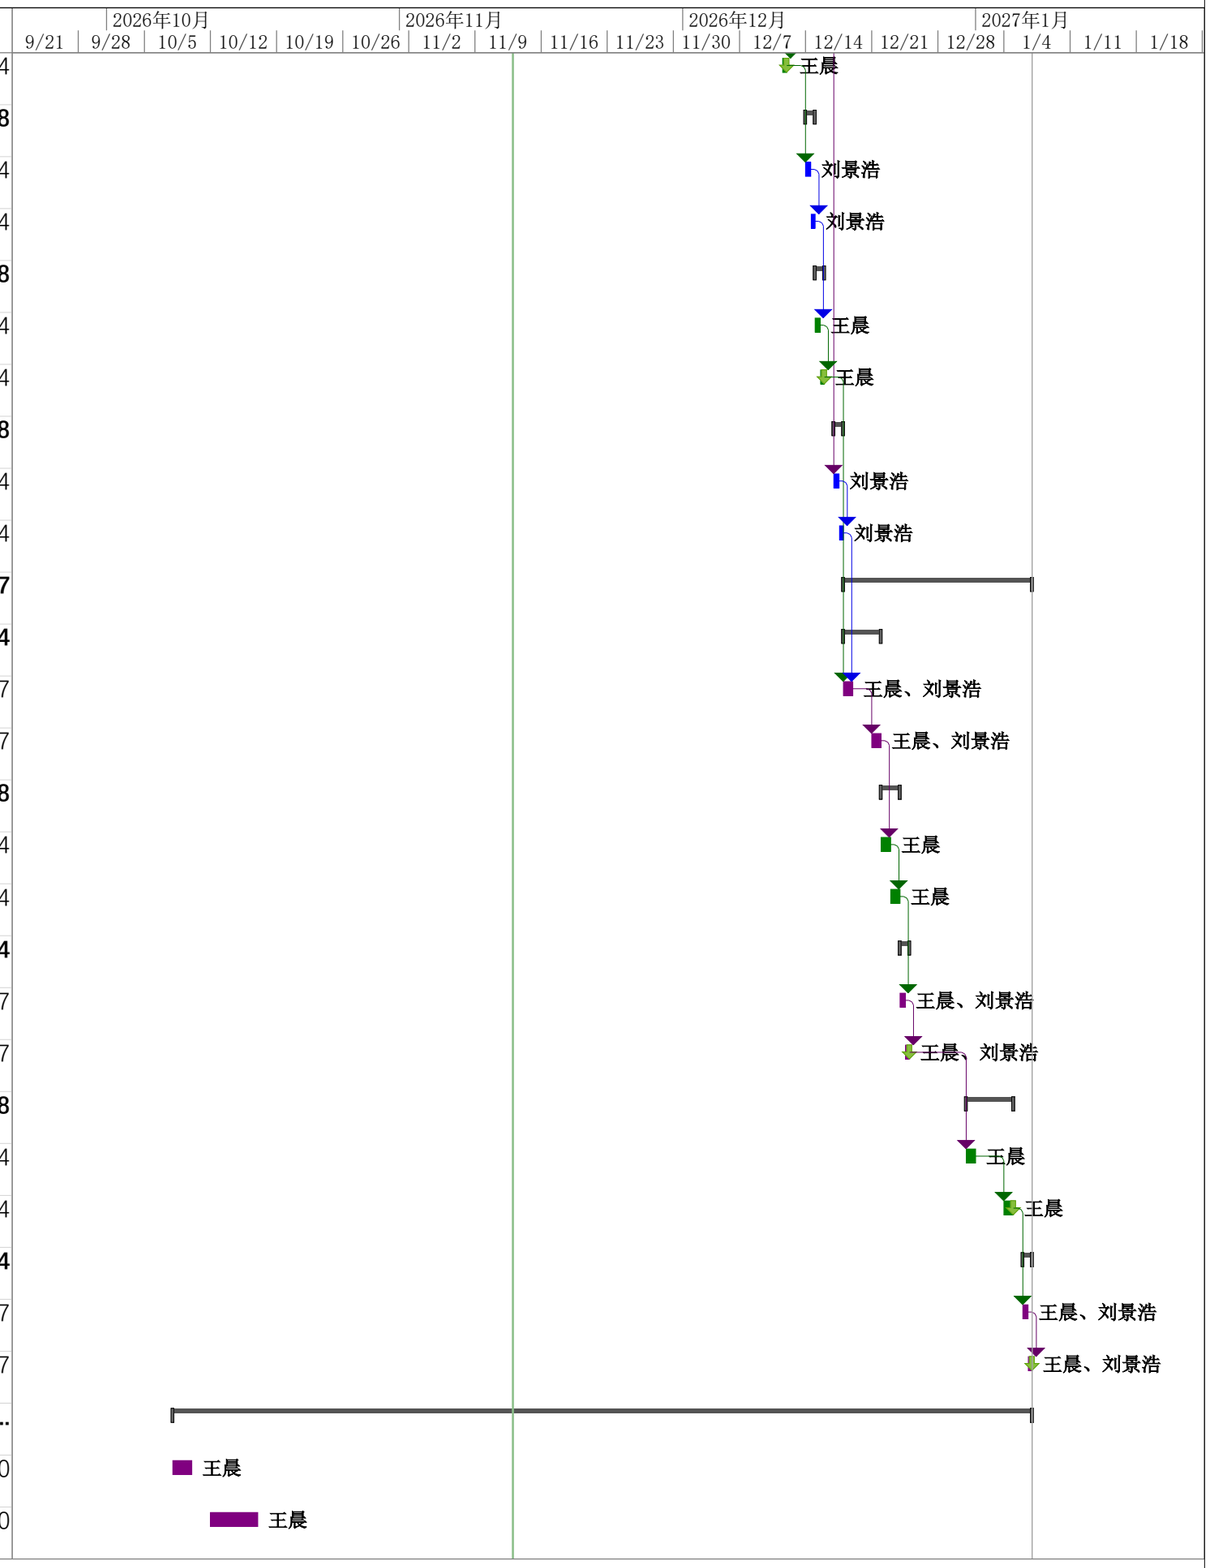

WBS	名称	计划人时	开始时间	完成时间	前置任务	任务负责人	成本
M03	M03 周进度风险与评审提交管理	0.85人时	26/10/19	26/10/23		王晨	¥38.90
M04	M04 周进度风险与评审提交管理	0.85人时	26/10/26	26/10/30		王晨	¥38.90
M05	M05 周进度风险与评审提交管理	0.85人时	26/11/2	26/11/6		王晨	¥38.90
M06	M06 周进度风险与评审提交管理	0.85人时	26/11/9	26/11/13		王晨	¥38.90
M07	M07 周进度风险与评审提交管理	0.85人时	26/11/16	26/11/20		王晨	¥38.90
M08	M08 周进度风险与评审提交管理	0.85人时	26/11/23	26/11/27		王晨	¥38.90
M09	M09 周进度风险与评审提交管理	0.85人时	26/11/30	26/12/4		王晨	¥38.90
M10	M10 周进度风险与评审提交管理	0.85人时	26/12/7	26/12/11		王晨	¥38.90
M11	M11 周进度风险与评审提交管理	0.85人时	26/12/14	26/12/18		王晨	¥38.90
M12	M12 周进度风险与评审提交管理	0.85人时	26/12/21	26/12/25		王晨	¥38.90
M13	M13 周进度风险与评审提交管理	0.85人时	26/12/28	26/12/31		王晨	¥38.90
M14	M14 周进度风险与评审提交管理	0.85人时	27/1/4	27/1/6		王晨	¥38.90
R2.1	R2.1 复核与交接 关键技术与工具可行性验证	0.45人时	26/10/8	26/10/12		刘景浩	¥20.59
R2.2	R2.2 复核与交接 经济、操作及内容供给分析	0.45人时	26/10/12	26/10/13		王晨	¥20.59
R3.2	R3.2 复核与交接 功能、数据与非功能需求	0.45人时	26/10/20	26/10/21		刘景浩	¥20.59
R3.3	R3.3 复核与交接 双端原型与场景核对	0.45人时	26/10/20	26/10/21		王晨	¥20.59
R3.5	R3.5 复核与交接 需求课堂评审反馈处理	0.45人时	26/11/4	26/11/4		王晨	¥20.59
R4.1	R4.1 复核与交接 系统架构、接口与数据库设计	0.45人时	26/10/26	26/10/28		刘景浩	¥20.59
R4.2	R4.2 复核与交接 认证、内容、激励与治理设计	0.45人时	26/10/29	26/10/30		刘景浩	¥20.59
R4.3	R4.3 复核与交接 双端浏览与创作详细设计	0.45人时	26/10/29	26/11/2		王晨	¥20.59
R4.4	R4.4 复核与交接 部署、备份与恢复详细设计	0.45人时	26/11/2	26/11/3		刘景浩	¥20.59
R4.6	R4.6 复核与交接 测试用例设计与数据准备	0.45人时	26/11/3	26/11/3		王晨	¥20.59
R5.1	R5.1 复核与交接 项目骨架、配置与接口约定	0.45人时	26/11/6	26/11/6		刘景浩	¥20.59
R5.2	R5.2 复核与交接 登录、邮箱与材料认证	0.45人时	26/11/9	26/11/10		刘景浩	¥20.59
R5.3	R5.3 复核与交接 文章存储、岗位检索与筛选接口	0.45人时	26/11/11	26/11/13		刘景浩	¥20.59
R5.4	R5.4 复核与交接 小程序与网页阅读页面	0.45人时	26/11/6	26/11/10		王晨	¥20.59
R5.5	R5.5 复核与交接 网页Markdown创作与草稿	0.45人时	26/11/11	26/11/13		王晨	¥20.59
R5.6	R5.6 复核与交接 小程序文字与图片创作	0.45人时	26/11/16	26/11/17		刘景浩	¥20.59
R5.7	R5.7 复核与交接 双端草稿、发布与文章管理	0.45人时	26/11/18	26/11/19		刘景浩	¥20.59

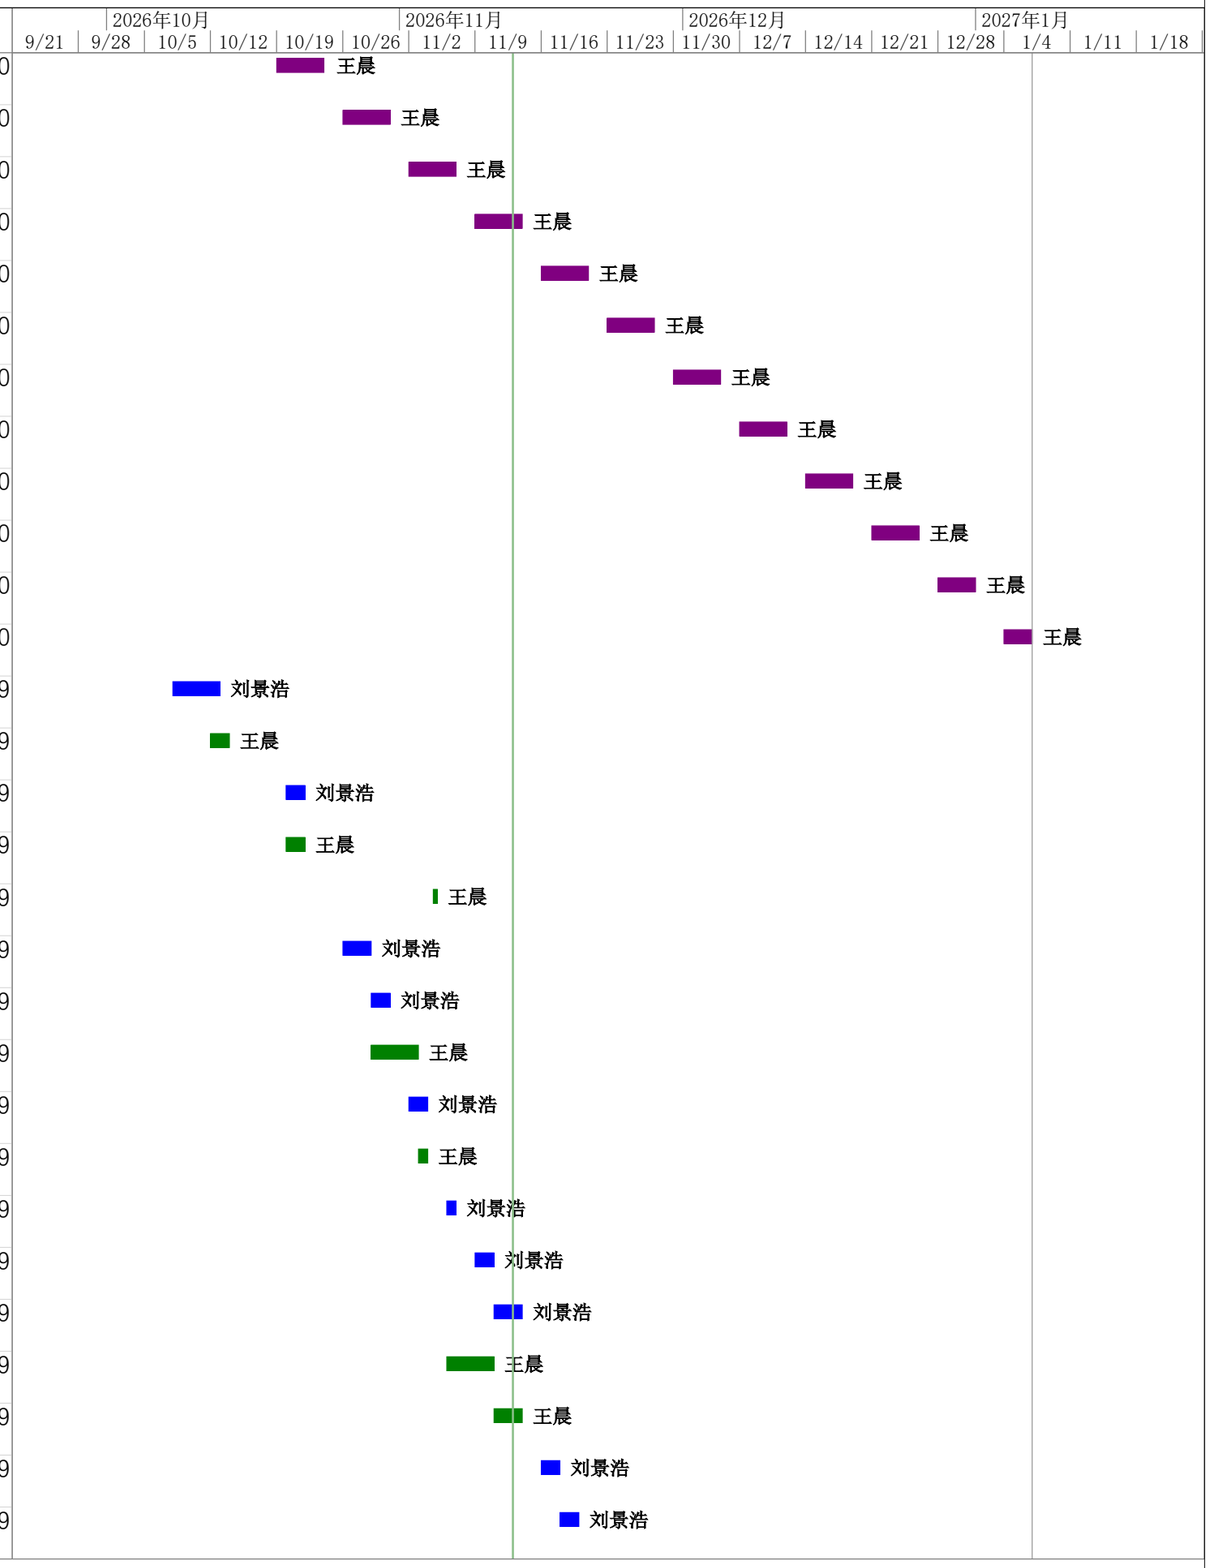

WBS	名称	计划人时	开始时间	完成时间	前置任务	任务负责人	成本
R5.8	R5.8 复核与交接 评论、点赞、投币、收藏与荣誉	0.45人时	26/11/20	26/11/24		刘景浩	¥20.59
R5.9	R5.9 复核与交接 社区审核、反馈与举报网页	0.45人时	26/11/16	26/11/18		王晨	¥20.59
R5.10	R5.10 复核与交接 独立运维执行与备份服务	0.45人时	26/11/19	26/11/23		王晨	¥20.59
R5.11	R5.11 复核与交接 运维网页、状态与操作记录	0.45人时	26/11/24	26/11/25		王晨	¥20.59
R6.1	R6.1 复核与交接 功能、接口与集成测试	0.45人时	26/11/30	26/12/1		王晨	¥20.59
R6.2	R6.2 复核与交接 性能与负载测试	0.45人时	26/11/30	26/12/1		刘景浩	¥20.59
R6.3	R6.3 复核与交接 压力与稳定性测试	0.45人时	26/12/2	26/12/2		刘景浩	¥20.59
R6.4	R6.4 复核与交接 安全权限与双端兼容测试	0.45人时	26/12/2	26/12/2		王晨	¥20.59
R6.5	R6.5 复核与交接 部署、故障与备份恢复验证	0.45人时	26/12/3	26/12/3		刘景浩	¥20.59
R6.6	R6.6 复核与交接 缺陷修复、复测与回归	0.45人时	26/12/3	26/12/4		王晨	¥20.59
R6.8	R6.8 复核与交接 测试报告复核与提交准备	0.45人时	26/12/7	26/12/8		刘景浩	¥20.59
R7.1	R7.1 复核与交接 安装包、用户与维护说明	0.45人时	26/12/9	26/12/10		刘景浩	¥20.59
R7.2	R7.2 复核与交接 干净环境启动与课堂演示	0.45人时	26/12/11	26/12/11		刘景浩	¥20.59
R7.3	R7.3 复核与交接 维护申请与变更演练	0.45人时	26/12/14	26/12/14		王晨	¥20.59
R7.4	R7.4 复核与交接 运维交接与反馈整改	0.45人时	26/12/15	26/12/15		刘景浩	¥20.59
R7.5	R7.5 复核与交接 课堂测试评审意见处理	0.45人时	26/12/17	26/12/17		王晨	¥20.59
R8.2	R8.2 复核与交接 总评材料与详细计划附录	0.45人时	26/12/22	26/12/23		刘景浩	¥20.59
R8.4	R8.4 复核与交接 总评反馈处理与归档	0.45人时	26/12/31	27/1/4		刘景浩	¥20.59
K	**K 课程里程碑**	**0人时**	**26/9/16**	**27/1/6**		**按下级分配**	**¥0.00**
K00	K00 课程启动与选题	0人时	26/9/16	26/9/16			¥0.00
K00A	K00A 预备作业与项目介绍	0人时	26/9/23	26/9/23			¥0.00
K00B	K00B 项目计划及 PPT	0人时	26/9/30	26/9/30			¥0.00
K01	K01 项目计划评审	0人时	26/10/14	26/10/14			¥0.00
K02	K02 可行性研究	0人时	26/10/21	26/10/21			¥0.00
K03	K03 需求分析与形式化说明	0人时	26/10/28	26/10/28			¥0.00
K04	K04 项目需求评审	0人时	26/11/4	26/11/4			¥0.00
K05	K05 总体设计	0人时	26/11/11	26/11/11			¥0.00
K06	K06 详细设计	0人时	26/11/18	26/11/18			¥0.00
K07	K07 项目设计评审	0人时	26/11/25	26/11/25			¥0.00

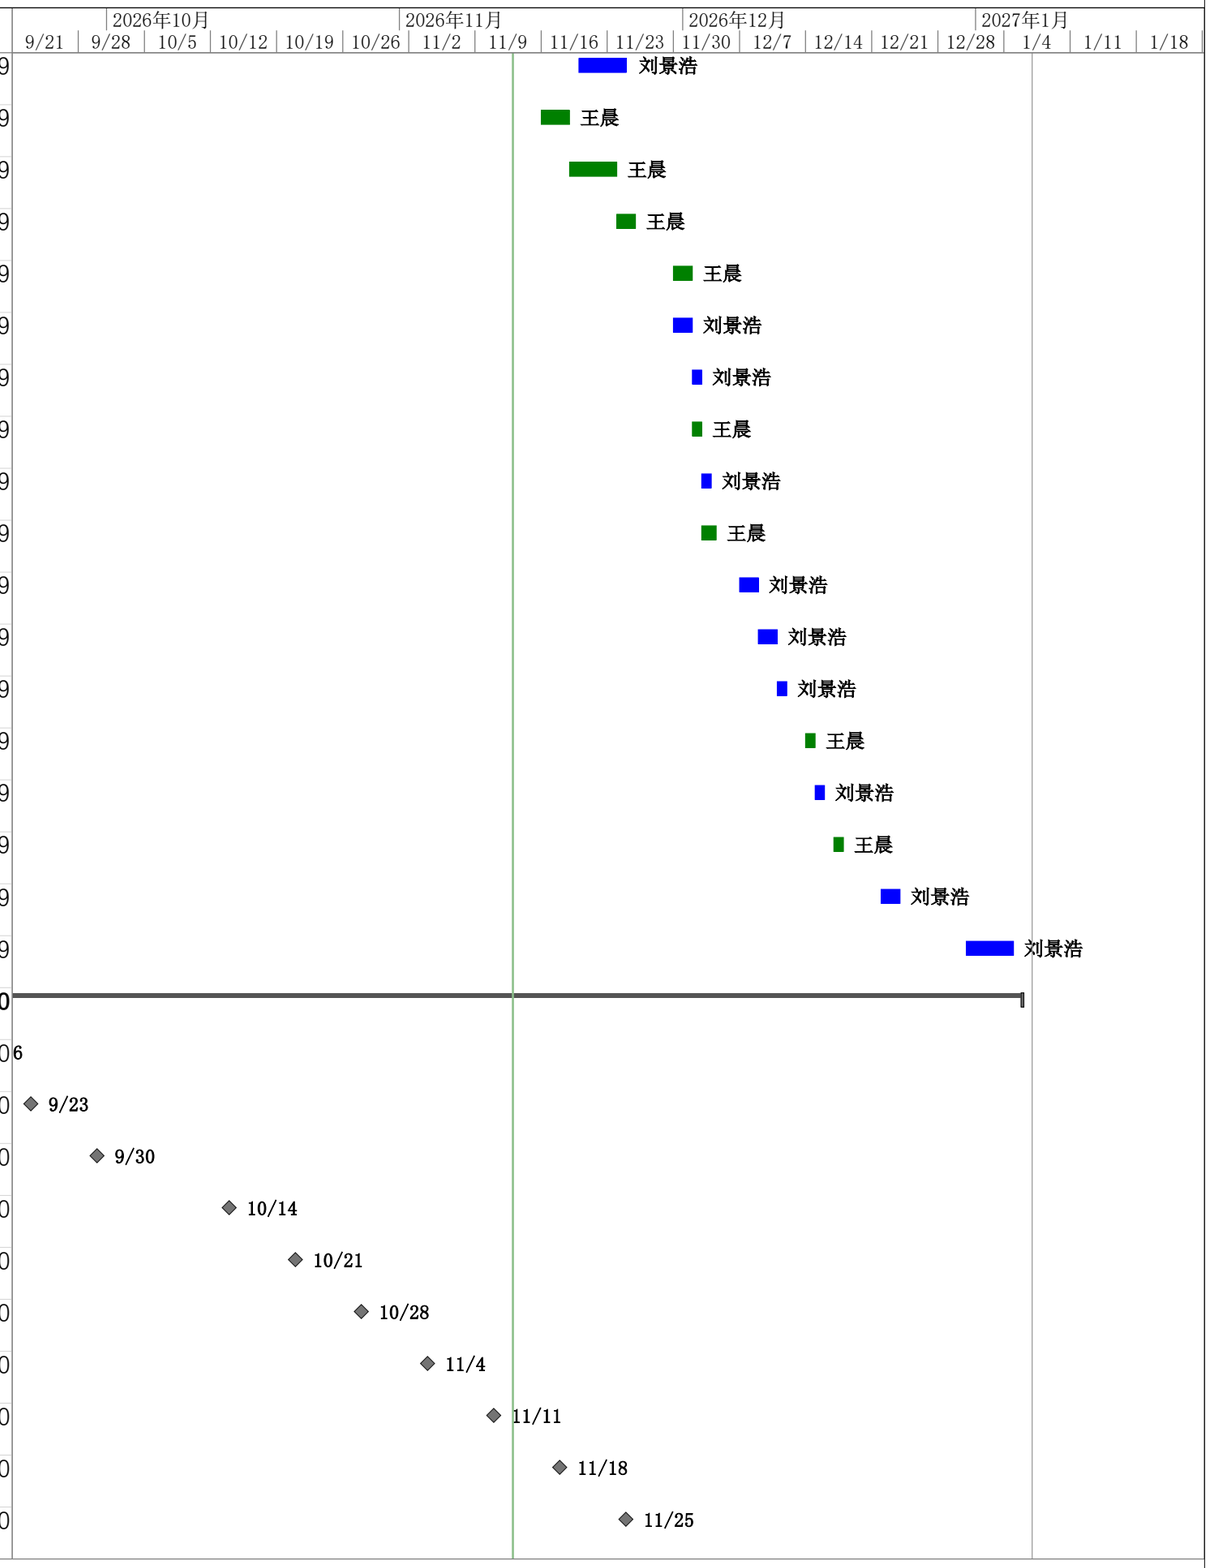

WBS	名称	计划人时	开始时间	完成时间	前置任务	任务负责人	成本
K08	K08 实现与翻转1	0人时	26/12/2	26/12/2			¥0.00
K09	K09 维护与翻转2	0人时	26/12/9	26/12/9			¥0.00
K10	K10 项目测试评审	0人时	26/12/16	26/12/16			¥0.00
K10A	K10A 面向对象方法学引论	0人时	26/12/23	26/12/23			¥0.00
K11	K11 面向对象分析、设计、实现	0人时	26/12/30	26/12/30			¥0.00
K12	K12 课程总结与收尾	0人时	27/1/6	27/1/6			¥0.00

