
详细甘特图 项目计划与评审

第 1–6 项 · 日期、人员、前置与关键标记来自 Project 核查

WBS	与任务	负责人 / 人时	计划窗口	直接前置
1.1.1	确认WBS、依赖与提交边界	王0.50 / 刘0.50	10/08–10/08	—
1.1.2	建立资源预算与风险安排	王0.50 / 刘0.50	10/08–10/08	1.1.1
1.2.1	逐条检查评审要求与计划	王0.50 / 刘0.50	10/09–10/09	1.1.2
1.2.2	确认汇报材料与提交清单	王0.50 / 刘0.50	10/09–10/09	1.2.1
1.3.1	登记课堂计划意见与影响	王0.50 / 刘0.50	10/15–10/15	1.2.2
1.3.2	共同修订排期与计划基线	王0.50 / 刘0.50	10/15–10/15	1.3.1

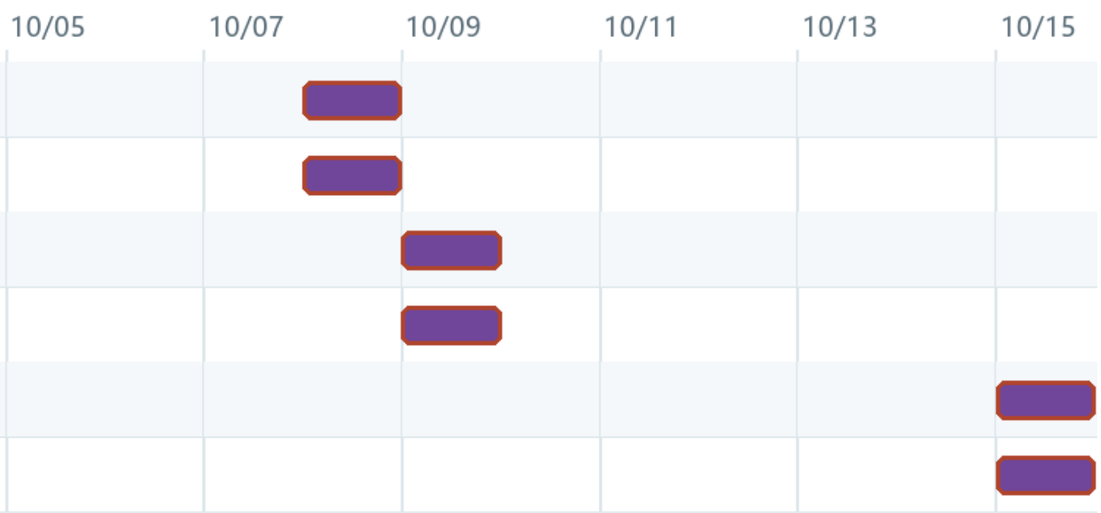

王晨　刘景浩　共同　节点

红边为 Project 关键任务；完整前置见任务表。

详细甘特图 可行性研究

第 1–16 项 · 日期、人员、前置与关键标记来自 Project 核查

WBS 与任务	负责人 / 人时	计划窗口	直接前置
2.1.1.1.1 FS01.1 明确使用者	王0.20	10/08–10/08	—
2.1.1.1.2 FS01.2 限定业务边界	王0.20	10/08–10/08	2.1.1.1.1
2.1.1.1.3 FS01.3 划分访问权限	王0.20	10/08–10/08	2.1.1.1.2
2.1.1.1.4 FS01.4 把目标写成检查项	王0.20	10/08–10/08	2.1.1.1.3
2.1.1.1.5 FS01.5 核对规模和约束	王0.20	10/08–10/08	2.1.1.1.4
2.1.1.2.1 FS02.1 列出当前渠道	王0.25	10/08–10/08	2.1.1.1
2.1.1.2.2 FS02.2 保留已有有效能力	王0.25	10/08–10/08	2.1.1.2.1
2.1.1.2.3 FS02.3 还原当前处理步骤	王0.25	10/08–10/08	2.1.1.2.2
2.1.1.2.4 FS02.4 定位信息断点	王0.25	10/08–10/08	2.1.1.2.3
2.1.1.2.5 FS02.5 把不足变成改进输入	王0.25	10/08–10/08	2.1.1.2.4
2.1.2.1.1 FS03.1 抽去现状工具名称	王0.25	10/09–10/09	2.1.1.2
2.1.2.1.2 FS03.2 定义系统边界	王0.20	10/09–10/09	2.1.2.1.1
2.1.2.1.3 FS03.3 明确输入与输出	王0.20	10/09–10/09	2.1.2.1.2
2.1.2.1.4 FS03.4 分解主要逻辑处理	王0.20	10/09–10/09	2.1.2.1.3
2.1.2.1.5 FS03.5 建立字典并检查平衡	王0.20	10/09–10/09	2.1.2.1.4
2.1.2.1.6 FS03.6 推导目标物理实现	王0.20	10/09–10/09	2.1.2.1.5




王晨　刘景浩　共同　节点

红边为 Project 关键任务；完整前置见任务表。

详细甘特图 可行性研究

第 17–32 项 · 日期、人员、前置与关键标记来自 Project 核查

WBS 与任务	负责人 / 人时	计划窗口	直接前置
2.1.2.2.1 FS04.1 重写核心问题	王0.20	10/12–10/12	2.1.2.1
2.1.2.2.2 FS04.2 拆开问题与解决手段	王0.20	10/12–10/12	2.1.2.2.1
2.1.2.2.3 FS04.3 收紧本期范围	王0.20	10/12–10/12	2.1.2.2.2
2.1.2.2.4 FS04.4 补充反例和限制	王0.20	10/12–10/12	2.1.2.2.3
2.1.2.2.5 FS04.5 形成反馈和关闭方式	王0.20	10/12–10/12	2.1.2.2.4
2.2.1.1.1 FS05.1 形成六类解法	刘0.25	10/12–10/12	2.1.2.1
2.2.1.1.2 FS05.2 使用同一评价基准	刘0.20	10/12–10/12	2.2.1.1.1
2.2.1.1.3 FS05.3 逐项比较小程序与App	刘0.20	10/12–10/12	2.2.1.1.2
2.2.1.1.4 FS05.4 评估成员与工具能力	刘0.20	10/12–10/12	2.2.1.1.3
2.2.1.1.5 FS05.5 换算工作量和人工成本	刘0.20	10/12–10/12	2.2.1.1.4
2.2.1.1.6 FS05.6 计算并解释评分	刘0.20	10/12–10/12	2.2.1.1.5
2.2.2.1.1 FS06.1 明确继续与否	刘0.25	10/13–10/13	2.1.2.2、2.2.1.1
2.2.2.1.2 FS06.2 给出推荐理由	刘0.25	10/13–10/13	2.2.2.1.1
2.2.2.1.3 FS06.3 说明备选方针	刘0.25	10/13–10/13	2.2.2.1.2
2.2.2.1.4 FS06.4 定义继续条件	刘0.25	10/13–10/13	2.2.2.1.3
2.2.2.1.5 FS06.5 定义调整触发点	刘0.25	10/13–10/13	2.2.2.1.4

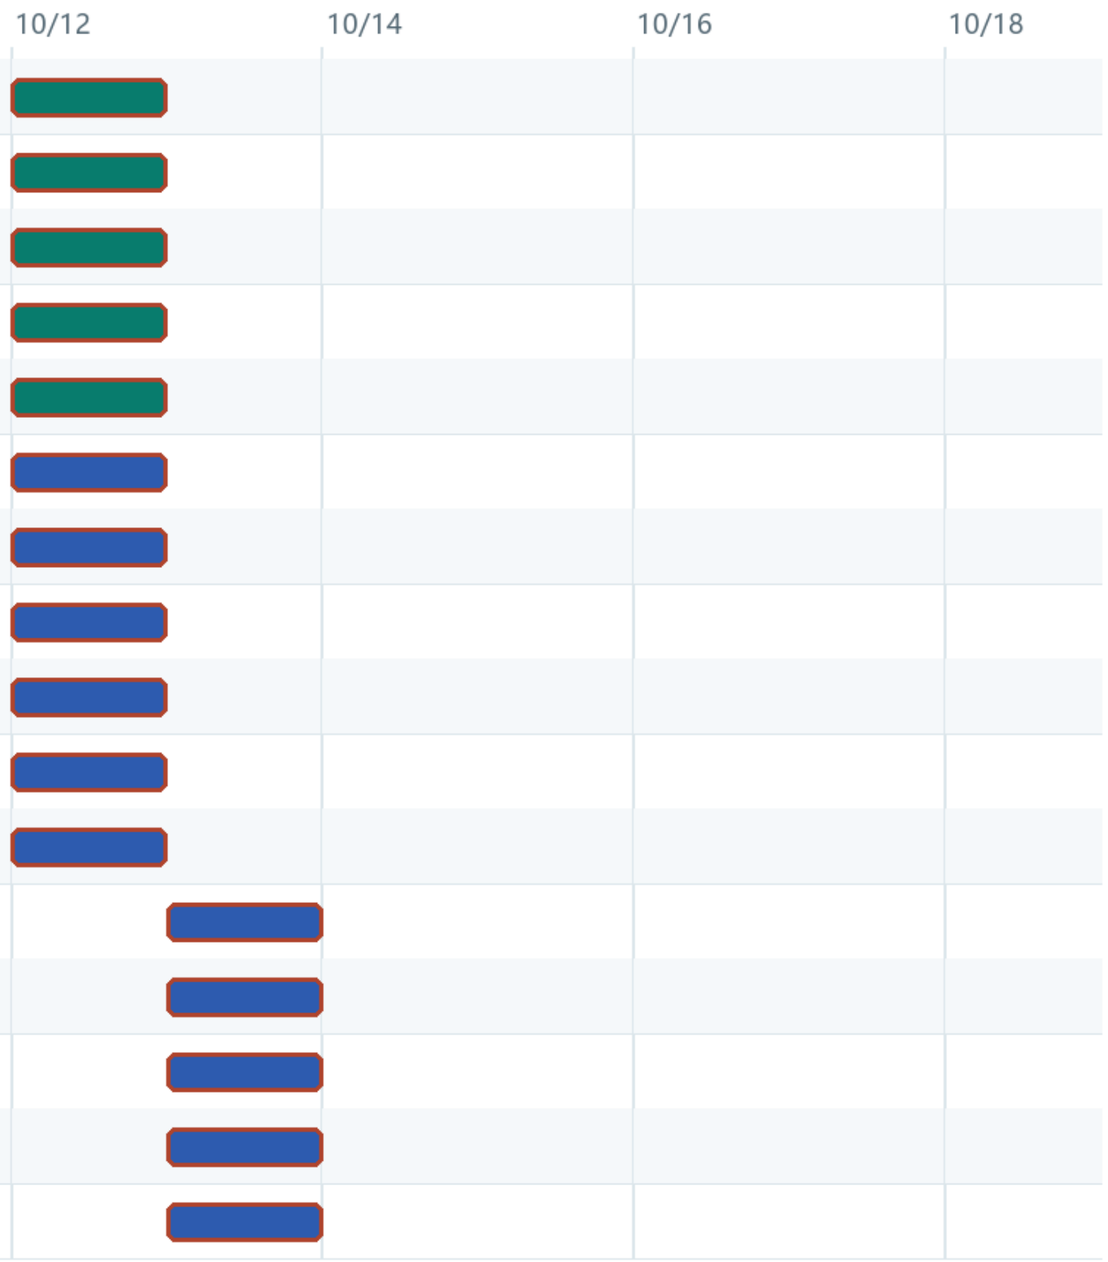


王晨　刘景浩　共同　节点

红边为 Project 关键任务；完整前置见任务表。

详细甘特图 可行性研究

第 33–44 项 · 日期、人员、前置与关键标记来自 Project 核查

WBS 与任务	负责人 / 人时	计划窗口	直接前置
2.3.1.1.1 FS07.1 分解交付工作	王0.13 / 刘0.12	10/14–10/14	2.2.2.1
2.3.1.1.2 FS07.2 估算人时与人员分配	王0.13 / 刘0.12	10/14–10/14	2.3.1.1.1
2.3.1.1.3 FS07.3 建立依赖与排期	王0.13 / 刘0.12	10/14–10/14	2.3.1.1.2
2.3.1.1.4 FS07.4 核算成本与资源	王0.12 / 刘0.13	10/14–10/14	2.3.1.1.3
2.3.1.1.5 FS07.5 细排下一需求阶段	王0.12 / 刘0.13	10/14–10/14	2.3.1.1.4
2.3.1.1.6 FS07.6 安排监督与调整	王0.12 / 刘0.13	10/14–10/14	2.3.1.1.5
2.3.2.1.1 FS08.1 组织完整报告	王0.13 / 刘0.12	10/15–10/15	2.3.1.1
2.3.2.1.2 FS08.2 标记版本及输入	王0.13 / 刘0.12	10/15–10/15	2.3.2.1.1
2.3.2.1.3 FS08.3 核对图文一致	王0.13 / 刘0.12	10/15–10/15	2.3.2.1.2
2.3.2.1.4 FS08.4 编制审查索引	王0.12 / 刘0.13	10/15–10/15	2.3.2.1.3
2.3.2.1.5 FS08.5 区分记录与待办	王0.12 / 刘0.13	10/15–10/15	2.3.2.1.4
2.3.2.1.6 FS08.6 接收决定并闭环	王0.12 / 刘0.13	10/15–10/15	2.3.2.1.5

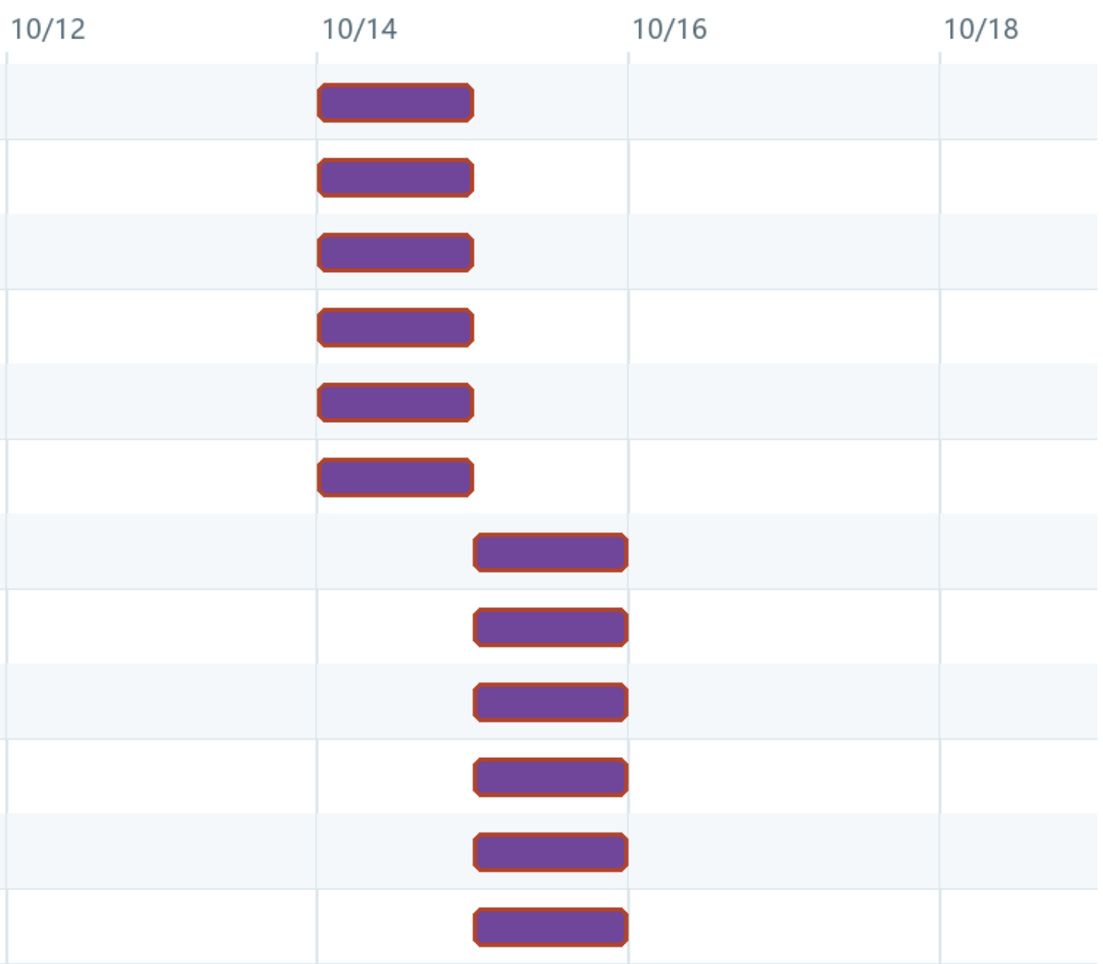


王晨　刘景浩　共同　节点

红边为 Project 关键任务；完整前置见任务表。

详细甘特图 需求分析

第 1–16 项 · 日期、人员、前置与关键标记来自 Project 核查

WBS	任务	负责人 / 人时	计划窗口	直接前置
3.1.1.1	RA01 确认用户类别与需求代表	王0.50 / 刘0.50	10/16–10/16	2.3.2
3.1.1.2	RA02 整理需求来源与情景	王0.50 / 刘0.50	10/16–10/16	3.1.1.1
3.1.2.1	RA02 描述用例主流程与异常	王0.50 / 刘0.50	10/19–10/19	3.1.1
3.1.2.2	RA01 核对角色权限和边界	王0.50 / 刘0.50	10/19–10/19	3.1.2.1
3.2.1.1	RA01 拆分功能需求与本期范围	王0.80	10/20–10/20	3.1.2
3.2.1.2	RA01 明确互动激励与治理规则	王0.80	10/20–10/20	3.2.1.1
3.2.2.1	RA01 定义数据和接口约束	王0.50	10/21–10/21	3.2.1
3.2.2.2	RA01 量化性能可靠性与安全指标	王0.60	10/21–10/21	3.2.2.1
3.2.2.3	RA10 定义异常和验收场景	王0.50	10/21–10/21	3.2.2.2
3.3.1.1	RA03 整理小程序阅读与作者界面	刘0.80	10/20–10/20	3.1.2
3.3.1.2	RA03 整理网页创作与阅读线框	刘0.80	10/20–10/20	3.3.1.1
3.3.2.1	RA03 核对社区案件与关联定位	刘0.80	10/21–10/21	3.3.1
3.3.2.2	RA03 核对独立运维与执行确认	刘0.80	10/21–10/21	3.3.2.1
3.4.1.1	RA10 汇总功能非功能与SRS	王0.50 / 刘0.50	10/22–10/22	3.2.2、3.3.2
3.4.1.2	RA10 关联追踪编号与输入版本	王0.50 / 刘0.50	10/22–10/22	3.4.1.1
3.4.2.1	RA10 组织内部需求评审	王0.50 / 刘0.50	10/23–10/23	3.4.1

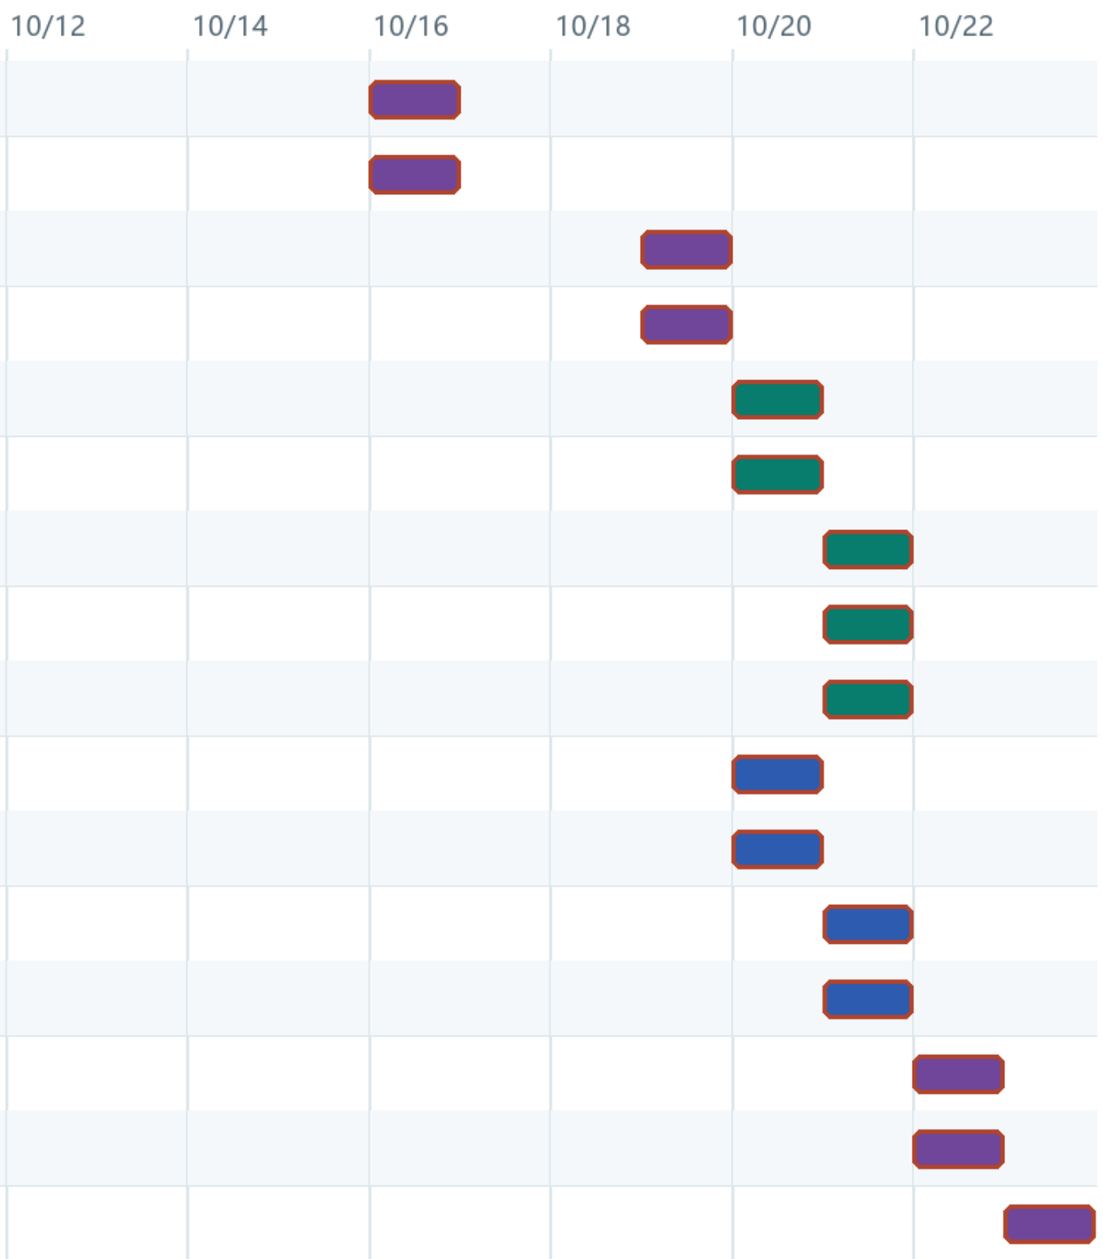


王晨　刘景浩　共同　节点

红边为 Project 关键任务；完整前置见任务表。

详细甘特图 需求分析

第 17–32 项 · 日期、人员、前置与关键标记来自 Project 核查

WBS	任务	负责人 / 人时	计划窗口	直接前置
3.4.2.2	RA10 核对汇报与提交清单	王0.50 / 刘0.50	10/23–10/23	3.4.2.1
3.5.1.1	RA10 登记课堂评审问题	刘0.80	11/04–11/04	3.9.2
3.5.1.2	RA10 分析范围接口和排期影响	刘0.80	11/04–11/04	3.5.1.1
3.5.2.1	RA10 修订需求与未关闭问题	刘0.80	11/04–11/04	3.5.1
3.5.2.2	RA10 向设计交接确认结果	刘0.80	11/04–11/04	3.5.2.1
3.6.1.1	RA01 核对综合要求与未来范围	王0.58 / 刘0.42	10/28–10/28	3.4.2
3.6.1.2	RA02 核对代表来源及获取方法	王0.58 / 刘0.42	10/28–10/28	3.6.1.1
3.6.1.3	RA10 建立课件与评审覆盖索引	王0.58 / 刘0.42	10/28–10/28	3.6.1.2
3.6.2.1	RA04 建立ER实体属性与基数	王0.58 / 刘0.42	10/29–10/29	3.6.1
3.6.2.2	RA05 建立上下文一级和关键二级DFD	王0.73 / 刘0.52	10/29–10/29	3.6.2.1
3.6.2.3	RA05 核对父子流平衡与边界	王0.43 / 刘0.32	10/29–10/29	3.6.2.2
3.7.1.1	RA06 定义字典结构正则与语义	王0.60 / 刘0.40	10/30–10/30	3.6.2
3.7.1.2	RA07 分析函数依赖及1NF至3NF	王0.60 / 刘0.40	10/30–10/30	3.7.1.1
3.7.1.3	RA06 核对处理逻辑与反例约束	王0.30 / 刘0.20	10/30–10/30	3.7.1.2
3.7.2.1	RA08 绘制STD与状态转换表	王0.60 / 刘0.40	10/30–10/30	3.7.1
3.7.2.2	RA09 绘制层次方框图	王0.30 / 刘0.20	10/30–10/30	3.7.2.1

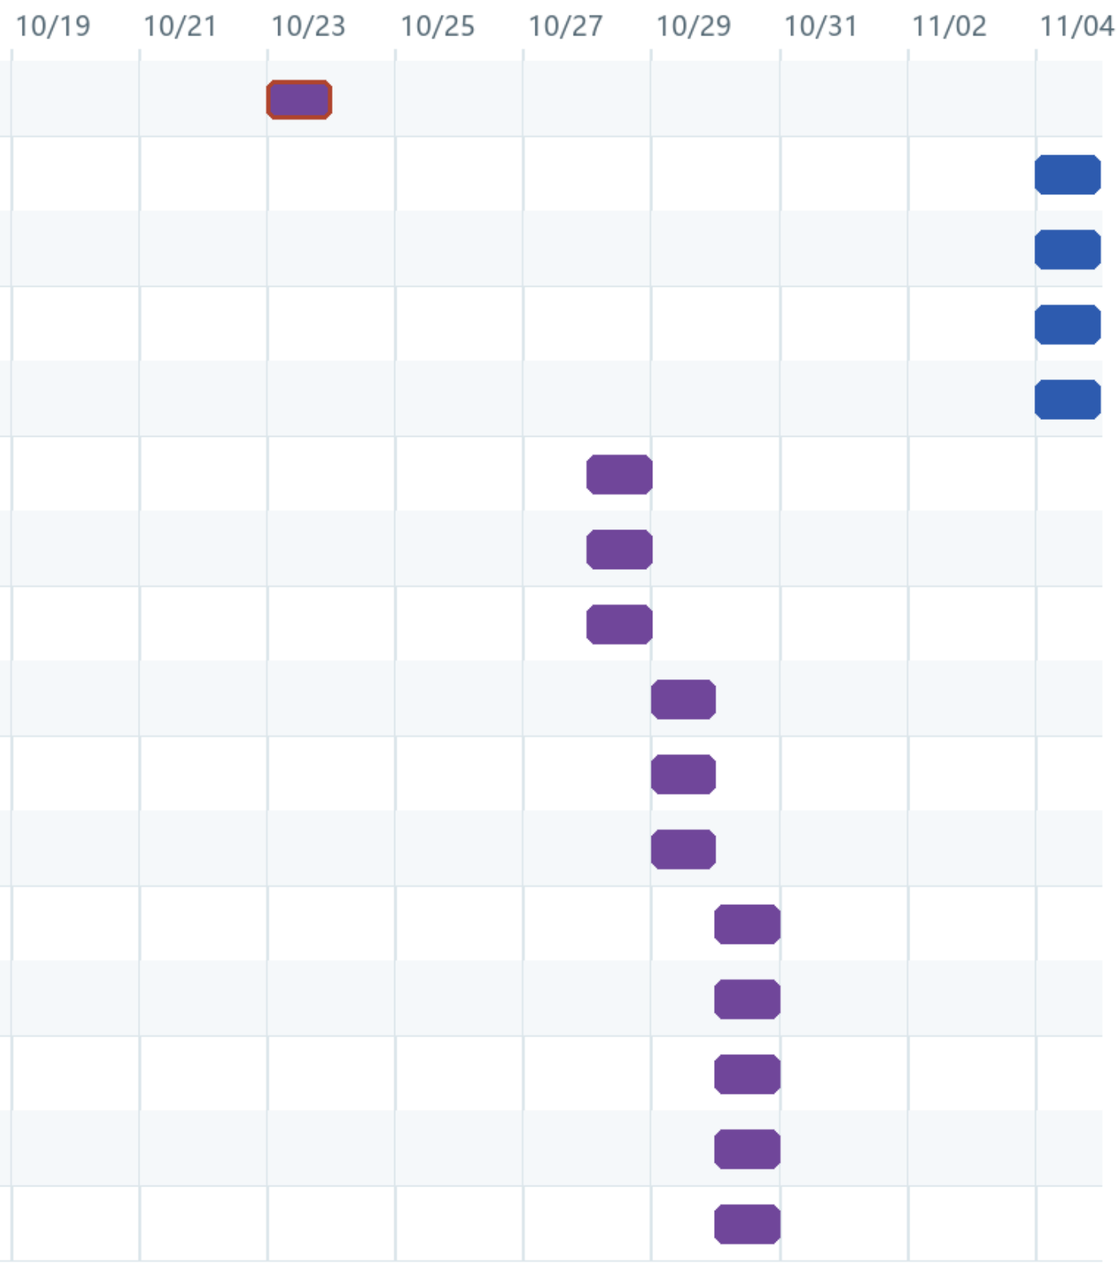


王晨　刘景浩　共同　节点

红边为 Project 关键任务；完整前置见任务表。

详细甘特图 需求分析

第 33–44 项 · 日期、人员、前置与关键标记来自 Project 核查

WBS	与任务	负责人 / 人时	计划窗口	直接前置
3.7.2.3	RA09 绘制Warnier图	王0.30 / 刘0.20	10/30–10/30	3.7.2.2
3.7.2.4	RA09 编制IPO与改进IPO	王0.30 / 刘0.20	10/30–10/30	3.7.2.3
3.8.1.1	RA03 整理青绿四页与W01至W14线框	王0.38 / 刘0.62	11/02–11/02	3.7.2
3.8.1.2	RA03 准备代表和任务走查表	王0.37 / 刘0.63	11/02–11/02	3.8.1.1
3.8.2.1	RA03 执行任务并记录原话和问题	王0.38 / 刘0.62	11/02–11/02	3.8.1
3.8.2.2	RA03 修改原型并取得复核确认	王0.37 / 刘0.63	11/02–11/02	3.8.2.1
3.9.1.1	RA10 执行一致完整现实有效检查	王0.60 / 刘0.40	11/03–11/03	3.8.2
3.9.1.2	RA10 核对FR规则模型与验收追踪	王0.60 / 刘0.40	11/03–11/03	3.9.1.1
3.9.1.3	RA10 形成SRS候选版本与问题表	王0.30 / 刘0.20	11/03–11/03	3.9.1.2
3.9.2.1	RA10 同步计划WBS与排期证据	王0.60 / 刘0.40	11/03–11/03	3.9.1
3.9.2.2	RA10 按两张评审表核对交付包	王0.60 / 刘0.40	11/03–11/03	3.9.2.1
3.9.2.3	RA10 准备讲稿与排练交接	王0.30 / 刘0.20	11/03–11/03	3.9.2.2

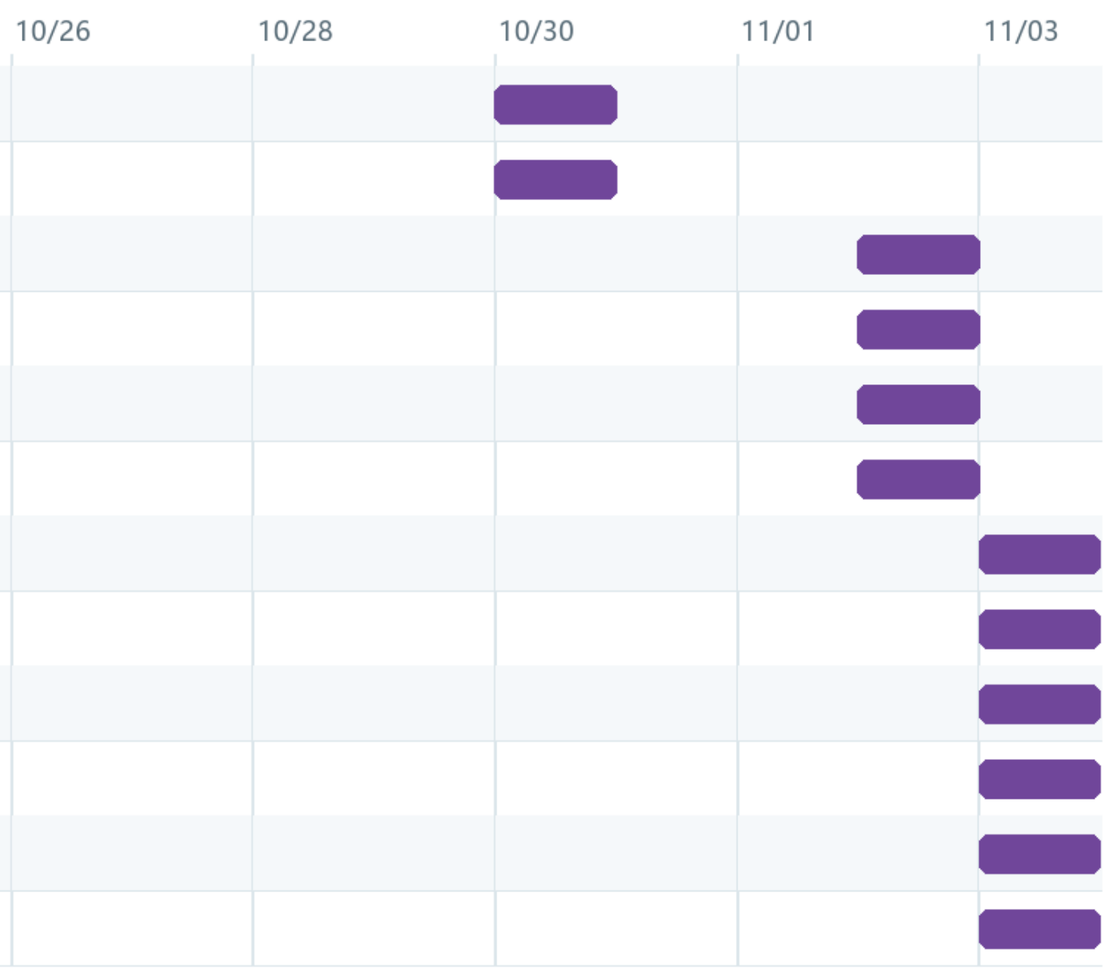

王晨　刘景浩　共同　节点

红边为 Project 关键任务；完整前置见任务表。

详细甘特图 总体与详细设计

第 1–16 项 · 日期、人员、前置与关键标记来自 Project 核查

WBS	任务	负责人 / 人时	计划窗口	直接前置
4.1.1	复查需求DFD与系统边界	王0.75	10/26–10/26	3.4.2
4.1.2	形成处理分组与排除条件	王0.75 / 刘0.50	10/26–10/26	4.1.1
4.2.1	整理三方案流程与物理元素	王0.75 / 刘0.50	10/26–10/26	4.1.2
4.2.2	估算成本和效益	王0.75	10/26–10/26	4.2.1
4.2.3	编制候选实现进度	王0.50 / 刘0.50	10/26–10/26	4.2.2
4.3.1	推荐方案并记录取舍	王0.75 / 刘0.50	10/27–10/27	4.2.3
4.4.1	逐项追踪18个DFD处理	王1.25	10/27–10/27	4.3.1
4.4.2	拆分四条复杂过程与交接	王1.00 / 刘0.75	10/27–10/27	4.4.1
4.5.1	精化公开阅读和管理数据流	王1.00	10/28–10/28	4.4.2
4.5.2	判定流类型与输入输出边界	王0.75	10/28–10/28	4.5.1
4.5.3	完成变换与事务结构映射	王2.00 / 刘0.75	10/28–10/28	4.5.2
4.5.4	用设计原理与启发规则精化	王1.25 / 刘0.50	10/29–10/29	4.5.3
4.5.5	导出接口和数据并复查	王1.25 / 刘0.75	10/29–10/29	4.5.4
4.6.1	核对逻辑实体与物理关系	王1.50	10/28–10/28	4.4.2
4.6.2	核对迁移、字段、约束与索引	王1.50 / 刘0.50	10/29–10/29	4.6.1
4.7.1	编制三级测试策略与方案	王0.50 / 刘1.25	11/02–11/02	4.5.5、4.6.2




王晨　刘景浩　共同　节点

红边为 Project 关键任务；完整前置见任务表。

详细甘特图 总体与详细设计

第 17–32 项 · 日期、人员、前置与关键标记来自 Project 核查

WBS	任务	负责人 / 人时	计划窗口	直接前置
4.7.2	编制预期结果、取证与进度	王0.75 / 刘1.00	11/02–11/02	4.7.1
4.8.1	汇编系统说明与用户手册	王0.50 / 刘1.25	11/03–11/03	4.5.5
4.8.2	汇编测试计划与数据库设计结果	王1.00 / 刘0.75	11/03–11/03	4.7.2、4.6.2
4.8.3	汇编详细实现计划	王0.75 / 刘0.50	11/04–11/04	4.8.2
4.8.4	统稿总体设计并核对配套材料	王1.00 / 刘0.75	11/04–11/04	4.8.1、4.8.3
4.9.1	技术审查并登记问题	王1.25 / 刘0.75	11/05–11/05	4.8.4、3.5.2
4.9.2	管理复审与内部基线交接	王1.00 / 刘0.75	11/05–11/05	4.9.1
4.10.1	细化认证与发布状态和过程	王1.75	11/09–11/09	4.9.2
4.10.2	细化账本及治理并计算复杂度	王1.75 / 刘0.75	11/10–11/10	4.10.1
4.11.1	细化小程序和网页交互	刘2.00	11/09–11/09	4.9.2
4.11.2	细化图片、草稿和跨端冲突	王0.50 / 刘1.75	11/10–11/10	4.11.1
4.12.1	细化独立运维授权与任务状态	王0.75 / 刘1.50	11/11–11/11	4.9.2
4.12.2	细化备份结构、恢复和回退	王0.75 / 刘1.50	11/11–11/11	4.12.1
4.13.1	编制单元与白盒用例	王1.50 / 刘1.25	11/12–11/12	4.10.2、4.11.2 + 1
4.13.2	编制集成系统用例与数据	王1.50 / 刘1.75	11/12–11/12	4.13.1
4.13.3	详细设计与测试用例交叉复核	王1.00 / 刘1.00	11/13–11/13	4.13.2

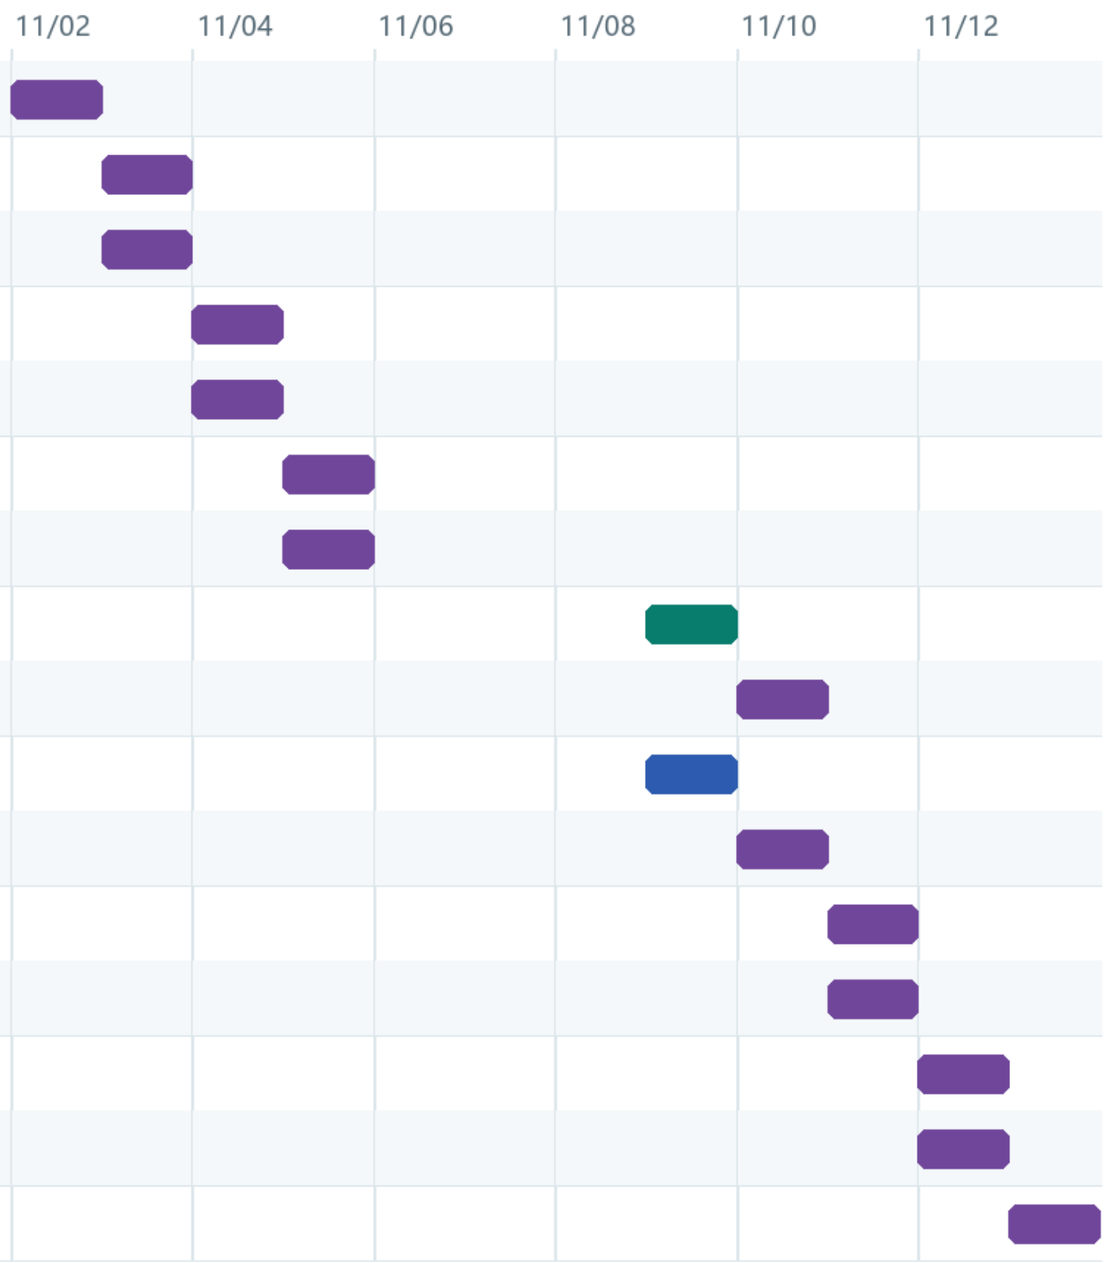


王晨　刘景浩　共同　节点

红边为 Project 关键任务；完整前置见任务表。

详细甘特图 总体与详细设计

第 33–36 项 · 日期、人员、前置与关键标记来自 Project 核查

WBS	任务	负责人 / 人时	计划窗口	直接前置
4.14.1	整理提交前设计修订	王1.00 / 刘1.00	11/20–11/20	4.13.3
4.14.2	登记课堂设计意见及影响	王0.75 / 刘0.75	11/25–11/25	4.14.1
4.14.3	分模块修订设计与测试	王1.50 / 刘1.50	11/26–11/26	4.14.2
4.14.4	交叉复核并交接联调	王1.00 / 刘1.00	11/26–11/26	4.14.3

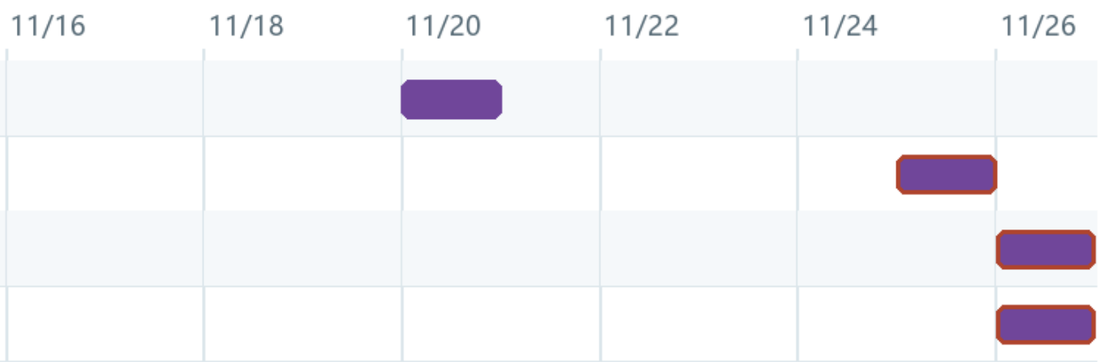


王晨　刘景浩　共同　节点

红边为 Project 关键任务；完整前置见任务表。

详细甘特图 编码与单元测试

第 1–16 项 · 日期、人员、前置与关键标记来自 Project 核查

WBS	任务	负责人 / 人时	计划窗口	直接前置
5.1.1	搭建模块骨架与环境配置	王0.80	11/06–11/06	4.9.2
5.1.2	核对共享接口和错误格式	王1.00	11/06–11/06	5.1.1
5.2.1	实现登录与校园邮箱验证	王1.50	11/09–11/09	5.1.2
5.2.2	实现材料认证接口和角色限制	王1.50	11/10–11/10	5.2.1
5.3.1	实现文章图片、草稿存储接口	王1.00	11/11–11/11	5.2.2
5.3.2	实现岗位专业公司筛选与分页	王1.00	11/12–11/13	5.3.1
5.4.1	实现双端筛选与阅读界面	刘3.50	11/06–11/06	4.9.2
5.4.2	核对游客状态、失败和空结果	刘2.00	11/09–11/10	5.4.1
5.5.1	实现Markdown、图片和资料链接	刘3.50	11/11–11/11	5.4.2
5.5.2	实现预览、保存与草稿恢复	刘2.00	11/12–11/13	5.5.1
5.6.1	实现移动图文编辑和上传	王3.50	11/16–11/16	5.3.2
5.6.2	实现移动草稿保存及恢复	王2.00	11/17–11/17	5.6.1
5.7.1	实现发布、修改、下架和恢复接口	王3.50	11/18–11/18	5.6.2、5.5.2
5.7.2	接通双端作者文章管理	王1.00 / 刘1.00	11/19–11/19	5.7.1
5.8.1	实现主页、评论图片及收藏交流	王3.50	11/20–11/20	5.7.2
5.8.2	实现点赞、领取投币、荣誉排序与通知	王2.00	11/23–11/24	5.8.1

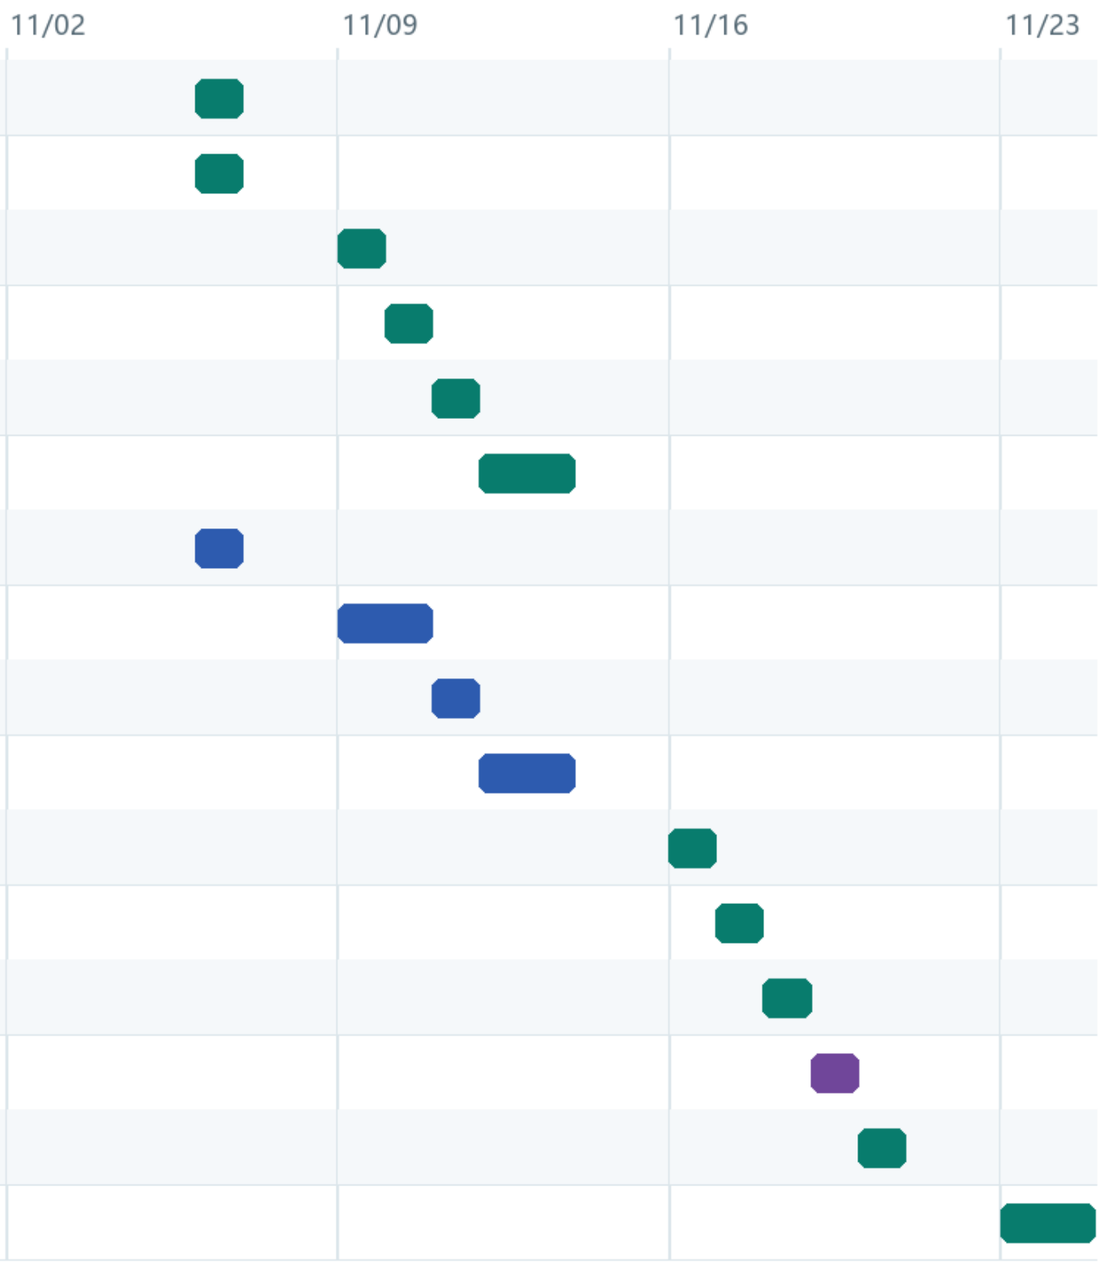


王晨　刘景浩　共同　节点

红边为 Project 关键任务；完整前置见任务表。

详细甘特图 编码与单元测试

第 17–25 项 · 日期、人员、前置与关键标记来自 Project 核查

WBS	与任务	负责人 / 人时	计划窗口	直接前置
5.9.1	实现认证审核与举报反馈处理接口	刘3.50	11/16–11/16	5.5.2
5.9.2	实现社区管理网页并联调	刘2.00	11/17–11/18	5.9.1
5.10.1	实现独立运维任务执行服务	刘4.00	11/19–11/19	5.9.2
5.10.2	实现部署重启、备份恢复及失败保护	刘2.50	11/20–11/23	5.10.1
5.11.1	实现运维状态、日志和备份列表	刘4.00	11/24–11/24	5.10.2
5.11.2	联调网页部署重启与备份恢复	刘2.50	11/25–11/25	5.11.1
5.12.1	联通真实接口与跨端链路	王1.75 / 刘1.75	11/27–11/27	4.14.4、5.2.2 +9
5.12.2	复核程序清单、代码走查和单元结果	王1.25 / 刘1.25	11/27–11/27	5.12.1
5.12.3	封存代码清单、用例与实现证据	王1.25 / 刘1.25	11/27–11/27	5.12.2

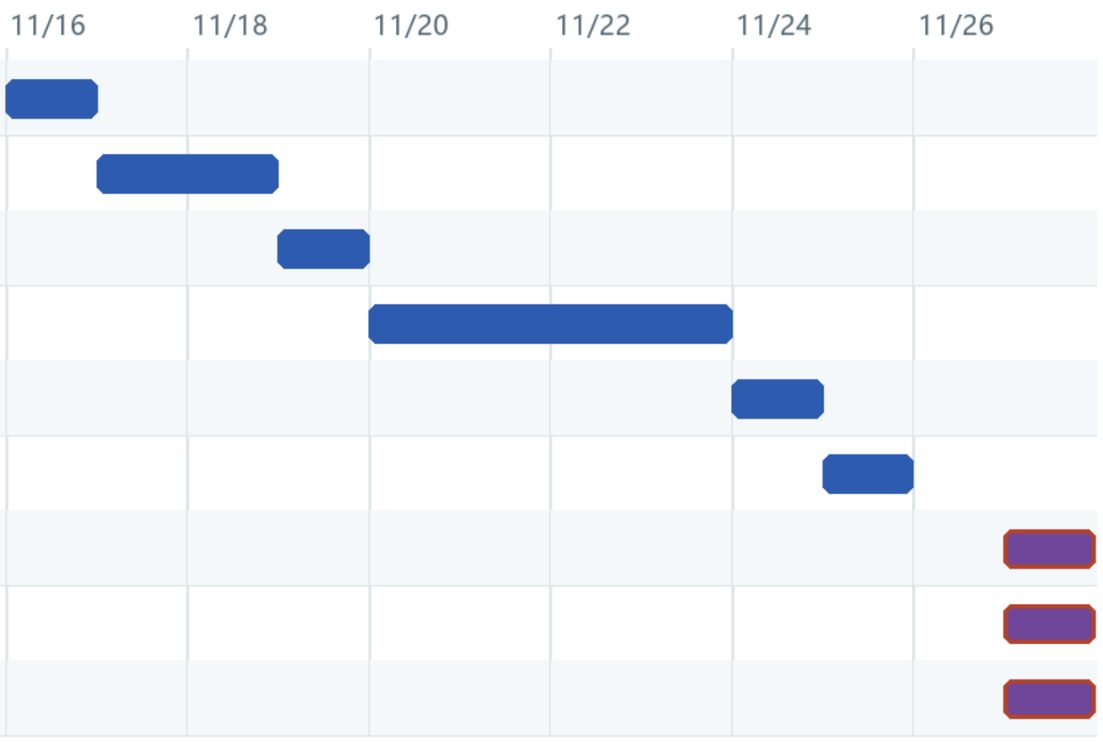

王晨　刘景浩　共同　节点

红边为 Project 关键任务；完整前置见任务表。

详细甘特图 综合测试

第 1–16 项 · 日期、人员、前置与关键标记来自 Project 核查

WBS	任务	负责人 / 人时	计划窗口	直接前置
6.1.1	执行核心系统场景与角色流程	王0.50 / 刘2.00	11/30–11/30	5.12.3
6.1.2	执行真实MySQL和接口集成	王1.75 / 刘1.00	12/01–12/01	6.1.1
6.2.1	固定环境执行30并发负载	王2.00	11/30–11/30	5.12.3
6.2.2	分析常规负载并核对阈值	王1.25	12/01–12/01	6.2.1
6.3.1	执行阶梯压力与边界探测	王1.75	12/02–12/02	6.2.2
6.3.2	执行稳定性与降载恢复	王2.00	12/02–12/02	6.3.1
6.4.1	验证角色隔离与隐私	王0.50 / 刘1.50	12/02–12/02	6.1.2
6.4.2	验证双端浏览、编辑及图片	刘2.00	12/02–12/02	6.4.1
6.4.3	核对实际使用设备与网络	刘1.75	12/03–12/03	6.4.2
6.5.1	验证冷启动与停机运维入口	王1.75 / 刘0.50	12/03–12/03	6.3.2
6.5.2	验证隔离恢复和损坏备份拒绝	王2.00 / 刘0.75	12/03–12/03	6.5.1
6.6.1	按模块处理已登记缺陷	王1.25 / 刘1.50	12/03–12/03	6.4.3、6.3.2
6.6.2	复测缺陷并执行关键回归	王1.25 / 刘1.25	12/04–12/04	6.6.1、6.5.2
6.7.1	组织目标用户走查与反馈登记	王0.50 / 刘1.25	12/04–12/04	6.6.2、6.4.3
6.7.2	内部验收并封版系统测试报告	王1.50 / 刘1.50	12/04–12/04	6.7.1
6.8.1	复核报告与证据链	王1.50 / 刘0.75	12/07–12/07	6.7.2



王晨　刘景浩　共同　节点

红边为 Project 关键任务；完整前置见任务表。

详细甘特图 综合测试

第 17–17 项 · 日期、人员、前置与关键标记来自 Project 核查

WBS	与任务	负责人 / 人时	计划窗口	直接前置
6.8.2	整理课堂说明和测试修订	王1.25 / 刘0.75	12/08–12/08	6.8.1




王晨　刘景浩　共同　节点

红边为 Project 关键任务；完整前置见任务表。

详细甘特图 部署与维护

第 1–10 项 · 日期、人员、前置与关键标记来自 Project 核查

WBS	与任务	负责人 / 人时	计划窗口	直接前置
7.1.1	整理安装、用户及管理操作说明	王1.50	12/09–12/09	6.8.2
7.1.2	整理运维、恢复与故障维护规程	王1.50	12/10–12/10	7.1.1
7.2.1	在干净配置核对冷启动	王1.50	12/11–12/11	7.1.2
7.2.2	核对演示数据、认证与外网失败回退	王1.50	12/11–12/11	7.2.1
7.3.1	登记维护申请和影响分析	刘1.50	12/14–12/14	7.2.2
7.3.2	执行修改回退及回归演练	刘1.50	12/14–12/14	7.3.1
7.4.1	核对备份、配置与维护资料	王1.50	12/15–12/15	7.3.2
7.4.2	双方练习操作并确认交接	王1.50	12/15–12/15	7.4.1
7.5.1	登记12月16日测试评审意见	刘1.50	12/17–12/17	6.8.2
7.5.2	修订报告及相关实现用例	刘1.50	12/17–12/17	7.5.1

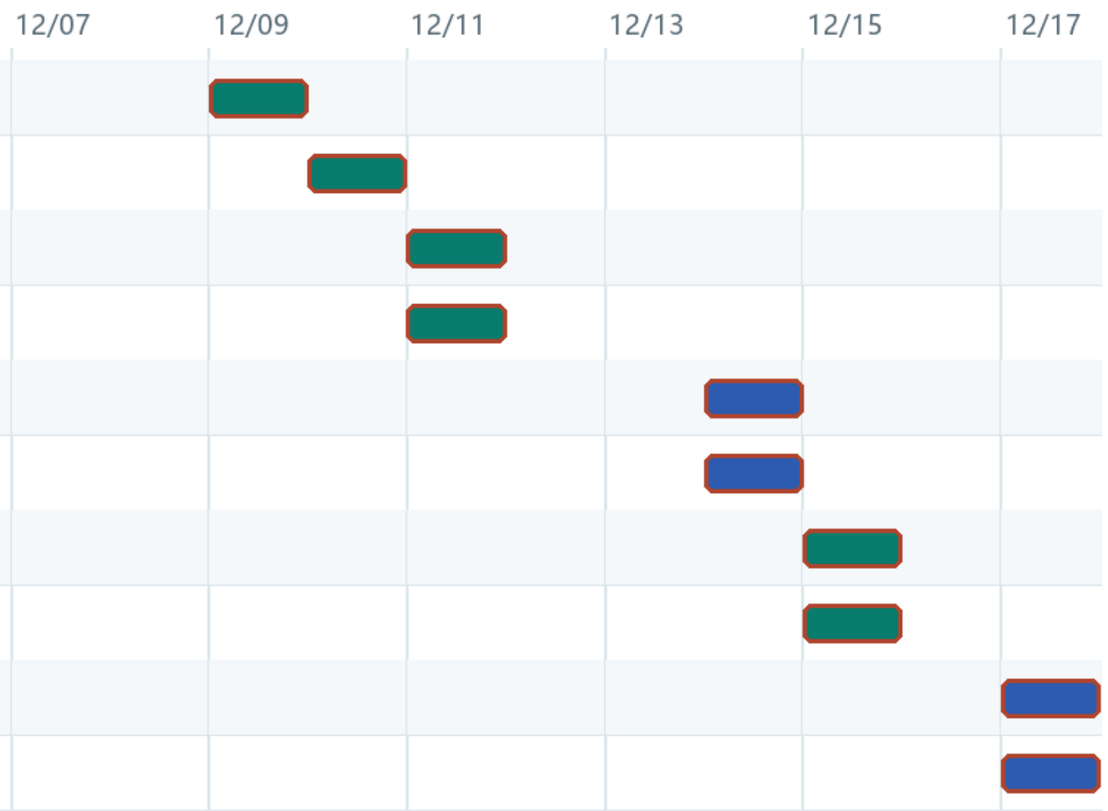


王晨　刘景浩　共同　节点

红边为 Project 关键任务；完整前置见任务表。

详细甘特图 总结与收尾

第 1–10 项 · 日期、人员、前置与关键标记来自 Project 核查

WBS	与任务	负责人 / 人时	计划窗口	直接前置
8.1.1	共同核对计划实际与阶段成果	王0.90 / 刘0.90	12/18–12/18	7.4.2、7.5.2
8.1.2	共同总结偏差风险和协作贡献	王0.90 / 刘0.90	12/21–12/21	8.1.1
8.2.1	整理总评PPT资料和详细周计划	王1.50	12/22–12/22	8.1.2
8.2.2	核对引用、图表与交付目录	王1.50	12/23–12/23	8.2.1
8.3.1	共同执行交付清单核查	王0.90 / 刘0.90	12/24–12/24	8.2.2
8.3.2	共同预演并确认提交版本	王0.90 / 刘0.90	12/24–12/24	8.3.1
8.4.1	处理总评意见并准备提交基线	王1.50	12/31–12/31	8.3.2
8.4.2	核对提交后尾项与最终归档	王1.50	01/04–01/04	8.4.1
8.5.1	共同核对课程收尾材料	王0.90 / 刘0.90	01/06–01/06	8.4.2
8.5.2	共同确认交付与后续维护边界	王0.90 / 刘0.90	01/06–01/06	8.5.1

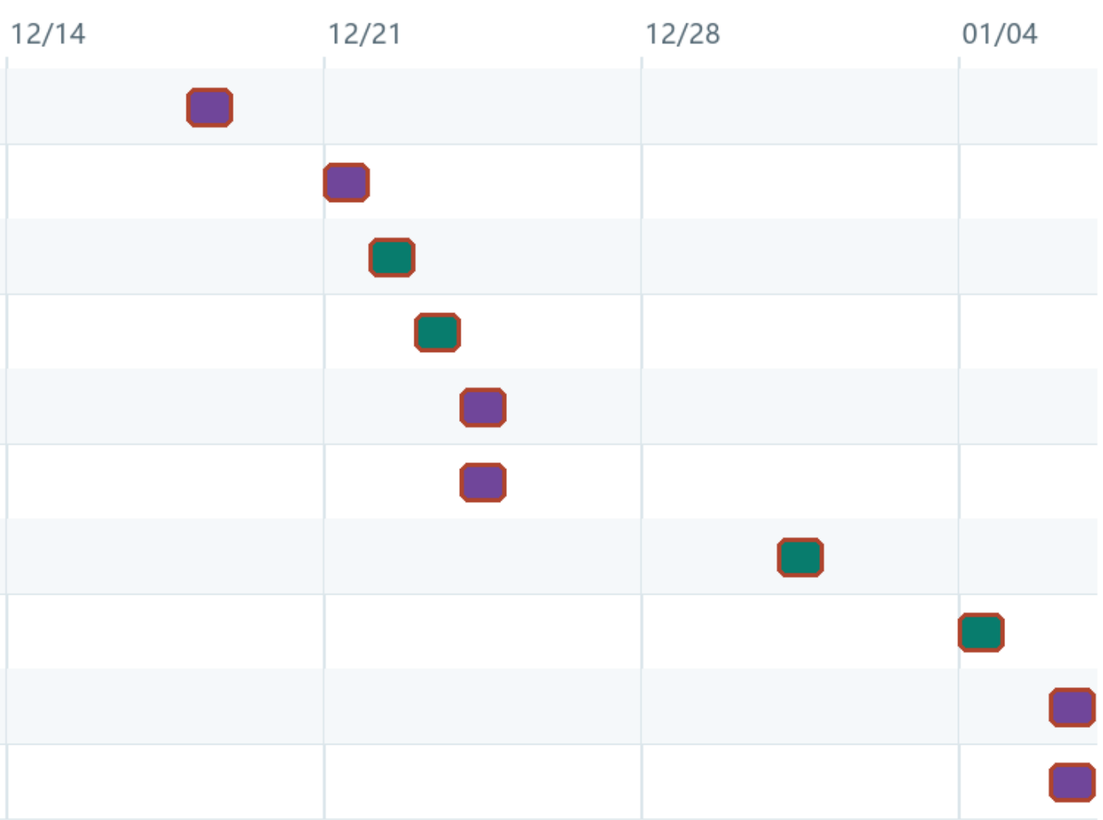


王晨　刘景浩　共同　节点

红边为 Project 关键任务；完整前置见任务表。

详细甘特图 持续项目管理与交叉复核

第 1–16 项 · 日期、人员、前置与关键标记来自 Project 核查

WBS	任务	负责人 / 人时	计划窗口	直接前置
M01	周进度风险与评审提交管理	王0.60 / 刘0.25	10/08–10/09	—
M02	周进度风险与评审提交管理	王0.60 / 刘0.25	10/12–10/16	—
M03	周进度风险与评审提交管理	王0.60 / 刘0.25	10/19–10/23	—
M04	周进度风险与评审提交管理	王0.60 / 刘0.25	10/26–10/30	—
M05	周进度风险与评审提交管理	王0.60 / 刘0.25	11/02–11/06	—
M06	周进度风险与评审提交管理	王0.60 / 刘0.25	11/09–11/13	—
M07	周进度风险与评审提交管理	王0.60 / 刘0.25	11/16–11/20	—
M08	周进度风险与评审提交管理	王0.60 / 刘0.25	11/23–11/27	—
M09	周进度风险与评审提交管理	王0.60 / 刘0.25	11/30–12/04	—
M10	周进度风险与评审提交管理	王0.60 / 刘0.25	12/07–12/11	—
M11	周进度风险与评审提交管理	王0.60 / 刘0.25	12/14–12/18	—
M12	周进度风险与评审提交管理	王0.60 / 刘0.25	12/21–12/25	—
M13	周进度风险与评审提交管理	王0.60 / 刘0.25	12/28–12/31	—
M14	周进度风险与评审提交管理	王0.60 / 刘0.25	01/04–01/06	—
R2.1	复核与交接 关键技术与工具可行性验证	刘0.45	10/08–10/12	—
R2.2	复核与交接 经济、操作及内容供给分析	王0.45	10/12–10/13	—

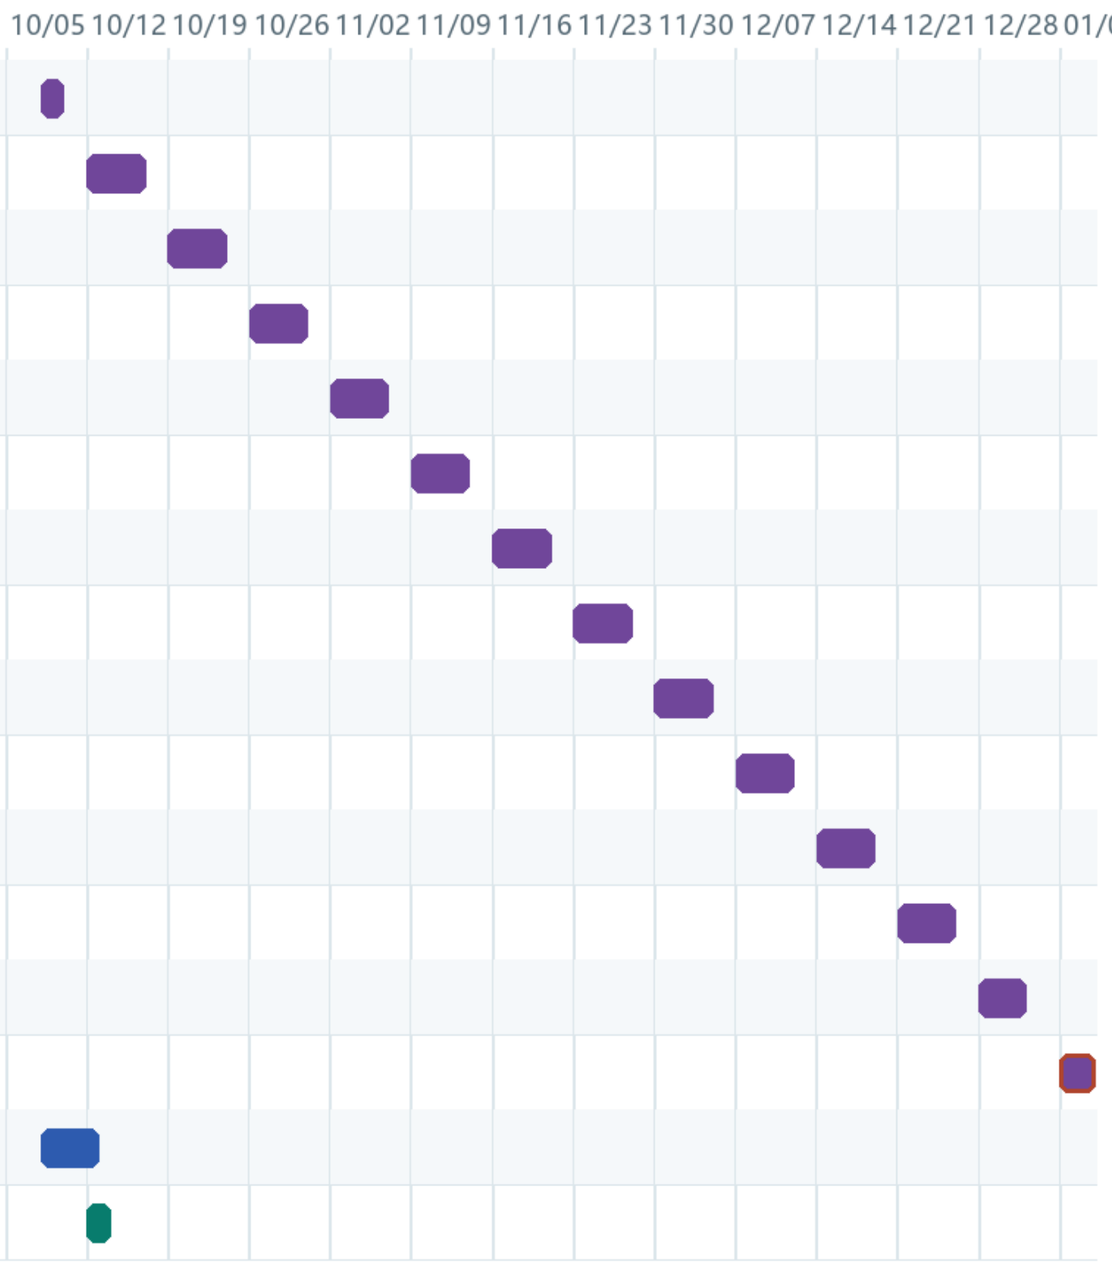


王晨　刘景浩　共同　节点

红边为 Project 关键任务；完整前置见任务表。

详细甘特图 持续项目管理与交叉复核

第 17–32 项 · 日期、人员、前置与关键标记来自 Project 核查

WBS	任务	负责人 / 人时	计划窗口	直接前置
R3.2	复核与交接 功能、数据与非功能需求	刘0.45	10/20–10/21	—
R3.3	复核与交接 双端原型与场景核对	王0.45	10/20–10/21	—
R3.5	复核与交接 需求课堂评审反馈处理	王0.45	11/04–11/04	—
R4.1	复核与交接 系统架构、接口与数据库设计	刘0.45	10/26–10/28	—
R4.2	复核与交接 认证、内容、激励与治理设计	刘0.45	10/29–10/30	—
R4.3	复核与交接 双端浏览与创作详细设计	王0.45	10/29–11/02	—
R4.4	复核与交接 部署、备份与恢复详细设计	刘0.45	11/02–11/03	—
R4.6	复核与交接 测试用例设计与数据准备	王0.45	11/03–11/03	—
R5.1	复核与交接 项目骨架、配置与接口约定	刘0.45	11/06–11/06	—
R5.2	复核与交接 登录、邮箱与材料认证	刘0.45	11/09–11/10	—
R5.3	复核与交接 文章存储、岗位检索与筛选接口	刘0.45	11/11–11/13	—
R5.4	复核与交接 小程序与网页阅读页面	王0.45	11/06–11/10	—
R5.5	复核与交接 网页Markdown创作与草稿	王0.45	11/11–11/13	—
R5.6	复核与交接 小程序文字与图片创作	刘0.45	11/16–11/17	—
R5.7	复核与交接 双端草稿、发布与文章管理	刘0.45	11/18–11/19	—
R5.8	复核与交接 评论、点赞、投币、收藏与荣誉	刘0.45	11/20–11/24	—

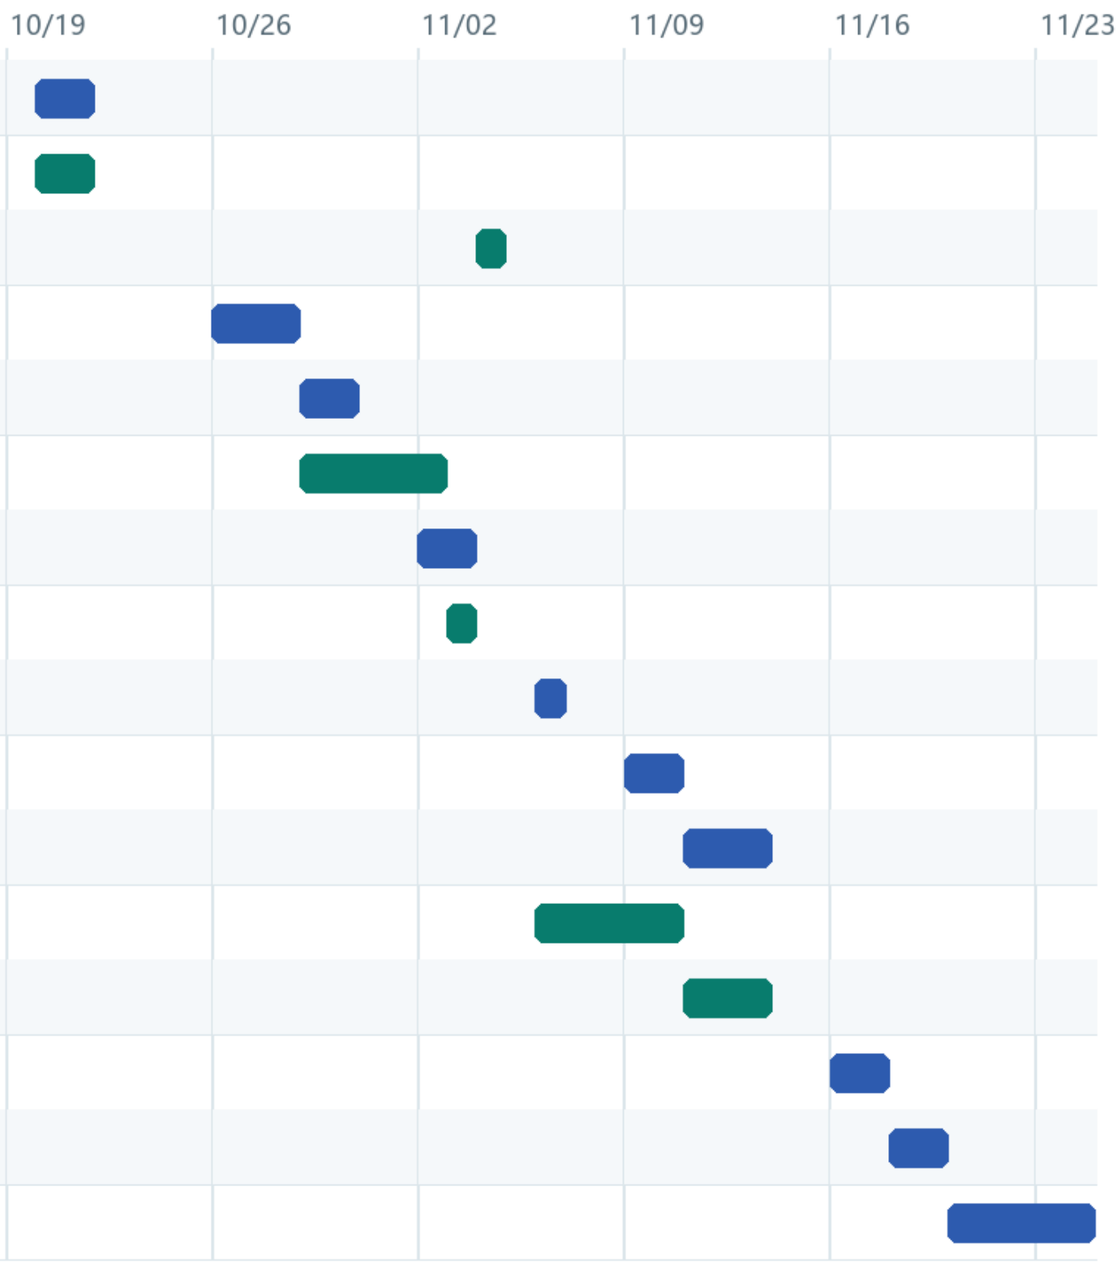


王晨　刘景浩　共同　节点

红边为 Project 关键任务；完整前置见任务表。

详细甘特图 持续项目管理与交叉复核

第 33–48 项 · 日期、人员、前置与关键标记来自 Project 核查

WBS	任务	负责人 / 人时	计划窗口	直接前置
R5.9	复核与交接 社区审核、反馈与举报网页	王0.45	11/16–11/18	—
R5.10	复核与交接 独立运维执行与备份服务	王0.45	11/19–11/23	—
R5.11	复核与交接 运维网页、状态与操作记录	王0.45	11/24–11/25	—
R6.1	复核与交接 功能、接口与集成测试	王0.45	11/30–12/01	—
R6.2	复核与交接 性能与负载测试	刘0.45	11/30–12/01	—
R6.3	复核与交接 压力与稳定性测试	刘0.45	12/02–12/02	—
R6.4	复核与交接 安全权限与双端兼容测试	王0.45	12/02–12/02	—
R6.5	复核与交接 部署、故障与备份恢复验证	刘0.45	12/03–12/03	—
R6.6	复核与交接 缺陷修复、复测与回归	王0.45	12/03–12/04	—
R6.8	复核与交接 测试报告复核与提交准备	刘0.45	12/07–12/08	—
R7.1	复核与交接 安装包、用户与维护说明	刘0.45	12/09–12/10	—
R7.2	复核与交接 干净环境启动与课堂演示	刘0.45	12/11–12/11	—
R7.3	复核与交接 维护申请与变更演练	王0.45	12/14–12/14	—
R7.4	复核与交接 运维交接与反馈整改	刘0.45	12/15–12/15	—
R7.5	复核与交接 课堂测试评审意见处理	王0.45	12/17–12/17	—
R8.2	复核与交接 总评材料与详细计划附录	刘0.45	12/22–12/23	—

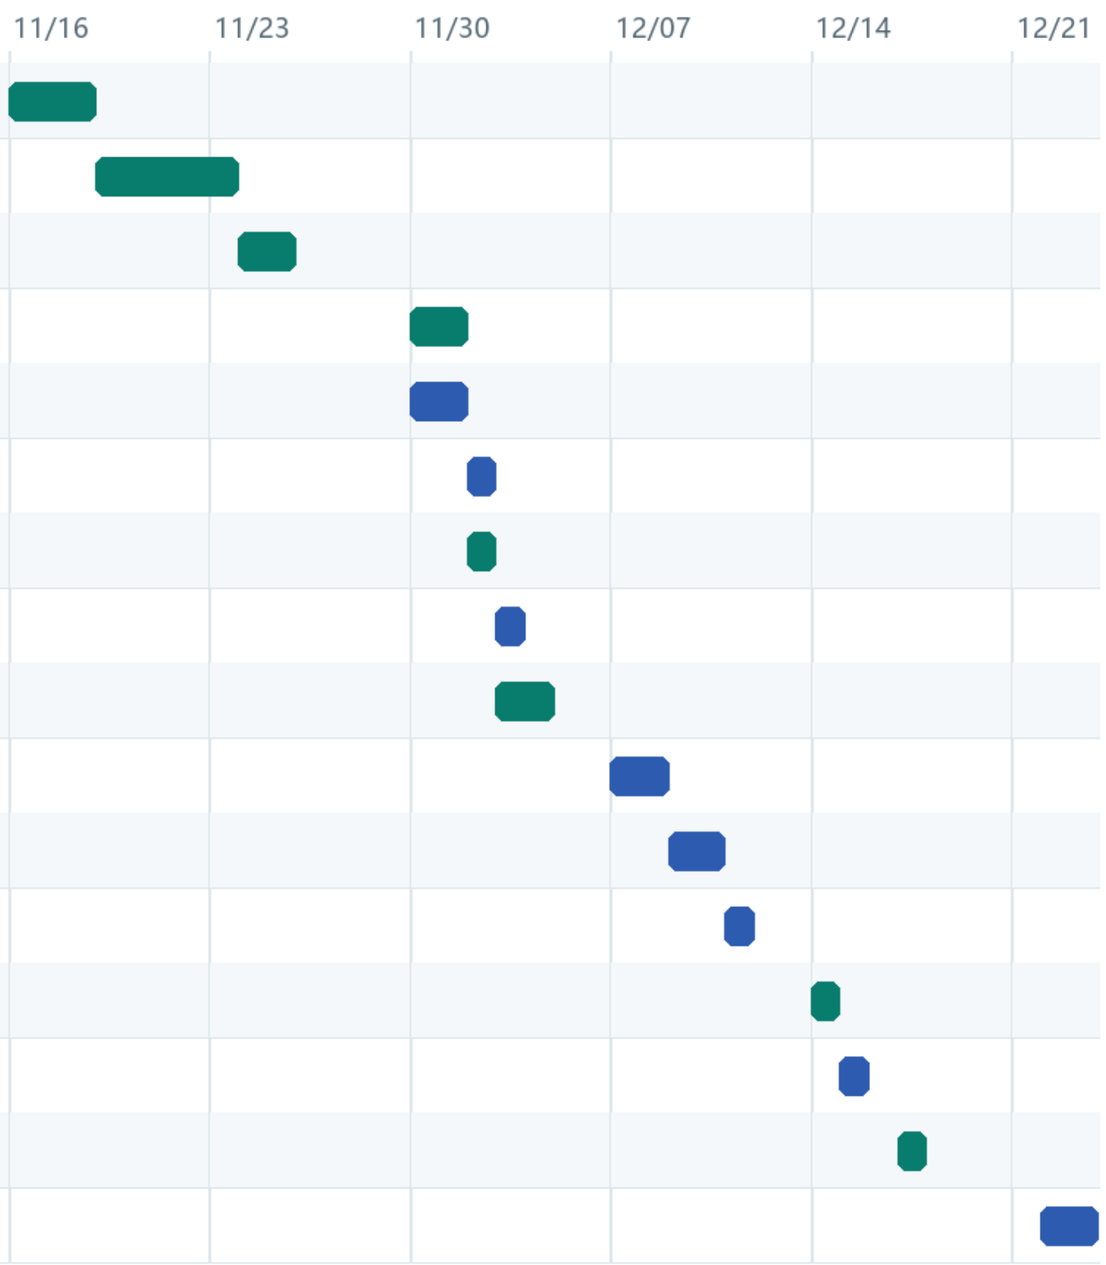


王晨　刘景浩　共同　节点

红边为 Project 关键任务；完整前置见任务表。

详细甘特图 持续项目管理与交叉复核

第 49–49 项 · 日期、人员、前置与关键标记来自 Project 核查

WBS	与任务	负责人 / 人时	计划窗口	直接前置
R8.4	复核与交接 总评反馈处理与归档	刘0.45	12/31–01/04	—




王晨　刘景浩　共同　节点

红边为 Project 关键任务；完整前置见任务表。

详细甘特图 课程里程碑

第 1–16 项 · 日期、人员、前置与关键标记来自 Project 核查

WBS	任务	负责人 / 人时	计划窗口	直接前置
K00	课程启动与选题	—	09/16–09/16	—
K00A	预备作业与项目介绍	—	09/23–09/23	—
K00B	项目计划及 PPT	—	09/30–09/30	—
K01	项目计划评审	—	10/14–10/14	—
K02	可行性研究	—	10/21–10/21	—
K03	需求分析与形式化说明	—	10/28–10/28	—
K04	项目需求评审	—	11/04–11/04	—
K05	总体设计	—	11/11–11/11	—
K06	详细设计	—	11/18–11/18	—
K07	项目设计评审	—	11/25–11/25	—
K08	实现与翻转1	—	12/02–12/02	—
K09	维护与翻转2	—	12/09–12/09	—
K10	项目测试评审	—	12/16–12/16	—
K10A	面向对象方法学引论	—	12/23–12/23	—
K11	面向对象分析、设计、实现	—	12/30–12/30	—
K12	课程总结与收尾	—	01/06–01/06	—

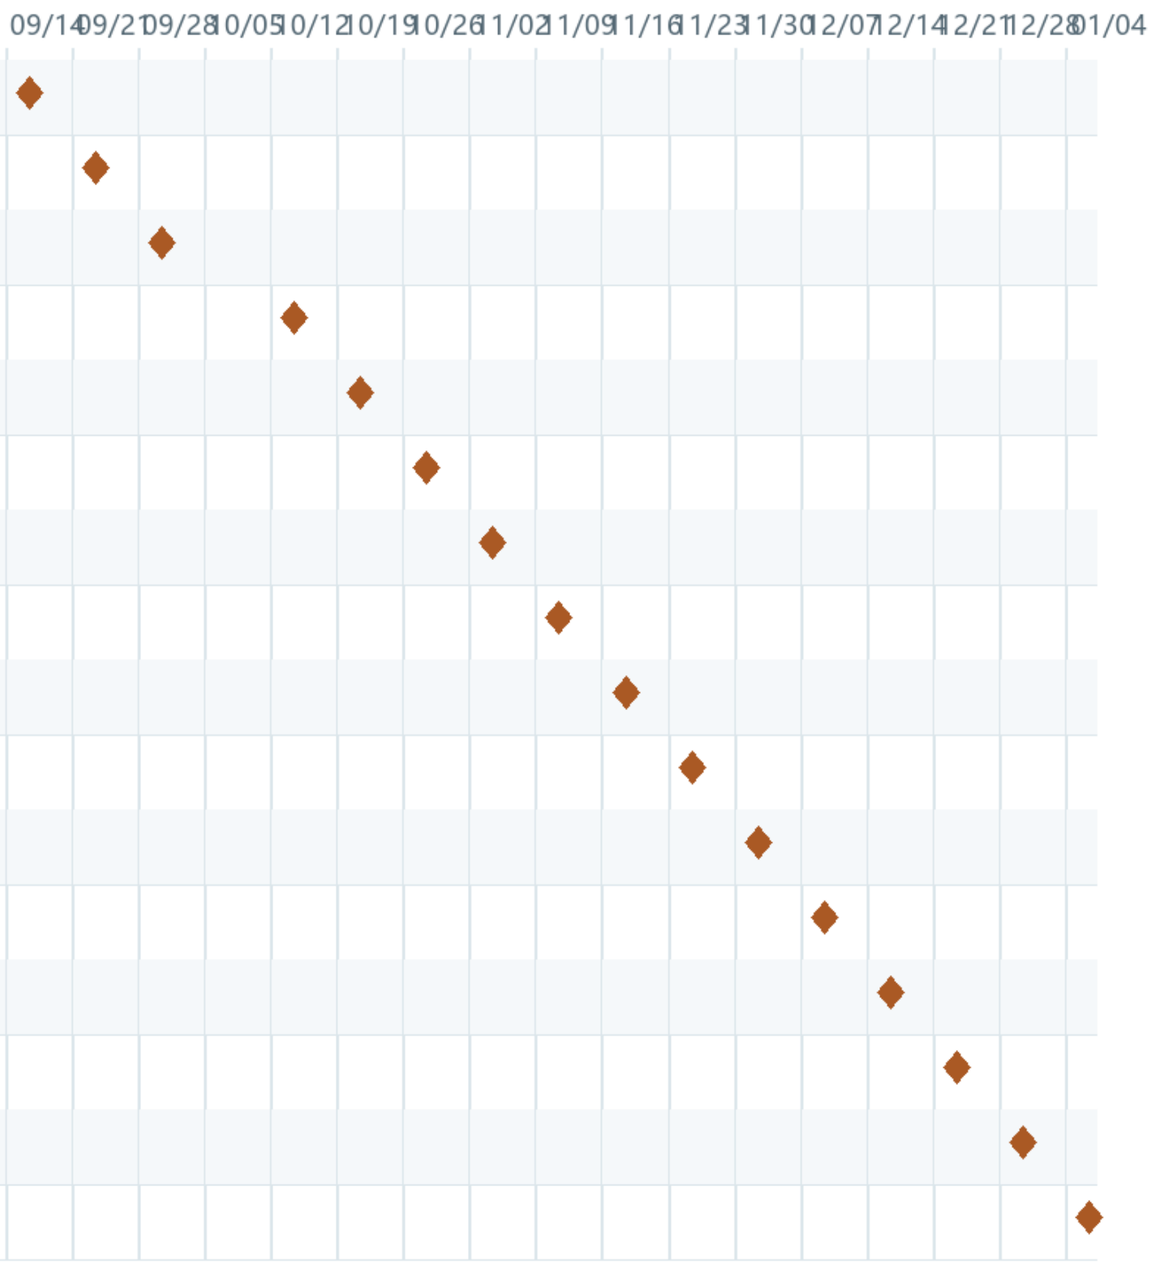

王晨　刘景浩　共同　节点

红边为 Project 关键任务；完整前置见任务表。
