

城院帮项目计划

编制依据 GB/T 8567—2006 第 7.2 节 软件开发计划 SDP

软件工程课程项目 G04

组长兼项目负责人 王晨 32401211

成员 刘景浩 32401205

计划基准 2026 年 10 月 1 日 文档版本 V1.9 修订日期 2026 年 11 月 8 日

实习与求职经验分享社区

免费阅读 非现金激励 自愿站外联系

本文用于需求阶段作业提交与后续执行。正文说明范围、责任、进度和管理，附录与图表提供逐任务检查依据。

文档控制

前端技术变更 CR-G04-20261101-FE：微信原生小程序（WXML/WXSS/JavaScript）与独立网页（Vue 3/TypeScript/Vite）分别开发，共用 Java/Spring Boot 接口与 MySQL。原 Project 基准及技术切换增量区间分别列示，详见前端技术选型与变更说明。

字段	记录
文档标识	G04-SDP-20261108-02
标题	城院帮项目计划
小组与项目负责人	G04；王晨 32401211，组长兼项目负责人；刘景浩 32401205
修订日期与文档状态	2026 年 11 月 8 日；项目计划文档修订
输入与排期基准	本报告 G04-SDP-20261108-02；排期原基准 G04-BL-20261028-01；过程细化 G04-BL-20261104-PROCESS
修订说明	第 4 章登记四类用户代表。附录 J 列出走查任务及待验证的改进。
当前版本与交付标识	V1.9；2026 年 11 月 8 日

正文按 GB/T 8567—2006 第 7.2 节的 13 章组织，详细活动见第 6 章。附录 A、B 提供任务分解、逐周安排与完成条件，附录 C 对应教师 16 项评审要求。[Q1]

项目计划投入 226.55 人时，直接人工预算 10366.93 元。两名成员日常各投入 30—45 分钟，集中开发和测试按周计划追加投入。王晨每周检查任务进度、人员负荷与交接，刘景浩同步任务状态并参加复核。原生 MPP 包含 295 条人员分配及对应日期、依赖。

正文采用国标第 7.2 节 13 章；详细活动见第 6 章，课程补充见附录 A—J。完整章序与教师 16 项定位见随附“国标结构与评审对照 G04”。

目录

文档控制 2
1 引言 4
2 引用文件 6
3 交付产品 7
4 所需工作概述 11
5 实施整个软件开发活动的计划 12
6 实施详细软件开发活动的计划 17
7 进度表和活动网络图 25
WBS 工作分解结构 26
8 项目组织和资源 36
9 培训 38
10 项目估算 38
11 风险管理 41
12 支持条件 43
13 注解 44
附录 A 工作包时间责任与完成标准 45
附录 B 详细任务分解与周安排 52
附录 C 计划阶段 16 项评审对照 68
附录 D 会议与成员阶段评价 70
附录 E 模板依据与量化管理 71
附录 F 人工预算与配套管理文件 76
附录 G Git 图形界面协作说明 78
附录 H 日志需求与开发工作记录 80
附录Ⅰ 可行性八步骤与需求分析任务安排 82
附录 J 用户代表与原型走查 103

1 引言

1.1 标识

系统名称为城院帮，项目标识 HZCU-CampusHub，文档标识 G04-SDP-2026。本文件规定项目的实施、进度、责任、资源和质量控制。文档版本 V1.9，修订标识 G04-SDP-20261108-02，修订日期 2026 年 11 月 8 日；排期基准 G04-BL-20261028-01。

1.2 系统概述

城院帮面向已经明确求职岗位、正在准备投递与面试的大学生，提供实习与求职经验分享社区。重点服务大三、大四读者，鼓励已获得实习或工作经历的校内学生与校友分享亲历。平台结构支持全校，首批内容与演示案例聚焦计算机相关专业。

核心使用场景：读者选择目标岗位，并按公司、同专业等条件筛选经验，了解与自己起点接近的人如何准备投递和面试。阅读后可收藏、评论，必要时自愿查看作者联系方式并在站外联系。

项目总目标：在课程周期内完成微信小程序、读者与作者网页端、社区管理网页和运维管理网页，交付可运行的经验社区及配套工程文档。产品采用免费阅读、非现金激励和自愿站外联系的模式。

准备实习与求职的学生需要跨渠道搜集资料，判断经验与自身专业、基础和目标岗位的适用性，并找到相似起点的准备路径与交流渠道。项目按岗位、同专业筛选、经历背景和文章评论组织亲历经验，需求依据前期讨论与求职场景分析。[R5]

开发方为 G04 王晨与刘景浩，使用方为本校读者、作者及管理维护角色；本组承担课堂项目投入。教师和助教依课程要求评审，未设企业委托方。现阶段正式运行现场为个人电脑、Windows 及 WSL2 本地课堂演示环境。

1.3 文档概述

本文规定交付产品、开发活动、进度网络、组织资源、培训、估算、风险与支持条件，与可行性分析报告、WBS、周计划和系统测试计划配套使用。

1.4 与其他计划之间的关系

本计划统筹范围、进度与资源；可行性分析报告说明方案选择与实施依据；系统测试计划细化功能、性能、压力和恢复验证；工作日志、周会议纪要及问题变更记录支持执行检查。总体设计、详细设计和操作手册按对应工作包交付。

1.5 基线

计划基准日期为 2026 年 10 月 1 日，执行窗口为 2026 年 10 月 8 日至 2027 年 1 月 6 日。王晨担任组长兼项目负责人，刘景浩担任成员。工作范围覆盖计划、可行性、需求、总体与详细设计、实现、测试、部署维护及课程收尾。

本计划采用下表所列范围、任务、排期、测试和课程资料作为输入，需求、设计及测试成果按相应里程碑形成受控版本。

本计划文档修订标识为 G04-SDP-20261108-02，日期为 2026 年 11 月 8 日；排期基准采用 G04-BL-20261028-01。输入文件、版本及 SHA256 见《版本与输入基线 G04.json》。

输入编号	输入文件与版本日期	用途
IN01	城院帮软件需求规格说明书 G04.docx；V1.2，2026 年 10 月 28 日	初步范围、角色和需求输入；原 10 月 23 日需求目标保留历史；本轮 3.6—3.9 修订后登记内部确认。
IN02—IN04	任务数据.json、详细周计划 G04.md、任务人员工时明细 G04.csv；10 月 28 日修订登记	WBS、交接、负责人和 226.55 人时估算。
IN05—IN06	城院帮项目计划 G04.mpp、计划阶段评审原表.pdf；10 月 28 日修订登记	日期依赖与课程 16 项检查要求。
IN07—IN08	系统测试计划 G04.docx；10 月 18 日整理。10 月 17 日周会纪要；10 月 21 日整理	测试与恢复要求；会议 1.054 人时 / 人及 91.0、90.5 分评价。
IN10	第 2 章 可行性研究(1).pdf；课程提供版，58 页；2026 年 10 月 21 日接收	八步骤、系统流程图、DFD、数据字典与成本效益方法。
IN11	软件工程-课程项目评审表-需求阶段评审.pdf；课程提供版，2 页、11 项；2026 年 10 月 21 日接收	当前周需求交接与证据检查，不替代计划阶段 16 项原表。

输入编号	输入文件与版本日期	用途
IN12—IN14	第 3 章需求分析.pdf 70 页及需求评审表 2 页，10 月 28 日接收；SRS V1.2、模型说明 V1.1 及分析报告 V1.3	三模型、数据规范化、辅助图、四维验证及 11 项评审对照。
IN15—IN16	本周课程作业通知；10 月 31 日元宝会议纪要及组长评分补充	11 月 1 日 22 时提交要求；文档共同评审、协作环境与分支规范；本期评价 91.2/91.3。

项目计划 G04-SDP-2026 采用 V1.9，可行性分析报告 G04-FAR-2026 采用 V1.6；细化修订号 G04-BL-20261104-PROCESS，原排期 G04-BL-20261028-01 保留作对照。

2 引用文件

[R1] 软件工程课程课件 第 13 章 软件项目管理，97 页。依据 13.1 软件规模、13.2 工作量估算、13.3 进度计划、13.4 人员组织、13.5 质量保证及 13.6 配置管理。

[R2] 软件工程课程课件 第 1 章 软件工程学概述，78 页。依据软件生命周期、瀑布模型、文档及阶段评审。

[R3] 软件工程课程计划与团队作业通知，2026 学年。课程节点、阶段成果及周日 22 时邮件提交要求。

[R4] 软件工程课程项目计划阶段评审检查表，2 页，16 项评审要求。

[R5] G04 初步需求与已确认产品范围，2026 年 10 月 18 日整理；对应 IN01 初步需求规格说明书，登记路径、版本及摘要见 1.5 与《版本与输入基线 G04.json》。

[R6] 张海藩、牟永敏 软件工程导论 第 6 版，清华大学出版社，2013，ISBN 9787302330981。教材结构参考；用于生命周期、可行性和项目管理方法对应。

[R7] Kathy Schwalbe．IT 项目管理 原书第 8 版．北京：机械工业出版社，2017。版次采用本组指定教材，出版年与上海交通大学在线课程教材目录核对：
https://cnmooc.sjtu.cn/portal/course/5762/15509.mooc ，查阅 2026 年 10 月 21 日。

[R8] 工具官方参考文档，网页登记日期为 2026 年 10 月 21 日；网页文档与实际工具版本分别记录。

Microsoft．Learn more about resource units，Project 桌面版资源单位说明：
https://support.microsoft.com/en-us/project/learn-more-about-resource-units 。

Apache Software Foundation．JMeter User Manual，在线手册：
https://jmeter.apache.org/usermanual/index.html 。

JUnit Team．JUnit User Guide，参考文档版本 6.1.3：
https://docs.junit.org/6.1.3/overview.html 。实际依赖由工程构建清单锁定。

Git 项目．Git Reference，在线参考：https://git-scm.com/docs 。实际 Git 版本在发布清单登记。

课件参考条目按资料名称、章节与课程来源列示。项目管理方法以所提供课件和评审表为直接依据，任务估算与技术方案由本组制定。

[F1] GB/T 8567—2006 第 7.2 节第 7、8 章。进度表、活动网络图、项目组织和资源为本组计划的编制依据；周计划字段和控制指标由本组结合课程要求制定。

[F2] GB/T 8567—2006 第 7.2 节。计划跟踪和更新、配置控制、进度与资源安排。完整 131 页 PDF 副本已保存，标准状态于 2026 年 10 月 16 日在国家标准公开系统核对为现行；实际与预测分开、预警阈值为本组控制规则。

[R11] GB/T 8567—2006 计算机软件文档编制规范，第 7.2 节软件开发计划。正文 13 章与标准章序对应；第 6 章按本项目规模说明适用及裁剪。

课程资料采用课程提供版本，以章节名称、页数和 2026 年 10 月 28 日修订登记日期识别；课件条目保留课程来源，不列教师作者姓名。已保存输入文件的路径和 SHA256 见《版本与输入基线 G04.json》，在线资料按版本或查阅日期登记。

[R9] 软件工程课程课件 第 2 章 可行性研究，58 页；2026 年 10 月 21 日接收。八步骤见 PDF 第 8—14 页，两类图见第 16—39 页，数据字典见第 41—49 页，成本效益见第 51—56 页。

[R10] 软件工程课程项目评审表 需求阶段评审，2 页、11 项，2026 年 10 月 21 日接收。作为需求阶段交接依据，计划阶段 16 项评审继续保留。

[R12] 第 3 章 需求分析，软件工程课程课件，70 页，2026 年 10 月 28 日接收。三模型见 25—26、69 页；实体联系、规范化、状态和辅助图见 29—57 页；验证见 60—68 页。

3 交付产品

3.1 程序

交付微信小程序源码及开发者工具可运行产物、读者作者网页、社区管理网页、独立运维网页与执行器、业务服务、数据库迁移和初始化脚本。各程序以发布清单中的版本、构建方式和运行条件标识。

3.2 文档

交付成果登记

下表为交付成果索引，计划形成日期来自 WBS。执行时在《交付成果登记 G04.csv》中记录实际日期、版本、证据与确认人，达到完成标准并经复核后登记验收结果。课堂日期和邮件截止见第 3.6 节。[F2]

成果与 WBS	计划形成日	责任与复核	交付及完成依据
D01 项目计划及排期 1.3	10/15	王晨组织，双方确认	正式计划、WBS、MPP、工程网络与预算。任务可分配、交接与验收；评审意见逐项登记
D02 可行性报告 2.3	10/15	双方编写，交叉确认	报告、方案比较及实施安排；技术、成本、资源、进度和验收要求明确
D03 需求修订基线 3.6—3.9 及 3.5	11/01 提交 11/03 复核 11/04 反馈	双方编写，交叉确认	SRS、三模型、字段字典、原型走查、追踪和 11 项对照。用户确认及内部审查有真实记录后登记验收，不把原 10/23 目标当实际完成。
D04 设计基线 4.5	11/05	王晨技术，刘景浩交互，双方确认	总体及详细设计、接口、数据与恢复流程。关键设计问题关闭；原型、契约和用例一致
D05 集成候选版本 5.12	11/27	王晨集成，刘景浩核对端到端流程	双端、业务、社区与运维；提交及发布标识。真实接口联通；模拟与实际分开；保留联调记录
D06 首轮内部验收 6.7	12/04	刘景浩汇总，王晨技术核对，双方确认	测试报告、JTL、用例、缺陷及恢复证据。按第 6 章目标实测，严重缺陷关闭；未过项重排
D07 运行维护与交接 7.3	12/14	王晨统稿，刘景浩复核运维操作，双方交接	运行手册、备份、回退及交接记录。双方可按手册冷启动并演练；失败能定位和回退
D08 总结与归档 8.5	01/06	王晨组织，刘景浩核查附件，双方确认	总结、最终包、清单与真实评价。1 月 3 日提交基线，1 月 4 日核对尾项，1 月 6 日确认收尾

3.3 服务

提供本机安装与冷启动演示、角色和操作说明、部署重启备份恢复演练，以及双方交接。课程后持续运营、云端服务等级和第三方咨询不作为本次承诺。

3.4 非移交产品

个人开发环境、AI 会话、缓存、临时预览、私人资料和实际账号密钥不作为交付产品；工具依赖以安装说明或版本清单提供。正式源码、工程文档与可复现的测试证据不因使用 AI 而排除。

3.5 验收标准

里程碑的准入与准出

里程碑是检查成果和作出下一步决定的时点。内部形成、邮件提交、课堂评审分别登记；预计日期不能作为实际完成证明。教师反馈先分析影响，再回到对应需求、设计或实现任务处理。[F2]

检查点	必须具备的输入	通过条件与未通过处理
需求修订 11 月 3—4 日	课件、三模型、字典、原型及用户反馈	64 项需求追踪及四维验证；实际用户确认、未决项和评审意见有责任及期限，阻塞问题未关闭不得签署设计输入基线。
设计基线 11 月 5 日	SRS 与接口、数据、关键状态和恢复方案	关键设计问题关闭；测试条件可执行；未关闭阻塞项先处理
集成候选 11 月 27 日	模块产物、单元结果、接口与联调数据	双端和管理链路使用实际接口；失败明确责任并重排
首轮内部验收 12 月 4 日	固定版本、测试数据、用例、性能压力及恢复记录	核心流程执行且严重缺陷关闭；限制和剩余项有期限
最终归档 1 月 3 日至 6 日	运行包、文档、证据、已知问题与真实成员评价	1 月 3 日提交当时基线，1 月 4 日核对尾项，1 月 6 日完成收尾

核心流程全部执行，阻塞与严重缺陷关闭。未关闭的一般问题列影响、责任人与期限。必须需求有实际验收结果；本机网页部署、业务重启、备份恢复有真实记录；代码、安装包、报告和测试版本一致。公网部署及小程序正式发布不作为本次课堂条件。

3.6 最后交付期限

课堂节点依据课程计划，邮件在此前周日 22 时前提交，组内当日 18 时前封版。课堂新增意见在课后登记、分析和修订；提交版与后续修订分别归档。课程安排变化时，组长更新 Project 和提交清单。[R3]

课堂日期	邮件截止周日 22 时	提交材料	对应工作
10/14	10/11	项目计划评审	1.2 评审材料；1.3 课后修订
10/21	10/18	可行性报告	2.3 内部结论与交叉确认
10/28	10/25	SRS 与需求 PPT	3.4 需求基线与完整用例
11/04	11/01	SRS 修订与需求复审	先提交已有修订；3.5 处理当堂新意见
11/11	11/08	总体设计报告	4.5 内部设计基线
11/18	11/15	详细设计报告	设计正文、接口和状态一致
11/25	11/22	设计修订与翻转 PPT1	先交现有修订；4.7 处理当堂意见
12/02	11/29	代码清单、用例与翻转 PPT2	5.12 联调与候选版本
12/09	12/06	系统测试报告	6.7 首份报告；6.8 后续复核
12/16	12/13	测试报告修订	先交已有修订；7.5 处理当堂意见
12/30	12/27	总结与总评 PPT	8.3 交付核查与演练
01/06	01/03	归档基线与课程收尾	12/31 准备提交基线；01/04 核对尾项；01/06 确认

组长使用学校邮箱提交，邮件主题为“SE2026-G04-作业名称”，按课程要求抄送助教和本组成员。收件、抄送、附件、来源及版本在发送前核对并保留发送记录。

最终收尾日为 2027 年 1 月 6 日；1 月 3 日提交当时确认的归档基线，1 月 4 日处理并核对尾项。周计划与附录 A、B 给出各项中间成果的截止和确认人。

4 所需工作概述

用户类别与代表

用户/参与者	核心功能与价值	用户代表
访客、登录但未认证用户	浏览、检索、筛选、免费阅读文章及文章内资料链接；进行必要的登录与认证操作。	—
已认证读者	查看评论和作者主页；点赞、投币、收藏、评论与图片回复；举报/反馈；自愿站外联系。	UR-R01
已认证作者（与读者同账号）	网页 Markdown 与小程序基础图文创作；多草稿、预览、发布、修改、下架；可选联系方式；查看认可与荣誉。	UR-A01
社区管理员	网页端认证审核、巡查、举报/反馈/申诉处理、分类维护、必要的用户限制与操作留痕。	UR-M01
运维管理员	独立运维权限；网页查看服务状态、错误日志和备份记录，执行部署、重启、备份恢复，追踪任务结果。	UR-O01

内容范围包括求职准备、面试流程与复盘、实习资料、成长路径、岗位与公司体验。文章可关联岗位、公司、专业、经历阶段和发生时间，正文采用自由撰写与可跳过的写作提示。附录 J 列出走查任务和待验证的改进。

身份与交流：本期仅校园邮箱注册并验证码认证，材料人工审核和微信绑定列后续扩展；主页显示昵称、专业、年级与认证状态，不公开真实邮箱。未认证用户只浏览和阅读文章，评论、作者主页和联系方式由认证用户访问。所有限制在服务端执行。

创作与激励：网页端支持 Markdown 和图片，小程序提供基础图文创作、草稿、预览、修改和下架。资料可附网盘链接。点赞表示认可，投币表示特别有帮助，收藏供以后查阅。币通过简单日常任务获得，每日设领取上限，不兑换现金；作者按收到的有效币累计获得称号与勋章。

治理原则：先发布、后管理。认证用户可以举报、反馈，社区管理员查看关联文章及评论、处理问题并保留操作记录。禁止广告及欺骗性内容。荣誉体现社区贡献，不作为经历真实性的保证。

本次交付不包含付费文章、支付、现金打赏、咨询订单、站内即时通信、任务悬赏、跑腿、招聘交易及独立考研考公板块。

交付目标与可检查结果

项目目标按读者使用、作者创作、管理维护和课程成果四类结果检查，并通过需求编号和验收用例建立追踪关系。交付、进度和资源按 GB/T 8567—2006 第 7.2 节组织，阶段产物与完成标准见下表。[Q1]

目标	预期结果	对应工作与检查
G1 找到并阅读经验	岗位为主入口，专业与公司辅助筛选；未认证权限在接口端执行	需求 3.1—3.4；文章与权限用例，报告第 6 章
G2 分享与交流	网页 Markdown、小程序图文、草稿发布、评论及非现金激励形成完整流程	实现 5.2—5.9、5.12；双端异常与账本证据
G3 管理与维护	社区与运维权限分开；网页部署、重启、备份恢复及失败保护可复核	设计 4.4、实现 5.10—5.11；验证 6.4—6.5、维护 7.1—7.3
G4 课程交付	本地可启动；核心用例执行、严重缺陷关闭，文档、版本与运行包一致	验收 6.7；归档 8.3—8.5，完整标准见第 3、6 章

实施假设与约束

本计划采用两人协作、现有电脑、本地课堂演示及免费经验社区的实施范围。集中开发与测试追加投入按周计划组织；校园邮箱、跨端内容、独立运维与恢复纳入技术验证。可研 C01—C05 与本计划任务、负责人和验收节点对应，范围或资源变更通过问题与变更登记管理。

5 实施整个软件开发活动的计划

5.1 软件开发过程

采用阶段成果与评审控制的开发过程，WBS 按软件工程阶段组织。需求和总体、详细设计分别交付报告；11 月 5 日完成内部设计评审后，11 月 6 日开始集中实现。课堂在 11 月 11 日、

18 日和 25 日分别检查设计材料，新增意见通过影响分析进入模块调整，不将编码开始等同于课堂评审已通过。[R1][R2]

阶段	本项目工作与产物	阶段完成条件
项目计划与评审	WBS、周计划、Project、预算、风险与责任	每项任务可分配、可交接、可验收；评审意见有记录
可行性研究	技术、经济、操作、进度、资料与风险分析	关键技术有验证方法，失败有替代方案
需求分析	SRS、用例、原型、权限、数据与异常	需求有编号和明确验收条件；双方确认内部基线
总体与详细设计	架构、ER、接口、流程、状态及运行恢复设计	关键问题关闭；文档足以指导实现和测试
编码与单元测试	双端、业务和管理运维模块；单元与联调记录	AI 输出人工核验；真实接口联通，形成候选版本
综合测试	功能、接口、安全兼容、性能压力、稳定性与恢复证据	核心用例通过；阻塞和严重缺陷关闭；限制明确
部署与维护	本机发布包、操作规程、维护变更与交接	可冷启动、恢复、回退；双方可操作管理流程
总结与收尾	偏差分析、总结、真实评价、版本和最终交付	资料同版本，课程意见完成处理，交接有记录

生命周期与 WBS 对应

WBS 设 8 个顶层工作组，并保留管理、评审和收尾活动。教材的软件生命周期仍按问题定义、可行性研究、需求分析、总体设计、详细设计、编码与单元测试、综合测试、维护 8 阶段理解。总体与详细设计共用 WBS 第 4 组，但分别交付和评审；项目计划、部署和总结是管理及交付活动。[R2]

教材阶段	本项目工作包	阶段产物或当前处理
问题定义	前期范围与选题讨论	已过阶段作为历史依据，不重新列为本期待办
可行性研究	2.1—2.3	关键技术条件、方案比较及可行性报告
需求分析	3.1—3.5	SRS、原型、权限异常、追踪及反馈修订
总体设计	4.1—4.2；4.5	架构、数据模型、接口边界及总体设计报告
详细设计	4.3—4.4、4.6；4.5	内部流程、状态、恢复机制及详细设计报告
编码与单元测试	5.1—5.12	模块实现、单元验证、交叉复核与联调


教材阶段	本项目工作包	阶段产物或当前处理
综合测试	6.1—6.8	功能、安全、兼容、性能压力、稳定性与恢复
维护	7.1—7.5	部署交接、维护变更、缺陷修复与回归

采用带反馈的阶段控制：需求或设计评审意见进入问题和变更台账，先分析范围、接口、排期与测试影响，再回到受影响阶段修订。内部基线及课堂复核分别记录，关键问题未关闭时不扩大后续实现范围；执行中同步更新周计划和 Project。[R1][R2]

5.2 软件开发总体计划

系统架构与开发工具

微信原生小程序承担移动端阅读与基础创作；独立 Vue 3/TypeScript/Vite 网页承担长文、完整创作和管理。两端共用 Java/Spring Boot 接口、MySQL、内容结构与权限规则，页面组件和构建流程分别维护。独立运维执行器处理受控部署、重启、备份及恢复。

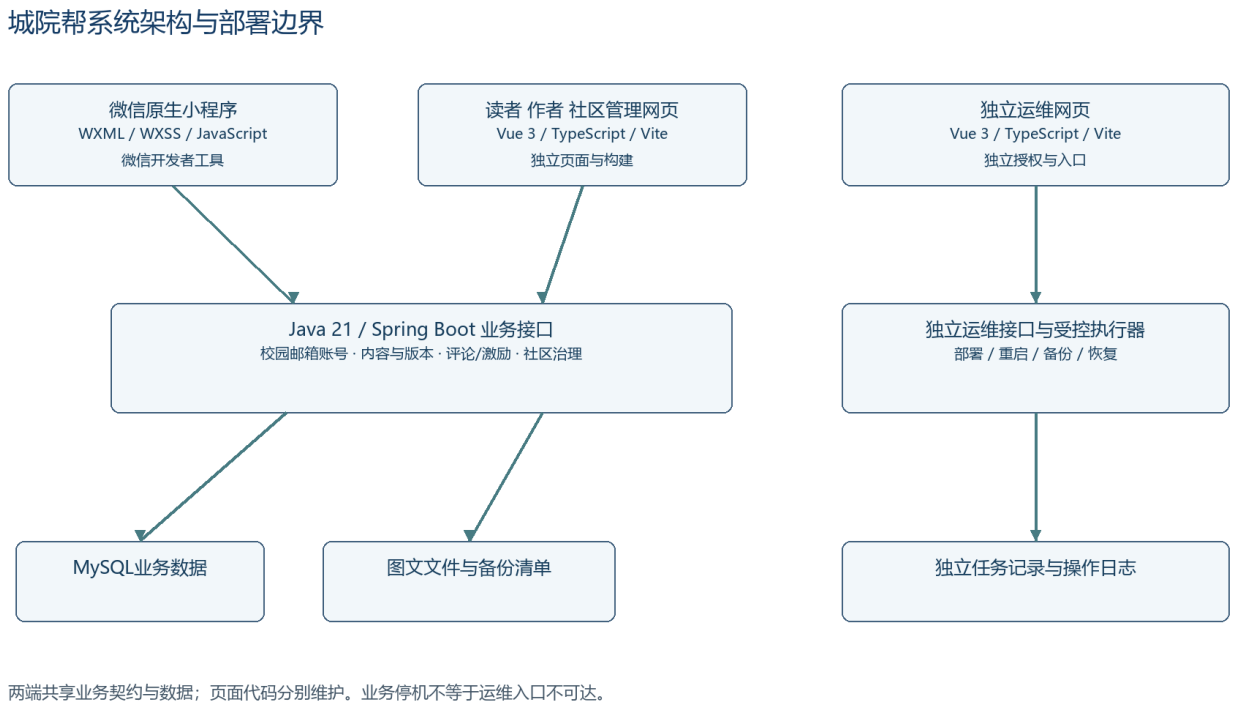

系统架构与本机部署

工程活动	采用工具	主要产物
计划与正式文档	Microsoft Word、Excel	计划、SRS、可行性、测试维护报告与追踪表

工程活动	采用工具	主要产物
项目排期	Microsoft Project	原生 MPP、阶段与详细甘特图、依赖、资源和关键任务
分析与设计	draw.io、Axure RP	架构、工程网络、ER、流程和交互原型；许可不足时用可用的同类原型工具
AI 辅助开发	Codex/GPT、WorkBuddy	框架、接口及具体代码由 Codex/GPT 辅助实现；小程序及相关页面使用 WorkBuddy；豆包用于 PPT。两人审查后入 Git。
前端	VS Code、微信开发者工具	微信原生小程序与 Vue 3 独立网页构建与双端调试、开发者工具演示
后端与数据库	IntelliJ IDEA、Java、Spring Boot、MySQL	接口代码、SQL、初始化和数据库版本
单元接口及集成	JUnit、Spring 测试支持、Postman	单元结果、接口集合、数据断言和集成证据
性能压力与稳定性	Apache JMeter	脚本、JTL、P95、错误率和资源趋势
缺陷跟踪	Bugzilla	复现、等级、指派、修复、复测和关闭记录
配置与协作	Git、GitHub、SourceTree	版本历史、个人分支、合并复核与基线；组长创建维护项目仓库

工具按工程活动选择。JMeter 用于 HTTP 接口度量，浏览器和微信开发者工具用于页面与小程序体验检查。两位成员对各自任务的代码、文档及验证结果负责。[R1][R8]

软件开发方法以需求和设计基线、模块实现、单元验证、集成与综合测试为主；评审意见按影响返回相关阶段。代码与过程材料采用本章软件产品标准，接口字段及错误码在设计中细化，测试步骤和证据格式由系统测试计划承接。

复用框架、依赖及已有成果前，负责人核对版本、许可证、接口和测试覆盖。关键需求包括权限、草稿恢复、跨端版本、币账本与运维失败保护，均按本期验收场景复核。

现有电脑承载本地环境，性能记录包括实际配置及资源竞争情况。方案评审记录备选项、理由、限制和确认人；教师评审、内部复核及用户试用各自保存记录。

软件产品标准

本项目采用 G04-STD-2026 V1.0 软件产品标准，2026 年 10 月 21 日生效用于后续编写和复核。下表作为代码、接口、文档与测试记录的共同检查依据；具体字段和设计决策在需求及设计中按版本细化。

检查范围	采用标准	检查与记录
代码格式与命名	Java 统一 4 空格缩进、UTF-8；类用 UpperCamelCase，方法与变量用 lowerCamelCase，常量用 UPPER_SNAKE_CASE；前端统一 2 空格，组件用 UpperCamelCase；SQL 表和列用小写下划线。	任务负责人格式检查，另一成员复核差异。
注释与复杂逻辑	对外接口说明用途、输入输出和错误；事务、幂等、权限及恢复过程说明关键约束和失败处理；公共方法写必要参数与返回说明，避免复制无效注释。复杂分支拆分并列边界用例。	PR 说明关联 REQ 与 WBS，保存复杂逻辑检查和用例。
接口与错误	HTTP 接口传输 JSON 并采用 UTF-8；字段命名统一 lowerCamelCase；响应包含 code、message、data、traceId，分页明确页码与上限；状态码区分成功、输入错误、未认证、无权限、冲突和服务失败。	接口文档与 Postman 断言一致；兼容变化先评估调用端。
安全与配置	服务端执行权限校验、输入校验与参数化 SQL；密码、验证码、令牌和 SMTP 授权码不写日志和仓库；外部响应不暴露堆栈。Debug 与 Release 诊断按配置切换，默认 Release。	检查越权、危险输入、日志脱敏与配置样例。
文档与版本	使用统一文档编号、版本、日期及输入基线；正文 12 磅、表格 11 磅；图表注明编号与来源，长表重复表头；Word 刷新目录后导出 PDF；正文、附件与文件摘要清单同批发布。	封版时交叉复核目录、引用、图表、文件摘要和交付清单。
需求与测试记录	REQ 标识需求，TC 标识用例，DEF 标识缺陷，CR 标识变更；记录对象版本、环境、输入、步骤、预期、实际、结果及证据路径。功能、性能、压力、稳定性和恢复结果分别保存。	测试报告关联需求与缺陷；重测记录引用修复版本。
脚本与交付	运维脚本只执行已配置目标与固定动作，检查返回状态并保留任务编号；数据库迁移新增版本，不覆盖已发布迁移；发布清单列构建、依赖、配置项和校验摘要。	交叉复核后合并，发布前执行冷启动与失败恢复检查。

6 实施详细软件开发活动的计划

6.1 项目计划和监督

王晨组织周检查、风险与变更，刘景浩汇总任务及配置状态；双方核对产物、阻塞、预测完成与下周任务。跟踪表分别记录基线、预测、实际及证据，缺项登记补录责任。测试、安装及移交见系统测试计划和 6.12、6.13 节。

6.2 建立软件开发环境

对应工程基础与工具核查任务。两人分别核对开发、测试环境及依赖版本；统一 Git 开发库、数据库迁移、配置样例与文档目录。AI、编辑器和个人缓存属于辅助环境；密钥保存在本机忽略配置中。

6.3 系统需求分析

需求分析按课件建立数据、功能、行为三个模型：ER 图、分层 DFD 和状态转换图。3.1—3.4 保留原计划历史；新增 3.6—3.9 完成本轮课件核对、字典规范化、原型走查和四维验证，3.5 接收 11 月 4 日课堂意见。真实用户确认是设计输入基线的前提。

可行性研究与需求交接

可行性八步骤在 2.1—2.3 工作包下设 FS01—FS08，向下展开 44 项任务，合计 10.00 人时。需求分析在 3.1—3.9 下展开 44 项执行任务，覆盖课件 10 个主题；其中 3.6—3.9 仍为 20.00 人时。任务、责任、日期、人时和产物见附录 I，并与 WBS、甘特图及 Project 源对应。

6.3.1 需求与可行性方法的交付展示

分析成果	具体完成判断	展示位置
可行性八步骤	44 项分解，逐步有输入、动作、项目结果、完成标准和 WBS；不能只列八个名称	可研第 3.5 节；成果页码导航
两类流程图	物理程序/介质数据流与逻辑 DFD 明确区分；P1—P5、D1—D6 同名	可研第 5.2 节

分析成果	具体完成判断	展示位置
三个分析模型	用投币案例显示 ER 对象联系、DFD 数据变换和 STD 状态条件；完整模型另附	需求分析第 3、4、7 章
字典与规范化	五类字典有实例；组合、正则和语义分开；展示同一例子 1NF→2NF→3NF	需求分析第 5、6 章
辅助工具	层次方框、带重复/选择的 Warnier、IPO 和课件表形改进 IPO 均有实际图	需求分析第 8 章
验证和审查	四类验证有场景与证据；11 项评审能定位；真实用户反馈与会议如实登记	需求分析第 9、10 章

本次保留 52 个工作包及其日历窗口，将 24 个原子任务进一步细分，形成 167 项核心末级任务；Project 共 322 条目。团队 226.55 人时、王晨 120.35 人时、刘景浩 106.20 人时和人工预算 10366.93 元保持不变。细化修订号为 G04-BL-20261104-PROCESS，原 G04-BL-20261028-01 保留作对照。

6.4 系统设计

对应 WBS 第 4 组。王晨侧重业务边界、接口和数据，刘景浩侧重双端、社区及独立运维；共同复核系统级决策、部署边界与失败传播，形成总体设计及可追溯决策。

6.5 软件需求分析

将系统要求分配到认证、内容、互动、社区和运维软件配置项，建立 REQ 到接口、数据和验收用例的追踪。未关闭的规则经双方确认后更新 SRS，不以代码行为替代需求确认。

6.6 软件设计

分别完成配置项级接口、状态、局部处理与数据约束，覆盖草稿冲突、图片失败、投币一致性及部署恢复保护。总体和详细设计分别交付，内部设计基线及课堂反馈处理按原计划执行。

6.7 软件实现和配置项测试

对应 WBS 第 5 组及单元验证。负责人使用 Codex/GPT 或 WorkBuddy 辅助实现并自查，另一成员交叉复核。按业务断言执行测试，保存代码版本、用例、结果及缺陷，修复后重测。

6.8 配置项集成和测试

按共享认证、内容接口、网页和小程序、管理及运维的依赖分段接入，在 WBS 5.12 形成联调候选。核对真实接口、权限、错误响应与数据状态；问题回到所属模块修复并重测，保存结果和版本。

6.9 CSCI 合格性测试

对软件配置项按对应需求与用例检查。在本地目标环境和微信开发者工具中执行；与实现者交叉复核，保留独立性限制。由另一成员验收不能称为独立第三方认证。

6.10 CSCI 与 HWCI 集成和测试

本项目不开发定制硬件配置项，不单设专用硬件集成工作包。现有电脑、WSL2、数据库及开发者工具的运行兼容和资源检查纳入环境核查、兼容及系统测试，不省略实际运行检查。

6.11 系统合格性测试

对应 WBS 第 6 组，使用《系统测试计划 G04》安排功能、接口、安全兼容、负载、压力、稳定性及恢复验证。下列场景与指标均为计划要求，实际执行后才能填通过或失败。

场景	需求/设计要规定的行为	计划验证证据
验证码错误、过期、发送失败	清晰反馈、可重新申请；次数与有效期在 SRS 确定	成功/失败/过期、不同邮箱资格及日志不泄密
未认证或普通账号请求受限数据	服务端拒绝；不返回隐藏资料与管理信息	直接接口请求及不同角色回归
断网、保存失败、图片部分上传失败	保留可恢复正文；标记失败图片；重试不重复发布	草稿/图片/重复提交场景记录
同一文章跨设备编辑	识别版本冲突，不静默覆盖另一端新内容	双端冲突与恢复结果
重复领取、并发投币、余额不足	奖励只发一次；投币记录与余额一致；不得透支	重复与并发请求后的余额/贡献一致性
文章/评论被下架、收藏链接失效	明确不可用状态，保留必要记录；不泄漏已隐藏内容	旧链接、通知跳转、收藏等相邻路径回归
举报、申诉、管理员处理失败	保留原状态或明确结果；理由与操作人可追踪	处理前后状态、通知、审计及失败回退

场景	需求/设计要规定的行为	计划验证证据
运维网页操作失败或重复提交	目标确认、权限校验、任务互斥与持久日志；业务停机可查询	部署/重启/恢复、越权、重复、失败与业务停机场景
外部网盘/联系方式失效	用户可反馈；平台不保证站外服务结果	文章资料与联系入口提示及反馈闭合

测试类别	对象与工具	责任与证据
单元	权限、状态、账本和筛选；JUnit 及 Spring 测试	各模块负责人；代码版本与单元结果
接口、功能和集成	五类角色、双端与完整链路；Postman	刘景浩统筹、双方修复；集合、断言和缺陷
安全与兼容	越权、隐私、危险输入、图片、双端编辑	刘景浩；直接 API、浏览器及开发者工具记录
性能与负载	查询、详情、发布与评论；JMeter	王晨；JTL、P95、错误率、吞吐与资源趋势
压力与稳定性	容量边界、持续运行与降载恢复	王晨；阶梯脚本、故障和一致性记录
部署与备份恢复	冷启动、部署重启、损坏备份、回退	王晨验证、刘景浩配合运维实现；恢复前后数据与执行日志

性能与恢复目标

以下是计划验收目标，最终结论必须注明执行环境、版本、数据与实际结果。同机施压需记录资源竞争；JMeter 结果不能替代页面渲染和小程序体验检查。

场景	计划目标	必须保留的证据
30 并发负载	合成 200 用户、2000 文章、5000 评论；60 秒升载、运行 10 分钟；读 P95≤1 秒、写≤2 秒，非预期错误率<1%	环境版本、脚本、原始 JTL 与统计结果
阶梯压力	10、30、50、100 并发，各运行 2 分钟，升载 30 秒；100 用于探测，不承诺此容量	吞吐、错误、CPU 内存、失效点与数据一致性
稳定性与恢复	10 并发运行 30 分钟；压力后降至 10 并发，2 分钟内恢复；账本与数据不发生不一致	持续运行结果、降载恢复及数据库断言
备份恢复	数据库、图片及版本清单一致；拒绝损坏或不兼容备份；恢复前保护当前状态	备份哈希、恢复日志、关键记录及失败保护结果

6.12 软件使用准备

课堂启动顺序：启动 WSL2 与数据库，启动网页和运维服务，再启动业务后端，检查接口后打开网页及小程序。演示前关闭无关软件、确认磁盘空间和备份、重置测试数据。邮箱发信与外部网盘需要网络；本机文章与主要交互流程使用预置数据演示。

演示邮箱 32401211@stu.hzcu.edu.cn 用于收件和认证场景。读者作者、社区管理员与运维管理员分别准备测试身份。邮箱及平台凭据分别存于受控本地配置，交付材料和日志仅保留脱敏信息。

运维网页提供服务状态、错误日志、备份记录，以及部署、业务服务重启、备份和恢复操作。部署使用已准备的发布包；重启对象为项目业务服务；恢复对象为演示数据库与关联文件。每次确认目标和版本或备份标识，生成持久化任务编号，展示排队、执行中、成功或失败状态。普通用户和社区管理员无运维执行权限。

部署流程：检查发布包及环境、保存必要备份、切换应用、执行健康检查、记录结果。失败保留证据并进入回退处理。执行服务对同一目标的冲突任务互斥，防止重复请求造成重复操作。

恢复流程：核对备份完整性、数据库与图片匹配、应用版本兼容性，保存当前状态，在维护状态执行恢复，验证后恢复访问。恢复会覆盖目标数据，备份时点之后的变更可能丢失，确认页明确显示影响。Git 代码回退与数据库恢复分别管理。

备份覆盖演示数据库与图片关联文件、版本及完整性清单。演示环境运行期间安排每日备份及重要部署前备份；不要求电脑关机时执行定时任务。备份放在应用目录之外，并在验收前制作离机副本。同一电脑内另一目录只用于操作恢复，不能视为整机故障保护。日志屏蔽密码、令牌和认证材料。课堂前先验证网页实际发起四类操作，以及越权、重复请求、失败和业务服务停机后的查询行为。

社区运营准备至少 8 篇示例文章，覆盖 4 类主题，标注来源，虚构内容标演示数据。管理员处理举报与反馈时可直接查看对应文章及评论，并将处理理由反馈给用户。

维护流程为问题登记、影响分析、修复安排、执行、回归、归档与反馈。王晨负责集成环境、运行架构核对及部署恢复验收；刘景浩负责独立执行服务、运维网页、操作手册和模块修复；双方完成维护交接。课程结束交付运行手册、已知问题、备份与交接记录。

6.13 软件移交准备

对应部署维护与 WBS 第 8 组收尾。交付可执行程序、源码、迁移脚本、文档、依赖版本、测试报告、已知限制、备份清单及操作说明；两人按手册完成冷启动与维护交接，核对版本、文件哈希和恢复证据。

6.14 软件配置管理

配置管理覆盖代码、文档和数据。Git 管理版本，GitHub 用于协作，王晨负责仓库创建、成员授权及合并协调。main 保持可交付；工作分支采用“类型/姓名缩写-任务名”，如 feat/wc-email-auth、feat/ljh-web-editor，双方交叉复核后合并。此为会后由组长授权完善的规则，会议原首字母方案保留在附录 D。密钥、认证材料与备份不提交仓库。细则见分支命名与协作约定 G04.md。[R1，第 74—85 页]

配置项	主责与核对内容	留存方式
需求与计划	刘景浩汇总；王晨复核技术/排期	文档标识、评审意见、影响范围和修订记录
原型、架构与接口	王晨技术设计；刘景浩页面流程	draw.io 源文件、接口约定与对应需求号
源码与数据库脚本	各模块主责；王晨集成	Git 提交、迁移版本、关键配置模板
用例、报告与演示数据	刘景浩汇总；王晨核对技术结果	需求关联、执行版本、结果及数据来源
发布包与工具版本	王晨发布清单；刘景浩核对交付	构建标识、依赖及工具版本、发布说明
密钥与身份材料	授权人员受控访问	独立受控保存，不纳入普通仓库或公开附件

提交与评审节点：11 月 1 日 22 时前提交初版项目计划、SRS 和评审 PPT；11 月 3 日按 3.9 工作包完成评审前复核与更新；11 月 4 日处理课堂评审反馈。设计 11 月 5 日、实现 11 月 27 日、首轮内部验收 12 月 4 日保持原计划。初版提交不等于需求已批准。

变更流程：提出请求、分析影响、双方确认、实施、验证、同步材料、登记状态。记录编号、理由、受影响需求与配置项、责任人、计划处理日期、实施版本和复核结论。涉及课程范围与截止日的变化按课程要求向教师说明。

刘景浩维护配置与变更记录，王晨核查技术版本。交付前双方核对文档、代码、数据库脚本、测试证据及发布包的一致性。收尾归档项目总结、最终交付包、运行手册、已知问题、阶段评价与课程反馈。

配置审计与状态报告

配置审计：每个阶段封版前，刘景浩按清单检查文件标识、版本、修改记录、相关图表及证据是否同步；王晨核对任务、接口、数据库脚本和运行包的一致性；双方确认遗漏及未关闭问题。产物为基线核查清单、文件摘要和问题处理记录。[R1，13.6.2，PDF 第 84 页]

状态报告：每周记录当前基线、提出/批准/实施/验证中的变更、缺陷、未决事项、责任人和处理期限，说明本周版本相对上一基线的变化。刘景浩汇总，王晨复核并在周会议中确认。配置审计与状态报告同标识、版本控制和变化控制一起纳入配置管理，属于计划安排，不预填实际完成记录。[R1，13.6.2，PDF 第 85 页]

版本同步清单

范围或验收变化同步需求、设计和测试；日期或依赖变化同步 Project、甘特、网络、周计划及交付登记；人时成本变化同步人工明细与预算。相关报告、图表和汇报材料采用同一版本清单。

6.15 软件产品评估

阶段成果由负责人先按完成标准自查，另一人复核需求覆盖、可运行性和证据；记录对象版本、场景、结论、限制及确认人。内部确认、教师评审与真实用户反馈分开，未达标项关联问题台账。

6.16 软件质量保证

质量保证从需求开始，REQ 需求编号、TC 用例编号、设计模块、WBS 工作包、代码版本及证据相互关联。完成标准用检查场景、预期结果和应保存证据描述，避免只写“功能完成”。[R1，13.5]

检查点	检查内容	责任与产物
计划及评审	范围、期限、预算、依赖、资源与 16 项材料	双方共同确认，王晨组织；问题与处理记录
需求与设计	角色、状态、异常、数据、非功能和可验收性	各自编写与交叉复核；追踪表与基线
模块实现与接入	契约、权限、事务、草稿冲突和错误处理	任务负责人自查，另一人复核；单元接口与评审证据
测试、维护与交付	实测结果、缺陷关闭、恢复与版本一致	双方提供证据与修复；报告、维护单和发布清单

6.17 问题解决过程

任务预计无法赶上交接即登记，由组长分析是否影响关键路径、测试和提交；另一成员承担可独立子任务或资料复核，重排后同步 Project、周计划、风险和变更。

进度预警与问题升级

以下为本计划的建议控制规则，双方在执行周会确认适用。已确认的历史会议不增加未发生的决定。负责人发现风险已发生时登记问题编号，关联 WBS、交付成果、处理动作和关闭证据；影响基线时另提变更。

触发条件	处理时限与负责人	保存记录
关键活动预测延期，或严重权限与恢复风险	发现当日由任务负责人告知王晨；暂停受影响放行，双方评估	问题、受影响交付、措施与重新检查日期
一般任务预计延期 1 日以上，或任务人时预测偏差超过 20%	负责人登记；最近周会比较拆分、协作与后移；不得挤掉必要测试	原因、剩余人时、预测完成与容量变化
数据不足或未提交证据	缺项标记未登记或待复核，负责人登记补录期限	缺失项、补录责任和期限

每个问题关联对象、复现条件、影响、负责人、修复版本和重测证据；需要改基线时先评估变更，再实施及确认关闭。

6.18 联合评审

双方在计划、可行性、需求、设计、系统验收和收尾节点共同复核。技术评审检查方案与证据，管理评审检查范围、期限、成本及风险；会议记录保存实际日期、参与人、结论和后续行动。

6.19 文档编制

报告由双方按任务协作，王晨统筹项目管理与技术一致性，刘景浩汇总相关测试、网页及运维材料。正式 Word 更新目录后同源导出 PDF，图表、周计划和台账与对应版本一起检查。文档清单见第 3 章，任务细分见附录 A、B。

6.20 其他软件开发活动

风险见第 11 章，进度、工时及问题指标按实际记录逐周更新。隐私材料与演示数据分开管理。本项目由两人协作完成，按模块交接并复盘工具、流程和估算偏差，必要时修订计划并留痕。

7 进度表和活动网络图

本章展示 WBS 工作分解总览，完整树图作为排期附件。资源容量按两名成员日常各 30—45 分钟及集中阶段追加投入检查，任务人时、周负荷和贡献评价规则见附录 E。

WBS 设 8 个顶层工作组，并按第 5 章对应教材生命周期，52 个工作包细化为 167 项子任务。工作包用于范围与交付管理，子任务用于逐周执行和接口交接。另列 14 项持续周管理活动、35 项交叉复核及 12 个课程里程碑；这些活动进入 Project 资源检查，不充当软件功能点。

WBS 工作分解结构



图 7-1　城院帮 WBS 工作分解总览

完整分解见《WBS 树状结构图 G04》第 2—4 页。第 2 页为总览，第 3 页展开可行性研究八步骤，第 4 页展开需求分析工作包。各工作包的执行项、负责人、交接及验收见附录 A、B、I 及详细周计划。

用户代表邀约、走查及复测按 3.8.1.2、3.8.2.1、3.8.2.2 执行，四类代表与任务见附录 J。实际走查日期及结果在登记表中更新。

按目标组织的阶段路线

依据国标第 7.2 节第 7、8 章，将总体进度、活动依赖、任务负责人和资源逐项衔接。三段总览用于浏览，教材阶段与详细 WBS 另列；日期和验收标准采用本组计划数据。[Q1]

阶段	计划时间	主要产物与 WBS	进入下一段的条件
分析与设计	10 月 8 日至 11 月 5 日	计划、可行性、需求、总体及详细设计；WBS 1—4	形成可验收的范围与设计，11 月 5 日双方核对后进入集中实现
实现与验证	11 月 6 日至 12 月 4 日	双端、共享接口、社区及运维；WBS 5—6	11 月 27 日联调；12 月 4 日按实际证据进行首轮内部验收
维护与收尾	12 月 7 日至 1 月 6 日	反馈修复、部署维护、总结归档；WBS 7—8	保护恢复和回退证据，1 月 3 日提交归档基线，1 月 6 日收尾

详细任务的准入与完成登记

每项任务使用现有 WBS 标识，同时记录角色、交付物、前置、排期、工期、计划及实际人时。开始前由负责人确认上游产物和环境；结束后保存产物版本、场景结果与复核结论。工期是进度跨度，人时是人员投入，两者不互换。[F2]

阶段排期与人员投入

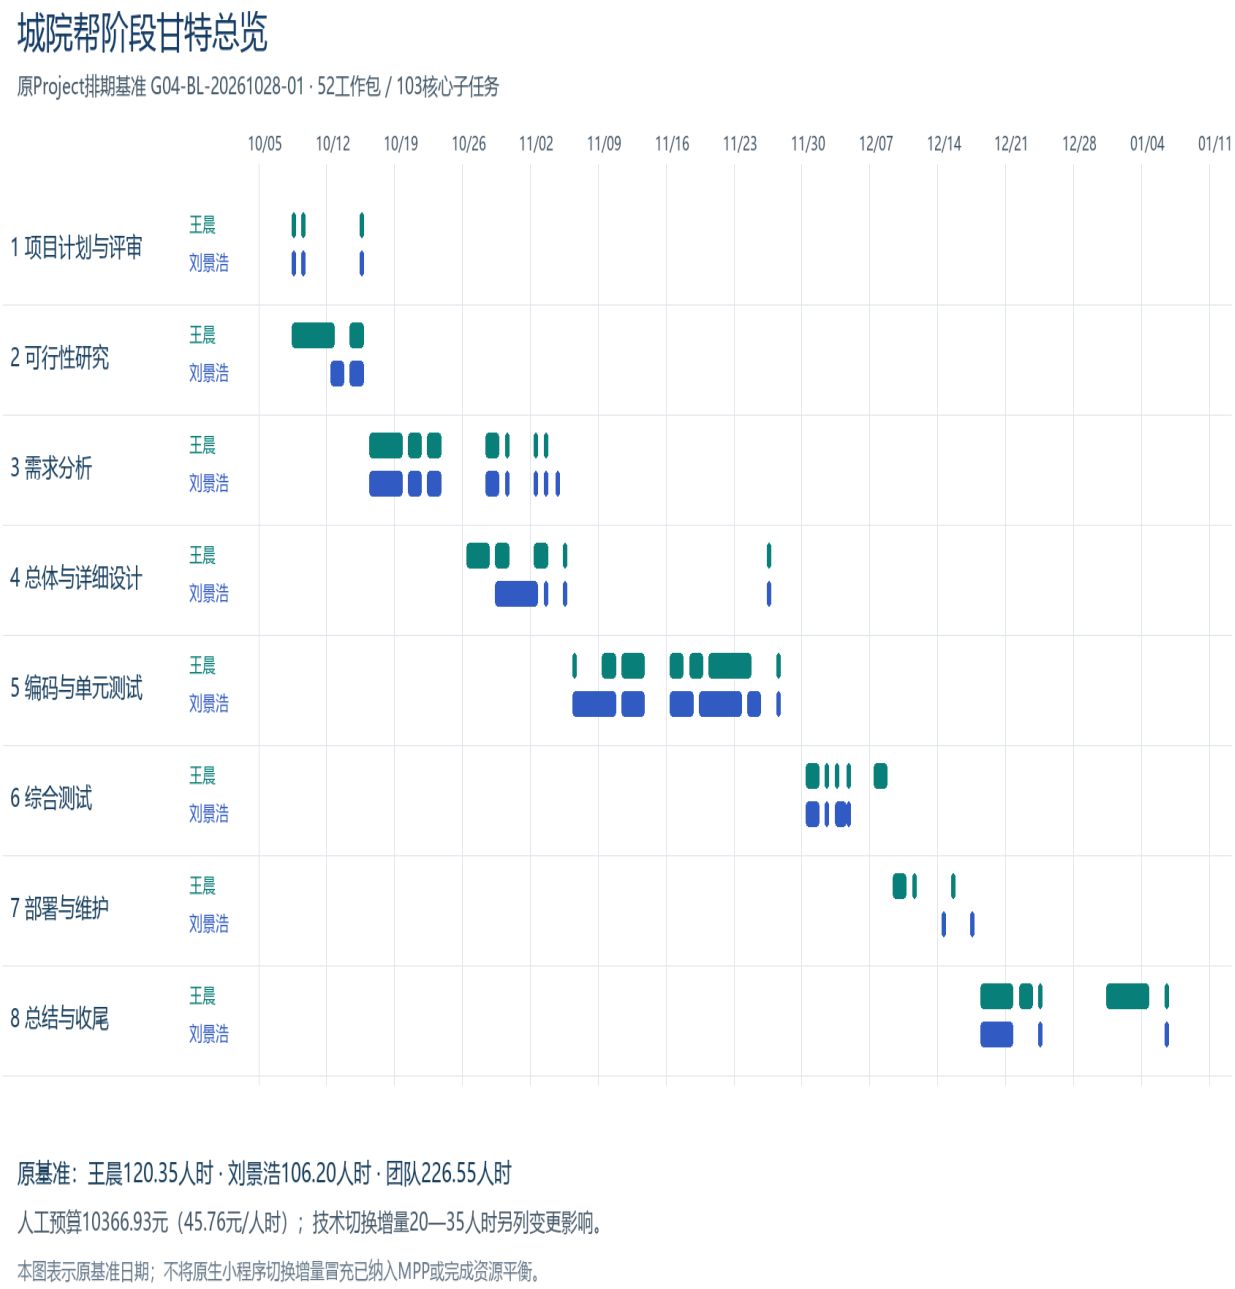


图 2　项目进度甘特总览　青绿为王晨，蓝色为刘景浩。来源为本组 WBS 与原生 Project 排期。

《任务执行跟踪 G04.csv》按执行任务登记计划日期、人时、实际开始与结束、预测完成、产物证据及复核结果。工作量按末级执行任务汇总，管理、文档及交叉复核统一纳入容量检查。

工作量估算统一以人时计：两人合计 226.55 人时，人工预算 10366.93 元。日期用于说明交接和课程节点；Project 工期只用于日历排程与关键路径计算，不与人时互换。排期采用周一至周五日历，国庆 10 月 1 日至 7 日及元旦 1 月 1 日不排正常任务，周末用于提交及已确认的加时。

附录 A 给出 52 个工作包的时间、责任、依赖、产物与完成标准；附录 B 逐周列出具体子任务、交接点和验收证据。任务预算统一为人工预算，按计划人时×45.76 元/人时计算，合计 10366.93 元。正文图展示主要阶段；完整子任务、复核和管理任务在原生 MPP 与分页甘特图中查阅。

工程网络与关键控制链

工程网络采用箭线表示法。以下五页包含十幅纵向子图，新增需求模型修订单独展示，跨页事件编号一致；事件时刻和总时差与原生 Project 逐项核对。[R1 13.3]

本网络采用含日期约束的 CPM：EET 从左至右取前置完成时刻及计划释放时刻的最大值；LET 从右至左取后继允许开始时刻及内部截止的最小值。活动总时差 TF=LET(结束事件)−EET(开始事件)−持续期。0 日虚活动只表示依赖。时间刻度从 2026 年 10 月 8 日开始，按既定工作日历累计；例如刻度 21 对应 11 月 5 日下班时，刻度 64 对应 2027 年 1 月 6 日下班时。零时差表示受当前日期、依赖和资源顺序约束的关键活动，不等于所有红线均为技术强依赖。[R1，13.3]

控制链或节点	安排及管理含义
需求形成	1.1→1.2→2.2→2.3→3.1→3.2 或 3.3→3.4；保护 10 月 23 日内部需求基线
设计转实现	3.5→4.5；11 月 4 日课后处理反馈，11 月 5 日确认内部设计
实现与验收	5.4→5.5→5.9→5.10→5.11→4.7→5.12 后分功能安全和性能压力两路，经 6.6 汇入 6.7
后端与恢复支路	后端移动支路有 1 日总时差；恢复验证 6.5 有 0.5 日；不能据此省略验证
测试维护与收尾	报告复核、指南、冷启动、交接、总结及归档设置明确内部截止；1 月 6 日为固定课程节点

5.4 至 5.11 的网页、社区和运维串行安排包含刘景浩的资源顺序，不能全部理解为技术强依赖。组长管理和交叉复核单独计入负荷。任务延期先分析交接、截止和人员冲突，再调整子任务，不以取消测试补回时间。

关键路径计算举例

活动	起止事件	起点 EET	终点 LET	持续期	总时差	结论
1.2	2→4	1.0	2.0	1	0.0	关键
3.4	19→20	10.0	12.0	2	0.0	关键
5.9	61→62	27.0	30.0	3	0.0	关键
6.5	77→78	40.0	41.5	1	0.5	有余量
8.5	103→104	63.0	64.0	1	0.0	关键


网络计算以工作日为日期刻度，52 项工作包均与原生 Project 核对。需求修订链 3.6→3.7→3.8→3.9 总时差 0.5 工作日，随后 3.5 与 4.5 为零时差评审控制点；不能把修订链误称为零时差关键路径。

贯穿需求、设计、实现、测试和收尾的一条代表性关键控制链：

3.5 → 4.5 → 5.4 → 5.5 → 5.9 → 5.10 → 5.11 → 4.7 → 5.12 → 6.1 → 6.4 → 6.6 → 6.7 → 6.8 → 7.1 → 7.2 → 7.3 → 7.4 → 8.1 → 8.2 → 8.3 → 8.4 → 8.5

上链是当前含日期约束的代表性零时差控制链。完整关键链、截止约束和逐项时差见工程网络计算 JSON；原 3.4 至 3.5 直接依赖已改为经 3.6—3.9 修订任务交接。

工程网络图 计划可行性与原需求

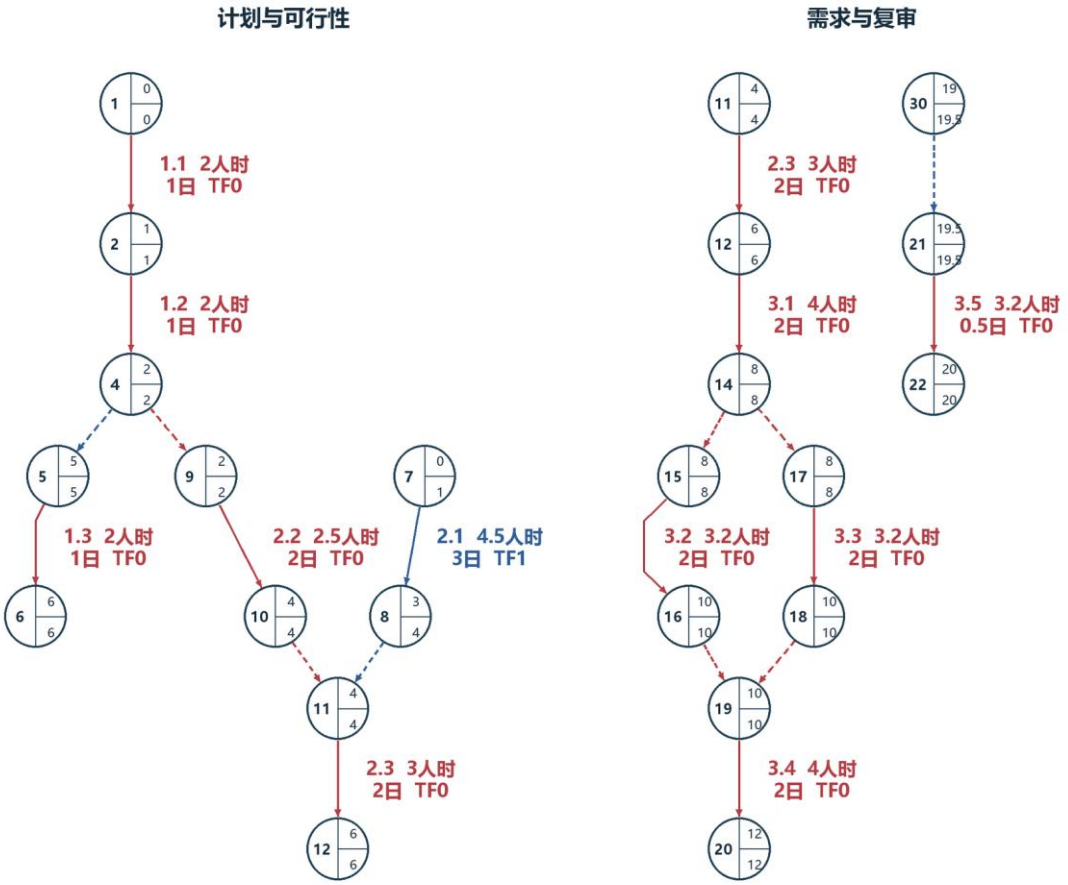


活动箭线标 WBS、人时、日历持续期与总时差；圆左为事件编号，右上 EET、右下 LET。红色零时差、蓝色有余量、虚线为 0 日依赖；跨页同号为同一事件。[R1 13.3]

工程网络图 当前需求模型修订




活动箭线标 WBS、人时、日历持续期与总时差；圆左为事件编号，右上 EET、右下 LET。红色零时差、蓝色有余量、虚线为 0 日依赖；跨页同号为同一事件。[R1 13.3]

工程网络图 总体设计与基础实现

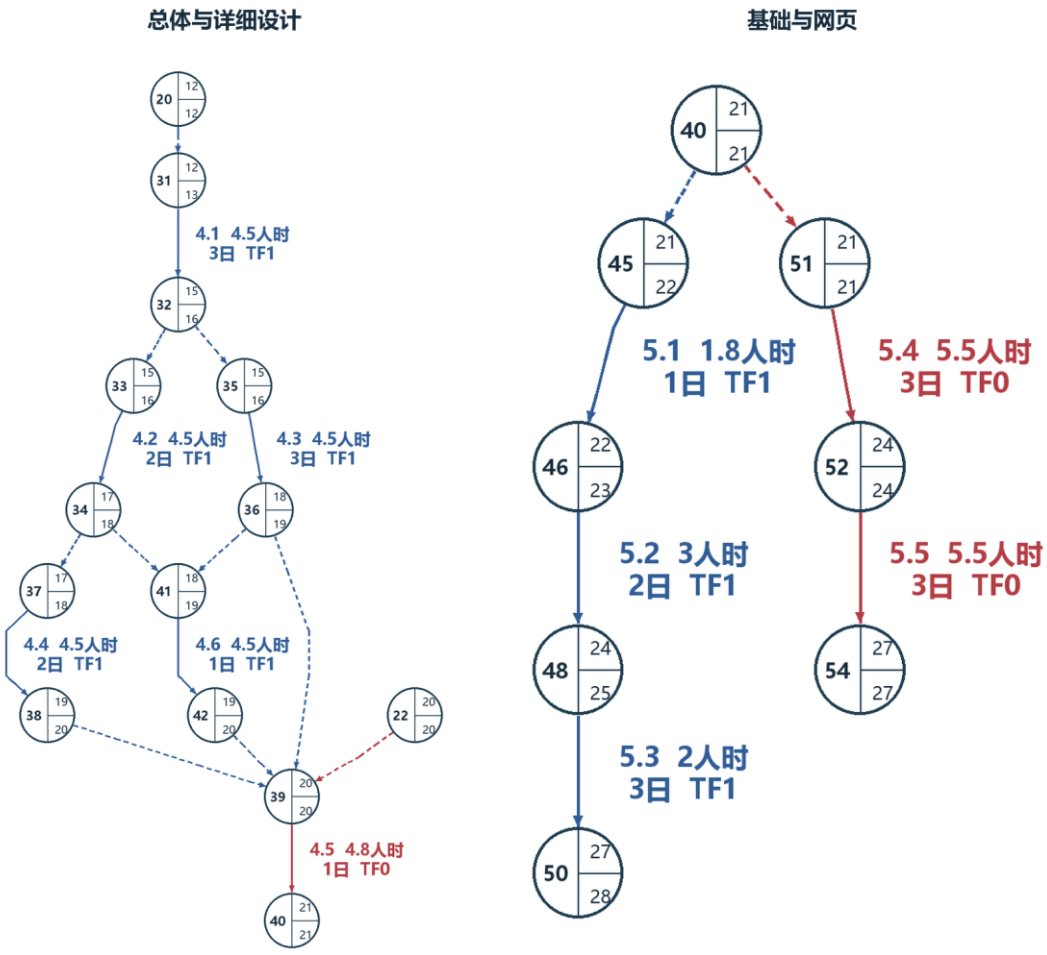


活动箭线标 WBS、人时、日历持续期与总时差；圆左为事件编号，右上 EET、右下 LET。红色零时差、蓝色有余量、虚线为 0 日依赖；跨页同号为同一事件。[R1 13.3]

工程网络图 业务运维及联调

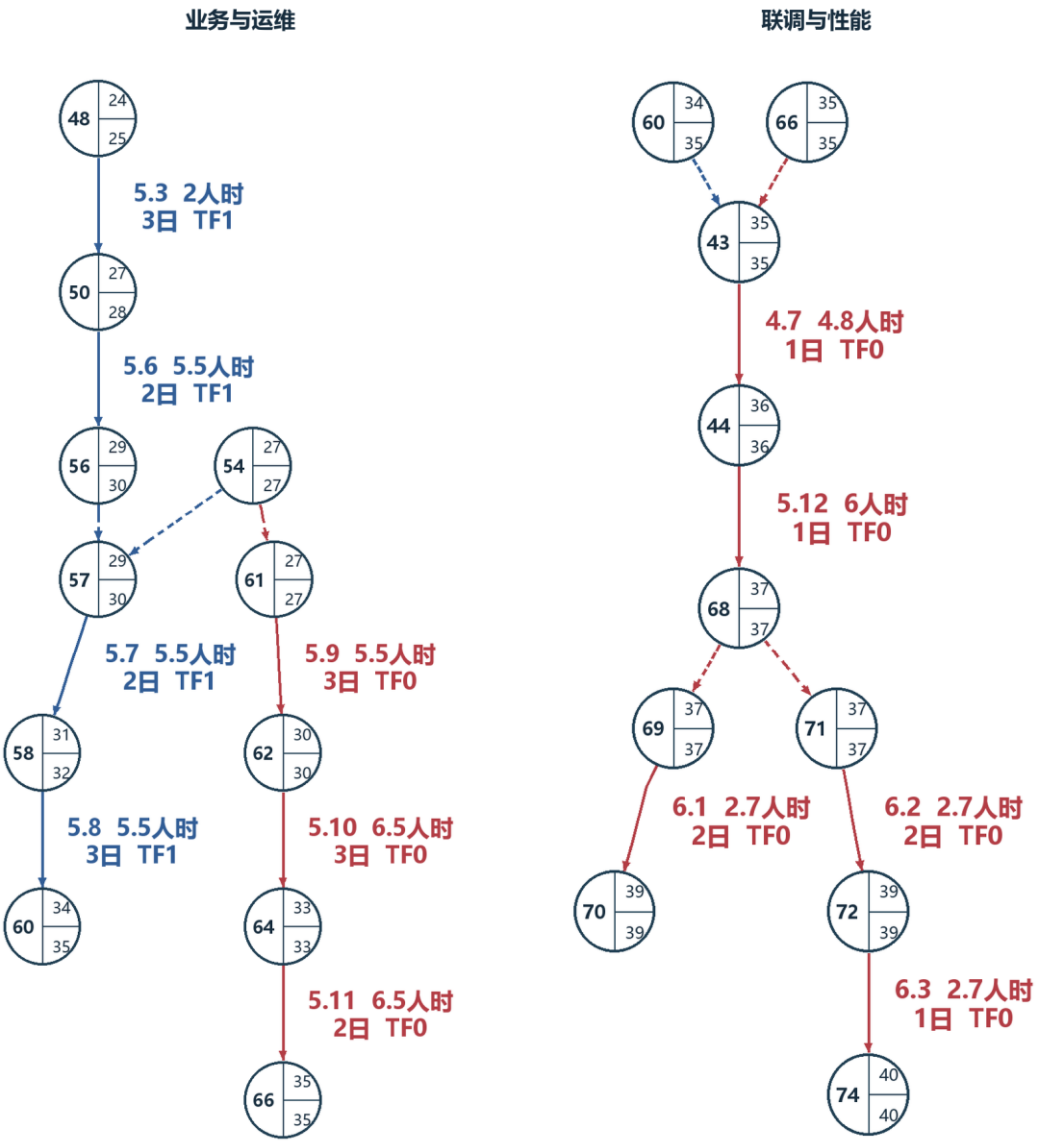

活动箭线标 WBS、人时、日历持续期与总时差；圆左为事件编号，右上 EET、右下 LET。红色零时差、蓝色有余量、虚线为 0 日依赖；跨页同号为同一事件。[R1 13.3]

工程网络图 综合测试维护与收尾

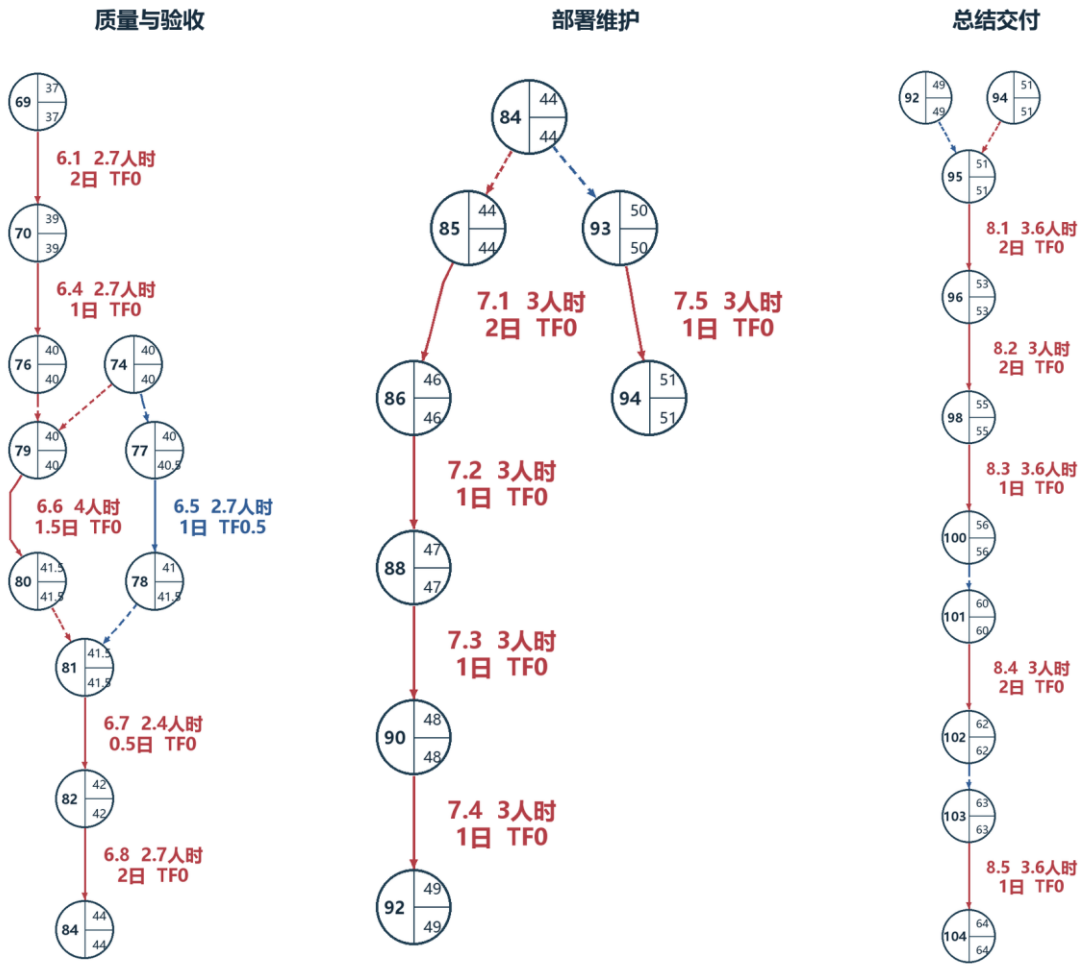

活动箭线标 WBS、人时、日历持续期与总时差；圆左为事件编号，右上 EET、右下 LET。红色零时差、蓝色有余量、虚线为 0 日依赖；跨页同号为同一事件。[R1 13.3]

8 项目组织和资源

8.1 项目组织

王晨担任组长兼项目负责人，承担项目管理、共享后端、小程序、集成和性能验证，并统筹测试报告、交付手册与最终归档；计划 120.35 人时。刘景浩承担网页阅读创作、社区及独立运维开发、功能安全兼容验证和交叉复核；计划 106.20 人时。双方均参加需求、设计、开发、文档和验收，AI 作为工具，实际贡献依据验收成果记录。

成员	主要负责工作	共同与持续责任
王晨 32401211；组长兼项目负责人	项目管理；共享后端、认证、文章 API、移动创作、交流激励、集成与性能恢复验证；120.35 人时	双方共同完成需求设计与验收；主责测试报告、交付手册、总评和归档；刘景浩交叉复核
刘景浩 32401205	网页阅读与 Markdown、社区治理、独立运维执行及网页；功能安全兼容验证；106.20 人时	需求原型、测试数据和用例；提供模块说明及证据；独立复核王晨统稿，双方修复本人模块

人员组织采用两人协商的小型民主协作组：双方共同决定需求和重要技术方案，各自对模块负责并交叉复核；王晨作为组长承担进度、变更、风险及提交协调责任。该安排参考课件 13.4 民主制程序员组，管理责任和技术协商权分别明确。[R1，13.4]

共同任务明确双方工作

计划与可行性由双方共同确认：王晨整理范围、资源与关键技术，刘景浩整理操作、内容来源与原型；SRS 与设计分别提供业务规则和交互场景。开发按模块负责；6.6.1 两人各用 1.25 人时修复本人模块，刘景浩统筹缺陷台账。王晨主责 6.8 测试报告、7.1 交付手册、8.2 总评材料、8.4 整改归档，刘景浩独立复核；共同验收仍由双方确认。

工作包 6.6 由刘景浩统筹缺陷台账与回归。王晨修复后端、移动和激励模块，刘景浩修复网页、社区及运维模块。模块负责人完成修复，另一成员独立复核，共同处理跨模块问题。

10 月 11 日两人讨论 GitHub 账号、版本工具和初始分工，初看 AI 计划。王晨借助 GPT 制作 PDF、借助豆包制作 PPT；先按 AI 计划分工，后续根据老师意见和实际情况修订。会议原命名方案与会后完善的协作规则分别见附录 D、第 6.14 章。

决策与交接职责

事项	组织和执行	确认与留痕
周计划与资源安排	王晨汇总，刘景浩提供模块状态；双方核对容量	双方确认承诺任务、期限和交接；保留纪要
范围日期预算调整	提出人说明影响，王晨协调，刘景浩核对任务与材料	双方确认；涉及课程约束按要求请教师评审
模块完成与阶段放行	任务负责人自查，另一人交叉复核	通过证据记入交付登记；共同成果分别说明承担内容
文档和发布材料封版	王晨汇总和封版，刘景浩独立复核清单与版本	双方核对引用、版本及未决项；审核批准按实际填写

周会固定检查顺序

先核对上周承诺与验收证据，再分析偏差和阻塞，更新风险及变更，最后确认下周任务、交接和每人可用人时。王晨组织并检查课程截止，刘景浩汇总模块、文档和配置状态，双方确认。实际会议日期、地点、讨论与评分据实填写。周会模板及问题、变更登记表使用相同编号。

8.2 项目资源

资源使用现有电脑与已选开发工具，Windows 与 WSL2 Linux 为正式演示环境。现有腾讯云轻量服务器为 2 核 2GB，仅作可选部署验证资源，是否承载全部服务以实测为准，不列入课堂验收必需条件。现阶段不要求新增云服务器或公网域名。工具可用性和邮件发信条件按实际需要核查；10 月 12 日前核查本机资源、磁盘、邮箱渠道与工具条件。

计划工作量按任务和周安排管理，不将 AI 生成速度直接换算为固定效率提升。每周对照实际难度调整后续任务交接，保留计划与实际偏差说明。

资源与预算检查

Project 纳入 167 项核心子任务、14 项周管理与 35 项交叉复核，包含 295 条人员分配。王晨计划 120.35 人时，刘景浩 106.20 人时。按每工作日 45 分钟的日常容量核查，高峰阶段存在负荷超出；周计划据此安排集中投入和任务交接。进度、开发、文档和复核统一跟踪。

资源取得与可用时间按周计划检查。两名成员日常各 30—45 分钟，集中实现、联调和测试阶段追加投入。附录 E、F 记录计划、实际与追加需求；王晨组织每周容量检查，刘景浩核对本人任务及交接。

9 培训

9.1 项目的技术要求

两人需掌握 Git 分支与交叉复核、Java 业务接口、双端创作、数据库迁移、JMeter 结果判读及部署恢复。不熟悉的环节先进行最小验证，再结合结果安排实现与复核。

9.2 培训计划

培训融入原有环境准备、联调、测试和维护交接任务，不另虚增人时：实现前双方核对分支及环境步骤；综合测试前王晨说明负载脚本与结果，刘景浩说明功能与回归记录；维护交接时各自演示负责模块，另一人照手册复现。产物为步骤说明、复现记录和问题处理结果。

10 项目估算

10.1 规模估算

规模采用计划阶段平均复杂度估算：18×4＋4×5＋8×4＋9×10＋1×7＝221 个未调整功能点。14 项技术因素影响分合计 34，TCF＝0.65＋0.01×34＝0.99，调整后 FP＝218.79。规模与 WBS 工作量分别管理，因素明细见可行性报告附录 D3，需求变更时同步复核。[R1，13.1—13.2] 功能点为计划阶段规模初估，需求模型细化后在 3.9 复核范围；本轮图形和文档数量不计作新增软件功能点。

10.2 工作量估算

人时估算与排期修订依据

工作量按末级任务自下而上估算，覆盖准备理解、交互实施、验证修复和文档交接，合计 226.55 人时。日期由前置关系、课程节点与人员可用时间确定，实际投入通过日志登记，周检查据此分析估算偏差并更新剩余工作。

估算例子	计划工作量 人时	估算包含内容
3.4 SRS 基线与需求评审材料	4.00	整理完整材料、追踪和内部复核；必要参数未关闭时记问题，不视为教师批准
5.9 社区审核反馈与举报	5.50	包含处理接口、管理页面、权限异常及交叉核对，不能只按生成页面时间估算
6.2 性能与负载测量	2.70	准备数据和脚本、执行测量、整理结果；异常需进入 6.6 修复回归
6.5 部署故障与恢复验证	2.70	按计划准备故障及备份场景、验证和证据；失败需评估余量及后续截止

每周复盘记录原估计、实际完成量和偏差原因；连续延期或交接不符时重新估算后续任务，优先拆分、调整顺序或协作处理。更新必须同步任务表、甘特图、网络计算、预算和变更记录，不以省略测试消除延期。

计划工作量按任务和周安排管理，不将 AI 生成速度直接换算为固定效率提升。每周对照实际难度调整后续任务交接，保留计划与实际偏差说明。

人时与人工折算控制总额

成员或成本项	计划数量	估算金额与口径
王晨	120.35 人时	人工折算 5507.22 元；包含管理、开发、文档与复核
刘景浩	106.20 人时	人工折算 4859.71 元；包含开发、文档、验证与交接
团队人工	226.55 人时	45.76 元 / 人时，计划人工预算 10366.93 元
人工估算与新增现金	人工 10366.93 元；现金 0 元	总估算 10366.93 元；任务明细、工资参数及舍入见附录 E、F

直接人工与现金采购分别登记。计划人时和实际投入分别管理，每周比较人员负荷与可用容量。原生 MPP 采用 226.55 计划人时和 45.76 元 / 人时费率，高峰负荷通过集中投入、任务顺序及接口交接安排管理。

工作量交叉核验

WBS 自下而上估算 226.55 人时作为当前控制基准；成果领域三点估计增加本轮需求修订范围后，O=160、M=226、P=340，期望 234.00 人时、10707.84 元，相差 7.45 人时、约 3.29%。三

点结果用于返工风险与资源交叉复核，不替代 WBS 控制预算。详见模板与量化中的三点估计 CSV 及交叉核验 JSON。

10.3 成本估算

成本项目	数量及口径	计划金额
王晨人工折算	120.35 人时×45.76 元 / 人时	5507.22 元
刘景浩人工折算	106.20 人时×45.76 元 / 人时	4859.71 元
项目总估算	直接人工按完整精度汇总	10366.93 元

本期复用现有电脑、可用开发工具与既有服务器资源，无新增现金采购预算；人工按 226.55 人时、45.76 元 / 人时估算。任何后续新增采购须先评估并经双方确认后调整计划。

10.4 关键计算机资源估算

2026 年 10 月 21 日核对演示电脑配置，按下列 CPU、内存、磁盘与备份预算组织部署和测试，并在环境清单中记录实际配置。

实测项目	2026 年 10 月 21 日记录
处理器	AMD Ryzen 7 8845H，8 个物理核心、16 个逻辑处理器
系统与物理内存	Windows 11 家庭中文版，10.0.26200；系统可用物理内存 31.29 GiB
磁盘	C 盘总 298.86 GiB、空闲 51.41 GiB；D 盘总 652.86 GiB、空闲 235.88 GiB
工程软件基准	Java 21、Spring Boot 4.1.1、MySQL 8；已存工程 pom.xml 及 README 记载。补丁版本、WSL2 发行版和工具版本在部署清单锁定。

内存与处理器预算

运行部分	计划资源	检查要求
WSL2 服务环境	4 个逻辑处理器、内存预算 8 GiB	作为本地部署的配置目标，实施时记录实际限制与占用。
业务与数据库	Spring Boot JVM 上限 512 MiB；MySQL 预算 1 GiB	共享认证、文章与互动接口；先检查索引、分页和连接池。
网页与独立运维	网页服务与执行器合计 512 MiB	执行器和任务记录独立于被维护业务进程。
WSL2 系统及缓冲	预算 4 GiB，另留 2 GiB 余量	服务分配合计不超过 8 GiB；运行数据缓存随实测调整。
Windows 客户端与施压	浏览器、开发者工具及编辑工具合计 4 GiB；JMeter JVM 上限 2 GiB	同机测量单独记录资源竞争，关闭无关构建和 AI 桌面任务。
宿主系统与余量	Windows 预算 8 GiB；上述预算合计 22 GiB	本机可用物理内存 31.29 GiB，计划余量约 9.29 GiB。

数据与备份空间估算

空间对象	计划容量	估算依据
业务数据库	2 GiB	200 用户、2000 文章、5000 评论；正文按 16 KiB、评论按 1 KiB 估算，另含用户、账本、索引及增长余量。
图片	6 GiB	估算 2000 篇×平均 3 张×平均 1 MiB，约 5.86 GiB；用于容量规划，不构成文章图片数量限制。
滚动备份	24 GiB	保留 3 份完整快照，每份按数据库 2 GiB＋图片 6 GiB 估算；按未压缩容量预留。
日志、包与临时空间	8 GiB	运行日志预算 1 GiB，发布与回退包 4 GiB，导出和临时处理 3 GiB。
本地数据合计	40 GiB	数据与备份计划使用 D 盘受控目录；C 盘另留 8 GiB 用于代码、依赖和构建。
离机备份	至少 8 GiB 可用	验收前将一份完整快照另存其他物理设备；同机另一目录不能替代离机保护。

本地部署预留 C 盘 8 GiB、D 盘 40 GiB。4.1、4.4 由双方确认目录与资源限制，5.10—5.11 由刘景浩实现受控目录和保留策略，6.2、6.3 由王晨记录资源趋势，6.5 核对备份容量与恢复一致性。腾讯云 2 核 2GB 服务器作为扩展验证资源。

10.5 管理预留

管理预留为 0 人时、0 元，基准工作量 226.55 人时、直接人工预算 10366.93 元。管理、交叉复核和测试已作为执行任务计入预算，超出基准的投入按变更流程处理。

当剩余工作预测超出人时或成本基线，任务负责人提出变更，说明原因、剩余投入、交接和质量影响；王晨组织分析，刘景浩复核，双方确认后更新任务、Project、预算及风险。涉及课程范围或截止变化时提交教师评审。未经确认不启用额外预算，不削减必要测试。

工作量增加 20%的情景为 271.86 人时，属于敏感性分析，不属于已批准管理预留，也不计入现有总预算。

11 风险管理

每周进行一次双人复盘，检查完成证据、阻塞、依赖变化与下周任务。关键活动延误时当周调整顺序、拆分任务或协作处理，影响范围及截止日的变化与教师沟通。[R1，第 22—44 页]

风险	优先级	负责人	应对措施
本机资源、邮箱或开发工具受限	高	王晨	10/12 前完成 WSL2、磁盘与工具访问，核查发信渠道；预置认证账号，准备离机备份。
11 月关键模块集中或接口交接延误	高	王晨	周复盘优先检查零时差活动，提供固定接口约定和示例，及时拆分移交。
恢复覆盖数据或备份不一致	高	王晨	恢复前校验与现状备份，独立控制服务，失败停止并记录。
认证资料越权或币记录不一致	高	王晨	服务端鉴权、事务及重复防护，验收覆盖权限与并发异常。
双端格式与编辑状态不一致	中	刘景浩	提前统一内容模型与接口，验证图片失败和编辑冲突。
文章或作者供给不足	中	刘景浩	用来源明确的示例完成演示，记录用户反馈，逐步邀请经历作者。
AI 输出错误或版本丢失	中	两人	关键内容交叉复核，Git 版本化并备份，答辩前解释自身模块。
需求扩大影响交付	中	两人	变更前分析范围、日期与成本影响，优先完成已确认社区范围。

进度预警与问题升级

以下为本计划的建议控制规则，双方在执行周会确认适用。已确认的历史会议不增加未发生的决定。负责人发现风险已发生时登记问题编号，关联 WBS、交付成果、处理动作和关闭证据；影响基线时另提变更。

触发条件	处理时限与负责人	保存记录
关键活动预测延期，或严重权限与恢复风险	发现当日由任务负责人告知王晨；暂停受影响放行，双方评估	问题、受影响交付、措施与重新检查日期
一般任务预计延期 1 日以上，或任务人时预测偏差超过 20%	负责人登记；最近周会比较拆分、协作与后移；不得挤掉必要测试	原因、剩余人时、预测完成与容量变化
数据不足或未提交证据	标记未登记或待复核，不以 0 或 100%代填；负责人补录	缺失项、补录责任和期限

周会固定检查顺序

先核对上周承诺与验收证据，再分析偏差和阻塞，更新风险及变更，最后确认下周任务、交接和每人可用人时。王晨组织并检查课程截止，刘景浩汇总模块、文档和配置状态，双方确认。实际会议日期、地点、讨论与评分据实填写。周会模板及问题、变更登记表使用相同编号。

12 支持条件

12.1 计算机系统支持

最终课堂演示与验收使用组长电脑。Windows 运行浏览器和微信开发者工具；WSL2 Linux 承载网页服务、Spring Boot 后端、MySQL 和独立运维执行服务。小程序以微信开发者工具演示为验收方式。本机部署方案已确定，环境安装、地址配置及启动验证按周计划执行，不能将方案确定视为已部署成功。

位置	部署或运行内容	边界与准备要求
Windows	浏览器、微信开发者工具、开发工具	小程序在开发者工具中演示，网页由浏览器访问
WSL2 Linux	网页服务、业务后端、MySQL、独立运维服务	按项目目录与服务名操作；数据库不向公共网络开放
本机数据目录	发布包、图片、认证材料、日志、备份	开发与演示配置、账号、数据分开；备份另存目录
离机副本	验收用数据库与文件备份	验收前另存一份，记录位置；可在 U 盘或另一设备保存
腾讯云轻量服务器	已有 2 核 2GB，可选验证	不承担必需演示流程，不要求扩容或额外云端开发

校园邮箱发信和外部链接依赖外部网络；离线演示应明确无法完成的场景，不冒称真实发送或公网部署。运行凭据通过本机配置取得，不写入报告。

12.2 需要需方承担的工作和提供的条件

本项目按课程安排接受教师与助教评审。小组准备校园账号、演示设备、合成数据和提交材料，用户试用遵循自愿原则。课堂交付为本地演示，全校持续运营须另行核对授权、资源和服务条件。

12.3 需要分包商承担的工作和提供的条件

本项目由 G04 两名成员承担，无分包任务。AI 软件作为辅助工具纳入资源管理；工具可用性变化由负责人登记、比较替代方案并按变更流程处理。

13 注解

SDP 为软件开发计划，FAR 为可行性分析报告，SRS 为软件需求规格说明，CSCI 为计算机软件配置项，HWCI 为计算机硬件配置项，WBS 为工作分解结构，EET 和 LET 为事件最早与最迟时刻。工期表示排期跨度，人时表示个人投入；两人同时各投入 1 小时合计 2 人时。

正文采用国标第 7.2 节 13 章，第 6 章覆盖 20 类活动并说明裁剪。专用硬件、分包与独立第三方验证不适用；安装、移交、配置和质量安排由正文及配套台账承接。WBS、图表、周会与成员评分按课程要求补充。

附录 A 工作包时间责任与完成标准

各执行任务均列人工预算，项目人工预算 10366.93 元见附录 F。167 项子任务在附录 B 按周展开，工作包负责人、复核人和依赖在 Project 使用同一数据。

1 项目计划与评审

工作包	日期、人时与人工预算	任务负责人及复核	前置产物与完成标准
1.1 任务分解、排期与资源预算	10/08；2.00 人时；人工预算 91.52 元	王晨、刘景浩；复核共同确认	无前置；WBS 与 Project 任务表；预算及风险清单。完成标准：每项任务写明负责人、计划人时、前置、产物与人工预算；管理活动单列
1.2 项目计划内部复核与汇报材料	10/09；2.00 人时；人工预算 91.52 元	王晨、刘景浩；复核共同确认	前置 1.1；计划评审记录；PPT 提示词与附件清单。完成标准：16 项要求有材料位置；图表、分工和提交节点一致
1.3 项目计划评审反馈与修订	10/15；2.00 人时；人工预算 91.52 元	王晨、刘景浩；复核共同确认	前置 1.2；问题单、修订稿和计划基线标签。完成标准：逐项记录处理人、修改内容和复核结果；未关闭问题有期限

2 可行性研究

工作包	日期、人时与人工预算	任务负责人及复核	前置产物与完成标准
2.1 关键技术与工具可行性验证	10/08—10/12；4.50 人时；人工预算 205.92 元	王晨；复核刘景浩	无前置；环境配置清单；关键技术验证记录。完成标准：真实发信、编译、权限和恢复条件有验证记录；失败说明替代措施
2.2 经济、操作及内容供给分析	10/12—10/13；2.50 人时；人工预算 114.40 元	刘景浩；复核王晨	前置 1.2；经济操作分析；内容来源与邀请方案。完成标准：现有资源与新增费用分别列明，资料来源可追溯，作者招募与供给条件明确
2.3 可行性报告与内部评审	10/14—10/15；3.00 人时；人工预算 137.28 元	王晨、刘景浩；复核共同确认	前置 2.1,2.2；可行性报告；条件结论及问题清单。完成标准：技术、经济、操作、进度及风险都有依据；高风险项明确验证和应对

3 需求分析

工作包	日期、人时与人工预算	任务负责人及复核	前置产物与完成标准
3.1 用户场景、用例与权限边界	10/16—10/19；4.00 人时；人工预算 183.04 元	王晨、刘景浩；复核共同确认	前置 2.3；用例清单；角色权限矩阵。完成标准：游客、未认证、认证、社区和运维角色分开；普通账号不能访问管理数据
3.2 功能、数据与非功能需求	10/20—10/21；3.20 人时；人工预算 146.43 元	王晨；复核刘景浩	前置 3.1；SRS 需求条目；数据字典与验收条件。完成标准：REQ 编号关联用例；认证资料、隐私、状态、冲突、币账本与恢复边界可验收
3.3 双端原型与场景核对	10/20—10/21；3.20 人时；人工预算 146.43 元	刘景浩；复核王晨	前置 3.1；可点击原型或线框；场景核对记录。完成标准：原型覆盖空结果、加载失败、认证提示、草稿保存和运维任务失败
3.4 SRS 基线与需求评审材料	10/22—10/23；4.00 人时；人工预算 183.04 元	王晨、刘景浩；复核共同确认	前置 3.2,3.3；内部需求基线；追踪表与汇报素材。完成标准：需求、原型、权限和异常一致；未决问题记录；10 月 25 日提交材料齐全
3.5 需求课堂评审反馈处理	11/04；3.20 人时；人工预算 146.43 元	刘景浩；复核王晨	前置 3.9；SRS 修订；需求变更与影响记录。完成标准：11 月 4 日新意见在课后完成登记与修订；变更有责任人和复核结论
3.6 课件核对及三模型骨架	10-28—10-29；6 人时；274.56 元	王晨、刘景浩；王晨协调	3.4；课件覆盖、ER 与 DFD 骨架。ER 有实体属性和基数；DFD 上下文、一级与关键二级对应，范围与权限一致
3.7 字典规范化及行为辅助模型	10-30—10-30；5 人时；228.8 元	王晨、刘景浩；王晨协调	3.6；字段字典、正则、状态及辅助图。字段约束完整；1NF 至 3NF 有实例；状态、层次、Warnier 和 IPO 可解释
3.8 界面线框与真实用户走查	11-02—11-02；4 人时；183.04 元	王晨、刘景浩；刘景浩协调	3.7；原型、代表与反馈记录。覆盖正常与异常；真实参与和反馈分别登记，未确认不得代签
3.9 需求验证追踪与阶段提交	11-03—11-03；5 人时；228.8 元	王晨、刘景浩；王晨协调	3.8；SRS、模型追踪、评审对照及阶段材料。一致完整现实有效四项检查；未关闭问题有责任期限；提交材料同版本

4 总体与详细设计

工作包	日期、人时与人工预算	任务负责人及复核	前置产物与完成标准
4.1 系统架构、接口与数据库设计	10/26—10/28；4.50 人时；人工预算 205.92 元	王晨；复核刘景浩	前置 3.4；架构、ER、部署图；API 契约。完成标准：共享 API、错误响应、版本号、ER 和权限边界明确；客户端不直连数据库
4.2 认证、内容、激励与治理设计	10/29—10/30；4.50 人时；人工预算 205.92 元	王晨；复核刘景浩	前置 4.1；状态图；事务和失败处理设计。完成标准：验证码失效、越权、版本冲突、重复请求、下架及申诉均有处理规则
4.3 双端浏览与创作详细设计	10/29—11/02；4.50 人时；人工预算 205.92 元	刘景浩；复核王晨	前置 4.1；页面状态图；编辑与上传详细设计。完成标准：复杂正文不能被移动端静默覆盖；上传失败保留正文；编辑冲突可识别
4.4 部署、备份与恢复详细设计	11/02—11/03；4.50 人时；人工预算 205.92 元	王晨；复核刘景浩	前置 4.2；运维执行协议；备份恢复流程。完成标准：执行器独立于业务进程；固定目标；任务互斥；恢复前保护现有数据
4.5 内部设计评审与文档基线	11/05；4.80 人时；人工预算 219.65 元	王晨、刘景浩；复核共同确认	前置 4.3,4.4,4.6,3.5；总体及详细设计；评审记录与基线。完成标准：关键设计问题关闭；SRS、接口、数据、流程和测试条件一致
4.6 测试用例设计与数据准备	11/03；4.50 人时；人工预算 205.92 元	刘景浩；复核王晨	前置 4.3,4.2；TC 用例、REQ 追踪；合成数据及脚本方案。完成标准：覆盖五类角色、双端、账本、恢复、性能压力与稳定性；数据不含真实隐私
4.7 课堂设计反馈与模块调整	11/26；4.80 人时；人工预算 219.65 元	王晨、刘景浩；复核共同确认	前置 5.8,5.11；设计变更；模块修订与复核记录。完成标准：11 月 25 日意见同步至需求、设计、接口和实现；大改经影响评估排期

5 编码与单元测试

工作包	日期、人时与人工预算	任务负责人及复核	前置产物与完成标准
5.1 项目骨架、配置与接口约定	11/06；1.80 人时；人工预算 82.37 元	王晨；复核刘景浩	前置 4.5；工程骨架、环境模板和接口示例。完成标准：双方按契约独立工作；配置与凭据分离；构建入口可复现
5.2 登录、邮箱与材料认证	11/09—11/10；3.00 人时；人工预算 137.28 元	王晨；复核刘景浩	前置 5.1；认证代码、单元结果与接口集合。完成标准：验证码错误、过期和发送失败有反馈；认证材料受控；审核有理由与通知

工作包	日期、人时与人工预算	任务负责人及复核	前置产物与完成标准
5.3 文章存储、岗位检索与筛选接口	11/11—11/13；2.00 人时；人工预算 91.52 元	王晨；复核刘景浩	前置 5.2；内容 API、SQL、单元与接口结果。完成标准：草稿不公开；组合检索准确；图片关联正确；错误响应与版本字段符合契约
5.4 小程序与网页阅读页面	11/06—11/10；5.50 人时；人工预算 251.68 元	刘景浩；复核王晨	前置 4.5；页面与交互记录；模拟数据说明。完成标准：此时按契约使用模拟数据并明确标注；真实 API 接入在 5.12 完成
5.5 网页 Markdown 创作与草稿	11/11—11/13；5.50 人时；人工预算 251.68 元	刘景浩；复核王晨	前置 5.4；编辑器模块；保存失败及预览检查。完成标准：正文图片保存一致；失败保留内容；危险脚本过滤；复杂正文格式保留
5.6 小程序文字与图片创作	11/16—11/17；5.50 人时；人工预算 251.68 元	王晨；复核刘景浩	前置 5.3；移动创作代码；图片和草稿用例。完成标准：手机能完成图文创作；失败图片可逐项重试；不静默覆盖复杂正文
5.7 双端草稿、发布与文章管理	11/18—11/19；5.50 人时；人工预算 251.68 元	王晨；复核刘景浩	前置 5.6,5.5；生命周期 API；双端文章管理与单元结果。完成标准：更新有版本冲突提示；管理员下架不可由作者自行恢复；删除不误删他人数据
5.8 评论、点赞、投币、收藏与荣誉	11/20—11/24；5.50 人时；人工预算 251.68 元	王晨；复核刘景浩	前置 5.7；交流激励模块；事务并发、权限与通知用例。完成标准：未认证不能取得评论主页联系方式；作者关闭联系立即生效；余额不负、不自投、不重复奖励；贡献与消费分开
5.9 社区审核、反馈与举报网页	11/16—11/18；5.50 人时；人工预算 251.68 元	刘景浩；复核王晨	前置 5.5；社区管理 API 与网页；处理状态和权限记录。完成标准：刘景浩同时负责社区处理 API 与网页；复用认证契约；一键定位原文评论；理由、通知、限制申诉及审计可追溯
5.10 独立运维执行与备份服务	11/19—11/23；6.50 人时；人工预算 297.44 元	刘景浩；复核王晨	前置 5.9；执行器、备份清单与失败保护用例。完成标准：仅受控服务与目录；任务互斥且持久；恢复前备份；数据库与图片一致；业务停机仍可查任务
5.11 运维网页、状态与操作记录	11/24—11/25；6.50 人时；人工预算 297.44 元	刘景浩；复核王晨	前置 5.10；运维网页；四类操作与失败反馈记录。完成标准：各动作显示目标与影响并确认；显示运行、成功、失败状态和审计；不提供任意命令输入
5.12 系统联调、构建与实现基线	11/27；6.00 人时；人工预算 274.56 元	王晨、刘景浩；复核共同确认	前置 4.7；安装包、代码清单、联调记录与实现基线。完成标准：关闭模拟数据替代 API 的缺口；五类角色、业务与运维真实联通；接口、代码和用例一致

6 综合测试

工作包	日期、人时与人工预算	任务负责人及复核	前置产物与完成标准
6.1 功能、接口与集成测试	11/30—12/01；2.70 人时；人工预算 123.55 元	刘景浩；复核王晨	前置 5.12；TC 实际结果、Postman 集合及缺陷单。完成标准：阅读认证创作交流管理全链路通过；失败输入、数据断言与缺陷可复现
6.2 性能与负载测试	11/30—12/01；2.70 人时；人工预算 123.55 元	王晨；复核刘景浩	前置 5.12；JMeter 脚本、JTL、统计及环境记录。完成标准：200 用户 2000 文章 5000 评论；30 并发运行 10 分钟；读 P95≤1 秒、写≤2 秒、非预期错误率<1% 为计划目标
6.3 压力与稳定性测试	12/02；2.70 人时；人工预算 123.55 元	王晨；复核刘景浩	前置 6.2；压力稳定性结果、资源趋势和账本一致性记录。完成标准：10/30/50/100 并发各 2 分钟用于探测；100 不代表承诺容量；降载 10 并发 2 分钟内恢复；10 并发运行 30 分钟
6.4 安全权限与双端兼容测试	12/02；2.70 人时；人工预算 123.55 元	刘景浩；复核王晨	前置 6.1；安全、权限、兼容及页面体验记录。完成标准：跨角色直接 API 被拒；敏感材料不泄漏；网页与开发者工具核心流程一致；设备条件及限制写清
6.5 部署、故障与备份恢复验证	12/03；2.70 人时；人工预算 123.55 元	王晨；复核刘景浩	前置 6.3；启动、部署重启、恢复与回退记录。完成标准：状态操作真实执行；数据库与图片一致；损坏备份被拒；失败不静默损坏当前数据
6.6 缺陷修复、复测与回归	12/03—12/04；4.00 人时；人工预算 183.04 元	刘景浩；复核王晨	前置 6.4,6.3；双方修复提交、复测结果和残留问题清单。完成标准：刘景浩统筹；王晨修复后端移动激励；刘景浩修复网页社区运维；阻塞及严重缺陷关闭
6.7 测试报告与系统内部验收	12/04；2.40 人时；人工预算 109.82 元	王晨、刘景浩；复核共同确认	前置 6.6,6.5；系统测试报告；候选交付包和验收清单。完成标准：实际数据与计划目标分开；结论可追溯到版本、环境与证据；12 月 6 日提交包齐全
6.8 测试报告复核与提交准备	12/07—12/08；2.70 人时；人工预算 123.55 元	王晨；复核刘景浩	前置 6.7；测试报告修订与汇报材料。完成标准：保留 12 月 6 日提交基线，后续复核意见形成独立修订记录并关联原版本

7 部署与维护

工作包	日期、人时与人工预算	任务负责人及复核	前置产物与完成标准
7.1 安装包、用户与维护说明	12/09—12/10；3.00 人时；人工预算 137.28 元	王晨；复核刘景浩	前置 6.8；发布包、安装用户管理运维说明。完成标准：指南包括版本、目录、冷启动、四类操作影响、离机备份和已知限制；对应同一安装包
7.2 干净环境启动与课堂演示	12/11；3.00 人时；人工预算 137.28 元	王晨；复核刘景浩	前置 7.1；干净环境启动及课堂演示核查记录。完成标准：按指南可复现；预认证演示与真实邮箱验证分开；测试账号不展示凭据
7.3 维护申请与变更演练	12/14；3.00 人时；人工预算 137.28 元	刘景浩；复核王晨	前置 7.2；维护变更单、回退与回归记录。完成标准：在隔离测试环境完成申请、评估、实施、回归及版本归档演练
7.4 运维交接与反馈整改	12/15；3.00 人时；人工预算 137.28 元	王晨；复核刘景浩	前置 7.3；交接清单、备份与权限配置记录。完成标准：双方能操作固定运维任务；离机副本有位置和完整性记录；私密配置独立交接
7.5 课堂测试评审意见处理	12/17；3.00 人时；人工预算 137.28 元	刘景浩；复核王晨	前置 6.8；测试评审修订和残留风险记录。完成标准：逐项处理、复核和记录；未解决问题明确责任及期限；同版本更新交付包

8 总结与收尾

工作包	日期、人时与人工预算	任务负责人及复核	前置产物与完成标准
8.1 项目总结与计划偏差分析	12/18—12/21；3.60 人时；人工预算 164.74 元	王晨、刘景浩；复核共同确认	前置 7.4,7.5；总结报告、偏差分析和实际贡献证据。完成标准：按工作包、提交和问题单总结管理、开发与文档成果，说明计划偏差及原因
8.2 总评材料与详细计划附录	12/22—12/23；3.00 人时；人工预算 137.28 元	王晨；复核刘景浩	前置 8.1；总评素材、完整周计划和引用。完成标准：PPT 由豆包制作；正文与附录范围分工日期一致；无旧范围截图与凭据
8.3 最终验收与汇报演练	12/24；3.60 人时；人工预算 164.74 元	王晨、刘景浩；复核共同确认	前置 8.2；交付基线、验收清单及演练记录。完成标准：源码、脚本、包、文档、测试与图表同版本；12 月 27 日提交、12 月 30 日汇报
8.4 总评反馈处理与归档	12/31—01/04；3.00 人时；人工预算 137.28 元	王晨；复核刘景浩	前置 8.3；总评修订、提交基线及归档尾项记录。完成标准：12 月 31 日准备 1 月 3 日提交基线；1 月 4 日核对尾项并追加归档记录

工作包	日期、人时与人工预算	任务负责人及复核	前置产物与完成标准
8.5 课程收尾与交付确认	01/06；3.60 人时；人工预算 164.74 元	王晨、刘景浩；复核共同确认	前置 8.4；收尾确认、最终清单与实际成员评价。完成标准：1 月 6 日课程收尾；实际互评由双方确认；后续运维范围另行约定

附录 B 保留工作包交接层任务说明。可行性与需求的原执行项已进一步分解，当前末级活动、负责人、日期、人时及验收以附录 I 和 Project 任务源为准；父项仅汇总，不与子任务重复累计。

附录 B 详细任务分解与周安排

周任务行列当周分摊人时与人工预算；跨周任务在各周分别计入投入，任务全量估算见附录 A 和任务分解 CSV。每行按所列子任务范围执行与检查，工作包整体完成标准见附录 A。工作量以人时列示，日期只表示交接边界。全部子任务、周管理与复核均列计划人时和按 45.76 元/人时计算的人工预算；项目合计 226.55 人时、10366.93 元，实际投入另记。双方每周按 Project 的 R 类任务检查对方产物，记录问题、修改和关闭结论；共同任务由双方确认。

第 1 周 10/05—10/11

本周目标：计划评审准备与关键条件核查。

交接与提交：10 月 9 日双方确认计划、图表和汇报；10 月 11 日 22 时提交评审材料。关键技术验证接续至 10 月 12 日。

持续管理 M01：10/08—10/09；0.85 人时；人工预算 38.90 元。负责人王晨，刘景浩提供状态。检查完成证据、阻塞、下周交接和提交节点；更新风险变更及实际差异；双方确认记录；保存周会议及变更记录。

编号	当周具体任务	任务负责人	前置与交接	产物与完成标准
1.1.1	确认 WBS、依赖与提交边界；10/08；1.00 人时；人工预算 45.76 元	王晨、刘景浩	无；按约定输入启动	形成确认 WBS、依赖与提交边界对应产物；按附录 A 核对内容与未决问题。证据：WBS 与 Project 任务表；预算及风险清单
1.1.2	建立资源预算与风险安排；10/08；1.00 人时；人工预算 45.76 元	王晨、刘景浩	1.1.1	完成建立资源预算与风险安排；记录交叉复核或双方确认结论。证据：WBS 与 Project 任务表；预算及风险清单
1.2.1	逐条检查评审要求与计划；10/09；1.00 人时；人工预算 45.76 元	王晨、刘景浩	1.1.2	形成逐条检查评审要求与计划对应产物；按附录 A 核对内容与未决问题。证据：计划评审记录；PPT 提示词与附件清单
1.2.2	确认汇报材料与提交清单；10/09；1.00 人时；人工预算 45.76 元	王晨、刘景浩	1.2.1	完成确认汇报材料与提交清单；记录交叉复核或双方确认结论。证据：计划评审记录；PPT 提示词与附件清单
2.1.1	验证双端构建与邮箱条件；10/08；2.25 人时；人工预算 102.96 元	王晨	无；按约定输入启动	形成验证双端构建与邮箱条件对应产物；按附录 A 核对内容与未决问题。证据：环境配置清单；关键技术验证记录

编号	当周具体任务	任务负责人	前置与交接	产物与完成标准
2.1.2	本周启动：核查独立运维、存储与恢复路径；10/09；本周 1.13 人时；人工预算 51.71 元	王晨	2.1.1	确认邮件渠道、运维独立执行和备份范围的配置条件。证据：环境配置清单；关键技术验证记录

第 2 周 10/12—10/18

本周目标：计划修订与可行性结论。

交接与提交：10 月 14 日课堂意见在 15 日修订；可行性结论由双方确认，10 月 18 日 22 时提交。

持续管理 M02：10/12—10/16；0.85 人时；人工预算 38.90 元。负责人王晨，刘景浩提供状态。检查完成证据、阻塞、下周交接和提交节点；更新风险变更及实际差异；双方确认记录；保存周会议及变更记录。

编号	当周具体任务	任务负责人	前置与交接	产物与完成标准
1.3.1	登记课堂计划意见与影响；10/15；1.00 人时；人工预算 45.76 元	王晨、刘景浩	1.2.2	形成登记课堂计划意见与影响对应产物；按附录 A 核对内容与未决问题。证据：问题单、修订稿和计划基线标签
1.3.2	共同修订排期与计划基线；10/15；1.00 人时；人工预算 45.76 元	王晨、刘景浩	1.3.1	完成共同修订排期与计划基线；记录交叉复核或双方确认结论。证据：问题单、修订稿和计划基线标签
2.1.2	本周收尾：核查独立运维、存储与恢复路径；10/12；本周 1.12 人时；人工预算 51.25 元	王晨	2.1.1	执行样例核查并记录真实结果、失败与替代措施。证据：环境配置清单；关键技术验证记录
2.2.1	核查工具、设备与现金费用；10/12；1.25 人时；人工预算 57.20 元	刘景浩	1.2.2	形成核查工具、设备与现金费用对应产物；按附录 A 核对内容与未决问题。证据：经济操作分析；内容来源与邀请方案
2.2.2	分析资料来源、作者邀请与操作成本；10/13；1.25 人时；人工预算 57.20 元	刘景浩	2.2.1	完成分析资料来源、作者邀请与操作成本；记录交叉复核或双方确认结论。证据：经济操作分析；内容来源与邀请方案
2.3.1	双方汇总技术与资源判断；10/14；1.50 人时；人工预算 68.64 元	王晨、刘景浩	2.1.2,2.2.2	形成双方汇总技术与资源判断对应产物；按附录 A 核对内容与未决问题。证据：可行性报告；条件结论及问题清单

编号	当周具体任务	任务负责人	前置与交接	产物与完成标准
2.3.2	共同评审可行性结论与条件；10/15；1.50 人时；人工预算 68.64 元	王晨、刘景浩	2.3.1	完成共同评审可行性结论与条件；记录交叉复核或双方确认结论。证据：可行性报告；条件结论及问题清单
3.1.1	共同核对读者作者与管理场景；10/16；2.00 人时；人工预算 91.52 元	王晨、刘景浩	2.3.2	形成共同核对读者作者与管理场景对应产物；按附录 A 核对内容与未决问题。证据：用例清单；角色权限矩阵

第 3 周 10/19—10/25

本周目标：补充可行性研究，完成需求、原型与验收条件。

交接与提交：需求、权限、原型与验收条件形成同一基线；10 月 25 日 22 时交 SRS 和需求 PPT。

持续管理 M03：10/19—10/23；0.85 人时；人工预算 38.90 元。负责人王晨，刘景浩提供状态。检查完成证据、阻塞、下周交接和提交节点；更新风险变更及实际差异；双方确认记录；保存周会议及变更记录。

编号	当周具体任务	任务负责人	前置与交接	产物与完成标准
3.1.2	确认权限矩阵与核心用例；10/19；2.00 人时；人工预算 91.52 元	王晨、刘景浩	3.1.1	完成确认权限矩阵与核心用例；记录交叉复核或双方确认结论。证据：用例清单；角色权限矩阵
3.2.1	细化文章交流、激励与治理规则；10/20；1.60 人时；人工预算 73.22 元	王晨	3.1.2	形成细化文章交流、激励与治理规则对应产物；按附录 A 核对内容与未决问题。证据：SRS 需求条目；数据字典与验收条件
3.2.2	定义数据、异常与非功能验收；10/21；1.60 人时；人工预算 73.22 元	王晨	3.2.1	完成定义数据、异常与非功能验收；记录交叉复核或双方确认结论。证据：SRS 需求条目；数据字典与验收条件
3.3.1	绘制双端阅读创作原型；10/20；1.60 人时；人工预算 73.22 元	刘景浩	3.1.2	形成绘制双端阅读创作原型对应产物；按附录 A 核对内容与未决问题。证据：可点击原型或线框；场景核对记录
3.3.2	核对社区和运维管理流程；10/21；1.60 人时；人工预算 73.22 元	刘景浩	3.3.1	完成核对社区和运维管理流程；记录交叉复核或双方确认结论。证据：可点击原型或线框；场景核对记录

编号	当周具体任务	任务负责人	前置与交接	产物与完成标准
3.4.1	共同汇总 SRS 与需求追踪，含 FS01—FS07 补充复核；10/22；2.00 人时；人工预算 91.52 元	王晨、刘景浩	3.2.2,3.3.2	补齐可行性八步骤输入、系统流程图与 DFD、数据字典定义及方案理由；衔接 SRS、ER 与追踪。王晨侧重逻辑、数据和计划，刘景浩侧重参照软件、终端及操作，两人交叉确认。证据：可研附录 F—I、需求追踪表。
3.4.2	内部复核并准备需求汇报；10/23；2.00 人时；人工预算 91.52 元	王晨、刘景浩	3.4.1	含 FS08 文档审查 0.50 人时，其余 1.50 人时用于需求 PPT 和提交核对；按需求评审 11 项登记真实证据与未关闭项，双方确认内容、引用和附件版本。

第 4 周 10/26—11/01

本周目标：总体架构和关键业务设计。

交接与提交：根据本周课程要求和 10 月 31 日文档共同评审更新材料；11 月 1 日 22 时前提交项目计划、初版 SRS 及需求评审 PPT。11 月 3 日保留评审前复核，不作为本次作业截止。

持续管理 M04：10/26—10/30；0.85 人时；人工预算 38.90 元。负责人王晨，刘景浩提供状态。检查完成证据、阻塞、下周交接和提交节点；更新风险变更及实际差异；双方确认记录；保存周会议及变更记录。

编号	当周具体任务	任务负责人	前置与交接	产物与完成标准
4.1.1	设计业务模块与接口契约；10/26；2.50 人时；人工预算 114.40 元	王晨	3.4.2	形成设计业务模块与接口契约对应产物；按附录 A 核对内容与未决问题。证据：架构、ER、部署图；API 契约
4.1.2	设计数据关系与本机部署边界；10/27—10/28；2.00 人时；人工预算 91.52 元	王晨	4.1.1	完成设计数据关系与本机部署边界；记录交叉复核或双方确认结论。证据：架构、ER、部署图；API 契约
4.2.1	细化认证文章与治理状态；10/29；2.50 人时；人工预算 114.40 元	王晨	4.1.2	形成细化认证文章与治理状态对应产物；按附录 A 核对内容与未决问题。证据：状态图；事务和失败处理设计
4.2.2	细化币事务、隐私及异常处理；10/30；2.00 人时；人工预算 91.52 元	王晨	4.2.1	完成细化币事务、隐私及异常处理；记录交叉复核或双方确认结论。证据：状态图；事务和失败处理设计

编号	当周具体任务	任务负责人	前置与交接	产物与完成标准
4.3.1	设计网页 Markdown 与移动图文；10/29；2.50 人时；人工预算 114.40 元	刘景浩	4.1.2	形成设计网页 Markdown 与移动图文对应产物；按附录 A 核对内容与未决问题。证据：页面状态图；编辑与上传详细设计
4.3.2	本周启动：设计图片、草稿和跨端编辑流程；10/30；本周 1.00 人时；人工预算 45.76 元	刘景浩	4.3.1	形成图片上传、草稿与跨端版本冲突流程草案。证据：页面状态图；编辑与上传详细设计
3.6.1	核对课件评审表、用户及范围；10-28；3 人时；137.28 元	王晨、刘景浩（王晨 1.75、刘景浩 1.25 人时）	3.4.2	ER 有实体属性和基数；DFD 上下文、一级与关键二级对应，范围与权限一致；保存课件覆盖、ER 与 DFD 骨架
3.6.2	建立 ER 与分层 DFD 并交叉核对；10-29；3 人时；137.28 元	王晨、刘景浩（王晨 1.75、刘景浩 1.25 人时）	3.6.1	ER 有实体属性和基数；DFD 上下文、一级与关键二级对应，范围与权限一致；保存课件覆盖、ER 与 DFD 骨架
3.7.1	细化数据字典正则及规范化；10-30；2.5 人时；114.4 元	王晨、刘景浩（王晨 1.5、刘景浩 1 人时）	3.6.2	字段约束完整；1NF 至 3NF 有实例；状态、层次、Warnier 和 IPO 可解释；保存字段字典、正则、状态及辅助图
3.7.2	核对状态转换及辅助图形；10-30；2.5 人时；114.4 元	王晨、刘景浩（王晨 1.5、刘景浩 1 人时）	3.7.1	字段约束完整；1NF 至 3NF 有实例；状态、层次、Warnier 和 IPO 可解释；保存字段字典、正则、状态及辅助图

第 5 周 11/02—11/08

本周目标：需求反馈与内部设计基线。

交接与提交：11 月 4 日课后处理需求复审意见；11 月 5 日内部设计评审；11 月 6 日开始实现；11 月 8 日交总体设计。

持续管理 M05：11/02—11/06；0.85 人时；人工预算 38.90 元。负责人王晨，刘景浩提供状态。检查完成证据、阻塞、下周交接和提交节点；更新风险变更及实际差异；双方确认记录；保存周会议及变更记录。

编号	当周具体任务	任务负责人	前置与交接	产物与完成标准
3.5.1	记录需求复审意见；11/04；1.60 人时；人工预算 73.22 元	刘景浩	3.9.2	形成记录需求复审意见对应产物；按附录 A 核对内容与未决问题。证据：SRS 修订；需求变更与影响记录
3.5.2	修订需求并同步设计影响；11/04；1.60 人时；人工预算 73.22 元	刘景浩	3.5.1	完成修订需求并同步设计影响；记录交叉复核或双方确认结论。证据：SRS 修订；需求变更与影响记录
4.3.2	本周收尾：设计图片、草稿和跨端编辑流程；11/02；本周 1.00 人时；人工预算 45.76 元	刘景浩	4.3.1	核对复杂正文保留和失败恢复，完成详细设计复核。证据：页面状态图；编辑与上传详细设计
4.4.1	定义运维接口、鉴权与白名单；11/02；2.50 人时；人工预算 114.40 元	王晨	4.2.2	形成定义运维接口、鉴权与白名单对应产物；按附录 A 核对内容与未决问题。证据：运维执行协议；备份恢复流程
4.4.2	设计备份一致性、恢复与失败保护；11/03；2.00 人时；人工预算 91.52 元	王晨	4.4.1	完成设计备份一致性、恢复与失败保护；记录交叉复核或双方确认结论。证据：运维执行协议；备份恢复流程
4.5.1	共同核对总体与详细设计；11/05；2.40 人时；人工预算 109.82 元	王晨、刘景浩	4.3.2,4.4.2,4.6.2,3.5.2	形成共同核对总体与详细设计对应产物；按附录 A 核对内容与未决问题。证据：总体及详细设计；评审记录与基线
4.5.2	共同评审并确认内部设计基线；11/05；2.40 人时；人工预算 109.82 元	王晨、刘景浩	4.5.1	完成共同评审并确认内部设计基线；记录交叉复核或双方确认结论。证据：总体及详细设计；评审记录与基线

编号	当周具体任务	任务负责人	前置与交接	产物与完成标准
4.6.1	编制核心与异常验收用例；11/03；2.50 人时；人工预算 114.40 元	刘景浩	4.3.2,4.2.2	形成编制核心与异常验收用例对应产物；按附录 A 核对内容与未决问题。证据：TC 用例、REQ 追踪；合成数据及脚本方案
4.6.2	准备合成数据和性能脚本方案；11/03；2.00 人时；人工预算 91.52 元	刘景浩	4.6.1	完成准备合成数据和性能脚本方案；记录交叉复核或双方确认结论。证据：TC 用例、REQ 追踪；合成数据及脚本方案
5.1.1	搭建模块骨架与环境配置；11/06；0.80 人时；人工预算 36.61 元	王晨	4.5.2	骨架与配置可构建，凭据独立。证据：工程骨架、环境模板和接口示例
5.1.2	核对共享接口和错误格式；11/06；1.00 人时；人工预算 45.76 元	王晨	5.1.1	共享请求、错误格式与接口示例明确。证据：工程骨架、环境模板和接口示例
5.4.1	实现双端筛选与阅读界面；11/06；3.50 人时；人工预算 160.16 元	刘景浩	4.5.2	双端检索阅读按共享契约完成。证据：页面与交互记录；模拟数据说明
3.8.1	准备导航线框与用户代表任务；11-02；2 人时；91.52 元	王晨、刘景浩（王晨 0.75、刘景浩 1.25 人时）	3.7.2	覆盖正常与异常；真实参与和反馈分别登记，未确认不得代签；保存 原型、代表与反馈记录
3.8.2	执行代表走查并登记修改与确认；11-02；2 人时；91.52 元	王晨、刘景浩（王晨 0.75、刘景浩 1.25 人时）	3.8.1	覆盖正常与异常；真实参与和反馈分别登记，未确认不得代签；保存 原型、代表与反馈记录
3.9.1	同步 SRS 与四维验证及追踪；11-03；2.5 人时；114.4 元	王晨、刘景浩（王晨 1.5、刘景浩 1 人时）	3.8.2	一致完整现实有效四项检查；未关闭问题有责任期限；提交材料同版本；保存 SRS、模型追踪、评审对照及阶段材料
3.9.2	同步计划排期并核对评审提交包；11-03；2.5 人时；114.4 元	王晨、刘景浩（王晨 1.5、刘景浩 1 人时）	3.9.1	一致完整现实有效四项检查；未关闭问题有责任期限；提交材料同版本；保存 SRS、模型追踪、评审对照及阶段材料

第 6 周 11/09—11/15

本周目标：认证、文章接口及双端创作界面。

交接与提交：提供认证和内容接口契约；双端页面模拟数据明确标注；11 月 15 日交详细设计。

持续管理 M06：11/09—11/13；0.85 人时；人工预算 38.90 元。负责人王晨，刘景浩提供状态。检查完成证据、阻塞、下周交接和提交节点；更新风险变更及实际差异；双方确认记录；保存周会议及变更记录。

编号	当周具体任务	任务负责人	前置与交接	产物与完成标准
5.2.1	实现登录与校园邮箱验证；11/09；1.50 人时；人工预算 68.64 元	王晨	5.1.2	登录验证码错误、过期、发信失败可处理。证据：认证代码、单元结果与接口集合
5.2.2	实现材料认证接口和角色限制；11/10；1.50 人时；人工预算 68.64 元	王晨	5.2.1	材料受控；审核理由、结果和角色权限正确。证据：认证代码、单元结果与接口集合
5.3.1	实现文章图片、草稿存储接口；11/11；1.00 人时；人工预算 45.76 元	王晨	5.2.2	草稿不公开；正文、图片和版本关联正确。证据：内容 API、SQL、单元与接口结果
5.3.2	实现岗位专业公司筛选与分页；11/12—11/13；1.00 人时；人工预算 45.76 元	王晨	5.3.1	岗位专业公司组合筛选及分页正确。证据：内容 API、SQL、单元与接口结果
5.4.2	核对游客状态、失败和空结果；11/09—11/10；2.00 人时；人工预算 91.52 元	刘景浩	5.4.1	空结果与失败可恢复；模拟数据标注清楚。证据：页面与交互记录；模拟数据说明
5.5.1	实现 Markdown、图片和资料链接；11/11；3.50 人时；人工预算 160.16 元	刘景浩	5.4.2	Markdown 预览、图片和网盘链接可用。证据：编辑器模块；保存失败及预览检查
5.5.2	实现预览、保存与草稿恢复；11/12—11/13；2.00 人时；人工预算 91.52 元	刘景浩	5.5.1	保存失败保留正文，危险脚本受控，草稿可恢复。证据：编辑器模块；保存失败及预览检查

第 7 周 11/16—11/22

本周目标：移动创作、文章管理和社区治理。

交接与提交：移动编辑与发布接口接通；刘景浩交付社区处理 API 和管理网页。设计修订材料 11 月 22 日提交。

持续管理 M07：11/16—11/20；0.85 人时；人工预算 38.90 元。负责人王晨，刘景浩提供状态。检查完成证据、阻塞、下周交接和提交节点；更新风险变更及实际差异；双方确认记录；保存周会议及变更记录。

编号	当周具体任务	任务负责人	前置与交接	产物与完成标准
5.6.1	实现移动图文编辑和上传；11/16；3.50 人时；人工预算 160.16 元	王晨	5.3.2	手机图文与图片上传可独立完成。证据：移动创作代码；图片和草稿用例
5.6.2	实现移动草稿保存及恢复；11/17；2.00 人时；人工预算 91.52 元	王晨	5.6.1	失败图片可重试，草稿恢复不覆盖复杂正文。证据：移动创作代码；图片和草稿用例
5.7.1	实现发布、修改、下架和恢复接口；11/18；3.50 人时；人工预算 160.16 元	王晨	5.6.2,5.5.2	生命周期接口及冲突检测可用。证据：生命周期 API；双端文章管理与单元结果
5.7.2	接通双端作者文章管理；11/19；2.00 人时；人工预算 91.52 元	王晨	5.7.1	双端管理一致；管理下架不能自行恢复。证据：生命周期 API；双端文章管理与单元结果
5.8.1	实现主页、评论图片及收藏交流；11/20；3.50 人时；人工预算 160.16 元	王晨	5.7.2	评论图片、主页联系、收藏有认证边界。证据：交流激励模块；事务并发、权限与通知用例
5.9.1	实现认证审核与举报反馈处理接口；11/16；3.50 人时；人工预算 160.16 元	刘景浩	5.5.2	处理 API 复用认证，状态理由审计齐备。证据：社区管理 API 与网页；处理状态和权限记录
5.9.2	实现社区管理网页并联调；11/17—11/18；2.00 人时；人工预算 91.52 元	刘景浩	5.9.1	网页定位原文评论；处理、申诉和通知联通。证据：社区管理 API 与网页；处理状态和权限记录

编号	当周具体任务	任务负责人	前置与交接	产物与完成标准
5.10.1	实现独立运维任务执行服务；11/19；4.00 人时；人工预算 183.04 元	刘景浩	5.9.2	独立执行器鉴权、目标白名单及任务互斥可用。证据：执行器、备份清单与失败保护用例
5.10.2	本周启动：实现部署重启、备份恢复及失败保护；11/20；本周 1.25 人时；人工预算 57.20 元	刘景浩	5.10.1	四类操作留痕；数据库图片一致，恢复前保护当前状态。证据：执行器、备份清单与失败保护用例

第 8 周 11/23—11/29

本周目标：交流激励、运维及真实接口联调。

交接与提交：运维执行器和网页完成交接；11 月 26 日处理设计意见，27 日完成真实 API 联调；29 日交代码清单、用例及翻转 PPT2。

持续管理 M08：11/23—11/27；0.85 人时；人工预算 38.90 元。负责人王晨，刘景浩提供状态。检查完成证据、阻塞、下周交接和提交节点；更新风险变更及实际差异；双方确认记录；保存周会议及变更记录。

编号	当周具体任务	任务负责人	前置与交接	产物与完成标准
4.7.1	共同登记课堂设计意见；11/26；2.40 人时；人工预算 109.82 元	王晨、刘景浩	5.8.2,5.11.2	形成共同登记课堂设计意见对应产物；按附录 A 核对内容与未决问题。证据：设计变更；模块修订与复核记录
4.7.2	分别调整模块并共同复核；11/26；2.40 人时；人工预算 109.82 元	王晨、刘景浩	4.7.1	完成分别调整模块并共同复核；记录交叉复核或双方确认结论。证据：设计变更；模块修订与复核记录
5.8.2	实现点赞、领取投币、荣誉排序与通知；11/23—11/24；2.00 人时；人工预算 91.52 元	王晨	5.8.1	余额不负、不重复奖励、不自投；荣誉及通知一致。证据：交流激励模块；事务并发、权限与通知用例
5.10.2	本周收尾：实现部署重启、备份恢复及失败保护；11/23；本周 1.25 人时；人工预算 57.20 元	刘景浩	5.10.1	四类操作留痕；数据库图片一致，恢复前保护当前状态。证据：执行器、备份清单与失败保护用例

编号	当周具体任务	任务负责人	前置与交接	产物与完成标准
5.11.1	实现运维状态、日志和备份列表；11/24；4.00 人时；人工预算 183.04 元	刘景浩	5.10.2	状态、日志及备份列表权限正确。证据：运维网页；四类操作与失败反馈记录
5.11.2	联调网页部署重启与备份恢复；11/25；2.50 人时；人工预算 114.40 元	刘景浩	5.11.1	网页确认目标和影响，失败及停机仍能查结果。证据：运维网页；四类操作与失败反馈记录
5.12.1	双方接通真实接口与跨端链路；11/27；3.00 人时；人工预算 137.28 元	王晨、刘景浩	4.7.2	双端业务及运维接真实 API，关闭模拟替代缺口。证据：安装包、代码清单、联调记录与实现基线
5.12.2	构建候选版本并归档实现证据；11/27；3.00 人时；人工预算 137.28 元	王晨、刘景浩	5.12.1	构建、源码、代码清单和用例同版本归档。证据：安装包、代码清单、联调记录与实现基线

第 9 周 11/30—12/06

本周目标：完整系统测试与首次内部验收。

交接与提交：测试使用固定数据和候选版本；双方按模块修复；12 月 4 日内部验收，6 日 22 时交报告。

持续管理 M09：11/30—12/04；0.85 人时；人工预算 38.90 元。负责人王晨，刘景浩提供状态。检查完成证据、阻塞、下周交接和提交节点；更新风险变更及实际差异；双方确认记录；保存周会议及变更记录。

编号	当周具体任务	任务负责人	前置与交接	产物与完成标准
6.1.1	执行角色及核心业务功能用例；11/30；1.20 人时；人工预算 54.91 元	刘景浩	5.12.2	五类角色和完整核心链路实际执行。证据：TC 实际结果、Postman 集合及缺陷单
6.1.2	执行接口、集成和失败场景；12/01；1.50 人时；人工预算 68.64 元	刘景浩	6.1.1	失败可复现，输入数据断言关联缺陷。证据：TC 实际结果、Postman 集合及缺陷单
6.2.1	固定环境执行 30 并发负载；11/30；1.20 人时；人工预算 54.91 元	王晨	5.12.2	固定数据环境执行 30 并发负载场景。证据：JMeter 脚本、JTL、统计及环境记录

编号	当周具体任务	任务负责人	前置与交接	产物与完成标准
6.2.2	分析 P95、错误率与资源占用；12/01；1.50 人时；人工预算 68.64 元	王晨	6.2.1	核对 P95、错误率、吞吐和资源原始结果。证据：JMeter 脚本、JTL、统计及环境记录
6.3.1	执行阶梯压力寻找容量边界；12/02；1.20 人时；人工预算 54.91 元	王晨	6.2.2	阶梯 10 至 100 并发探测边界，非容量承诺。证据：压力稳定性结果、资源趋势和账本一致性记录
6.3.2	执行稳定性与降载恢复；12/02；1.50 人时；人工预算 68.64 元	王晨	6.3.1	10 并发 30 分钟；降载恢复及账本一致性有记录。证据：压力稳定性结果、资源趋势和账本一致性记录
6.4.1	执行越权隐私与危险输入检查；12/02；1.20 人时；人工预算 54.91 元	刘景浩	6.1.2	直接 API 越权失败，隐私与危险输入受控。证据：安全、权限、兼容及页面体验记录
6.4.2	执行双端浏览编辑与图片兼容；12/02；1.50 人时；人工预算 68.64 元	刘景浩	6.4.1	浏览器和开发者工具核心体验一致，设备限制列明。证据：安全、权限、兼容及页面体验记录
6.5.1	验证冷启动与网页运维操作；12/03；1.20 人时；人工预算 54.91 元	王晨	6.3.2	指南冷启动及网页四类运维操作实际执行。证据：启动、部署重启、恢复与回退记录
6.5.2	验证损坏备份、回退与恢复一致性；12/03；1.50 人时；人工预算 68.64 元	王晨	6.5.1	损坏备份被拒；回退与恢复前后数据一致。证据：启动、部署重启、恢复与回退记录
6.6.1	按模块分派缺陷并修复；12/03；2.50 人时；人工预算 114.40 元	王晨、刘景浩（各修复本人模块）	6.4.2,6.3.2	双方按模块修复，记录版本和缺陷指派。证据：双方修复提交、复测结果和残留问题清单
6.6.2	交叉复测原场景与相邻流程；12/03—12/04；1.50 人时；人工预算 68.64 元	刘景浩	6.6.1	交叉回归原及相邻场景，严重缺陷关闭。证据：双方修复提交、复测结果和残留问题清单
6.7.1	双方确认测试结论与交付限制；12/04；2.40 人时；人工预算 109.82 元	王晨、刘景浩	6.6.2,6.5.2	实际结果与目标分开，环境版本证据可追溯。证据：系统测试报告；候选交付包和验收清单

第 10 周 12/07—12/13

本周目标：测试证据复核和发布维护说明。

交接与提交：12 月 6 日已提交基线保留；后续报告复核单独修订，整理运行说明并检查冷启动；13 日交已有测试修订。

持续管理 M10：12/07—12/11；0.85 人时；人工预算 38.90 元。负责人王晨，刘景浩提供状态。检查完成证据、阻塞、下周交接和提交节点；更新风险变更及实际差异；双方确认记录；保存周会议及变更记录。

编号	当周具体任务	任务负责人	前置与交接	产物与完成标准
6.8.1	复核测试报告与证据链；12/07；1.20 人时；人工预算 54.91 元	王晨	6.7.1	已提交测试基线保留，复核结论另记。证据：测试报告修订与汇报材料
6.8.2	整理课堂测试汇报和已有修订；12/08；1.50 人时；人工预算 68.64 元	王晨	6.8.1	报告修订与课堂汇报证据一致。证据：测试报告修订与汇报材料
7.1.1	整理安装、用户及管理操作说明；12/09；1.50 人时；人工预算 68.64 元	王晨	6.8.2	形成整理安装、用户及管理操作说明对应产物；按附录 A 核对内容与未决问题。证据：发布包、安装用户管理运维说明
7.1.2	整理运维、恢复与故障维护规程；12/10；1.50 人时；人工预算 68.64 元	王晨	7.1.1	完成整理运维、恢复与故障维护规程；记录交叉复核或双方确认结论。证据：发布包、安装用户管理运维说明
7.2.1	在干净配置核对冷启动；12/11；1.50 人时；人工预算 68.64 元	王晨	7.1.2	形成在干净配置核对冷启动对应产物；按附录 A 核对内容与未决问题。证据：干净环境启动及课堂演示核查记录
7.2.2	核对演示数据、认证与外网失败回退；12/11；1.50 人时；人工预算 68.64 元	王晨	7.2.1	完成核对演示数据、认证与外网失败回退；记录交叉复核或双方确认结论。证据：干净环境启动及课堂演示核查记录

第 11 周 12/14—12/20

本周目标：维护交接与课堂测试意见处理。

交接与提交：双方完成维护与备份交接；17 日处理测试课堂新意见；开始真实总结和偏差分析。

持续管理 M11：12/14—12/18；0.85 人时；人工预算 38.90 元。负责人王晨，刘景浩提供状态。检查完成证据、阻塞、下周交接和提交节点；更新风险变更及实际差异；双方确认记录；保存周会议及变更记录。

编号	当周具体任务	任务负责人	前置与交接	产物与完成标准
7.3.1	登记维护申请和影响分析；12/14；1.50 人时；人工预算 68.64 元	刘景浩	7.2.2	形成登记维护申请和影响分析对应产物；按附录 A 核对内容与未决问题。证据：维护变更单、回退与回归记录
7.3.2	执行修改回退及回归演练；12/14；1.50 人时；人工预算 68.64 元	刘景浩	7.3.1	完成执行修改回退及回归演练；记录交叉复核或双方确认结论。证据：维护变更单、回退与回归记录
7.4.1	核对备份、配置与维护资料；12/15；1.50 人时；人工预算 68.64 元	王晨	7.3.2	形成核对备份、配置与维护资料对应产物；按附录 A 核对内容与未决问题。证据：交接清单、备份与权限配置记录
7.4.2	双方练习操作并确认交接；12/15；1.50 人时；人工预算 68.64 元	王晨	7.4.1	完成双方练习操作并确认交接；记录交叉复核或双方确认结论。证据：交接清单、备份与权限配置记录
7.5.1	登记 12 月 16 日测试评审意见；12/17；1.50 人时；人工预算 68.64 元	刘景浩	6.8.2	形成登记 12 月 16 日测试评审意见对应产物；按附录 A 核对内容与未决问题。证据：测试评审修订和残留风险记录
7.5.2	修订报告及相关实现用例；12/17；1.50 人时；人工预算 68.64 元	刘景浩	7.5.1	完成修订报告及相关实现用例；记录交叉复核或双方确认结论。证据：测试评审修订和残留风险记录
8.1.1	共同核对计划实际与阶段成果；12/18；1.80 人时；人工预算 82.37 元	王晨、刘景浩	7.4.2,7.5.2	形成共同核对计划实际与阶段成果对应产物；按附录 A 核对内容与未决问题。证据：总结报告、偏差分析和实际贡献证据

第 12 周 12/21—12/27

本周目标：总结材料、交付核查与总评演练。

交接与提交：总结与总评素材相互核对；24 日共同验收演练；27 日 22 时交总结和总评 PPT。

持续管理 M12：12/21—12/25；0.85 人时；人工预算 38.90 元。负责人王晨，刘景浩提供状态。检查完成证据、阻塞、下周交接和提交节点；更新风险变更及实际差异；双方确认记录；保存周会议及变更记录。

编号	当周具体任务	任务负责人	前置与交接	产物与完成标准
8.1.2	共同总结偏差风险和协作贡献；12/21；1.80 人时；人工预算 82.37 元	王晨、刘景浩	8.1.1	完成共同总结偏差风险和协作贡献；记录交叉复核或双方确认结论。证据：总结报告、偏差分析和实际贡献证据
8.2.1	整理总评 PPT 资料和详细周计划；12/22；1.50 人时；人工预算 68.64 元	王晨	8.1.2	形成整理总评 PPT 资料和详细周计划对应产物；按附录 A 核对内容与未决问题。证据：总评素材、完整周计划和引用
8.2.2	核对引用、图表与交付目录；12/23；1.50 人时；人工预算 68.64 元	王晨	8.2.1	完成核对引用、图表与交付目录；记录交叉复核或双方确认结论。证据：总评素材、完整周计划和引用
8.3.1	共同执行交付清单核查；12/24；1.80 人时；人工预算 82.37 元	王晨、刘景浩	8.2.2	形成共同执行交付清单核查对应产物；按附录 A 核对内容与未决问题。证据：交付基线、验收清单及演练记录
8.3.2	共同预演并确认提交版本；12/24；1.80 人时；人工预算 82.37 元	王晨、刘景浩	8.3.1	完成共同预演并确认提交版本；记录交叉复核或双方确认结论。证据：交付基线、验收清单及演练记录

第 13 周 12/28—01/03

本周目标：总评反馈与 1 月 3 日归档基线。

交接与提交：参与 12 月 30 日总评；31 日准备 1 月 3 日提交基线，未完成尾项另列；元旦不排正常任务。

持续管理 M13：12/28—12/31；0.85 人时；人工预算 38.90 元。负责人王晨，刘景浩提供状态。检查完成证据、阻塞、下周交接和提交节点；更新风险变更及实际差异；双方确认记录；保存周会议及变更记录。

编号	当周具体任务	任务负责人	前置与交接	产物与完成标准
8.4.1	处理总评意见并准备提交基线；12/31；1.50 人时；人工预算 68.64 元	王晨	8.3.2	12 月 31 日形成 1 月 3 日待提交基线。证据：总评修订、提交基线及归档尾项记录

第 14 周 01/04—01/06

本周目标：归档尾项核对与课程收尾。

交接与提交：1 月 4 日核对归档尾项；6 日双方确认课程收尾和最终交付。

持续管理 M14：01/04—01/06；0.85 人时；人工预算 38.90 元。负责人王晨，刘景浩提供状态。检查完成证据、阻塞、下周交接和提交节点；更新风险变更及实际差异；双方确认记录；保存周会议及变更记录。

编号	当周具体任务	任务负责人	前置与交接	产物与完成标准
8.4.2	核对提交后尾项与最终归档；01/04；1.50 人时；人工预算 68.64 元	王晨	8.4.1	1 月 4 日核对尾项，以补充记录归档。证据：总评修订、提交基线及归档尾项记录
8.5.1	共同核对课程收尾材料；01/06；1.80 人时；人工预算 82.37 元	王晨、刘景浩	8.4.2	形成共同核对课程收尾材料对应产物；按附录 A 核对内容与未决问题。证据：收尾确认、最终清单与实际成员评价
8.5.2	共同确认交付与后续维护边界；01/06；1.80 人时；人工预算 82.37 元	王晨、刘景浩	8.5.1	完成共同确认交付与后续维护边界；记录交叉复核或双方确认结论。证据：收尾确认、最终清单与实际成员评价

附录 C 计划阶段 16 项评审对照

条目	教师检查要求	材料位置	核查口径
1	项目演示 PPT 与效果	项目介绍第 1、4、5 章；实际汇报 PPT	项目定位、核心功能、计划、可行性和成员工作完整，图表与正文清晰
2	按进度提交全部阶段成果	项目计划第 3、6、7 章；附录 B；交付成果登记	内部形成、邮件提交、课堂反馈分开，实际记录另补
3	可行性报告及关键技术	可行性报告第 7、10 章；条件 C01—C05	方案选择、实施责任、验证产物及变更触发条件清楚
4	计划模板是否合适	国标第 7.2 节 13 章；国标与评审对照	直接采用国标章序和内容，另保留课程 16 项要求；不以企业资料为编制依据。
5	成员任务贯穿全程及甘特图	项目计划第 7、8 章；附录 A、B；甘特图	两人均有开发、文档、验证与评审任务
6	Project 绘制 GANTT 且准确	项目计划第 7 章；原生 MPP 及 Project 附件	日期依赖不变；202 条分配已重开核验，原生资源表保留超载提示
7	每位组员明确合理分工	项目计划第 8 章；附录 A、B	明确主责、共同工作、交接及复核责任
8	WBS 合理并体现瀑布阶段	项目计划第 5、7 章；WBS 和网络	教材阶段单列对应，总体与详细设计分别交付，有反馈
9	完成时间估计合理	项目计划第 7、10 章；任务执行跟踪	工期、工作日历、依赖、人时和实际分别说明
10	每项任务指定负责人	项目计划第 8 章；附录 A、B；任务登记	学生负责执行与复核，AI 为工具
11	结合课程进度调整计划	项目计划第 3、6.1、6.14 章；附录 B	课堂与提交日期区分；变更批准后同步基线
12	整体及每项预算合理	项目计划第 10 章；附录 E、F；预算工作簿	人工 10366.93 元、现金 0 元分列，任务明细不重复汇总
13	配置工具与文档版本管理	项目计划第 6.14 章；Git 说明和变更登记	标识、版本、变化控制、配置审计和状态报告

条目	教师检查要求	材料位置	核查口径
14	负荷与过载说明	项目计划第 8、10、11 章；附录 E	MPP 采用 226.55 人时；每周检查日常容量与集中投入，实际投入记入日志
15	合理及时的项目会议记录	项目计划第 8 章、附录 D；真实会议及周会模板	历史事实保留；后续按上周检查、问题、下周分工填写
16	有效的成员绩效评价	项目计划第 8 章、附录 D、E；成员评分表	按实际成果、整改和协作记录形成阶段评价

附录 D 会议与成员阶段评价

本附录汇总阶段讨论、文档修订及成员评价。10 月 11 日和 17 日记录按历史阶段保留；10 月 31 日需求阶段记录见本附录及本期周会附件。

日期与记录	讨论内容	形成决定
2026 年 10 月 11 日；会议纪要	GitHub 账号、Git 版本控制、AI 生成计划初看与初始职责。	采用 Git/GitHub 协作，设置个人任务分支；初始分工按计划执行，结合教师意见和实际工作调整。
2026 年 10 月 17 日；腾讯会议，本地录制 63 分 14 秒	计划评审整改、国标与本校模板、人时工资预算、测试、SourceTree 与 Logo。	统一报告结构与图表，按任务细分人时和人工预算，选用 SourceTree 及小组 Logo，测试覆盖功能、性能、压力和恢复。
2026 年 10 月 31 日；线上会议，会议号 434440602	本周文档任务、SRS 与评审表、WorkBuddy/GitHub、主对话与执行对话、分支提交。	双方共同评审文档；按课程要求更新计划并准备 SRS 及 PPT；王晨统筹提交，刘景浩协助环境与材料核对。

10 月 17 日周会由王晨组织，王晨与刘景浩共同参加。会议投入按录制时间登记，两人各 1.054 人时、团队 2.108 人时，计入 M02 周会活动。

成员评价采用百分制，下表为 10 月 17 日计划修订与周会阶段评价，由组长于 10 月 18 日评定。后续里程碑评价结合对应阶段的实际成果、质量、进度和协作记录执行。

成员	本阶段实际承担	阶段评分
王晨；组长兼项目负责人	组织计划评审整改讨论，汇总报告与配套材料，借助 GPT 制作计划文档、豆包制作 PPT；统筹人时预算、排期与提交。	91.0 分
刘景浩	参与计划修订和评审问题核对，讨论并试用 Git 图形工具，比较 Logo 方案，对资料、分工、预算及后续安排提出检查反馈。	90.5 分

配套记录：20261011 会议纪要 G04、20261017 周会议纪要与成员评价 G04、20261031 需求阶段周会议纪要与成员评价 G04。10 月 31 日评分为王晨 91.2、刘景浩 91.3；本期工作为文档共同评审和协作环境讨论，计划人时不替代实际投入。

附录 E 模板依据与量化管理

E1 人员工时估算

人员投入按执行任务自下而上估算，分为准备理解、交互实施、验证修复和文档交接四类。[Q3][Q4][Q6] 执行任务作为人时累计层，工作包和阶段汇总下级投入。日常每人每天 30—45 分钟，集中开发及测试按周确认额外投入。

单人时长建议为需求子任务 1.6 小时，设计主作业 2.5 小时、核对 2 小时，普通模块主作业 3.5 小时、核对 2 小时，运维主作业 4 小时、核对 2.5 小时，测试准备 1.2 小时、执行结果核对 1.5 小时、缺陷修复 2.5 小时。周管理王晨 0.6 小时、刘景浩参与进度沟通 0.25 小时，交叉复核每项 0.45 小时。共同任务分别估计个人投入，不将整项工作重复给双方。

5.1 工程基础、5.2 邮箱账号与 5.3 公开检索已有局部实现及验证记录，后续复核适配按子任务 0.8—1.5 人时估计。计入人员实际参与的准备、交互、检查、修复和交接时间；两人同时各投入 1 小时计 2 人时。

4.6.2 由刘景浩主责，王晨协助测试数据准备 0.75 人时；5.7.2 由王晨主责，刘景浩协助网页跨端用例 1 人时。主责人组织交接，另一成员检查对方产物。个人投入按具体活动估计，执行中用实际记录校准。

阶段	王晨人时	刘景浩人时	团队人时	人工预算 元
1 项目计划与评审	3.00	3.00	6.00	274.56
2 可行性研究	6.00	4.00	10.00	457.60
3 需求分析	18.20	19.40	37.60	1720.58
4 总体与详细设计	19.05	13.05	32.10	1468.90
5 编码与单元测试	25.30	33.50	58.80	2690.69
6 综合测试	13.25	9.35	22.60	1034.18
7 部署与维护	9.00	6.00	15.00	686.40

阶段	王晨人时	刘景浩人时	团队人时	人工预算 元
8 总结与收尾	11.40	5.40	16.80	768.77
M 持续管理与交叉复核	15.15	12.50	27.65	1265.26
合计	120.35	106.20	226.55	10366.93

计划合计 226.55 人时，王晨 120.35（53.12%）、刘景浩 106.20（46.88%），人工预算 10366.93 元。累计层为 152 项执行任务：167 项核心子任务 198.90 人时、14 项周管理 11.90 人时、35 项复核 15.75 人时。课堂节点的准备和提交已纳入执行任务；实际贡献按成果另评。

167 项核心子任务及现有独立管理复核任务进入估算。课程零工期节点不重复加人时，评审准备和反馈处理已列入对应执行任务。人工预算按人时和工资单价计算，项目合计 10366.93 元，属于计划成本。

作为估算敏感性场景，增加 20%工作量对应 45.31 人时，上限为 271.86 人时。这只是风险比较，并未自动增加 MPP 任务或延长日期；确需增加投入时按变更流程重排。

E2 每周负荷与实际记录

两名成员日常各投入 30—45 分钟，完整周每人 3.5—5.25 人时、团队 7—10.5 人时。10 月 8 日至 1 月 6 日共 91 个自然日，日常容量合计 91—136.5 人时。实际投入按工作日志记录，周会对照计划和完成情况检查。

完整范围按 226.55 人时安排，相对日常容量增加 90.05—135.55 人时集中投入，重点分配在实现、联调与测试阶段。双方按周检查人员负荷、交接和剩余工作，超出安排的投入通过变更流程管理。

下表按工作日与任务窗口分摊计划人时，含管理和交叉复核；日常容量按自然日 30—45 分钟/人，超过上限的部分需要集中投入。实际人时按日志登记。

周分摊保留两位小数，尾差在最后一周调整；阶段、任务及周合计保持一致。

周	日期	王晨人时	刘景浩人时	每人日常容量	王晨加时	刘景浩加时
1	10-08 至 10-11	5.97	2.55	2.00—3.00	3.97	0.55

周	日期	王晨人时	刘景浩人时	每人日常容量	王晨加时	刘景浩加时
2	10-12 至 10-18	5.67	6.40	3.50—5.25	2.17	2.90
3	10-19 至 10-25	7.25	6.90	3.50—5.25	3.75	3.40
4	10-26 至 11-01	16.40	9.15	3.50—5.25	12.90	5.65
5	11-02 至 11-08	15.75	19.50	3.50—5.25	12.25	16.00
6	11-09 至 11-15	6.35	8.65	3.50—5.25	2.85	5.15
7	11-16 至 11-22	14.85	13.05	3.50—5.25	11.35	9.55
8	11-23 至 11-29	8.60	13.70	3.50—5.25	5.10	10.20
9	11-30 至 12-06	12.50	10.95	3.50—5.25	9.00	7.45
10	12-07 至 12-13	9.30	1.60	3.50—5.25	5.80	0.00
11	12-14 至 12-20	5.40	7.60	3.50—5.25	1.90	4.10
12	12-21 至 12-27	6.30	3.40	3.50—5.25	2.80	0.00
13	12-28 至 01-03	2.10	0.47	3.50—5.25	0.00	0.00
14	01-04 至 01-06	3.90	2.27	1.50—2.25	2.40	0.77

单周需求峰值为王晨 14.85 人时、刘景浩 15.00 人时。按每天 30 分钟、日常容量不跨周转移计算，逐周额外投入合计王晨 55.38、刘景浩 64.60 人时。双方每周确认具体加时；无法落实时，由项目负责人登记变更、调整依赖与非核心范围，保护性能、安全和恢复验证。

Project 按 202 条人员分配记录 226.55 人时。日常资源上限按 45 分钟 / 8 小时工作日设为 9.375%，两人均出现超载。周末容量单独核查，分配明细按周精确到 0.01 人时，个人与任务汇总一致。集中加时落实前，维持资源超载风险并逐周重排。

跟踪字段为任务编号、成员、日期、实际人时、成果、证据、剩余人时和复核人。偏差率 =（实际人时 - 计划人时）÷计划人时，计划为 0 的项目单列说明。阶段成果以验收记录为依据，投入与成果分别统计。

E3 成员贡献评分

成员评价采用百分制。10 月 17 日计划修订和 10 月 31 日需求阶段均保留组内综合评分；后续可按成果完成 50 分、质量 25 分、进度履约 15 分、协作 10 分细化并保存证据。当前总分与对应会议、实际工作一并登记。[Q4][Q5][Q6]

维度	满分	定量规则	证据
成果完成	50	按当期事先约定的任务权重累计已验收成果。共同任务记录各自具体部分；无证据项不默认完成。	成果清单、文件、提交或验收记录
成果质量	25	按合格检查项 / 适用检查项×25 计算，记录问题及关闭证据；不得用工时或提交数量代替质量。	交叉复核表、缺陷关闭和验收记录
进度履约	15	按按期验收任务权重 / 到期任务总权重×15 计算；批准延期使用调整后的日期。	任务基线、完成时间、变更记录
协作参与	10	本阶段采用出席并参与实际讨论 5 分、参与共同决定 5 分；依据会议记录核对。后续阶段重新约定适用事件。	实际会议及共同决定记录

分项评价根据阶段任务和验收范围确定权重，共同任务分别登记各自承担，记录分项依据、复核意见和总分。

评价阶段	王晨	刘景浩	依据
2026 年 10 月 17 日计划修订与周会	91.0 分	90.5 分	10 月 18 日组长综合评定；实际承担及会议记录见附录 D。
2026 年 10 月 31 日需求阶段文档共同评审	91.2 分	91.3 分	组内提供综合总分；双方参与本期文档评审和协作规范讨论，详见本期周会。

评价记录按阶段区分：10 月 17 日王晨 91.0、刘景浩 90.5；10 月 31 日需求阶段王晨 91.2、刘景浩 91.3。本期总分依据组内提供的综合评价记录，不反推未提供的分项得分。10 月 17 日会议人时继续仅计入对应历史活动。

E4 计划阶段材料核查

教师计划阶段评审共 16 项，逐项材料位置和完成标准见附录 C。提交前按以下四组检查文档、图表、排期与过程记录的一致性。

核查范围	对应条目	检查内容
成果与研究依据	1—4	核对汇报、阶段成果、可行性报告、项目计划及国标结构。
任务与进度	5—11	核对 WBS、任务负责人、人时、课程节点、甘特图、工程网络及原生 MPP。
预算与配置资源	12—14	复算任务及项目预算，核对 Git 版本登记、人员负荷和集中投入安排。
会议与成员评价	15—16	核对会议议题、进度问题、下一周分工、评分和实际成果依据。

E5 引用与估算记录

[Q1] GB/T 8567—2006 计算机软件文档编制规范。第 7.1 节印刷页 14—16、第 7.2 节印刷页 16—23；完整规范及摘页见“国内模板与国标依据”。国家标准公开系统：https://openstd.samr.gov.cn/bzgk/std/newGbInfo?hcno=84C42B6277D2714B7176B10C6E6B1A44 。

[Q2] 软件工程课程团队作业要求及本组周会管理规则。周会记录时间地点、上周进度、问题原因、下周任务与负责人；此表为 G04 课程适配模板，不是 GB/T 8567 统一表单。

[Q3] Microsoft．Learn more about resource units，Project 桌面版资源单位说明。https://support.microsoft.com/en-us/project/learn-more-about-resource-units，查阅 2026 年 10 月 21 日。

[Q4] 软件工程课程 第 13 章 软件项目管理，97 页。PDF 第 6—8 页规模、第 10—16 页工作量、第 17—43 页进度、第 44—57 页组织。课程资料。

[Q5] 软件工程课程项目计划阶段评审检查表，2 页，16 项，等级分 0—5。课程资料。

[Q6] 本组 Project 任务、WBS 估算及 2026 年 10 月 11 日已确认会议记录；估算与评分为编制建议。

附录 F 人工预算与配套管理文件

人工预算与现金支出分别管理

人工预算统一采用 45.76 元 / 人时的项目核算费率。费率测算输入为年度人工参考参数 95,545 元，按 12 个月、每月 21.75 个计薪日、每日 8 小时折算。该参数用于课程项目直接人工预算。[B1][B3]

小时费率 = 95,545 ÷ 12 ÷ 21.75 ÷ 8 = 45.7590996，预算取 45.76 元 / 人时。日常与集中投入采用同一费率，预算覆盖开发、文档、管理和复核的直接人工，实际支出另行登记。[B3]

成本项目	计划数量	单价及口径	金额 元
王晨人工折算	120.35 人时	45.76 元 / 人时	5507.22
刘景浩人工折算	106.20 人时	45.76 元 / 人时	4859.71
人工折算合计	226.55 人时	按未舍入金额汇总再保留两位	10366.93
项目总估算成本	人工估算与新增现金	计划估算	10366.93

各执行任务人工预算＝计划人时×45.76 元 / 人时，项目合计 10366.93 元。设备与既有工具复用，新增采购预算为 0 元。工作包、阶段及项目按下级明细汇总，实际人时与现金支出另行登记。

人工成本按人时乘以 45.76 元 / 人时计算，采用完整精度汇总，报表展示保留两位小数；实际投入通过工作日志登记。

费率敏感性分析另采用年度人工参数 168,604 元和 173,817 元，分别折合 80.75 元 / 人时、83.25 元 / 人时。计算方法见预算工作簿，任务工作量及排期使用原控制基准。

周会议与独立测试计划

使用《周会议纪要模板 G04》记录时间地点、上一周任务与人时实际、问题原因、处理动作和下一周分工。两人共同任务分别确认职责、投入和交接，集中加时逐周确认。历史 2026 年 10 月 11 日记录单独保留，不以空白模板替代。

《系统测试计划 G04》细化功能、接口、安全兼容、性能、压力、稳定性、恢复和缺陷证据。验收目标与正文第 6 章一致；阶段 22.60 人时已计入 226.55 总量，不再次累加。

附录 G Git 图形界面协作说明

项目版本控制采用 Git，协作托管使用 GitHub，仓库名 HZCU-CampusHub。SourceTree 用于图形化查看差异、暂存、提交、分支、获取、推送与历史记录；协作操作按任务保存提交和复核记录。[B4]

步骤	图形界面操作	完成依据
获取任务	先同步远端，核对当前分支与任务	分支和远端记录
创建任务分支	Branch 中创建，例如 feat/wc-email-auth 或 docs/ljh-test-plan	分支名称与任务对应
检查改动	查看未暂存与已暂存差异，只选择当前任务文件	不包含密码、缓存和无关报告
提交	输入能说明目的的提交信息，创建提交	提交编号与 WBS 或问题号
推送协作	在 SourceTree 推送当前任务分支，在 GitHub 发起 PR	PR 链接、另一人复核意见
审核归档	另一人复核并解决意见，按规则合并	合并记录、交付标签与配置清单

协作流程：任务登记、建立个人任务分支、检查差异、提交推送、交叉复核 PR、合并并标识基线。代码和交付资料分别按既定仓库管理，凭据及本地配置保持忽略，提交前检查暂存清单。

配置管理应同时覆盖标识、版本控制、变更控制、配置审计和状态报告。王晨在周检查中核对需求、程序、数据库迁移、测试与文档版本；刘景浩提供模块清单和差异，双方复核基线一致性。状态报告列新增、已合并、待审和阻塞，不能只列累计提交数作为贡献评分。

本附录引用

[B1] G04 人工成本估算参数表，2026 年 10 月 15 日。年度人工参数 95,545 元用于预算基准，168,604 元和 173,817 元用于费率敏感性比较；计算结果见人时人工预算工作簿。

[B2] 人工费用背景资料登记，2026 年 10 月 15 日。预算计算采用[B1]项目参数及[B3]计薪折算方法。

[B3] 人力资源社会保障部。关于职工全年月平均工作时间和工资折算问题的通知，人社部发〔2025〕2 号。中国政府网，2025 年 1 月 2 日。月计薪 21.75 天、每天 8 小时。https://app.www.gov.cn/govdata/gov/202501/02/523227/article.html 。

[B4] Atlassian．SourceTree 产品介绍与入门文档。https://www.atlassian.com/software/sourcetree；https://support.atlassian.com/sourcetree/kb/commit-push-and-pull-a-repository-on-sourcetree/ 。用于 Git 图形化协作工具选择和操作方法。

附录 H 日志需求与开发工作记录

H1 系统日志功能

日志需求关联 FR-M07、FR-001、FR-003 至 FR-007 及 NFR10 至 NFR11。4.1、4.4 确定字段、权限与保存策略；5.1、5.9—5.11 实现；6.1、6.4、6.5 验证；7.1 交接。当前 226.55 人时已包含相关工作，细化产生的额外投入按变更流程评估。

日志类别	必须记录	查看与保护	负责人及交付	完成标准
运行与异常	时间、级别、模块、版本、请求关联编号、结果或错误码；必要时记录耗时	仅授权维护角色查看；对外错误不暴露堆栈及内部配置	王晨负责业务基础，刘景浩负责运维查看；字段字典与失败样例	一次失败可由关联编号定位原因，界面与日志结果一致
业务与社区审计	操作人标识、时间、动作、对象标识、前后状态、理由、结果、关联编号	社区管理按授权查看；不能用删除文章抹去治理审计	刘景浩负责治理，王晨复核关键状态；审计样例与权限矩阵	声明覆盖的关键动作逐项留痕，状态与实际业务一致
独立运维任务	部署、重启、备份、恢复的任务编号、目标、版本、阶段、发起人及结果	业务服务停机仍可查；不依赖被维护业务库才能查询	刘景浩实现执行记录，王晨验证；成功失败与中断样例	成功状态与实际执行结果一致；失败和中断可追踪
保存与清理	按配置分段、轮转、保留与清理；关键审计按保留规则保护	密码、验证码、令牌、SMTP 授权码及认证证件不入普通日志	双方在设计评审确定参数，交付配置说明与清理记录	验证配置生效、日志空间可控；写入失败有处置结果

H2 日志界面与验收

独立运维网页提供按时间、级别、关联编号或任务编号查询必要日志的入口，分批展示，访问角色与社区管理权限分离。日志内容按文本安全显示，拒绝通过参数读取任意服务器文件；保留天数、分段大小和总量上限在设计评审确定并形成配置清单，不在计划中虚构已经批准的数值。

TC-LOG01—05 分别检查脱敏定位、角色与停机查询、治理审计、任务执行结果、轮转清理及写入失败处理。各项保存步骤、输入、预期、实际和脱敏证据；按对应工作包执行并记录结果。

H3 开发工作日志

两人按实际投入填写“模板与量化/开发工作日志 G04.csv”，记录日期、WBS、成员、当日目标、成果证据、实际人时、问题处理、下一步及复核状态。实际人时按工作日志记录；周会从日志核对前一周进度、问题原因和下一周分工。日志与 SourceTree 提交、问题单和验收记录互相引用，不用提交数量替代成员贡献。

附录 I 可行性八步骤与需求分析任务安排

本附录把方法步骤细化成可分配、可交接、可核对的任务。日历窗口沿用原工作包计划，实际完成日期和投入根据工作日志、用户任务记录和阶段验收填写。上层任务汇总下层人时，不重复累计。

I1 八步骤负责人和计划窗口

FS01—FS08 对应可行性研究的八个方法步骤，44 项分析任务作为末级活动进入原工作包。每个细项均给出负责人、计划人时、输入、产物与完成标准，汇总只计末级活动。

步骤与 WBS	负责人	计划日期	计划人时	交付成果
FS01 复查系统规模和目标 2.1.1.1	王晨	10/08—10/08	1.00	输出：用户—权限表、范围清单、目标与约束。完成标准：每项目标能找到需求和验收场景，范围外功能明确列出。
FS02 研究目前正在使用的系统 2.1.1.2	王晨	10/08—10/08	1.25	输出：现状流程和问题—改进对应表。完成标准：每个改进点有具体信息断点，已有渠道中可复用的能力得到保留。
FS03 导出新系统的高层逻辑模型 2.1.2.1	王晨	10/09—10/09	1.25	输出：推导图、系统流程图、上下文 DFD、处理/存储表和字典。完成标准：物理载体图与逻辑数据流图用途分明，编号与需求模型一致。
FS04 进一步定义问题 2.1.2.2	王晨	10/12—10/12	1.00	输出：修订后的问题陈述、范围和追踪链。完成标准：目标能够通过结果判断；未把实现方式写成用户问题。
FS05 导出和评价供选择的解法 2.2.1.1	刘景浩	10/12—10/12	1.25	输出：候选方案表、优缺点、量化评分和成本区间。完成标准：至少两个可比较方案；推荐理由能追溯到共同标准。
FS06 推荐行动方针 2.2.2.1	刘景浩	10/13—10/13	1.25	输出：推荐结论、条件、备选和变更入口。完成标准：说明为何继续、选什么、在何种情况下调整。
FS07 草拟开发计划书 2.3.1.1	王晨、刘景浩	10/14—10/14	1.50	输出：正式项目计划、WBS、周安排、甘特、网络、预算和测试安排。完成标准：同一任务在各文件中的责任、日期和人时一致。

步骤与 WBS	负责人	计划日期	计划人时	交付成果
FS08 写文档提交审查 2.3.2.1	王晨、刘景浩	10/15—10/15	1.50	输出：可阅读、可追踪、可审查的资料包。完成标准：图表可辨认、页码可定位、关键结论有依据，实际审查决定另行留痕。

FS04 进一步定义问题与 FS05 方案比较在 10 月 12 日并行迭代，FS06 汇总两者结果。范围、技术条件或方案结论发生变化时，返回相应步骤修订。

FS01 复查系统规模和目标　2.1.1.1

WBS	具体任务	任务负责人	日期与投入	产物及完成标准
2.1.1.1.1	FS01.1 明确使用者	王晨	10/08 0.20 人时 9.15 元	主要读者是已明确目标岗位、准备投递和面试的校内学生；分享者是认证用户，重点邀请有实习或工作经历者。；输出：用户—权限表、范围清单、目标与约束。完成标准：每项目标能找到需求和验收场景，范围外功能明确列出。
2.1.1.1.2	FS01.2 限定业务边界	王晨	10/08 0.20 人时 9.15 元	本期提供经验文章、评论、非现金认可、自愿站外联系、社区治理和独立运维；不建立咨询订单、现金交易和站内即时通信。；输出：用户—权限表、范围清单、目标与约束。完成标准：每项目标能找到需求和验收场景，范围外功能明确列出。
2.1.1.1.3	FS01.3 划分访问权限	王晨	10/08 0.20 人时 9.15 元	未登录和未认证者阅读公开文章；作者主页、评论、联系方式与互动要求校园认证；社区管理与运维权限分别授予。；输出：用户—权限表、范围清单、目标与约束。完成标准：每项目标能找到需求和验收场景，范围外功能明确列出。
2.1.1.1.4	FS01.4 把目标写成检查项	王晨	10/08 0.20 人时 9.15 元	按岗位检索，并组合公司、经历专业筛选；同一账号跨端使用；重复投币请求不重复记账；管理人员能定位举报对象。；输出：用户—权限表、范围清单、目标与约束。完成标准：每项目标能找到需求和验收场景，范围外功能明确列出。

WBS	具体任务	任务负责人	日期与投入	产物及完成标准
2.1.1.1.5	FS01.5 核对规模和约束	王晨	10/08 0.20 人时 9.15 元	按 52 项功能标识管理，其中 50 项本期、2 项未来；12 项非功能要求。两名成员，课堂本机演示，226.55 人时控制额。；输出：用户—权限表、范围清单、目标与约束。完成标准：每项目标能找到需求和验收场景，范围外功能明确列出。

FS02 研究目前正在使用的系统 2.1.1.2

WBS	具体任务	任务负责人	日期与投入	产物及完成标准
2.1.1.2.1	FS02.1 列出当前渠道	王晨	10/08 0.25 人时 11.44 元	招聘网站提供职位与公司入口；内容平台提供经验；群聊和个人联系用于补充；文档、收藏及网盘保存资料。；输出：现状流程和问题—改进对应表。完成标准：每个改进点有具体信息断点，已有渠道中可复用的能力得到保留。
2.1.1.2.2	FS02.2 保留已有有效能力	王晨	10/08 0.25 人时 11.44 元	保留招聘网站查岗位和外部资料链接；平台不重复建设企业招聘系统、网盘和社交通信服务。；输出：现状流程和问题—改进对应表。完成标准：每个改进点有具体信息断点，已有渠道中可复用的能力得到保留。
2.1.1.2.3	FS02.3 还原当前处理步骤	王晨	10/08 0.25 人时 11.44 元	先看岗位要求，再检索经验、人工判断适用性、分别收藏，剩余问题另找人询问。下图展示数据经过哪些载体。；输出：现状流程和问题—改进对应表。完成标准：每个改进点有具体信息断点，已有渠道中可复用的能力得到保留。
2.1.1.2.4	FS02.4 定位信息断点	王晨	10/08 0.25 人时 11.44 元	经历起点难比较；同专业和同岗位信息分散；评论答复难持续复用；公开联系意愿不清楚。；输出：现状流程和问题—改进对应表。完成标准：每个改进点有具体信息断点，已有渠道中可复用的能力得到保留。

WBS	具体任务	任务负责人	日期与投入	产物及完成标准
2.1.1.2.5	FS02.5 把不足变成改进输入	王晨	10/08 0.25 人时 11.44 元	增加经历背景、岗位与专业筛选、稳定文章链接及评论上下文；联系由作者开关控制。后续走查核对实际使用效果。；输出：现状流程和问题—改进对应表。完成标准：每个改进点有具体信息断点，已有渠道中可复用的能力得到保留。

FS03 导出新系统的高层逻辑模型　2.1.2.1

WBS	具体任务	任务负责人	日期与投入	产物及完成标准
2.1.2.1.1	FS03.1 抽去现状工具名称	王晨	10/09 0.25 人时 11.44 元	将“网站、群聊、网盘”等物理载体抽象为信息检索、适用性比较、经验保存和问题补充。；输出：推导图、系统流程图、上下文 DFD、处理/存储表和字典。完成标准：物理载体图与逻辑数据流图用途分明，编号与需求模型一致。
2.1.2.1.2	FS03.2 定义系统边界	王晨	10/09 0.20 人时 9.15 元	外部实体 E1 用户、E2 社区管理员、E3 运维管理员、E4 邮件服务、E5 受控运行环境；系统为 P0。；输出：推导图、系统流程图、上下文 DFD、处理/存储表和字典。完成标准：物理载体图与逻辑数据流图用途分明，编号与需求模型一致。
2.1.2.1.3	FS03.3 明确输入与输出	王晨	10/09 0.20 人时 9.15 元	以 F01—F10 记录用户、治理、运维、邮件和执行请求及结果，逐一给出方向、名称及数据组成。；输出：推导图、系统流程图、上下文 DFD、处理/存储表和字典。完成标准：物理载体图与逻辑数据流图用途分明，编号与需求模型一致。
2.1.2.1.4	FS03.4 分解主要逻辑处理	王晨	10/09 0.20 人时 9.15 元	P1 身份与权限、P2 经验内容、P3 交流与激励、P4 社区治理、P5 独立运维；分别关联 D1—D6 逻辑存储。；输出：推导图、系统流程图、上下文 DFD、处理/存储表和字典。完成标准：物理载体图与逻辑数据流图用途分明，编号与需求模型一致。

WBS	具体任务	任务负责人	日期与投入	产物及完成标准
2.1.2.1.5	FS03.5 建立字典并检查平衡	王晨	10/09 0.20 人时 9.15 元	父层外部输入输出在下层分配，名称与结构可追踪；原子字段、组合结构和语义约束分别定义。；输出：推导图、系统流程图、上下文 DFD、处理/存储表和字典。完成标准：物理载体图与逻辑数据流图用途分明，编号与需求模型一致。
2.1.2.1.6	FS03.6 推导目标物理实现	王晨	10/09 0.20 人时 9.15 元	在逻辑模型稳定后选择微信原生小程序与独立 Vue 网页、共享 Java 服务、MySQL、文件和独立运维执行器。系统流程图与 DFD 分开绘制。；输出：推导图、系统流程图、上下文 DFD、处理/存储表和字典。完成标准：物理载体图与逻辑数据流图用途分明，编号与需求模型一致。

FS04 进一步定义问题　2.1.2.2

WBS	具体任务	任务负责人	日期与投入	产物及完成标准
2.1.2.2.1	FS04.1 重写核心问题	王晨	10/12 0.20 人时 9.15 元	准备投递和面试的学生难以快速找到与目标岗位、专业和基础相近的亲历经验，并继续围绕内容交流。；输出：修订后的问题陈述、范围和追踪链。完成标准：目标能够通过结果判断；未把实现方式写成用户问题。
2.1.2.2.2	FS04.2 拆开问题与解决手段	王晨	10/12 0.20 人时 9.15 元	问题是经验适用性、可检索和可复用性；“小程序”“投币”是候选手段，不能直接代替问题描述。；输出：修订后的问题陈述、范围和追踪链。完成标准：目标能够通过结果判断；未把实现方式写成用户问题。
2.1.2.2.3	FS04.3 收紧本期范围	王晨	10/12 0.20 人时 9.15 元	招聘投递、咨询担保、付费阅读、考研考公、校园跑腿不纳入；毕业材料认证和微信绑定转后续需求。；输出：修订后的问题陈述、范围和追踪链。完成标准：目标能够通过结果判断；未把实现方式写成用户问题。

WBS	具体任务	任务负责人	日期与投入	产物及完成标准
2.1.2.2.4	FS04.4 补充反例和限制	王晨	10/12 0.20 人时 9.15 元	同专业筛选依据作者分享经历对应的专业；公开邮箱不出现；作者关闭联系入口后不再提供联系方式。；输出：修订后的问题陈述、范围和追踪链。完成标准：目标能够通过结果判断；未把实现方式写成用户问题。
2.1.2.2.5	FS04.5 形成反馈和关闭方式	王晨	10/12 0.20 人时 9.15 元	范围、权限或用户目标有冲突时回到 FS01—FS03；变更进入需求参数与决定表，经双方评审后更新基准。；输出：修订后的问题陈述、范围和追踪链。完成标准：目标能够通过结果判断；未把实现方式写成用户问题。

FS05 导出和评价供选择的解法　2.2.1.1

WBS	具体任务	任务负责人	日期与投入	产物及完成标准
2.2.1.1.1	FS05.1 形成六类解法	刘景浩	10/12 0.25 人时 11.44 元	A 微信原生小程序＋独立 Vue 网页；B 原生微信小程序＋独立网页；C 响应式网页；D 跨平台 App＋网页；E 原生双移动端＋网页；F 现有工具组合。；输出：候选方案表、优缺点、量化评分和成本区间。完成标准：至少两个可比较方案；推荐理由能追溯到共同标准。
2.2.1.1.2	FS05.2 使用同一评价基准	刘景浩	10/12 0.20 人时 9.15 元	按需求覆盖 25%、接触便利 20%、团队能力 20%、周期成本 20%、维护扩展 15%比较，不为某一解法单独改变范围。；输出：候选方案表、优缺点、量化评分和成本区间。完成标准：至少两个可比较方案；推荐理由能追溯到共同标准。
2.2.1.1.3	FS05.3 逐项比较小程序与 App	刘景浩	10/12 0.20 人时 9.15 元	比较进入方式、移动创作、审核发布、设备能力、维护量和双端复用；网页补充桌面长文创作。；输出：候选方案表、优缺点、量化评分和成本区间。完成标准：至少两个可比较方案；推荐理由能追溯到共同标准。

WBS	具体任务	任务负责人	日期与投入	产物及完成标准
2.2.1.1.4	FS05.4 评估成员与工具能力	刘景浩	10/12 0.20 人时 9.15 元	两人协作；WorkBuddy 承担前端辅助，Codex/GPT 辅助后端；学生负责需求、复核、测试及交付，AI 生成不等于完成。；输出：候选方案表、优缺点、量化评分和成本区间。完成标准：至少两个可比较方案；推荐理由能追溯到共同标准。
2.2.1.1.5	FS05.5 换算工作量和人工成本	刘景浩	10/12 0.20 人时 9.15 元	A 按 226.55 人时、45.76 元/人时测算 10366.93 元；其他解法采用相同单价按工作量增减比较，详见第 4 章。；输出：候选方案表、优缺点、量化评分和成本区间。完成标准：至少两个可比较方案；推荐理由能追溯到共同标准。
2.2.1.1.6	FS05.6 计算并解释评分	刘景浩	10/12 0.20 人时 9.15 元	A89、B78、C84、D66、E47、F72 分。评分是本项目约束下的方案判断，附录 D 列出权重、原始分和理由。；输出：候选方案表、优缺点、量化评分和成本区间。完成标准：至少两个可比较方案；推荐理由能追溯到共同标准。

FS06 推荐行动方针　2.2.2.1

WBS	具体任务	任务负责人	日期与投入	产物及完成标准
2.2.2.1.1	FS06.1 明确继续与否	刘景浩	10/13 0.25 人时 11.44 元	建议按限定范围继续推进需求和设计，以微信原生小程序＋独立 Vue 网页共享 Java 后端为推荐方案。；输出：推荐结论、条件、备选和变更入口。完成标准：说明为何继续、选什么、在何种情况下调整。
2.2.2.1.2	FS06.2 给出推荐理由	刘景浩	10/13 0.25 人时 11.44 元	移动入口适合随时阅读和基础创作；网页适合 Markdown 长文；共享身份、内容和治理规则，减少重复实现。；输出：推荐结论、条件、备选和变更入口。完成标准：说明为何继续、选什么、在何种情况下调整。

WBS	具体任务	任务负责人	日期与投入	产物及完成标准
2.2.2.1.3	FS06.3 说明备选方针	刘景浩	10/13 0.25 人时 11.44 元	若发布或双端投入显著超出控制额，保留响应式网页作为缩减方案；须经变更确认，不能直接替换交付范围。；输出：推荐结论、条件、备选和变更入口。完成标准：说明为何继续、选什么、在何种情况下调整。
2.2.2.1.4	FS06.4 定义继续条件	刘景浩	10/13 0.25 人时 11.44 元	需求模型与验收可追踪、跨端编辑不破坏正文、权限拒绝有效、投币一致性及受控恢复有可执行验证方案。；输出：推荐结论、条件、备选和变更入口。完成标准：说明为何继续、选什么、在何种情况下调整。
2.2.2.1.5	FS06.5 定义调整触发点	刘景浩	10/13 0.25 人时 11.44 元	真实用户走查出现关键任务失败、邮箱链路不可用、核心资源超负荷、测试发现阻断风险时，组织评审并修订计划。；输出：推荐结论、条件、备选和变更入口。完成标准：说明为何继续、选什么、在何种情况下调整。

FS07 草拟开发计划书　2.3.1.1

WBS	具体任务	任务负责人	日期与投入	产物及完成标准
2.3.1.1.1	FS07.1 分解交付工作	王晨、刘景浩	10/14 0.25 人时 11.44 元	以 8 个工程工作域、52 个工作包管理；工作包继续分到具体任务、负责人、起止日期、前置与完成标准。；输出：正式项目计划、WBS、周安排、甘特、网络、预算和测试安排。完成标准：同一任务在各文件中的责任、日期和人时一致。
2.3.1.1.2	FS07.2 估算人时与人员分配	王晨、刘景浩	10/14 0.25 人时 11.44 元	项目 226.55 人时：王晨 120.35、刘景浩 106.20；开发、文档、管理和交叉复核均计入，不只计算编程。；输出：正式项目计划、WBS、周安排、甘特、网络、预算和测试安排。完成标准：同一任务在各文件中的责任、日期和人时一致。

WBS	具体任务	任务负责人	日期与投入	产物及完成标准
2.3.1.1.3	FS07.3 建立依赖与排期	王晨、刘景浩	10/14 0.25 人时 11.44 元	使用原生 Project 维护依赖、阶段甘特和工程网络；总日历 64 个工作日，2027 年 1 月 6 日收尾。；输出：正式项目计划、WBS、周安排、甘特、网络、预算和测试安排。完成标准：同一任务在各文件中的责任、日期和人时一致。
2.3.1.1.4	FS07.4 核算成本与资源	王晨、刘景浩	10/14 0.25 人时 11.44 元	人工估算按 45.76 元/人时，总 10366.93 元；复用现有设备，不另列 AI 订阅。资源、风险和管理预留按计划管理。；输出：正式项目计划、WBS、周安排、甘特、网络、预算和测试安排。完成标准：同一任务在各文件中的责任、日期和人时一致。
2.3.1.1.5	FS07.5 细排下一需求阶段	王晨、刘景浩	10/14 0.25 人时 11.44 元	3.6 在 10/28—29 完成范围与三模型；3.7 在 10/30 完成字典及辅助图；3.8 在 11/2 走查；3.9 在 11/3 闭环材料。合计 20 人时。；输出：正式项目计划、WBS、周安排、甘特、网络、预算和测试安排。完成标准：同一任务在各文件中的责任、日期和人时一致。
2.3.1.1.6	FS07.6 安排监督与调整	王晨、刘景浩	10/14 0.25 人时 11.44 元	组长周检查进度、风险和变更；双方评审交接、分支合并与测试证据；课堂意见在后续工作包处理。；输出：正式项目计划、WBS、周安排、甘特、网络、预算和测试安排。完成标准：同一任务在各文件中的责任、日期和人时一致。

FS08 写文档提交审查　2.3.2.1

WBS	具体任务	任务负责人	日期与投入	产物及完成标准

WBS	具体任务	任务负责人	日期与投入	产物及完成标准
2.3.2.1.1	FS08.1 组织完整报告	王晨、刘景浩	10/15 0.25 人时 11.44 元	保留 GB/T 8567—2006 可行性研究报告的正文结构，在第 3.5 节逐步展示八步；项目计划列在材料包前。；输出：可阅读、可追踪、可审查的资料包。完成标准：图表可辨认、页码可定位、关键结论有依据，实际审查决定另行留痕。
2.3.2.1.2	FS08.2 标记版本及输入	王晨、刘景浩	10/15 0.25 人时 11.44 元	报告 V1.4、G04-FAR-20261028-02；引用 70 页需求课件、58 页可行性课件、评审表及现行计划和 SRS。；输出：可阅读、可追踪、可审查的资料包。完成标准：图表可辨认、页码可定位、关键结论有依据，实际审查决定另行留痕。
2.3.2.1.3	FS08.3 核对图文一致	王晨、刘景浩	10/15 0.25 人时 11.44 元	检查 P1—P5、D1—D6、F01—F10、需求编号、当前预算及版本；三模型、字典和案例同用一套数据规则。；输出：可阅读、可追踪、可审查的资料包。完成标准：图表可辨认、页码可定位、关键结论有依据，实际审查决定另行留痕。
2.3.2.1.4	FS08.4 编制审查索引	王晨、刘景浩	10/15 0.25 人时 11.44 元	八步成果导航给出正文页码；课件主题给出图号；计划 16 项与需求 11 项评审分别列位置与材料。；输出：可阅读、可追踪、可审查的资料包。完成标准：图表可辨认、页码可定位、关键结论有依据，实际审查决定另行留痕。
2.3.2.1.5	FS08.5 区分记录与待办	王晨、刘景浩	10/15 0.25 人时 11.44 元	历史会议和评分保留原日期；当前代表用户走查、需求周会和签认由实际参与者完成后填写。；输出：可阅读、可追踪、可审查的资料包。完成标准：图表可辨认、页码可定位、关键结论有依据，实际审查决定另行留痕。

WBS	具体任务	任务负责人	日期与投入	产物及完成标准
2.3.2.1.6	FS08.6 接收决定并闭环	王晨、刘景浩	10/15 0.25 人时 11.44 元	评审意见进入问题单，注明负责人、修改文件、关闭证据和确认日期；影响范围、人时或日期时提交变更并同步计划。；输出：可阅读、可追踪、可审查的资料包。完成标准：图表可辨认、页码可定位、关键结论有依据，实际审查决定另行留痕。

I2 需求分析课件主题与工作分解

课件主题	对应 WBS 细项	任务负责人	人时	计划窗口
RA01 综合要求与用户边界	3.1.1.1；3.1.2.2；3.2.1.1；3.2.1.2；3.2.2.1；3.2.2.2；3.6.1.1	王晨；王晨、刘景浩	5.70	10/16—10/28
RA02 获取需求与用例	3.1.1.2；3.1.2.1；3.6.1.2	王晨、刘景浩	3.00	10/16—10/28
RA03 界面原型与用户确认	3.3.1.1；3.3.1.2；3.3.2.1；3.3.2.2；3.8.1.1；3.8.1.2；3.8.2.1；3.8.2.2	刘景浩；王晨、刘景浩	7.20	10/20—11/02
RA04 数据模型 ER	3.6.2.1	王晨、刘景浩	1.00	10/29—10/29
RA05 功能模型 DFD	3.6.2.2；3.6.2.3	王晨、刘景浩	2.00	10/29—10/29
RA06 数据字典与正则	3.7.1.1；3.7.1.3	王晨、刘景浩	1.50	10/30—10/30
RA07 数据规范化	3.7.1.2	王晨、刘景浩	1.00	10/30—10/30
RA08 行为模型 STD	3.7.2.1	王晨、刘景浩	1.00	10/30—10/30
RA09 辅助分析图	3.7.2.2；3.7.2.3；3.7.2.4	王晨、刘景浩	1.50	10/30—10/30
RA10 验证追踪与需求评审	3.2.2.3；3.4.1.1；3.4.1.2；3.4.2.1；3.4.2.2；3.5.1.1；3.5.1.2；3.5.2.1；3.5.2.2；3.6.1.3；3.9.1.1；3.9.1.2；3.9.1.3；3.9.2.1；3.9.2.2；3.9.2.3	刘景浩；王晨；王晨、刘景浩	13.70	10/21—11/04

需求分析 44 项执行任务合计 37.60 人时。ER、DFD、STD 分别作为数据、功能、行为模型；数据字典、正则与语义约束、规范化及辅助图均有独立任务；原型走查、问题修改与确认分别保存实际记录。

3.1.1 共同核对读者作者与管理场景

WBS	具体任务	任务负责人	日期与投入	产物及完成标准

WBS	具体任务	任务负责人	日期与投入	产物及完成标准
3.1.1.1	RA01 确认用户类别与需求代表	王晨、刘景浩	10/16 1.00 人时 45.76 元	确认用户类别与需求代表的文档、图表或记录；游客、未认证、认证、社区和运维角色分开；普通账号不能访问管理数据
3.1.1.2	RA02 整理需求来源与情景	王晨、刘景浩	10/16 1.00 人时 45.76 元	整理需求来源与情景的文档、图表或记录；游客、未认证、认证、社区和运维角色分开；普通账号不能访问管理数据

3.1.2 确认权限矩阵与核心用例

WBS	具体任务	任务负责人	日期与投入	产物及完成标准
3.1.2.1	RA02 描述用例主流程与异常	王晨、刘景浩	10/19 1.00 人时 45.76 元	描述用例主流程与异常的文档、图表或记录；游客、未认证、认证、社区和运维角色分开；普通账号不能访问管理数据
3.1.2.2	RA01 核对角色权限和边界	王晨、刘景浩	10/19 1.00 人时 45.76 元	核对角色权限和边界的文档、图表或记录；游客、未认证、认证、社区和运维角色分开；普通账号不能访问管理数据

3.2.1 细化文章交流、激励与治理规则

WBS	具体任务	任务负责人	日期与投入	产物及完成标准
3.2.1.1	RA01 拆分功能需求与本期范围	王晨	10/20 0.80 人时 36.61 元	拆分功能需求与本期范围的文档、图表或记录；REQ 编号关联用例；认证资料、隐私、状态、冲突、币账本与恢复边界可验收
3.2.1.2	RA01 明确互动激励与治理规则	王晨	10/20 0.80 人时 36.61 元	明确互动激励与治理规则的文档、图表或记录；REQ 编号关联用例；认证资料、隐私、状态、冲突、币账本与恢复边界可验收

3.2.2 定义数据、异常与非功能验收

WBS	具体任务	任务负责人	日期与投入	产物及完成标准

WBS	具体任务	任务负责人	日期与投入	产物及完成标准
3.2.2.1	RA01 定义数据和接口约束	王晨	10/21 0.50 人时 22.88 元	定义数据和接口约束的文档、图表或记录；REQ 编号关联用例；认证资料、隐私、状态、冲突、币账本与恢复边界可验收
3.2.2.2	RA01 量化性能可靠性与安全指标	王晨	10/21 0.60 人时 27.46 元	量化性能可靠性与安全指标的文档、图表或记录；REQ 编号关联用例；认证资料、隐私、状态、冲突、币账本与恢复边界可验收
3.2.2.3	RA10 定义异常和验收场景	王晨	10/21 0.50 人时 22.88 元	定义异常和验收场景的文档、图表或记录；REQ 编号关联用例；认证资料、隐私、状态、冲突、币账本与恢复边界可验收

3.3.1 绘制双端阅读创作原型

WBS	具体任务	任务负责人	日期与投入	产物及完成标准
3.3.1.1	RA03 整理小程序阅读与作者界面	刘景浩	10/20 0.80 人时 36.61 元	整理小程序阅读与作者界面的文档、图表或记录；原型覆盖空结果、加载失败、认证提示、草稿保存和运维任务失败
3.3.1.2	RA03 整理网页创作与阅读线框	刘景浩	10/20 0.80 人时 36.61 元	整理网页创作与阅读线框的文档、图表或记录；原型覆盖空结果、加载失败、认证提示、草稿保存和运维任务失败

3.3.2 核对社区和运维管理流程

WBS	具体任务	任务负责人	日期与投入	产物及完成标准
3.3.2.1	RA03 核对社区案件与关联定位	刘景浩	10/21 0.80 人时 36.61 元	核对社区案件与关联定位的文档、图表或记录；原型覆盖空结果、加载失败、认证提示、草稿保存和运维任务失败
3.3.2.2	RA03 核对独立运维与执行确认	刘景浩	10/21 0.80 人时 36.61 元	核对独立运维与执行确认的文档、图表或记录；原型覆盖空结果、加载失败、认证提示、草稿保存和运维任务失败

3.4.1 共同汇总 SRS 与需求追踪

WBS	具体任务	任务负责人	日期与投入	产物及完成标准
3.4.1.1	RA10 汇总功能非功能与 SRS	王晨、刘景浩	10/22 1.00 人时 45.76 元	汇总功能非功能与 SRS 的文档、图表或记录；补齐 FS01—FS07 可行性输入及 SRS 追踪；两图符号、数据字典结构式与正则、方案及能力理由和成本效益可解释；各问题有需求或验证归属。
3.4.1.2	RA10 关联追踪编号与输入版本	王晨、刘景浩	10/22 1.00 人时 45.76 元	关联追踪编号与输入版本的文档、图表或记录；补齐 FS01—FS07 可行性输入及 SRS 追踪；两图符号、数据字典结构式与正则、方案及能力理由和成本效益可解释；各问题有需求或验证归属。

3.4.2 内部复核并准备需求汇报

WBS	具体任务	任务负责人	日期与投入	产物及完成标准
3.4.2.1	RA10 组织内部需求评审	王晨、刘景浩	10/23 1.00 人时 45.76 元	组织内部需求评审的文档、图表或记录；FS08 文档审查 0.50 人时纳入本任务，其余 1.50 人时用于需求 PPT 和提交；按 11 项登记实际证据和未关闭项，双方确认。
3.4.2.2	RA10 核对汇报与提交清单	王晨、刘景浩	10/23 1.00 人时 45.76 元	核对汇报与提交清单的文档、图表或记录；FS08 文档审查 0.50 人时纳入本任务，其余 1.50 人时用于需求 PPT 和提交；按 11 项登记实际证据和未关闭项，双方确认。

3.5.1 记录需求复审意见

WBS	具体任务	任务负责人	日期与投入	产物及完成标准
3.5.1.1	RA10 登记课堂评审问题	刘景浩	11/04 0.80 人时 36.61 元	登记课堂评审问题的文档、图表或记录；11 月 4 日新意见在课后完成登记与修订；变更有责任人和复核结论
3.5.1.2	RA10 分析范围接口和排期影响	刘景浩	11/04 0.80 人时 36.61 元	分析范围接口和排期影响的文档、图表或记录；11 月 4 日新意见在课后完成登记与修订；变更有责任人和复核结论

3.5.2 修订需求并同步设计影响

WBS	具体任务	任务负责人	日期与投入	产物及完成标准
3.5.2.1	RA10 修订需求与未关闭问题	刘景浩	11/04 0.80 人时 36.61 元	修订需求与未关闭问题的文档、图表或记录；11 月 4 日新意见在课后完成登记与修订；变更有责任人和复核结论
3.5.2.2	RA10 向设计交接确认结果	刘景浩	11/04 0.80 人时 36.61 元	向设计交接确认结果的文档、图表或记录；11 月 4 日新意见在课后完成登记与修订；变更有责任人和复核结论

3.6.1 核对课件评审表、用户及范围

WBS	具体任务	任务负责人	日期与投入	产物及完成标准
3.6.1.1	RA01 核对综合要求与未来范围	王晨、刘景浩	10/28 1.00 人时 45.76 元	核对综合要求与未来范围的文档、图表或记录；ER 有实体属性和基数；DFD 上下文、一级与关键二级对应，范围与权限一致
3.6.1.2	RA02 核对代表来源及获取方法	王晨、刘景浩	10/28 1.00 人时 45.76 元	核对代表来源及获取方法的文档、图表或记录；ER 有实体属性和基数；DFD 上下文、一级与关键二级对应，范围与权限一致
3.6.1.3	RA10 建立课件与评审覆盖索引	王晨、刘景浩	10/28 1.00 人时 45.76 元	建立课件与评审覆盖索引的文档、图表或记录；ER 有实体属性和基数；DFD 上下文、一级与关键二级对应，范围与权限一致

3.6.2 建立 ER 与分层 DFD 并交叉核对

WBS	具体任务	任务负责人	日期与投入	产物及完成标准
3.6.2.1	RA04 建立 ER 实体属性与基数	王晨、刘景浩	10/29 1.00 人时 45.76 元	建立 ER 实体属性与基数的文档、图表或记录；ER 有实体属性和基数；DFD 上下文、一级与关键二级对应，范围与权限一致
3.6.2.2	RA05 建立上下文一级和关键二级 DFD	王晨、刘景浩	10/29 1.25 人时 57.20 元	建立上下文一级和关键二级 DFD 的文档、图表或记录；ER 有实体属性和基数；DFD 上下文、一级与关键二级对应，范围与权限一致

WBS	具体任务	任务负责人	日期与投入	产物及完成标准
3.6.2.3	RA05 核对父子流平衡与边界	王晨、刘景浩	10/29 0.75 人时 34.32 元	核对父子流平衡与边界的文档、图表或记录；ER 有实体属性和基数；DFD 上下文、一级与关键二级对应，范围与权限一致

3.7.1 细化数据字典正则及规范化

WBS	具体任务	任务负责人	日期与投入	产物及完成标准
3.7.1.1	RA06 定义字典结构正则与语义	王晨、刘景浩	10/30 1.00 人时 45.76 元	定义字典结构正则与语义的文档、图表或记录；字段约束完整；1NF 至 3NF 有实例；状态、层次、Warnier 和 IPO 可解释
3.7.1.2	RA07 分析函数依赖及 1NF 至 3NF	王晨、刘景浩	10/30 1.00 人时 45.76 元	分析函数依赖及 1NF 至 3NF 的文档、图表或记录；字段约束完整；1NF 至 3NF 有实例；状态、层次、Warnier 和 IPO 可解释
3.7.1.3	RA06 核对处理逻辑与反例约束	王晨、刘景浩	10/30 0.50 人时 22.88 元	核对处理逻辑与反例约束的文档、图表或记录；字段约束完整；1NF 至 3NF 有实例；状态、层次、Warnier 和 IPO 可解释

3.7.2 核对状态转换及辅助图形

WBS	具体任务	任务负责人	日期与投入	产物及完成标准
3.7.2.1	RA08 绘制 STD 与状态转换表	王晨、刘景浩	10/30 1.00 人时 45.76 元	绘制 STD 与状态转换表的文档、图表或记录；字段约束完整；1NF 至 3NF 有实例；状态、层次、Warnier 和 IPO 可解释
3.7.2.2	RA09 绘制层次方框图	王晨、刘景浩	10/30 0.50 人时 22.88 元	绘制层次方框图的文档、图表或记录；字段约束完整；1NF 至 3NF 有实例；状态、层次、Warnier 和 IPO 可解释
3.7.2.3	RA09 绘制 Warnier 图	王晨、刘景浩	10/30 0.50 人时 22.88 元	绘制 Warnier 图的文档、图表或记录；字段约束完整；1NF 至 3NF 有实例；状态、层次、Warnier 和 IPO 可解释

WBS	具体任务	任务负责人	日期与投入	产物及完成标准
3.7.2.4	RA09 编制 IPO 与改进 IPO	王晨、刘景浩	10/30 0.50 人时 22.88 元	编制 IPO 与改进 IPO 的文档、图表或记录；字段约束完整；1NF 至 3NF 有实例；状态、层次、Warnier 和 IPO 可解释

3.8.1 准备导航线框与用户代表任务

WBS	具体任务	任务负责人	日期与投入	产物及完成标准
3.8.1.1	RA03 整理青绿四页与 W01 至 W14 线框	王晨、刘景浩	11/02 1.00 人时 45.76 元	整理青绿四页与 W01 至 W14 线框的文档、图表或记录；覆盖正常与异常；真实参与和反馈分别登记，未确认不得代签
3.8.1.2	RA03 准备代表和任务走查表	王晨、刘景浩	11/02 1.00 人时 45.76 元	准备代表和任务走查表的文档、图表或记录；覆盖正常与异常；真实参与和反馈分别登记，未确认不得代签

3.8.2 执行代表走查并登记修改与确认

WBS	具体任务	任务负责人	日期与投入	产物及完成标准
3.8.2.1	RA03 执行任务并记录原话和问题	王晨、刘景浩	11/02 1.00 人时 45.76 元	执行任务并记录原话和问题的文档、图表或记录；覆盖正常与异常；真实参与和反馈分别登记，未确认不得代签
3.8.2.2	RA03 修改原型并取得复核确认	王晨、刘景浩	11/02 1.00 人时 45.76 元	修改原型并取得复核确认的文档、图表或记录；覆盖正常与异常；真实参与和反馈分别登记，未确认不得代签

3.9.1 同步 SRS 与四维验证及追踪

WBS	具体任务	任务负责人	日期与投入	产物及完成标准
3.9.1.1	RA10 执行一致完整现实有效检查	王晨、刘景浩	11/03 1.00 人时 45.76 元	执行一致完整现实有效检查的文档、图表或记录；一致完整现实有效四项检查；未关闭问题有责任期限；提交材料同版本

WBS	具体任务	任务负责人	日期与投入	产物及完成标准
3.9.1.2	RA10 核对 FR 规则模型与验收追踪	王晨、刘景浩	11/03 1.00 人时 45.76 元	核对 FR 规则模型与验收追踪的文档、图表或记录；一致完整现实有效四项检查；未关闭问题有责任期限；提交材料同版本
3.9.1.3	RA10 形成 SRS 候选版本与问题表	王晨、刘景浩	11/03 0.50 人时 22.88 元	形成 SRS 候选版本与问题表的文档、图表或记录；一致完整现实有效四项检查；未关闭问题有责任期限；提交材料同版本

3.9.2 同步计划排期并核对评审提交包


WBS	具体任务	任务负责人	日期与投入	产物及完成标准
3.9.2.1	RA10 同步计划 WBS 与排期证据	王晨、刘景浩	11/03 1.00 人时 45.76 元	同步计划 WBS 与排期证据的文档、图表或记录；一致完整现实有效四项检查；未关闭问题有责任期限；提交材料同版本
3.9.2.2	RA10 按两张评审表核对交付包	王晨、刘景浩	11/03 1.00 人时 45.76 元	按两张评审表核对交付包的文档、图表或记录；一致完整现实有效四项检查；未关闭问题有责任期限；提交材料同版本
3.9.2.3	RA10 准备讲稿与排练交接	王晨、刘景浩	11/03 0.50 人时 22.88 元	准备讲稿与排练交接的文档、图表或记录；一致完整现实有效四项检查；未关闭问题有责任期限；提交材料同版本

I3 排期图及过程交接

可行性八步骤和需求分析甘特图采用同一份 Project 任务数据，图表只展示过程汇总；全部末级任务、前置及人员分配见原生 MPP、MSPDI XML 及任务明细。



可行性八步骤计划

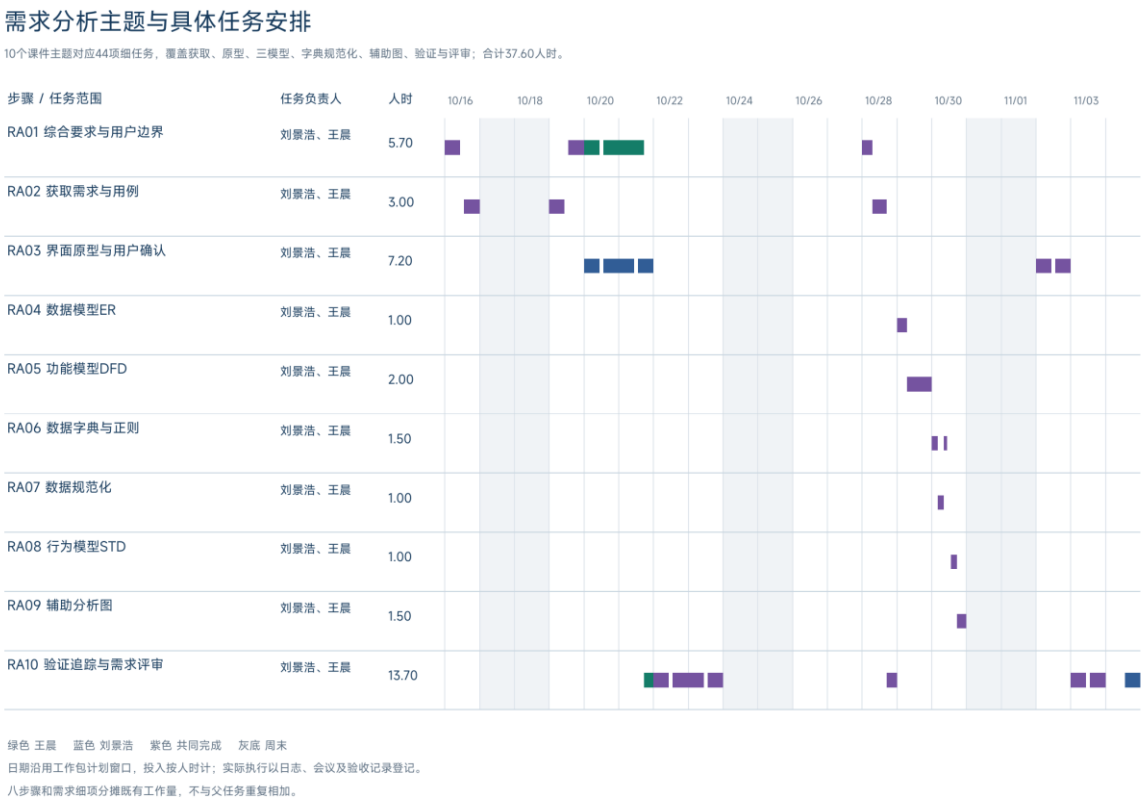

需求分析主题计划

阶段会议中检查已完成证据、遗留问题、下一周任务与责任调整。当前最近的已确认会议为 2026 年 10 月 31 日腾讯会议 434440602；本次两名成员组内评分为 91.2、91.3，不将计划细化转记为新会议或新的实际完成。

会议与用户研究状态（2026 年 11 月 4 日核对）：10 月 31 日双方共同评审文档，阶段综合评分王晨 91.2、刘景浩 91.3。独立任务完成证据未留存；真实用户访谈和原型任务走查尚未开展，原定任务日期不作为实际完成证明。后续按当前 WBS 执行并保存问题、修改和确认记录。

附录 J 用户代表与原型走查

第 4 章登记四类用户代表，本附录安排需求访谈、原型走查和修改复测。角色按产品使用场景分配，参与时间和角色背景在邀约时核对。

代表代号与角色	走查任务	项目组分工
UR-R01 已认证读者	UW01	刘景浩主持，王晨记录
UR-A01 已认证作者	UW02	王晨主持，刘景浩记录
UR-M01 社区管理员	UW03	刘景浩主持，王晨记录
UR-O01 运维人员	UW04	刘景浩主持，王晨记录

下表是项目组基于 SRS 和原型交接记录提出的待验证改进。每项先观察任务表现，再记录代表实际观点和是否采纳。

任务与需求	项目组改进建议	走查与验收观察
UW01 FR-R02、FR-R03	筛选后容易忘记已选范围，零结果时需要明确的下一步。建议在结果上方常驻已应用条件，允许单项移除并保留岗位。	按岗位和同专业找一篇经验。出现零结果时，只移除专业条件，检查岗位是否保留。
UW02 FR-C03、FR-C04、FR-C05	断网或上传失败时容易混淆本机暂存与服务端保存。建议清楚标明保存状态，图片失败后只重试该图并保留正文。	编写图文草稿，在上传失败后退出再进入。核对文字是否恢复、失败图片能否单独重试。
UW03 FR-M02、FR-M03	举报处置需要同时理解目标内容和上下文。建议从工单直达被举报评论与原文，目标已下架时显示状态并保留处置记录。	从举报列表定位一条评论，核对原文、目标状态及历史处置，再登记理由。
UW04 FR-O02、FR-O06	恢复误操作会影响演示数据。建议确认页列出备份时间、目标环境和影响，失败时给出失败阶段和可执行的下一步。	用演示环境核对目标后取消一次，再检查模拟失败能否定位阶段与日志。

工作安排沿用 WBS 3.8.1.2、3.8.2.1、3.8.2.2。王晨汇总走查问题与变更结论，刘景浩跟踪原型修订，两人交叉复核。执行时登记日期、终端、原型版本、原话、修改和复测确认。当前状态为已登记，待邀约与走查。

城院帮可行性分析报告

编制依据 GB/T 8567—2006 第 7.1 节 可行性分析研究报告 FAR

软件工程课程项目 G04

组长兼项目负责人 王晨 32401211

成员 刘景浩 32401205

研究基准 2026 年 10 月 6 日 文档版本 V1.6 修订日期 2026 年 11 月 4 日

实习与求职经验分享社区

免费阅读 非现金激励 自愿站外联系

研究结论

本项目具备课程开发与本地课堂演示的实施可行性。采用方案 B，即微信原生小程序与独立 Vue 3 网页客户端、Java/Spring Boot 单体后端、MySQL 数据库及独立运维执行器。报告给出方案比较、技术依据、资源预算、实施进度、运营维护安排和评审对照。

本期交付范围为校园实习与求职经验社区及配套管理、运维功能。人员投入、技术验证和系统验收按项目计划执行；持续公网运营另行立项评估。

文档控制

前端技术变更 CR-G04-20261101-FE：微信原生小程序（WXML/WXSS/JavaScript）与独立网页（Vue 3/TypeScript/Vite）分别开发，共用 Java/Spring Boot 接口与 MySQL。原 Project 基准及技术切换增量区间分别列示，详见前端技术选型与变更说明。

字段	记录
文档标识	G04-FAR-20261101-01
标题	城院帮可行性分析报告
小组与项目负责人	G04；王晨 32401211，组长兼项目负责人；刘景浩 32401205
修订日期与文档状态	2026 年 11 月 1 日；需求阶段交付候选
输入与排期基准	本报告 G04-FAR-20261101-01；排期原基准 G04-BL-20261028-01；技术变更 CR-G04-20261101-FE
修订说明	统一实施结论与方案选择，完善技术验证、人员投入和运营安排，规范预算表述及正文用语。
当前版本与交付标识	V1.5；2026 年 11 月 1 日

本报告按 GB/T 8567—2006 第 7.1 节 11 章组织研究内容，以课程要求、既定范围及当前任务数据为约束，提供方案选择、资源检查和验证条件。[Q1]

项目计划工作量为 226.55 人时，人工预算 10366.93 元。两名成员日常各投入 30—45 分钟，集中开发与测试按周计划追加投入。王晨负责每周资源负荷检查和任务协调，刘景浩同步任务进展并参加复核。Project 资源表包含 295 条人员分配。

正文按 GB/T 8567—2006 第 7.1 节组织 11 章。经济、技术、法律和用户使用分析见第 6—9 章，实施结论见第 10 章；教师评审对应见附录 A，课程方法对应见附录 I。

目录

文档控制 2
八步骤成果导航 4
1 引言 5
2 引用文件 6
3 可行性分析的前提 8
4 可选的方案 23
5 所建议的系统 26
6 经济可行性 30
7 技术可行性 34
8 法律可行性 39
9 用户使用可行性 39
10 其他与项目有关的问题 41
11 注解 44
附录 A 教师计划阶段评审要求与证据位置 45
附录 B 实施条件检查表 46
附录 C 技术验证与验收安排 47
附录 D 定量方案评估 48
附录 E 人工成本测算 52
附录 F 可行性八步骤结果与工作分解 54
附录 G 需求阶段 11 项评审交接 65
附录 H 高层数据字典与形式化规则 66
附录 I 课程方法与成果对照 70
附录 J 工作量三点估计与交叉检查 71

八步骤成果导航

每一步均给出具体分解、项目结果和完成标准；点击或按页码可直接查阅。第 5.2 节集中展示课件要求的系统流程图和数据流图。

主题	正文展示	页码
FS01 复查系统规模和目标	第 3.5 节；5 项分解；3.6.1	12
FS02 研究目前正在使用的系统	第 3.5 节；5 项分解；3.6.1	13
FS03 导出新系统的高层逻辑模型	第 3.5 节；6 项分解；3.6.2、3.7.1	15
FS04 进一步定义问题	第 3.5 节；5 项分解；3.6.1、3.9.1	17
FS05 导出和评价供选择的解法	第 3.5 节；6 项分解；3.6.1、3.9.1	18
FS06 推荐行动方针	第 3.5 节；5 项分解；3.8、3.9	20
FS07 草拟开发计划书	第 3.5 节；6 项分解；3.6—3.9	21
FS08 写文档提交审查	第 3.5 节；6 项分解；3.9.1、3.9.2	23

阅读顺序：FS01—FS04 明确问题和模型，FS05—FS06 比较并选择，FS07—FS08 安排并审查。完整正文仍按 GB/T 8567—2006 可行性研究报告结构组织。

1 引言

1.1 标识

系统名称为城院帮，项目标识 HZCU-CampusHub，文档标识 G04-FAR-2026。本报告用于课程项目可行性分析与实施方案选择。文档版本 V1.6，修订标识 G04-FAR-20261101-01，修订日期 2026 年 11 月 4 日；项目计划排期基准 G04-BL-20261028-01。

1.2 背景

准备实习与求职时，学生需要搜集资料和面试经验，判断分享是否适合自己的专业、基础和目标岗位，并整理可执行的准备路径。前期需求讨论提出资料分散、筛选耗时、相似起点经历难找，以及缺少进一步交流渠道等问题。公司与岗位的面试流程、准备重点也需要便于查找和比较。[6]

研究依据为前期需求讨论、校内求职场景分析及公开软件资料比较。分析聚焦资料检索、经历背景匹配、面试经验复用和作者交流四类需求；用户操作反馈纳入需求评审及试用任务。

1.3 项目概述

项目目标是让岗位相关经验能够持续找到、理解和交流，并使作者能够较方便地记录亲历。阅读入口以岗位为主，公司作为可选筛选，同时支持“与我相同专业”的筛选。文章免费阅读，点赞表示认可，投币表示特别有帮助，收藏用于之后查阅；作者自愿留联系方式，站外服务由双方自行协商。

课程目标是交付经验阅读、图文创作、评论互动、非现金激励、社区治理和独立运维能力，并形成需求、设计、测试和维护资料。使用效果通过经验检索、创作发布、交流和复访等试用记录评价。

开发方为 G04 两名成员，面向本校求职读者、经验作者和管理维护人员。小组承担课堂项目投入，正式交付环境为本机课堂演示；持续公网运营作为后续条件另行评估。

1.4 文档概述

报告按 GB/T 8567—2006 第 7.1 节组织 11 章正文，依次说明前提、备选方案、推荐系统及经济、技术、法律、使用可行性，形成方案选择和实施安排。

本报告修订标识为 G04-FAR-20261101-01，修订日期 2026 年 11 月 4 日。项目计划采用 G04-BL-20261028-01 排期基准，输入文件及用途如下表。

输入	文件、版本与日期	用途
IN01	SRS V1.2；G04-SRS-20261028-02；2026-10-28	52 项功能标识、12 项非功能、当前范围与规则
IN02—04	项目计划 V1.4；当前 WBS、周计划、资源明细；2026-10-28	226.55 人时、负责人、依赖和成本
IN05—06	原生 MPP；G04-BL-20261028-01；计划 16 项评审表	排期原件和计划阶段检查
IN07—08	现行系统测试计划；10 月 17 日腾讯会议纪要	验证方案；历史会议每人 1.054 人时及 91.0/90.5 分
IN10	第 2 章可行性研究，课程提供版 58 页	八步骤、物理系统流程、DFD、字典与成本效益
IN11—12	第 3 章需求分析，70 页；需求阶段评审表 2 页 11 项	三模型、规范化、辅助图、验证和当前交接

项目计划 G04-SDP-2026 采用 V1.7，排期基准 G04-BL-20261028-01；可行性报告 G04-FAR-2026 修订为 V1.6，标识 G04-FAR-20261101-01。两文档分别登记版本，文件摘要见交付清单。

2 引用文件

[1] 软件工程课程课件 第 1 章 软件工程学概述，课程提供，78 页。PDF 第 29 至 32 页对应生命周期，第 37 至 41 页对应阶段文档、评审和反馈。

[2] 软件工程课程课件 第 13 章 软件项目管理，课程提供，97 页。13.1 估算软件规模，PDF 第 5 至 8 页；13.2 工作量估算，第 9 至 20 页；13.3 进度计划，第 21 至 44 页；13.4 人员组织，第 45 至 57 页；13.5 质量保证，第 58 至 72 页；13.6 软件配置管理，第 73 至 85 页。页码均为 PDF 页序，和幻灯片印刷页码相差 1。

[3] 软件工程课程项目评审表 计划阶段评审，课程提供，2 页，16 项检查。附录 A 保留逐项要求及证据位置。

[4] 张海藩，牟永敏．软件工程导论 第 6 版．清华大学出版社，2013，ISBN 9787302330981。出版社公开目录核对第 2 章 2.1 至 2.6 及第 13 章，https://www.tup.com.cn/booksCenter/book_05016406.html，查阅 2026 年 10 月 6 日。用于生命周期、可行性研究和项目管理方法对应。

[5] Kathy Schwalbe．IT 项目管理 原书第 8 版．北京：机械工业出版社，2017。版次采用本组指定教材，出版年与上海交通大学在线课程教材目录核对：https://cnmooc.sjtu.cn/portal/course/5762/15509.mooc，查阅 2026 年 10 月 21 日。

[6] G04 初步需求与计划输入资料，IN01—IN08；文档与登记日期见 1.4 输入表，SHA256 见《版本与输入基线 G04.json》。项目计划引用 G04-SDP-2026 V1.4，2026 年 10 月 28 日。

[9] Spring．Spring Boot Testing．https://docs.spring.io/spring-boot/reference/testing/，查阅 2026 年 10 月 6 日。用于 Java 模块验证工具选择。

[10] Apache JMeter．Generating Dashboard Report．https://jmeter.apache.org/usermanual/generating-dashboard.html，查阅 2026 年 10 月 6 日。用于负载结果、统计与证据保存方法。

[11] GB/T 8567—2006 计算机软件文档编制规范，第 7.1 节可行性分析研究报告，印刷页 14—16；原规范和摘页随附保存。[Q1]

课程资料采用课程提供版本，以章节名称、页数和 2026 年 10 月 21 日登记日期识别；课件条目保留课程来源，不列教师作者姓名。已保存输入文件的路径和 SHA256 见《版本与输入基线 G04.json》，在线资料按版本或查阅日期登记。

[12] 软件工程课程课件 第 2 章 可行性研究，课程提供版，58 页，2026 年 10 月 21 日接收。PDF 第 8—14 页为八步骤，第 16—23 页为系统流程图，第 25—39 页为数据流图，第 41—49 页为数据字典，第 51—56 页为成本效益分析。

[13] 软件工程课程项目评审表 需求阶段评审，课程提供版，2 页、11 项，2026 年 10 月 21 日接收。原表随附保存。

[14] 牛客网．面试经验，https://www.nowcoder.com/interview/center，查阅 2026 年 10 月 21 日。页面可见职位和企业检索入口，以及面经、动态和文章发布入口。

[15] 国家大学生就业服务平台．首页，https://fs.ncss.cn/，查阅 2026 年 10 月 21 日。页面可见职位信息、就业指导、实习岗位等栏目。

[16] DCloud．条件编译处理多端差异，https://uniapp.dcloud.net.cn/tutorial/platform.html，查阅 2026 年 10 月 21 日。用于说明共用工程仍需处理平台差异。

[17] DCloud．App 云打包，https://uniapp.dcloud.net.cn/dev/app/cloud-build.html，查阅 2026 年 10 月 21 日。用于比较 App 打包、签名和证书等发布工作。

[18] Kanabar, V.与 Warburton, R. D. H. Leveraging the new practice standard for project estimating. PMI Global Congress, 2011. https://www.pmi.org/learning/library/leveraging-new-practice-standard-project-estimating-6222 。查阅 2026 年 10 月 24 日；采用三点估计公式，项目参数另见附录 J。

3 可行性分析的前提

3.1 项目的要求

角色或范围	必须覆盖的能力	约束与完成边界
未登录或未认证读者	阅读文章、检索岗位并使用公开内容筛选	不查看作者公开主页、评论详情或他人信息；后端同样限制
已认证读者	评论、点赞、投币、收藏，查看作者主页	真实邮箱不公开；投币为非现金互动，不兑换收入
认证作者	网页 Markdown 与小程序图文创作、草稿、发布和回复	必要信息少，写作提示可跳过；网盘资料用链接说明来源
社区管理员	处理反馈举报、定位文章或评论、巡查和处置	先发布后管理，保留理由和处理记录，不与普通账号混用
运维人员	在独立网页执行部署、重启、备份恢复，查看状态日志	固定目标和动作；业务服务停止后仍可查看任务记录

本期范围为免费经验文章、评论交流、非现金激励、自愿站外联系及配套社区与运维管理。现金交易、付费文章、站内咨询订单、即时通讯、校园跑腿、考研考公专区和课程学习专区列入范围外事项。作者自行设置联系方式，认证用户按权限查看；荣誉和非现金币规则由需求规格说明书统一管理。

校园对象与使用场景

用户类别	所处场景	使用目标	范围
校内求职读者	已选定岗位、准备实习投递与面试，主要为大三大四，也允许其他有实际需要的在校生。	找到与自己专业和准备起点接近的经历，理解面试流程并留存资料。	结构面向全校；首批内容与演示集中计算机相关专业。
校内经验作者	已认证、愿分享亲历的学生；重点邀请有实习或工作经历者，不把职级或毕业作为写作门槛。	便捷记录、获得有用交流及非现金荣誉；自愿展示联系方式。	免费阅读；校园身份认证与内容举报处理分别管理。
社区管理员	承担反馈、举报、巡查与处置的授权账号。	及时定位文章或评论，记录理由，处理广告和欺骗性内容。	管理角色与普通学生权限分离。
运维人员	负责课堂环境部署、日志、备份和恢复的授权账号。	通过独立网页执行固定运维作业，失败时仍能查到状态和记录。	本机演示；真实校园持续运营另需落实人员与资源。

平台面向浙大城市学院，专业配置覆盖全校，首批内容和演示案例集中计算机相关专业。未登录或未认证用户阅读公开文章，认证用户查看作者主页、评论及公开联系方式。王晨负责需求联络，刘景浩组织作者和读者的原型反馈，双方汇总需求确认记录。[6][13]

3.2 项目的目标

项目目标是让岗位相关经验能够持续找到、理解和交流，并使作者能够较方便地记录亲历。阅读入口以岗位为主，公司作为可选筛选，同时支持“与我相同专业”的筛选。文章免费阅读，点赞表示认可，投币表示特别有帮助，收藏用于之后查阅；作者自愿留联系方式，站外服务由双方自行协商。

课程目标是交付经验阅读、图文创作、评论互动、非现金激励、社区治理和独立运维能力，并形成需求、设计、测试和维护资料。使用效果通过经验检索、创作发布、交流和复访等试用记录评价。

3.3 项目的环境条件假定和限制

项目条件	本报告采用的边界
小组与责任	G04；王晨 32401211，组长兼项目负责人；刘景浩 32401205，成员；开发、文档和评审两人协作

项目条件	本报告采用的边界
研究日期	2026 年 10 月 6 日；作为项目计划阶段配套可行性研究材料
目标用户	已知道目标岗位、正在准备实习投递与面试的本校学生；认证用户可分享亲历
交付终端	微信小程序、读者作者网页、社区管理网页、独立运维网页
正式环境	个人电脑本地演示；腾讯云 2 核 2GB 轻量服务器仅为可选验证资源
排期边界	项目计划排期从 2026 年 10 月 8 日至 2027 年 1 月 6 日，不重新安排已完成的选题等阶段
资金边界	本期新增现金支出预算 0 元，复用现有设备与可用工具
研究输出	可行性判断、方案选择、风险与验证清单、评审对照；完整需求和详细设计在后续阶段形成

3.4 进行可行性分析的方法

本研究采用八个步骤：复查系统规模和目标、研究现有系统、导出新系统高层逻辑模型、进一步定义问题、提出并评价解法、推荐行动方针、草拟开发计划、编写并提交研究报告。前四步通过需求反馈循环校正目标、范围与模型。[12，PDF 第 8—14 页]

技术、经济和操作是每种解法都要检查的基本维度，另按课程计划检查进度与人员能力。研究先明确校园用户和业务问题，再比较终端及实现方式。国标 11 章结构保持不变，八步骤的结果位置与 WBS 见附录 F；课件主题覆盖见附录 I。

3.5 可行性研究八步骤的具体分解

以下逐步展示输入、分析动作、已形成的方案结果和完成标准。步骤 1—4 允许反馈修正，步骤 5 比较多个解法，步骤 6 形成推荐，步骤 7 衔接人时排期，步骤 8 提交评审。

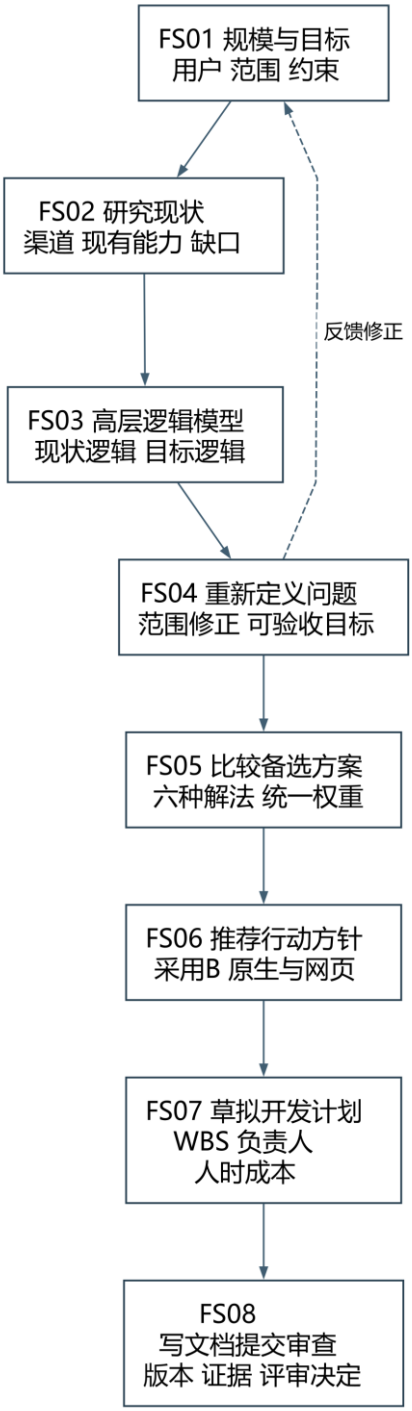


图 3-1 八步骤与反馈链

FS01 复查系统规模和目标

输入：用户讨论、现行 SRS、项目计划及课程评审要求

分解编号	具体步骤	本项目的分析和结果
01.1	明确使用者	主要读者是已明确目标岗位、准备投递和面试的校内学生；分享者是认证用户，重点邀请有实习或工作经历者。
01.2	限定业务边界	本期提供经验文章、评论、非现金认可、自愿站外联系、社区治理和独立运维；不建立咨询订单、现金交易和站内即时通信。
01.3	划分访问权限	未登录和未认证者阅读公开文章；作者主页、评论、联系方式与互动要求校园认证；社区管理与运维权限分别授予。
01.4	把目标写成检查项	按岗位检索，并组合公司、经历专业筛选；同一账号跨端使用；重复投币请求不重复记账；管理人员能定位举报对象。
01.5	核对规模和约束	按 52 项功能标识管理，其中 50 项本期、2 项未来；12 项非功能要求。两名成员，课堂本机演示，226.55 人时控制额。

范围卡：免费阅读＋非现金激励＋自愿站外联系。校园邮箱仅说明校内关联，不作为任职经历的证明。

输出：用户—权限表、范围清单、目标与约束。完成标准：每项目标能找到需求和验收场景，范围外功能明确列出。

交接：3.6.1；SRS 第 2—4 章

依据：课件第 2 章第 8—9 页

FS02 研究目前正在使用的系统

输入：现有求职信息渠道、个人资料保存及交流方式

分解编号	具体步骤	本项目的分析和结果
02.1	列出当前渠道	招聘网站提供职位与公司入口；内容平台提供经验；群聊和个人联系用于补充；文档、收藏及网盘保存资料。
02.2	保留已有有效能力	保留招聘网站查岗位和外部资料链接；平台不重复建设企业招聘系统、网盘和社交通信服务。
02.3	还原当前处理步骤	先看岗位要求，再检索经验、人工判断适用性、分别收藏，剩余问题另找人询问。下图展示数据经过哪些载体。
02.4	定位信息断点	经历起点难比较；同专业和同岗位信息分散；评论答复难持续复用；公开联系意愿不清楚。
02.5	把不足变成改进输入	增加经历背景、岗位与专业筛选、稳定文章链接及评论上下文；联系由作者开关控制。后续走查核对实际使用效果。

现状分析使用既有资料与讨论，不将平台观察包装为已完成的系统访谈。参考对象与信息来源见第 4 章。

输出：现状流程和问题—改进对应表。完成标准：每个改进点有具体信息断点，已有渠道中可复用的能力得到保留。

交接：3.6.1；需求分析报告第 2 章

依据：课件第 2 章第 10 页

FS02 现状实例：信息如何被处理

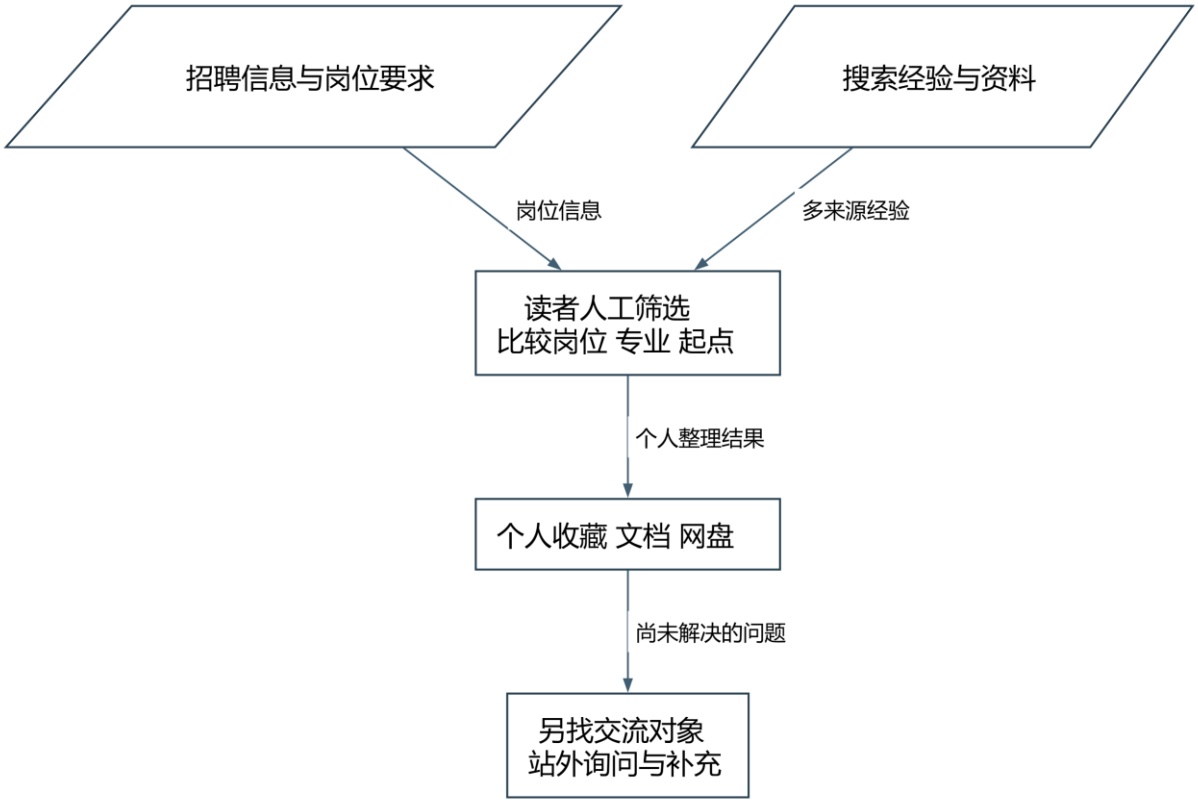


图 3-2 当前做法的数据载体与人工处理

断点	目标改进	检查方式
多处搜索和人工比较	按岗位组织并组合经历专业/公司	同一情景下能找到可比较经历
收藏分散，优质回复难复用	固定文章、评论上下文、个人收藏	再次打开能看到目标内容和相关讨论
不知道作者是否愿意联系	公开联系开关，认证后查看	关闭后不可获取联系方式

FS03 导出新系统的高层逻辑模型

输入：现状流程、目标、权限和数据需求

分解编号	具体步骤	本项目的分析和结果
03.1	抽去现状工具名称	将“网站、群聊、网盘”等物理载体抽象为信息检索、适用性比较、经验保存和问题补充。
03.2	定义系统边界	外部实体 E1 用户、E2 社区管理员、E3 运维管理员、E4 邮件服务、E5 受控运行环境；系统为 P0。
03.3	明确输入与输出	以 F01—F10 记录用户、治理、运维、邮件和执行请求及结果，逐一给出方向、名称及数据组成。
03.4	分解主要逻辑处理	P1 身份与权限、P2 经验内容、P3 交流与激励、P4 社区治理、P5 独立运维；分别关联 D1—D6 逻辑存储。
03.5	建立字典并检查平衡	父层外部输入输出在下层分配，名称与结构可追踪；原子字段、组合结构和语义约束分别定义。
03.6	推导目标物理实现	在逻辑模型稳定后选择微信原生小程序和独立 Vue 3 网页、共享 Java 服务、MySQL、文件和独立运维执行器。系统流程图与 DFD 分开绘制。

推导路径是现有物理做法→现有逻辑→目标逻辑→目标物理方案；目标不满足时返回修正。

输出：推导图、系统流程图、上下文 DFD、处理/存储表和字典。完成标准：物理载体图与逻辑数据流图用途分明，编号与需求模型一致。

交接：3.6.2、3.7.1；本报告第 5.2 节、附录 H

依据：课件第 2 章第 11 页、第 16—19、24 页起

FS03 从现状模型推导目标模型

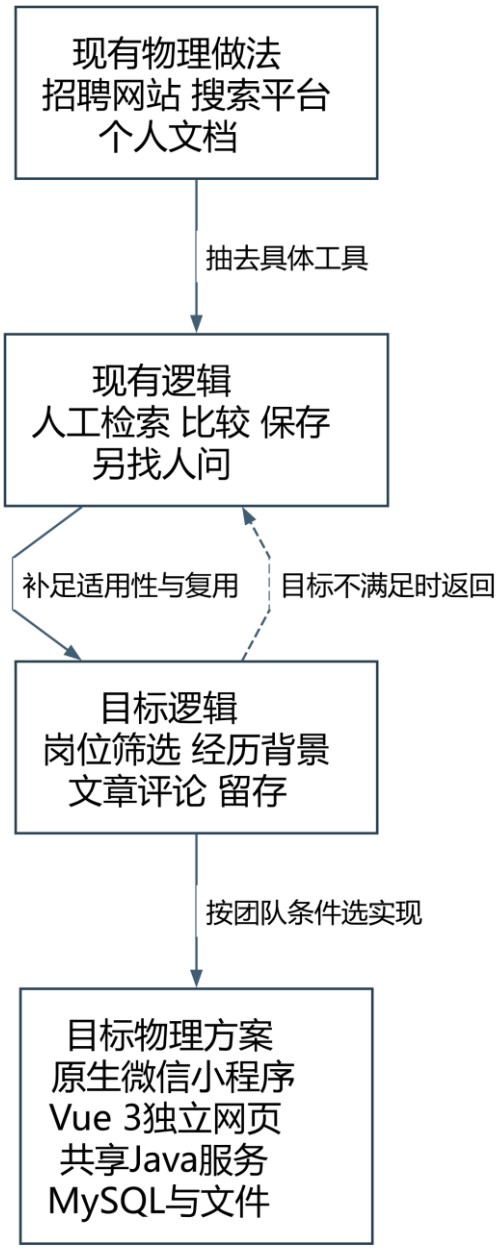


图 3-3 现状物理→现状逻辑→目标逻辑→物理方案

目标逻辑的具体边界、处理和数据见第 5.2 节两种图及附录 H；物理方案经 FS05 比较后才选定。

FS04 进一步定义问题

输入：步骤 1—3 的目标、缺口和模型

分解编号	具体步骤	本项目的分析和结果
04.1	重写核心问题	准备投递和面试的学生难以快速找到与目标岗位、专业和基础相近的亲历经验，并继续围绕内容交流。
04.2	拆开问题与解决手段	问题是经验适用性、可检索和可复用性；“小程序”“投币”是候选手段，不能直接代替问题描述。
04.3	收紧本期范围	招聘投递、咨询担保、付费阅读、考研考公、校园跑腿不纳入；毕业材料认证和微信绑定转后续需求。
04.4	补充反例和限制	同专业筛选依据作者分享经历对应的专业；公开邮箱不出现；作者关闭联系入口后不再提供联系方式。
04.5	形成反馈和关闭方式	范围、权限或用户目标有冲突时回到 FS01—FS03；变更进入需求参数与决定表，经双方评审后更新基准。

检查示例：用户希望“看和我同专业的人如何找第一份实习”→FR-R03→Article.majorId 及 P2 检索→TC-R03。

输出：修订后的问题陈述、范围和追踪链。完成标准：目标能够通过结果判断；未把实现方式写成用户问题。

交接：3.6.1、3.9.1；需求追踪矩阵

依据：课件第 2 章第 11 页

FS05 导出和评价供选择的解法

输入：统一范围、团队能力、进度、人时和成本口径

分解编号	具体步骤	本项目的分析和结果
05.1	形成六类解法	A uni-app 小程序＋网页；B 原生微信小程序＋独立网页；C 响应式网页；D 跨平台 App＋网页；E 原生双移动端＋网页；F 现有工具组合。
05.2	使用同一评价基准	按需求覆盖 25%、接触便利 20%、团队能力 20%、周期成本 20%、维护扩展 15%比较，不为某一解法单独改变范围。
05.3	逐项比较小程序与 App	比较进入方式、移动创作、审核发布、设备能力、维护量和双端复用；网页补充桌面长文创作。
05.4	评估成员与工具能力	两人协作；WorkBuddy 承担前端辅助，Codex/GPT 辅助后端；学生负责需求、复核、测试及交付，AI 生成不等于完成。
05.5	换算工作量和人工成本	A 按 226.55 人时、45.76 元/人时测算 10366.93 元；其他解法采用相同单价按工作量增减比较，详见第 4 章。
05.6	计算并解释评分	A89、B78、C84、D66、E47、F72 分。评分是本项目约束下的方案判断，附录 D 列出权重、原始分和理由。

结果：原条件下 A 为 89 分最高；当前按原生小程序与独立网页约束选择 B，并登记 20—35 人时增量。C 作为缩减备选，F 不能完整支撑独立系统交付。

输出：候选方案表、优缺点、量化评分和成本区间。完成标准：至少两个可比较方案；推荐理由能追溯到共同标准。

交接：3.6.1、3.9.1；第 4 章、附录 D

依据：课件第 2 章第 8、12 页

方案	量化结果	处理意见
A 小程序＋网页	89 分；226.55 人时；10366.93 元	原方案；本次未采用
B 原生小程序＋网页	78 分；246.55—261.55 人时	本次选择；原生与独立网页，增量另列
C 响应式网页	84 分；196.55—206.55 人时	范围缩减备选
D 跨平台 App＋网页	66 分；251.55—271.55 人时	安装与发布投入增加
E 原生双移动端＋网页	47 分；296.55—336.55 人时	超出当前团队适配能力

方案	量化结果	处理意见
F 现有工具组合	72 分；24—40 人时	不形成独立课设软件

FS06 推荐行动方针

输入：方案比较、风险和进度约束

分解编号	具体步骤	本项目的分析和结果
06.1	明确继续与否	建议按限定范围继续推进需求和设计，以微信原生小程序＋Vue 3 独立网页共享 Java 后端为推荐方案。
06.2	给出推荐理由	移动入口适合随时阅读和基础创作；网页适合 Markdown 长文；共享身份、内容和治理规则，减少重复实现。
06.3	说明备选方针	若发布或双端投入显著超出控制额，保留响应式网页作为缩减方案；须经变更确认，不能直接替换交付范围。
06.4	定义继续条件	需求模型与验收可追踪、跨端编辑不破坏正文、权限拒绝有效、投币一致性及受控恢复有可执行验证方案。
06.5	定义调整触发点	真实用户走查出现关键任务失败、邮箱链路不可用、核心资源超负荷、测试发现阻断风险时，组织评审并修订计划。

行动结论：采用 B；先完成当前需求修订和 11 月 5 日内部设计评审，再按既定工作包推进实现与验证。

输出：推荐结论、条件、备选和变更入口。完成标准：说明为何继续、选什么、在何种情况下调整。

交接：3.8、3.9；项目计划第 11 章风险管理

依据：课件第 2 章第 8、13 页

FS07 草拟开发计划书

输入：选定方案、WBS 和课程节点

分解编号	具体步骤	本项目的分析和结果
07.1	分解交付工作	以 8 个工程工作域、52 个工作包管理；工作包继续分到具体任务、负责人、起止日期、前置与完成标准。
07.2	估算人时与人员分配	项目 226.55 人时：王晨 120.35、刘景浩 106.20；开发、文档、管理和交叉复核均计入，不只计算编程。
07.3	建立依赖与排期	使用原生 Project 维护依赖、阶段甘特和工程网络；总日历 64 个工作日，2027 年 1 月 6 日收尾。
07.4	核算成本与资源	人工估算按 45.76 元/人时，总 10366.93 元；复用现有设备，不另列 AI 订阅。资源、风险和管理预留按计划管理。
07.5	细排下一需求阶段	3.6 在 10/28—29 完成范围与三模型；3.7 在 10/30 完成字典及辅助图；3.8 在 11/2 走查；3.9 在 11/3 闭环材料。合计 20 人时。
07.6	安排监督与调整	组长周检查进度、风险和变更；双方评审交接、分支合并与测试证据；课堂意见在后续工作包处理。

八步骤过程的 44 项活动分配在 2.1—2.3 的 10.00 人时内；需求阶段 3.6—3.9 仍为 20.00 人时。细化不增加团队 226.55 人时，修订号 G04-BL-20261104-PROCESS，原排期作为对照保留。

输出：正式项目计划、WBS、周安排、甘特、网络、预算和测试安排。完成标准：同一任务在各文件中的责任、日期和人时一致。

交接：FS01—FS08、2.1—2.3；需求分析 3.1—3.9；项目计划第 7—11 章及附录 I

依据：课件第 2 章第 14 页；第 13 章项目管理

FS07 下一需求阶段的责任与验收

工作包/日期	具体交付与分工	人时/完成标准
3.6；10/28—29	王晨：规则和 ER/DFD；刘景浩：角色场景、流向与展示复核。双方确认范围、现状和逻辑模型。	6.00；WC3.50/LJ2.50；图与字典同名、需求可追踪
3.7；10/30	王晨：字典/正则/规范化；刘景浩：辅助图和可读性；双方核对 STD 与四类辅助图。	5.00；WC3.00/LJ2.00；有展开例子、规则与反例
3.8；11/02	刘景浩组织用户走查；王晨准备场景、记录问题及规则复核；双方处理反馈。	4.00；WC1.50/LJ2.50；真实参与者和反馈修订记录
3.9；11/03	王晨汇总 SRS、追踪、计划和提交；刘景浩核对模型、原型、引用与文件。	5.00；WC3.00/LJ2.00；11 项索引、版本及材料检查完成

FS08 写文档提交审查

输入：八步结果、模型、估算、计划与课程评审表

分解编号	具体步骤	本项目的分析和结果
08.1	组织完整报告	保留 GB/T 8567—2006 可行性研究报告的正文结构，在第 3.5 节逐步展示八步；项目计划列在材料包前。
08.2	标记版本及输入	报告 V1.5、G04-FAR-20261101-01；引用 70 页需求课件、58 页可行性课件、评审表及现行计划和 SRS。
08.3	核对图文一致	检查 P1—P5、D1—D6、F01—F10、需求编号、当前预算及版本；三模型、字典和案例同用一套数据规则。
08.4	编制审查索引	八步成果导航给出正文页码；课件主题给出图号；计划 16 项与需求 11 项评审分别列位置与材料。
08.5	区分记录与待办	历史会议和评分保留原日期；当前代表用户走查、需求周会和签认由实际参与者完成后填写。
08.6	接收决定并闭环	评审意见进入问题单，注明负责人、修改文件、关闭证据和确认日期；影响范围、人时或日期时提交变更并同步计划。

提交材料：项目计划、可行性报告、需求分析报告、SRS、模型、字典、追踪矩阵、原型、排期原件和 PPT 制作提示词。

输出：可阅读、可追踪、可审查的资料包。完成标准：图表可辨认、页码可定位、关键结论有依据，实际审查决定另行留痕。

交接：3.9.1、3.9.2；需求阶段评审对照

依据：课件第 2 章第 8、14 页

4 可选的方案

4.1 原有方案的优缺点局限性及存在的问题

现有软件与生活中的做法

现状研究参照牛客、国家大学生就业服务平台，以及群聊、个人文档和网盘等日常工具，比较其用途、组织方式与本项目的改进方向。

参照对象	已核对的用途	可借鉴之处	本项目拟解决的问题
牛客面试经验	官方页面可见职位、企业检索和面经、文章发布入口。[14]	借鉴按岗位和公司组织面试经验的方式。	针对本校专业、当时基础和准备阶段组织亲历，通过经历背景匹配提供准备路径参考。
国家大学生就业服务平台	官方入口包含职位信息、就业指导、实习岗位等栏目。[15]	借鉴岗位与指导资料分工；权威岗位和政策继续引向原渠道。	城院帮聚焦校内个人准备和面试过程，不承担职位真实性审核或替代招聘平台。
班级或求职群聊	作为前期讨论中的生活场景：消息、文件和答复随对话持续增加。[6]	交流即时，已有关系和分享入口可以沿用。	问题是后续如何定位和复用经历；按岗位、公司、专业检索文章，并在文章下延续评论。
个人文档与网盘	前期讨论中的资料保存方式，便于汇集长文和附件链接。[6]	保留外部资料链接与来源，不重复建设网盘。	将资料链接放入有背景和时间说明的文章，结合收藏、反馈及更新说明；不收集未授权付费资料。

4.2 现状逻辑与进一步定义的问题

现状的物理渠道包括网页、群聊和文档；抽象成逻辑过程是“搜索多种来源、人工比较适用性、个人保存、再寻找交流对象”。新系统把岗位与经历背景作为共同检索信息，把可复用的经历和评论保留在同一内容对象下。再将这一逻辑模型落实为客户端、业务服务和存储。该过程对应由现有物理系统到现有逻辑、拟建逻辑再到物理解法的推导。[12，PDF 第 10—11 页]

问题	成因与边界	改进想法	验证方式
P01 同类资料多，适用性难判断	读者还要比较作者专业、当时基础与应聘岗位，原链接并不能自动回答是否适合自己。	少量经历背景＋岗位主入口＋同专业和公司筛选；背景信息可由作者完善。	试用时能说明文章与自身起点的相似处及差异。
P02 准备过程缺少连贯记录	面试题片段不能直接说明先准备什么、做过哪些项目、怎样投递及失败后如何调整。	鼓励写准备、投递、面试、结果和反思的亲历；采用可跳过的正文提示。	作者能按自身经历自由写作，不被多步必填表单阻断。
P03 有用交流难持续发挥作用	一次答复与后续读者的问题可能脱节，作者也缺少持续维护的反馈。	文章与评论绑定、收藏和非现金投币反馈；作者自愿留站外联系。	能从文章找到相关评论并反馈问题；站外协商不进入平台订单。
P04 开放分享需要校内治理	校园认证只能说明审核状态，不能替代内容真实性判断。	先发布后管理、反馈举报、管理员定位与记录理由。	越权、广告和争议经验场景进入 SRS、举报处置和测试。

上述问题分别对应检索筛选、经历背景、创作提示、评论交流及社区治理功能。试用检查读者查找适用经历、作者完成创作和管理员处理反馈的任务完成情况。

4.3 可选择的系统方案

先固定免费阅读、经验创作、评论交流、校园身份、治理和可维护性的业务目标，再按使用条件、能力与成本比较交付终端。方案均保留网页长文与管理的需要；F 为不新建系统的基准，E 为原生独立 App，D 为使用跨平台框架的独立 App。[16][17]

方案	使用与收益	主要限制	人时及人工估算
A uni-app 小程序＋网页	校园内通过微信访问，网页承担长文与管理；共享接口及部分前端逻辑。	需验证小程序与网页编辑差异，仍受宿主及发布条件约束。	226.55 人时 10366.93 元
B 原生微信小程序＋独立网页	可分别优化小程序和网页交互。	两套前端组件与回归；跨端编辑仍需统一格式。	246.55—261.55 人时 11282.13—11968.53 元
C 纯响应式网页社区	链接即可访问，长文与管理集中，客户端数量少。	移动访问采用浏览器入口，微信内访问体验单独适配。	196.55—206.55 人时 8994.13—9451.73 元
D 跨平台独立 App＋网页	独立应用入口，可在后续需要时评估设备能力和离线体验。	用户须另装应用，新增打包、签名、发布及设备测试。[17]	251.55—271.55 人时 11510.93—12426.13 元
E 原生 Android 与 iOS＋网页	可分别深度适配两类手机系统。	两套原生开发与发布链增加学习、测试和持续维护投入。	296.55—336.55 人时 13570.13—15400.53 元
F 沿用群聊、共享文档与现有平台	不新建社区，资料整理和交流可立即延续。	权限、跨资料检索及治理记录靠人工；不能形成本课设所需自主软件交付。	24.00—40.00 人时 1098.24—1830.40 元

方案 A 按 WBS 估算 226.55 人时。其他方案采用 45.76 元 / 人时的相同费率进行增量估算：B 增加 20—35 人时用于独立前端和双端回归；C 减少 20—30 人时的小程序适配；D 增加 25—45 人时用于 App 打包、签名与设备验证；E 增加 70—110 人时用于两套原生客户端及测试；F 投入 24—40 人时用于资料整理和人工管理。方案估算用于横向比较，实施排期采用方案 A。独立 App 方案的发布账户、证书及运行费用列入该方案的追加成本。

小程序与独立 App 的直接比较

比较点	微信小程序	独立 App
校园使用入口	在微信中访问，不要求另装本项目 App；适合先浏览经验再决定认证。	用户安装独立应用后使用，具有独立桌面入口。
创作和设备能力	基础文字图片可满足本期移动创作；长文放网页；宿主差异需验证。	设备集成及离线能力扩展空间较大，但本期未提出必须依赖它们的核心需求。
开发与发布	保留小程序、网页两端差异和宿主规则；并非写一次就不用适配。[16]	跨平台也要打包、签名及设备验证；原生双系统还需两套开发能力。[17]
维护与当前能力	可沿用当前 Web 和 Java 接口路线；两人先完成关键小样及交叉操作。	需要额外安排 Android/iOS 发布、签名和设备适配的学习与维护工作。

4.4 选择最终方案的准则

方案比较按需求价值 25%、校园可达性 20%、团队能力 20%、周期成本 20%、维护性 15% 加权评分，计算结果与理由见附录 D1。安全、权限和恢复要求作为交付验收项单独检查。

本项目选择方案 B。原生微信小程序满足当前明确的微信原生实现要求，独立 Vue 网页提供长文创作及管理体验。两端共用业务契约，不将页面代码复用计为本方案收益。原方案比较及 B 增加 20—35 人时的估算保留，技术变更按现有工作包核对资源与工期。

方案 A 重点实现图文保存与重开、跨端格式保护、校园邮箱认证、独立运维和备份恢复。业务后端采用 Java/Spring Boot 单体架构，共享数据和权限规则。独立 App 需求进入变更流程，重新核算学习、发布、维护工作及预算。

5 所建议的系统

5.1 对所建议的系统的说明

微信原生小程序承担移动端阅读与基础创作；独立 Vue 3/TypeScript/Vite 网页承担长文、完整创作和管理。两端共用 Java/Spring Boot 接口、MySQL、内容结构与权限规则，页面组件和构建流程分别维护。独立运维执行器处理受控部署、重启、备份及恢复。

5.2 数据流程和处理流程

5.2.1 系统流程图：物理数据经过哪些载体

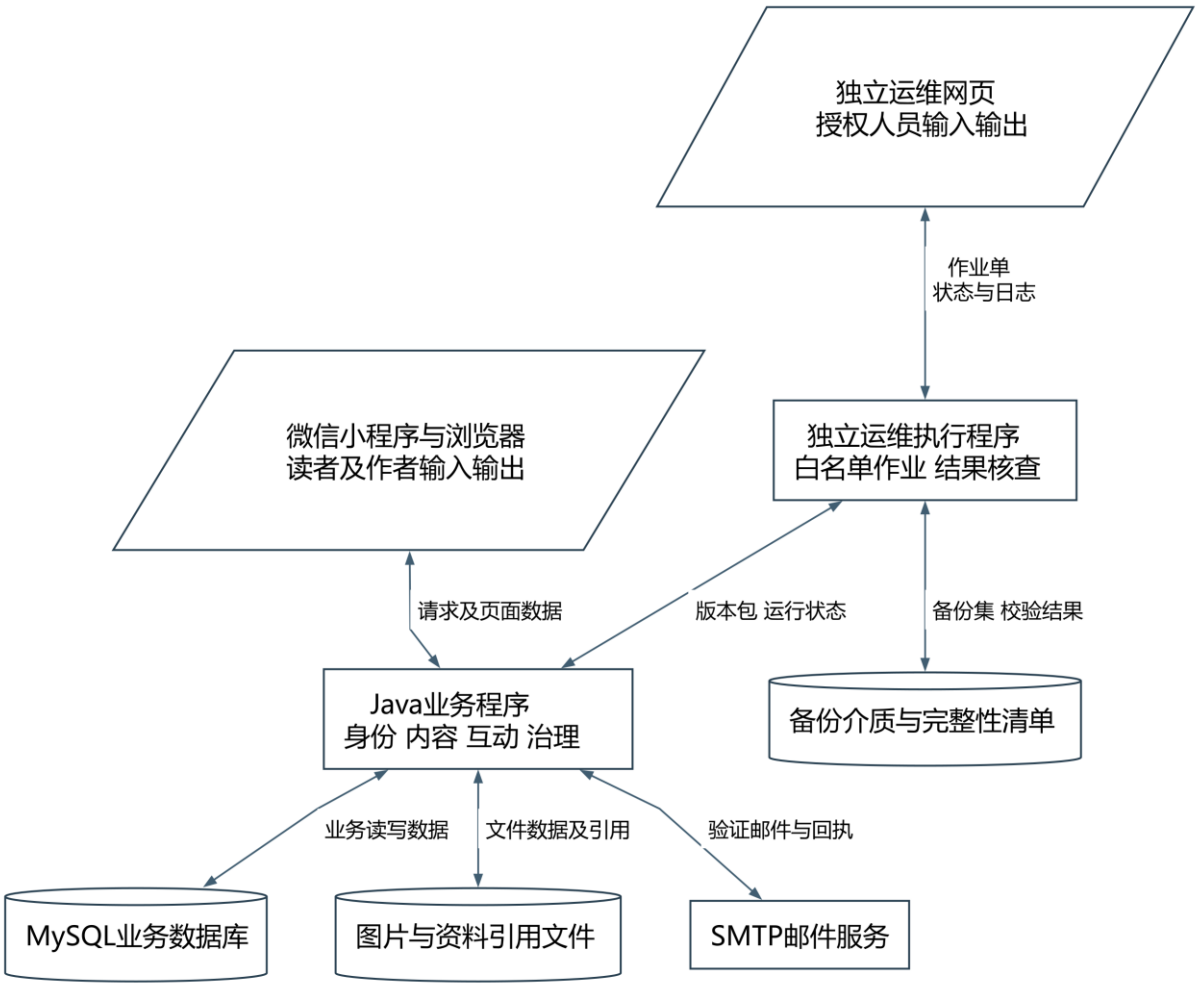


图 5-1 推荐方案系统流程图（物理数据流）

平行四边形为读者/作者及运维人员输入输出；矩形为业务和执行程序；圆柱为数据库、文件和备份介质。箭头表示请求、业务数据、文件、邮件或作业结果的传递，不是程序控制流程。

依据：第 2 章可行性研究第 16—19 页。Java 程序与 MySQL 等是方案载体；下一图中的 P0 是逻辑处理边界。

5.2.2 上下文 DFD：系统边界与主要输入输出

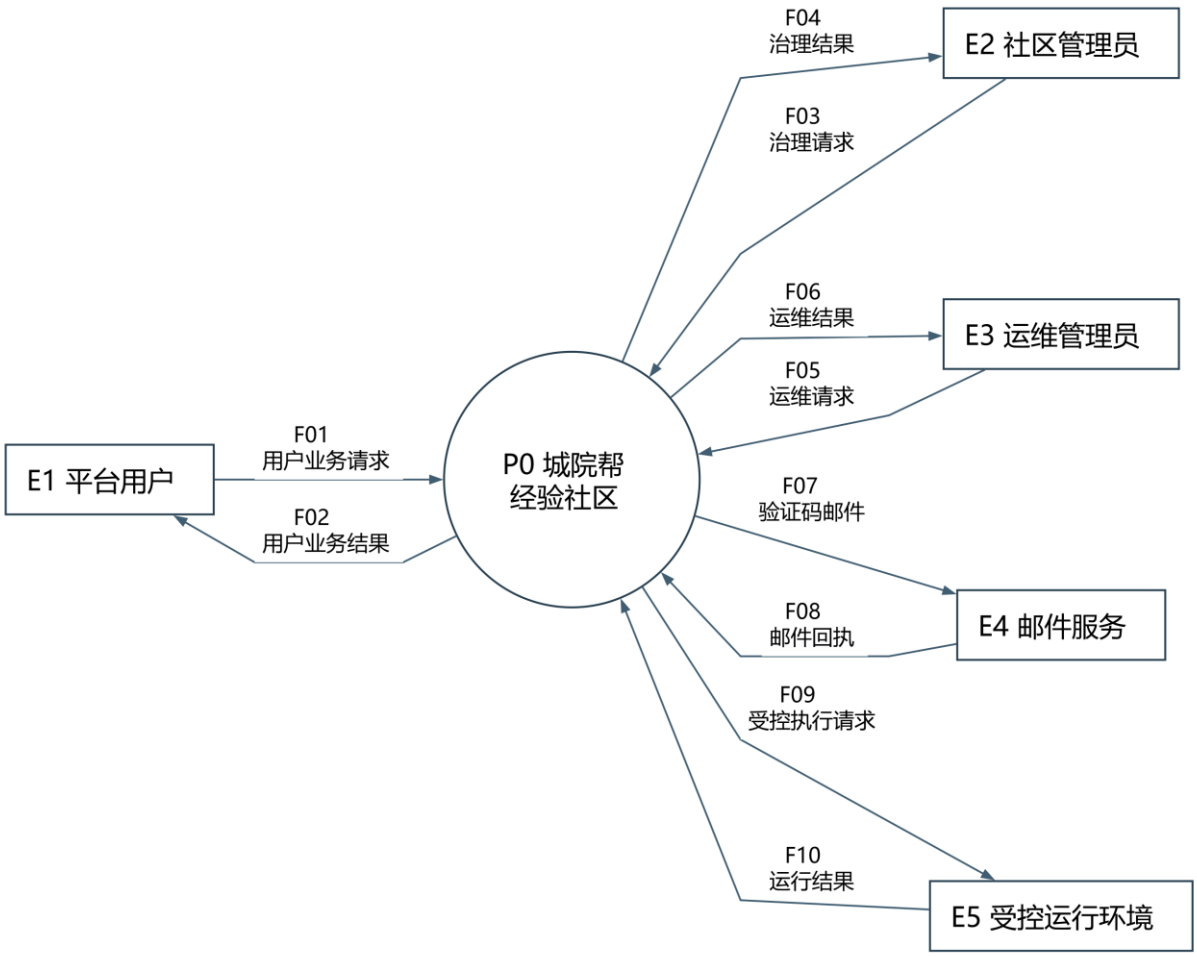


图 5-2 上下文数据流图

符号	用途
矩形/圆/箭头	外部实体/逻辑加工/有名称的数据流；本层 P0 代表整个平台。
平衡约束	F01—F10 在 P1—P5 分解中保留方向、组成及名称追踪；高层不是页面跳转图。

依据：第 2 章第 24 页起；需求模型 DFD00、DFD01—03。

5.2.3 功能分解、逻辑存储与场景展开

处理	主要职责	关联存储
P1 身份与权限	注册验证、登录、资料及管理授权	D1
P2 经验内容	岗位/公司/专业筛选，创作、版本与文件	D1、D2
P3 交流与激励	评论、联系、认可收藏、奖励与投币	D1、D2、D3、D4、D5
P4 社区治理	举报反馈、关联原文、巡查及处理	D1、D2、D3、D5
P5 独立运维	部署、重启、备份、恢复和审计	D6

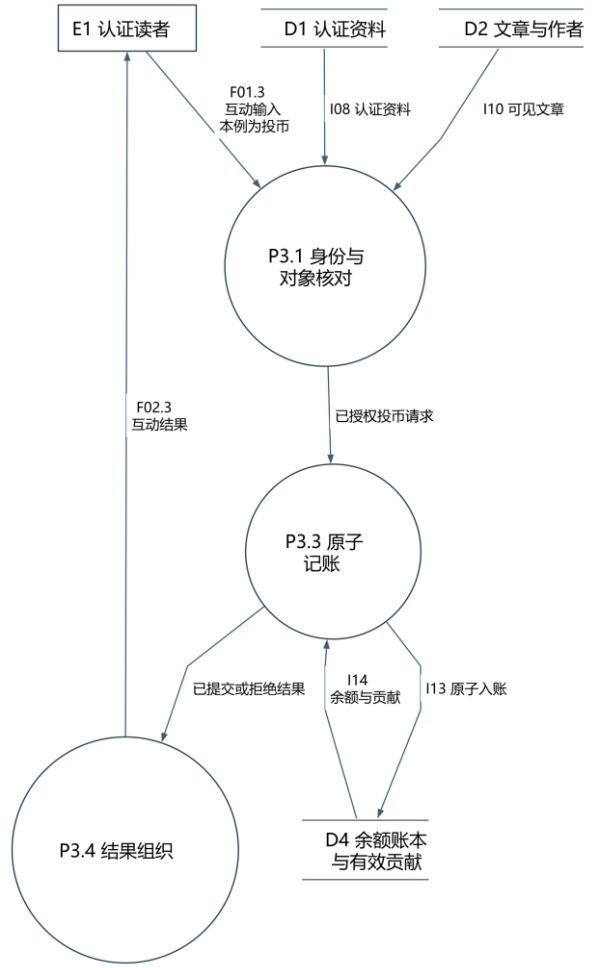


图 5-3 投币场景数据变换摘图（完整 P3 分解见 DFD31）

该摘图只展示投币路径，不取代完整父子平衡图；评论、联系、通知等支路见需求模型说明。I13 和 I14 对应 D4 原子入账及余额账本与贡献。完整边界字典见附录 H。

5.3 与原系统的比较

相较群聊和分散文档，城院帮将岗位经验、作者经历背景、评论与收藏组织为可持续检索的内容。学校招聘平台继续提供岗位与官方就业信息，城院帮提供校内准备路径及面试亲历，二者形成互补。使用效果通过后续试用任务评价。

5.4 影响和要求

方面	所需条件与影响
设备与软件	复用现有电脑、Windows 及 WSL2、开发者工具、业务服务和数据库；不安排专用硬件采购。
运行与开发	双端共用接口和内容模型，社区及运维权限分离；数据、图片和备份清单一致。
环境与经费	本地课堂演示为正式边界，腾讯云仅可选验证；现金与人工折算分别列入第 6 章，新增成本须经变更。

5.5 局限性

本期以本地课堂演示和核心流程交付为实施边界。校园邮箱、跨端内容一致性及运维恢复纳入技术验证和系统验收。正式公网发布、持续作者招募和全校长期服务属于后续运营建设范围。

6 经济可行性

6.1 投资

成本估算口径

本期复用现有电脑、可用开发工具与既有服务器资源，无新增现金采购预算；人工按 226.55 人时、45.76 元 / 人时估算。任何后续新增采购须先评估并经双方确认后调整计划。

成本项目	数量及口径	计划金额
王晨人工折算	120.35 人时×45.76 元 / 人时	5507.22 元
刘景浩人工折算	106.20 人时×45.76 元 / 人时	4859.71 元
项目总估算	人工按未舍入值汇总，直接人工预算	10366.93 元

人工预算反映开发、文档、管理和复核的计划投入，实际人时与现金支出分别记录。工作包按子任务汇总，项目总额按执行任务累计。

现有资源与获取条件

资源类别	采用的设备或工具	可用性和限制检查
开发及演示设备	两台个人电脑，组长电脑最终集成	保存环境清单；另一成员可按说明重现核心环境
分析文档与排期	Word、Excel、draw.io、Microsoft Project；原型工具按可用许可选择	核对所用工具的许可及文档、图表导出能力
AI 与前后端开发	Codex/GPT、WorkBuddy、VS Code、微信开发者工具、IntelliJ IDEA	Codex/GPT 负责框架与具体代码；WorkBuddy 负责小程序及相关页面；核查额度和构建条件。
数据与验证	MySQL、JUnit、Spring 测试、Postman、JMeter、Bugzilla、Git、GitHub、SourceTree	保存接口、测试脚本、缺陷记录和版本信息
运行与备份	现有本地服务环境及存储，可选腾讯云 2 核 2GB	本地交付不依赖公网或云端；核实备份空间与离机副本位置

本机资源与空间核查

2026 年 10 月 21 日核对演示电脑：Ryzen 7 8845H、8 核 16 线程、物理内存 31.29 GiB，Windows 11 版本 10.0.26200；C 盘空闲 51.41 GiB、D 盘空闲 235.88 GiB。工程基准为 Java 21、Spring Boot 4.1.1、MySQL 8。

资源	计划预算与取得条件
内存与 CPU	WSL2 预算 4 个逻辑处理器、8 GiB；Windows 端客户端 4 GiB、JMeter 2 GiB、宿主系统 8 GiB，合计 22 GiB；与 31.29 GiB 物理内存比较有约 9.29 GiB 余量。
本地空间	D 盘预留 40 GiB：数据库 2、图片 6、三份备份 24、日志及包和临时空间 8；C 盘另留 8 GiB 给代码、依赖与构建。
备份与检查	验收前取得至少 8 GiB 可用的离机存储；容量、目录及轮转由 4.1、4.4 和 5.10—5.11 落实，6.2、6.3、6.5 实测复核。

上述为资源预算，配置明细及空间估算见项目计划 10.4；图片平均数量用于容量推算，不作为创作限制。正式环境仍为本地课堂演示，可选 2 核 2GB 服务器不承担必需流程。

本期管理预留为 0 人时、0 元，人工及项目总估算仍为 10366.93 元。若需追加人时或费用，由任务负责人提出变更，王晨组织分析、刘景浩复核，双方确认后同步计划和本报告；20%工作量情景只作敏感性比较。

估算技术的选择与交叉核验

课件要求采用不同估计技术相互校验。本报告以既有 WBS 自下而上分解的 226.55 人时、10366.93 元作为计划控制基准，另用按成果领域进行的三点估计复核工作量。三点估计采用 E=(O+4M+P)/6，O、M、P 分别表示乐观、最可能和悲观投入；单位均为团队人时，不是日历工期。[12，PDF 第 51—52 页][18]

三点估计按计划可研、需求原型、设计、实现、综合验证、部署收尾和持续协调七个成果领域编制，参数与理由见附录 J。参数编制日期为 2026 年 10 月 24 日，实际投入通过项目工时台账记录。

方法	工作量与成本	交叉比较
WBS 任务分解	226.55 人时；10366.93 元	当前控制额；来自任务人员工时明细及原生 Project 分配
成果领域三点估计	期望 234.00 人时；10707.84 元	比 WBS 高 7.45 人时，3.29%；用于比较风险，不重复加入预算
三点情景	O160、M226、P340 人时	E=(O+4M+P)/6；联合情景不是统计置信区间

两种估计方法的中心差额为 7.45 人时，约 3.29%。WBS 的 226.55 人时继续作为计划控制基准；三点估计用于识别跨端创作、恢复和复测返工风险。周检查比较剩余工作与人员负荷，追加投入通过变更流程同步到 Project 与预算。

功能点 218.79 用于表达软件规模，WBS 用于估算实施工作量。10 月 17 日腾讯会议持续 63 分 14 秒，按两名成员各 1.054 人时登记会议投入，随工作日志单独记录。

6.2 预期的经济效益

本项目复用现有电脑和服务器资源，新增现金采购预算为 0 元，计划直接人工折算 10366.93 元。学习、审查、集成、文档和维护均计入任务人时，实际投入与现金支出分别登记。[2，PDF 第 10 页]

效益分析与敏感因素

预期效益包括形成可运行社区、可检索的经验目录及完整工程资料。读者可减少反复查找，作者可获得交流反馈与荣誉。后续依据真实发布、使用反馈与交付记录评价实际效果。

平台采用免费阅读和非现金激励，本期经济评价以人工投入、现有资源利用和使用价值为主。长期服务的经济测算采用第 6.2 节的场景参数，分别计算时间价值、净现值、回收期和内部收益率。[4，2.6][5]

主要敏感因素为人工投入增加、双端问题造成返工，以及公开运营带来的服务器与管理成本。后续新增域名、认证、设备或其他采购均应先估算，由双方确认后更新预算；正式公网发布并非本次交付前提。

经济分析结论为本期投入可承担。复用设备与工具控制新增现金支出，226.55 人时及 10366.93 元直接人工预算覆盖既定任务；新增采购、范围扩展和返工投入统一执行变更审批。

货币时间价值与收益指标

未来收益需要折算到研究时点。设初始投入 I、折现率 i，第 t 期收益 B_t 和运行成本 C_t，则净现金流为 B_t−C_t，现值为(B_t−C_t)/(1+i)^t，纯收入按净现值 NPV = Σ[(B_t−C_t)/(1+i)^t]−I 计算。投资回收期观察累计净现金流何时覆盖初始投入；本报告同时区分未折现和折现回收期。投资回收率 r 采用使 NPV(r)=0 的内部收益率口径。[12，PDF 第 53—56 页]

长期服务的经济评价采用三年测算场景：初始人工投入 10366.93 元，每年使用时间节约价值 5000 元、运行维护成本 1000 元，年净效益 4000 元，折现率 5%。该场景以时间节约价值计量社会使用效益，本期人工预算保持不变。

项目	计算结果	解释
3 年净额现值	10892.99 元	年度净使用效益 4000 元、折现 5%的演算场景
净现值 NPV	526.06 元	PV－初始人工估算 10366.93 元
投资回收期	未折现 2.59 年；折现 2.85 年	折现回收期按第 3 年净额比例插算
内部收益率 IRR	约 7.69%	使三年 NPV 为零的年折现率；不是实际投资收益

上述结果反映测算场景中的使用效益及其对参数的敏感性。平台本期收入预算为 0 元；实际运营采用独立的使用记录和运行成本台账评价。课程实施决策依据为现有资源、计划人工投入及核心功能的交付价值。

6.3 市场预测

目标服务范围为本校准备实习投递与面试的学生，首批内容集中计算机相关专业。以文章发布、检索使用、读者复访和管理工作量作为试用评价指标，运营扩展依据试用结果组织。

7 技术可行性

7.1 技术条件与验证

技术基础与限制

微信原生小程序承担移动端阅读与基础创作；独立 Vue 3/TypeScript/Vite 网页承担长文、完整创作和管理。两端共用 Java/Spring Boot 接口、MySQL、内容结构与权限规则，页面组件和构建流程分别维护。独立运维执行器处理受控部署、重启、备份及恢复。

AI 辅助编写和修复，学生负责人审查模块输入输出、权限及异常处理，完成集成与验证。概念界面、模拟接口及真实业务联通分别记录状态和证据。[2]

关键技术验证矩阵

技术验证分为早期条件核查、模块实现联调和系统验收三个层次，分别对应工作包 2.1、5.x 和 6.x。各项验证的方法、完成标准和保存材料见下表，责任与执行节点见附录 C。

编号与关键问题	早期验证方法及后续工作包	通过条件与应保存证据
FV01 双端构建与接口	2.1.1 构建同一最小页面，请求同一测试接口；5.4、5.12 接入完整流程	H5 和小程序均可启动；请求结果一致，保存环境、版本及截图
FV02 邮箱与身份条件	2.1.1 用授权测试邮箱核查发信和接收；5.2、6.4 检查认证及越权	发送、过期、重复申请可说明；真实发信记录不含密码；替代演示明确标注
FV03 网页 Markdown 与移动图文	早期检查可用控件和保存格式；4.3、5.5、5.6 及 6.1 验证编辑链路	保存重开不丢正文图片，跨端冲突有提示；危险输入经处理，保存操作记录
FV04 非现金币一致性	4.2 设计事务与幂等规则；5.8、6.1 验证重复及并发请求	同一业务不重复扣发，余额不为负，币事件与余额一致；保存数据断言
FV05 运维入口独立性	2.1.2 在隔离环境停止样例业务进程，检查独立执行器和状态记录；5.10、5.11 实现	运维入口仍可用；固定目标和身份受控，作业结果可查；保存日志及权限证据
FV06 备份恢复与失败保护	2.1.2 核查数据库、图片保存和样例恢复路径；4.4、6.5 完成演练	正常备份可校验，损坏或不兼容备份被拒绝；当前状态有保护，保存前后核对结果
FV07 治理权限与内容安全	4.2、5.7、5.9 及 6.4 验证举报定位、评论和管理员权限	管理员可定位和处理，普通账号不能越权；正文输入及图片处理有检查记录
FV08 性能与持续运行	6.2、6.3 使用固定合成数据和 JMeter 脚本，记录环境资源	保存 P95、错误率、吞吐、资源趋势与一致性记录，按计划目标判定结果

验证记录统一包含负责人、日期、环境、版本、输入、预期结果、实际结果、证据和缺陷。组长跟踪关键技术问题，模块负责人整改，另一成员复核；涉及范围、预算或关键节点的变更组织联合评审。

关键异常与质量要求

身份与隐私方面，未认证读者直接调用接口时仍不能取得他人资料或评论详情，真实邮箱不得出现在公开主页。创作方面，草稿保存、图片上传失败、危险输入和跨端版本冲突都必须有明确结果，不能只验证正常发表文章。

互动方面，领取和投币需要事务与重复请求保护，不能以页面防连点代替后端一致性。治理方面，原文或评论被处理后，举报仍能查到处理原因和历史对象信息。运维方面，部署失败、业务启动失败、恢复失败及执行器重新启动后，必须保留可查的任务状态和执行结果。

以上场景进入 SRS 与设计检查，再与单元、接口、功能、安全及恢复用例相连。Spring 测试支持用于验证 Java 模块，Postman 用于接口断言，JMeter 用于负载指标；任何一种工具都不能替代其余质量检查。[2][9][10]

性能与压力验证边界

性能优化采用分页、索引、事务边界和连接池管理。正式验收环境为个人电脑，按下表执行正常负载、阶梯压力、稳定性与降载恢复测试。腾讯云 2 核 2GB 服务器作为扩展验证环境，测试结果按环境分别登记。

验证场景	计划目标或观察要求	应保存的证据
正常负载	合成 200 用户、2000 文章、5000 评论；30 并发，60 秒升载后运行 10 分钟；读 P95 不超过 1 秒，写不超过 2 秒，非预期错误率低于 1%	版本、机器配置、数据规模、脚本、原始 JTL 及统计结果
阶梯压力	10、30、50、100 并发；每档运行 2 分钟、升载 30 秒；观察容量边界，不承诺支持 100 并发	吞吐、错误、CPU 内存、失效点及数据一致性
稳定性与降载恢复	10 并发运行 30 分钟；压力后降至 10 并发，目标为 2 分钟内恢复；账本与内容无不一致	持续运行趋势、降载时间、数据库检查结果
端侧体验	网页与开发者工具中的加载、滚动、图文编辑和失败提示	网页与小程序操作记录、截图和问题处理结果

P95 表示 95%的被测请求耗时不超过该值。同机施压记录资源竞争，预期业务拒绝与非预期服务错误分别统计。目标未达时保留原始结果、分析原因并登记整改或交付限制。

成员能力与学习成本

成员	能力输入及证据	方案含义	能力建设与验证
王晨	承担项目管理、后端工程、接口契约和日志相关工作。	负责 Java 共享业务接口、数据库与系统集成，并完成代码审查和验收。	核对现有版本与接口证据；验证双端数据契约及性能、恢复结果。
刘景浩	已参加计划修订、工具及 Logo 讨论；本期承担网页、社区和独立运维任务。	采用微信开发者工具及 Vue 3 / TypeScript / Vite 工具链实现网页与管理功能，通过原型和小样完成技术熟悉。	先用原型与小样验证创作、图片及运维作业；保存自己能复现的操作和结果。

成员	能力输入及证据	方案含义	能力建设与验证
两人共同	开发、文档和复核均由两人参与；日常每天各 30—45 分钟，集中期增加投入。	AI 承担辅助生成；任务负责人审查输入输出，另一成员交叉复核。	两人共同完成交叉复核；独立 App 方案需追加双系统开发、签名发布和设备测试投入。

7.2 进度与组织条件

规模估计与排期依据

项目规模估算为 UFP = 221，14 项技术因素影响分合计 34，TCF = 0.99，调整后 FP = 218.79，明细见附录 D3。该结果作为计划阶段规模基准，需求变更时复核计数与复杂度；工作量按 WBS 估算 226.55 人时。[2，PDF 第 6—10 页]

工作量采用 WBS 自下而上估计，日期按依赖、课程节点和可用时间安排。计划含 8 个顶层工作组、52 个工作包、167 项核心子任务，另列管理、复核及课堂节点。任务负责人、计划人时、交接和证据见周计划与 Project。

阶段节点与交付条件

时间节点	所需成果或交接	对可行性的作用
10 月 8 日至 12 日	2.1 关键技术及工具条件核查	尽早发现构建、邮箱和运维路径阻塞
10 月 12 日至 15 日	2.2 资源内容分析，2.3 共同评审	形成资源分析、方案选择及实施安排
10 月 18 日 22 时前	可行性报告邮件提交，10 月 21 日课堂节点	先保存提交版本，课堂意见再登记处理
10 月 23 日与 11 月 5 日	内部需求基线与内部设计评审	锁定规则和接口，使 11 月 6 日集中实现有输入
11 月 27 日	真实接口联调和候选版本	消除用模拟数据替代业务实现的缺口
12 月 4 日与 12 月 6 日	首轮内部系统验收及报告提交	保留功能、性能、恢复和整改证据
2027 年 1 月 3 日至 6 日	提交归档基线、处理尾项、课程收尾	区分提交时状态与最终关闭状态

阶段甘特图表示实施时间，工程网络表示活动依赖、事件最早最迟时刻与总时差。图表和原生 MPP 使用同一任务数据；箭线表示活动，圆表示事件，虚活动持续期为 0。[2，PDF 第 22—41 页]

关键路径与人员限制

全项目排期为 64 个工作日，关键活动覆盖需求确认、设计反馈、网页与管理运维实现、联调验证、维护及收尾。完整路径和时差见图表附件；工作日历、课堂固定日期与内部截止共同约束排期。

工作包 5.4、5.5、5.9、5.10、5.11 按刘景浩的人员可用性顺序安排。王晨提前交付认证、内容接口和共享数据规则，双方按接口契约交接。后端移动支路的总时差为 1 个工作日，恢复验证 6.5 的总时差为 0.5 个工作日，组长据此管理排期浮动。

成员	主要责任	本阶段共同工作
王晨 组长兼项目负责人	范围进度风险变更、评审提交；后端基础、认证文章移动激励、集成与性能验证	整理技术与交付边界；核对费用、操作、报告结论与评审材料
刘景浩	网页阅读创作、社区处理、独立运维执行器和网页；功能安全兼容及回归材料	整理资源、内容与操作分析；交叉复核技术证据，共同确认报告

两人共同承担开发、文档与交叉复核，AI 工具由任务负责人使用。Project 按 226.55 计划人时分配资源，日常投入与集中阶段追加投入共同形成可用容量。王晨每周检查产物、阻塞、资源负荷及预计完成日期，刘景浩同步进展与风险；冲突通过重排独立任务、调整交接和更新图表解决，系统测试保留完整验收窗口。[2，13.3—13.4]

进度方案按课程里程碑和内部交接组织实施。集中开发、联调与测试阶段执行周计划的追加投入安排；关键验证、共享接口或工作包发生延期时，由负责人分析依赖及人员负荷，组长组织调整并同步计划。

8 法律可行性

本期采用测试数据和本地课堂演示环境，实行公开资料与私有账号认证信息分离、角色授权、来源标注和内容举报处理。校园认证用于确认校园身份，内容质量通过交流、举报与管理员复核保障。

风险对象	当前项目的处理边界	正式运营前需补充的事项
邮箱与认证信息	真实邮箱不公开，仅保存必要验证记录；本期不采集学生证、毕业证等证明材料；报告不包含密码。	明确收集目的、保存周期、删除和申诉流程
文章图片与外部资料	标明来源及权限，演示与真实经验区分	核实传播授权和内容管理规则
公司待遇与避坑经验	提示发生时间、岗位和个体背景，允许举报与复核	核实争议信息处理责任和实际处置能力
站外联系方式	作者自愿公开，认证用户查看；平台不担保站外协商	说明公开范围与撤回方式，核对真实服务提示
非现金币与荣誉	不充值、不兑换、不承诺现金收益	如改变商业模式，重新评估资金与平台规则

本地课堂交付执行隐私保护、角色授权与内容治理规则。持续公网运营另行完成个人信息处理、内容管理、平台发布及维护责任检查，并保存运营检查记录。

9 用户使用可行性

9.1 操作与维护条件

读者与作者操作

读者从目标岗位进入经验，使用公司和同专业筛选缩小范围，先阅读后决定是否认证交流。作者用少量必要信息说明经历背景，正文提示可跳过；网页适合长文创作，小程序支持文字和多张图片。图片失败、退出重进、草稿恢复及网盘链接展示进入操作验证。

试用安排读者完成查找适用经验、理解作者背景、收藏及认证评论任务；作者完成草稿保存重开、图片失败处理、发布与修改任务。记录完成情况、操作时间、帮助需求和问题位置，按反馈修订流程与提示。

内容供给与作者激励

认证用户均可分享亲历，重点邀请已有实习或工作经历的学生。便捷创作、经验持续检索、评论交流、投币和荣誉构成非现金激励，作者自主设置公开联系方式。内容运营记录作者参与、文章发布和复访情况。

初期资料分为原创亲历、公开引用与合成演示案例。原创由作者确认，公开引用注明链接和来源，演示案例标明数据性质。内部学习资料按授权范围使用，平台公开展示须具有相应传播授权。

内容运营以来源清楚、经历具体和持续交流为质量目标。试用记录创作、评论、复访和作者反馈，课堂演示使用明确标注的示例数据，运营评价采用实际使用记录。

社区管理与反馈处理

社区采用先发布后管理，管理员查看反馈举报并一键定位文章和评论，记录理由、处理结果和复核情况。普通学生账号与管理账号分开，作者不能以自己的权限删除他人真实评价或绕过处理记录。广告、欺骗性内容及公司避坑文章中的争议信息，要有报告入口和处置流程，不能靠“已校园认证”代替内容真实性判断。

管理员处理流程为登记对象、检查内容与证据、决定处置、记录理由、反馈和必要复核。找不到原对象、重复举报、误操作或意见争议也需要可追溯状态；上述细节在需求中形成可验收规则，管理网页以减少查找和跳转为目标。

部署与维护操作

独立运维网页需要直接执行部署、重启和恢复，同时提供状态、错误日志与备份记录。它通过固定动作执行器操作既定服务，避免把网页设计成任意命令终端。执行前检查角色、目标和版本，危险动作确认，运行中的部署恢复互斥，结果和错误持久保存。

恢复同时检查数据库、图片与版本清单。先保护当前状态，再验证备份摘要与兼容性，必要时停止写入，恢复后检查关键记录、图片和币账本；失败时按既定保护与回退流程处理。备份文件或密码不能写入公开仓库，维护说明记录操作方式而非实际账号密码。

交付时两人按说明完成本地冷启动和维护交接，保存构建包、环境、初始化数据、已知限制和恢复记录。云服务器不是正式演示依赖，公网域名、备案、小程序发布及持续服务保障也不由课堂演示结果自动满足。

9.2 使用人员和培训

读者和作者依据界面提示完成阅读、认证和创作；社区管理员接受举报处置、角色授权与隐私培训，运维人员完成部署和恢复演练。两名成员依据手册交叉操作，记录任务完成情况、帮助需求及异常处理结果。

10 其他与项目有关的问题

10.1 风险与评审控制

风险分级与响应

风险采用概率和影响的内部定性评估，每周由双方更新。核心交付、数据和权限风险优先处理，作者供给影响长期运营结论。每项记录触发条件、负责人、响应措施及证据。[5]

风险与等级	触发条件	响应及任务负责人
双端创作与格式 高	保存重开、图片或跨端编辑出现不可恢复问题	统一文章格式，允许不同控件；王晨与刘景浩共同核对接口
邮箱条件 中	发信接收或授权流程无法走通	保持公开文章阅读；核查 SMTP 与邮箱服务条件，修复后验证；认证路线调整经需求变更确认。王晨负责。
运维与恢复 高	业务停止导致入口不可用，恢复破坏当前数据	独立执行器、保护当前状态、固定动作和恢复演练；刘景浩实现，王晨验证

风险与等级	触发条件	响应及任务负责人
进度及返工 高	关键工作包或接口预测完成晚于交接日期	分析依赖与人员冲突，重排独立任务，保护测试；王晨统筹，双方协作
真实内容不足 高	试用期间作者参与或经验供给持续不足	用真实试用重新判断运营，演示数据明确标注；刘景浩统筹，双方确认
AI 输出错误 高	代码无法解释，权限与事务缺陷，文档结果不一致	分模块审查和真实验证，不直接以生成结果验收；各模块负责人
工具或费用变化 中	额度、许可、订阅价格超出既定条件	比较现有替代，先做费用和进度影响分析；刘景浩登记，王晨协调
演示环境故障 中	组长电脑环境变化或关键配置丢失	保留可重现环境、离机副本和冷启动说明；双方交叉操作

可行性审查安排

可行性八步骤对应 2.1—2.3 下的 44 项活动，需求分析另有 44 项执行任务；课堂意见进入 3.5 及相关修订任务。王晨登记责任人与期限，刘景浩复核处理结果，双方同步需求、设计和计划。

报告评审检查目标、范围、方案、技术、经济、进度、操作、风险与实施安排。计划阶段 16 项要求见附录 A，实施检查见附录 B；核心技术、预算或资源发生重大变化时重新组织方案评审。

配置管理与变更控制

代码、文档、图表、排期和验证记录统一纳入配置管理。Git 保存历史，GitHub 用于协作，SourceTree 用于图形化差异查看与提交。王晨管理仓库和合并，工作分支采用 feat、fix 或 docs 类型及 wc、ljh 负责人标识，按任务提交并交叉复核。源稿、Word、PDF、图表与附件版本同步登记。[2，PDF 第 74—83 页]

变更流程为登记原因、分析范围进度成本和质量影响、双方确认、修改相关材料、验证一致性并留记录。任务负责人处理自己负责模块的问题，组长协调跨模块交接和提交。10 月 11 日两人初看 AI 生成的计划，确定 Git/GitHub、个人分支和初始分工，会议及职责评价见项目计划附录 D。后续按老师意见和实际工作量、能力修订。

10.2 结论与实施安排

综合技术、经济、进度、法律和用户使用分析，本项目在既定范围、两人协作及本地课堂演示环境下具备实施可行性。确定采用方案 B：微信原生小程序及 Vue 3 独立网页、Java/Spring Boot 单体后端、MySQL 数据库和独立运维执行器。实施重点为跨端创作、认证权限、币账本一致性、社区治理、性能验证和备份恢复。

本期目标为按课程节点交付可运行的软件和可追溯的工程资料。长期运营作为后续建设阶段，以真实作者参与、学生使用反馈、持续管理责任和运行成本作为扩展决策依据。

判定维度	当前判断	继续推进的必要条件
技术与质量	具备实施可行性	按 FV01—FV08 完成技术验证和系统验收
经济与资源	现金预算可承担	人工估算 10366.93 元；设备与工具可用，新增采购须经变更
进度与组织	按周计划组织实施	保护接口交接、关键路径和系统测试，两人共同复核阶段成果
操作与维护	满足本地演示交付要求	角色隔离、固定运维动作、失败保护和维护交接均可检查
内容供给与持续运营	后续运营评价	以作者参与、文章发布、读者复访及管理工作量评价运营效果

项目按方案 B 实施，依次完成需求基线、总体与详细设计、模块开发、系统联调、综合测试、部署维护和课程收尾。各阶段按项目计划检查产物、工作量和完成标准。

条件与任务责任	检查时点	证据与未通过处理
C01 技术条件 2.1、4.4、5.10—5.11；王晨主责，刘景浩复核	早期检查 10 月 12 日；报告确认 10 月 15 日；最终 6.5 实测	实际发信、双端构建、独立运维及恢复证据；未过登记问题与替代路线
C02 容量与资金项目计划第 7 章、2.2 及每周 M 任务；双方	10 月 15 日及每次周会核对	核查 226.55 人时、集中加时与现金需求；容量不足时调整任务安排

条件与任务责任	检查时点	证据与未通过处理
C03 内容与跨端设计 3.2、3.3、4.3、4.5；刘景浩主责，王晨复核	10 月 23 日需求、11 月 5 日设计基线	图片失败、草稿恢复及跨端冲突规则和验证；重大不兼容需重评方案
C04 产品与维护质量 6.1—6.7、7.1—7.3；双方	12 月 4 日首轮验收及运行交接	权限、账本、治理、性能压力和恢复实测；失败不得以选型或样例替代验收
C05 资料与持续运营 2.2、7.1 及后续反馈；双方	内容分析与试用时持续更新	完成资料来源登记和示例标注；运营试用记录作者参与、经验发布及读者复访

核心技术无法满足验收标准、运维恢复存在数据风险，或范围与资源发生重大偏差时，启动变更评审。双方分析范围、进度、成本和质量影响，修订实施方案与计划，并完成相应回归验证。

实施安排与项目计划的衔接

C01—C05 分别关联项目计划工作包、负责人、交接节点与验收材料。组长登记实施进展，双方检查完成标准；范围、日期、人时或费用调整均通过变更登记同步。报告结构依据 GB/T 8567—2006 第 7.1 节，实施跟踪衔接软件开发计划。[F2]

调整为校外访问、商业交易或长期运营，需重新分析部署发布条件、隐私治理、费用、维护责任和资源；重大需求或容量变化触发计划及可行性重新评审。

11 注解

FAR 为可行性分析报告，SDP 为软件开发计划，WBS 为工作分解结构，SRS 为软件需求规格说明书。人工成本采用计划投入估算，方案评分用于比较决策。

附录 A 教师计划阶段评审要求与证据位置

本表将教师计划阶段评审要求对应到报告、项目计划、原生排期和会议记录，便于评审查阅。第 3 项由本报告第 7、10 章及技术验证安排直接支撑。

条目	教师检查要求	本报告及配套证据位置
1	是否准备项目演示 PPT，效果如何	项目介绍第 1、4、5 章；实际汇报 PPT
2	是否按进度与课程要求提交全部阶段成果	项目计划第 3、6、7 章；附录 B；交付成果登记
3	是否提交可行性报告，关键技术可行分析是否描述	可行性报告第 7、10 章；条件 C01—C05
4	是否提交项目计划，模板是否适合	国标第 7.2 节 13 章；国标与评审对照
5	成员任务是否贯穿全项目，是否提供甘特图	项目计划第 7、8 章；附录 A、B；甘特图
6	是否采用 Project 绘制 GANTT 图，是否准确	项目计划第 7 章；原生 MPP 及 Project 附件
7	是否明确且合理地给组员分配任务	项目计划第 8 章；附录 A、B
8	WBS 是否合理，是否体现瀑布各阶段	项目计划第 5、7 章；WBS 和网络
9	是否逐项估计完成时间且合理	项目计划第 7、10 章；任务执行跟踪
10	是否逐项指定任务负责人，分工是否合理	项目计划第 8 章；附录 A、B；任务登记
11	是否根据课程进度调整项目计划	项目计划第 3、6.1、6.14 章；附录 B
12	整体及每项任务是否有预算，是否合理	项目计划第 10 章；附录 E、F；预算工作簿
13	是否使用配置管理工具管理文档版本	项目计划第 6.14 章；Git 说明和变更登记
14	是否有资源不均或过载，原因是什么	项目计划第 8、10、11 章；附录 E
15	是否开会并形成合理有效及时的记录	项目计划第 8 章、附录 D；真实会议及周会模板
16	是否对里程碑下各成员绩效有效评价	项目计划第 8 章、附录 D、E；成员评分表

附录 B 实施条件检查表

实施检查记录日期、对象版本、检查结果、责任人和完成期限，并与问题登记及阶段成果关联。

检查点	可接受标准	记录要求
目标与范围	目标用户、免费模式、终端及范围外事项清楚	核对本报告第 1 至 2 节与项目计划一致
现状与证据	区分需求讨论、计划假设与真实统计	需求来源可追溯，作者供给条件有验证安排
方案比较	至少比较推荐、替代与不开发方案，说明取舍	记录必要条件及触发替代的原因
系统模型	系统流程、数据流、字典名称和边界一致	图 1—5 与表中角色、存储、外部邮箱相对应
关键技术	核心风险有方法、通过标准、负责人及失败响应	附录 C 对应验证节点、责任与成果
经济与资源	预算不重复汇总，存量资源与新增支出区分	核对人工费率、任务人时、汇总金额及资源可用性
进度与分工	任务日期前置明确，两人有独立与共同工作	使用同一 WBS 与 Project，延期有影响分析
质量与维护	功能、安全、性能、压力、稳定性和恢复均有目标	计划目标与实测结果分开，维护能交接
内容与资料	演示、公开引用与原创亲历区分，隐私和权限有约束	引用资料授权范围清楚，运营检查事项及责任人明确
决策与变更	结论、实施安排与变更触发条件明确	有真实会议、行动与关闭记录，导出及源稿同版

附录 C 技术验证与验收安排

下表按工作包安排关键技术验证与系统验收，明确任务责任、执行节点及产物。完成情况和实际结果保存在测试记录、问题登记与阶段评审材料中。

编号	任务负责人及复核	执行工作包	验证产物
FV01	王晨负责、刘景浩复核	2.1.1；5.4、5.12	保存双端启动、共享接口请求及结果一致性记录。
FV02	王晨负责、刘景浩复核	2.1.1；5.2、6.4	保存邮件收发、验证码过期、重复申请、认证及越权检查结果。
FV03	刘景浩负责网页、王晨负责移动，双方复核	4.3；5.5、5.6、6.1	保存草稿重开、图片上传、跨端编辑冲突及危险输入检查记录。
FV04	王晨负责、刘景浩复核	4.2；5.8、6.1	保存重复与并发请求、余额、流水和投币统计一致性断言。
FV05	刘景浩实现、王晨复核	2.1.2；5.10、5.11	保存业务停止后运维入口、授权、固定动作及日志查询结果。
FV06	刘景浩实现、王晨验收，双方交接	2.1.2；4.4、6.5	保存完整备份、损坏或不兼容备份拒绝、失败保护及恢复核对记录。
FV07	刘景浩负责、王晨复核	5.7、5.9、6.4	保存举报定位、内容处置、管理权限和普通账号越权检查记录。
FV08	王晨负责、刘景浩复核	6.2、6.3、6.7	保存 JMeter 脚本、JTL、统计、资源趋势、降载恢复和数据一致性结果。

验证记录字段包括编号、日期、负责人、复核人、版本、环境、输入、预期结果、实际结果、结论、证据及缺陷处理。

附录 D 定量方案评估

D1 评分方法与必要条件

各项采用 1—5 分评价，按权重×得分 / 5 汇总为百分制。五项权重分别为需求价值 25%、校园可达性 20%、团队能力 20%、周期成本 20%、维护性 15%，评分依据为本期需求范围、实现工作量、校园入口和两人小组的技术条件。

方案	需求 25%	可达 20%	能力 20%	周期成本 20%	维护 15%	总分
A	5	5	4	4	4	89
B	5	5	3	3	3	78
C	4	4	4	5	4	84
D	5	3	3	2	3	66
E	5	2	1	1	2	47
F	2	4	5	5	2	72

原条件下 A 为 89 分、B 为 78 分、C 为 84 分。2026 年 11 月 1 日项目负责人明确采用原生微信小程序及独立 Vue 网页，原生实现成为本轮约束，选择 B；A 和 C 保留为比较资料，不再称为现行推荐。评分不因已作选择而倒改；双前端的成本与能力风险进入变更核对。

D2 工作量与经济量化

项目计划工作量为 226.55 人时，其中王晨 120.35 人时、刘景浩 106.20 人时。任务分配、每周负荷及记录方法见项目计划附录 E 和工时明细。64 个工作日表示排期跨度，具体劳动投入按人时计量。

项目直接人工估算为 10366.93 元，新增现金采购预算为 0 元。设备、服务器和工具采用现有资源，维护工作计入任务人时；经济效益按第 6.2 节的三年场景进行比较测算。

两名成员日常各投入 30—45 分钟，全期日常容量合计 91—136.5 人时。与 226.55 人时计划相比，集中阶段追加投入 70.05—115.55 人时，两名成员按周计划分担。工作量增加 20%的压力情景为 271.86 人时，超出基准的投入通过变更流程管理。

D3 功能点技术复杂性估算

功能点采用计划阶段平均复杂度估算：外部输入 18×4、外部输出 4×5、外部查询 8×4、内部逻辑文件 9×10、外部接口文件 1×7，合计 UFP = 221。该口径与项目计划 10.1 一致，需求变更时同步复核数量及复杂度。[Q4]

技术因素	影响分 0 至 5	本项目依据
数据通信	3	小程序、网页共享 HTTP 接口
分布式数据处理	0	业务采用单体，无分布式数据处理要求
性能要求	3	安排 P95、负载与压力验证
运行环境约束	2	本机演示为主，可选 2 核 2GB 服务器
事务率	2	以第 7.1 节正常负载场景作为估算输入
联机数据输入	4	创作、评论、认证等在线输入
最终用户效率	3	检索、筛选和双端编辑体验
联机更新	3	内容状态、草稿及互动更新
复杂处理	2	权限、投币一致性、运维任务状态
可复用性	2	共享接口与编辑数据
安装简易性	3	初始化、配置及部署说明
操作简易性	3	状态、日志、备份恢复入口
多场所使用	1	第一版以一个演示现场为主
易修改性	3	Git、迁移及需求变更追踪

未调整功能点 UFP = 18×4 + 4×5 + 8×4 + 9×10 + 1×7 = 221。14 项技术因素影响分合计 34，TCF = 0.65 + 0.01×34 = 0.99，调整后 FP = 218.79。功能点表达规模，实施工作量采用 WBS 自下而上估算 226.55 人时，两项指标分别管理。

D4 风险量化

风险概率等级 P 与影响等级 I 均采用 1—5 级，风险优先值为 P×I；低于 6 为低风险，6—10 为中风险，12 及以上为高风险。影响等级为 5 的严重安全、隐私或恢复问题作为发布阻塞项单独控制。

风险	P	I	P×I	等级	应对
人员高峰周与返工	4	4	16	高	日常各 30—45 分钟；逐周确认集中加时；不能满足时先重排或缩小范围，不压缩验证
双端草稿或版本冲突	3	4	12	高	共同确认版本与冲突规则，保留跨端用例
运维部署恢复失败	3	5	15	高	固定动作、备份校验、隔离恢复、失败保护
真实作者与经验供给不足	4	4	16	高	初期资料标来源；真实供给另做小规模试用验证
AI 生成代码或文档缺陷	3	4	12	高	负责人复核并保存测试或资料依据
隐私或越权访问	2	5	10	中且阻塞发布	即使总分不高，严重权限缺陷也必须关闭
集成挤压测试时间	3	5	15	高	保护内部联调及测试截止，延期立即分析影响

D5 实施决策与管理

采用方案 B 实施。双方按周计划完成资源负荷检查、关键技术验证和阶段评审；影响范围、进度或成本的事项由组长组织变更分析，双方确认后更新计划与配置项。系统验收按第 7 章和附录 C 执行。

[Q1] GB/T 8567—2006 计算机软件文档编制规范，第 7.1 节印刷页 14—16、第 7.2 节印刷页 16—23。完整来源见引用文件[11]。

[Q2] 软件工程课程团队作业要求及 G04 周会管理规则。周会记录时间地点、上周进度、问题原因、下周任务、负责人及完成期限。

[Q3] Microsoft．Learn more about resource units，Project 桌面版资源单位说明。https://support.microsoft.com/en-us/project/learn-more-about-resource-units，查阅 2026 年 10 月 21 日。

[Q4] 软件工程课程 第 13 章 软件项目管理，97 页。规模、工作量、进度和组织方法定位见引用文件[2]。

[Q5] 软件工程课程项目计划阶段评审检查表，2 页、16 项。

[Q6] G04 项目计划任务、WBS 估算及 2026 年 10 月 11 日会议记录。

附录 E 人工成本测算

人工预算与现金支出分别管理

人工预算统一采用 45.76 元 / 人时的项目核算费率。费率测算输入为年度人工参考参数 95,545 元，按 12 个月、每月 21.75 个计薪日、每日 8 小时折算。该参数用于课程项目直接人工预算。[B1][B3]

小时费率 = 95,545÷12÷21.75÷8 = 45.7590996，预算取 45.76 元 / 人时。日常与集中投入采用同一费率，预算覆盖开发、文档、管理和复核的直接人工，实际支出另行登记。[B3]

成本项目	计划数量	单价及口径	金额 元
王晨人工折算	120.35 人时	45.76 元 / 人时	5507.22
刘景浩人工折算	106.20 人时	45.76 元 / 人时	4859.71
人工折算合计	226.55 人时	按未舍入金额汇总再保留两位	10366.93
项目总估算成本	人工估算与新增现金	直接人工与新增采购合计	10366.93

各执行任务人工预算 = 计划人时×45.76 元 / 人时，项目合计 10366.93 元。设备与既有工具复用，新增采购预算为 0 元。工作包、阶段及项目按下级明细汇总，实际人时与现金支出另行登记。

人工成本按计划人时乘以 45.76 元 / 人时计算。工作包、阶段及项目使用完整精度汇总，展示金额保留两位小数；实际人时与计划人时分别登记。

费率敏感性分析另采用年度人工参数 168,604 元和 173,817 元，分别折合 80.75 元 / 人时、83.25 元 / 人时。计算方法见预算工作簿，任务工作量及排期使用原控制基准。

投入安排

本期人工投入 226.55 人时、预算 10366.93 元，免费阅读与非现金激励的产品模式保持一致。集中阶段投入按周计划组织，新增工作与费用经变更评审后同步到 Project 和预算。

本报告与项目计划、系统测试计划和周会议纪要配套使用，共同支持任务执行、质量控制和阶段评审。

本附录引用

[B1] G04 人工成本估算参数表，2026 年 10 月 15 日。年度人工参数 95,545 元用于预算基准，168,604 元和 173,817 元用于费率敏感性比较；计算结果见人时人工预算工作簿。

[B2] 人工费用背景资料登记，2026 年 10 月 15 日。预算计算采用[B1]项目参数及[B3]计薪折算方法。

[B3] 人力资源社会保障部。关于职工全年月平均工作时间和工资折算问题的通知，人社部发〔2025〕2 号。中国政府网，2025 年 1 月 2 日。月计薪 21.75 天、每天 8 小时。https://app.www.gov.cn/govdata/gov/202501/02/523227/article.html 。

[B4] Atlassian．SourceTree 产品介绍与入门文档。https://www.atlassian.com/software/sourcetree；https://support.atlassian.com/sourcetree/kb/commit-push-and-pull-a-repository-on-sourcetree/ 。用于 Git 图形化协作工具选择和操作方法。

附录 F 可行性八步骤结果与工作分解

八步骤的 44 项分析分解已分配到原工作包的 10.00 人时中。每项任务与本报告第 3.5 节的分析结果对应，负责人、计划窗口、人时、人工预算、输入与完成标准在同源任务表中登记。

F1 八步骤负责人和计划窗口

FS01—FS08 对应可行性研究的八个方法步骤，44 项分析任务作为末级活动进入原工作包。每个细项均给出负责人、计划人时、输入、产物与完成标准，汇总只计末级活动。

步骤与 WBS	负责人	计划日期	计划人时	交付成果
FS01 复查系统规模和目标 2.1.1.1	王晨	10/08—10/08	1.00	输出：用户—权限表、范围清单、目标与约束。完成标准：每项目标能找到需求和验收场景，范围外功能明确列出。
FS02 研究目前正在使用的系统 2.1.1.2	王晨	10/08—10/08	1.25	输出：现状流程和问题—改进对应表。完成标准：每个改进点有具体信息断点，已有渠道中可复用的能力得到保留。
FS03 导出新系统的高层逻辑模型 2.1.2.1	王晨	10/09—10/09	1.25	输出：推导图、系统流程图、上下文 DFD、处理/存储表和字典。完成标准：物理载体图与逻辑数据流图用途分明，编号与需求模型一致。
FS04 进一步定义问题 2.1.2.2	王晨	10/12—10/12	1.00	输出：修订后的问题陈述、范围和追踪链。完成标准：目标能够通过结果判断；未把实现方式写成用户问题。
FS05 导出和评价供选择的解法 2.2.1.1	刘景浩	10/12—10/12	1.25	输出：候选方案表、优缺点、量化评分和成本区间。完成标准：至少两个可比较方案；推荐理由能追溯到共同标准。
FS06 推荐行动方针 2.2.2.1	刘景浩	10/13—10/13	1.25	输出：推荐结论、条件、备选和变更入口。完成标准：说明为何继续、选什么、在何种情况下调整。
FS07 草拟开发计划书 2.3.1.1	王晨、刘景浩	10/14—10/14	1.50	输出：正式项目计划、WBS、周安排、甘特、网络、预算和测试安排。完成标准：同一任务在各文件中的责任、日期和人时一致。

步骤与 WBS	负责人	计划日期	计划人时	交付成果
FS08 写文档提交审查 2.3.2.1	王晨、刘景浩	10/15—10/15	1.50	输出：可阅读、可追踪、可审查的资料包。完成标准：图表可辨认、页码可定位、关键结论有依据，实际审查决定另行留痕。

FS04 进一步定义问题与 FS05 方案比较在 10 月 12 日并行迭代，FS06 汇总两者结果。范围、技术条件或方案结论发生变化时，返回相应步骤修订。

FS01 复查系统规模和目标 2.1.1.1

WBS	具体任务	任务负责人	日期与投入	产物及完成标准
2.1.1.1.1	FS01.1 明确使用者	王晨	10/08 0.20 人时 9.15 元	主要读者是已明确目标岗位、准备投递和面试的校内学生；分享者是认证用户，重点邀请有实习或工作经历者。；输出：用户—权限表、范围清单、目标与约束。完成标准：每项目标能找到需求和验收场景，范围外功能明确列出。
2.1.1.1.2	FS01.2 限定业务边界	王晨	10/08 0.20 人时 9.15 元	本期提供经验文章、评论、非现金认可、自愿站外联系、社区治理和独立运维；不建立咨询订单、现金交易和站内即时通信。；输出：用户—权限表、范围清单、目标与约束。完成标准：每项目标能找到需求和验收场景，范围外功能明确列出。
2.1.1.1.3	FS01.3 划分访问权限	王晨	10/08 0.20 人时 9.15 元	未登录和未认证者阅读公开文章；作者主页、评论、联系方式与互动要求校园认证；社区管理与运维权限分别授予。；输出：用户—权限表、范围清单、目标与约束。完成标准：每项目标能找到需求和验收场景，范围外功能明确列出。
2.1.1.1.4	FS01.4 把目标写成检查项	王晨	10/08 0.20 人时 9.15 元	按岗位检索，并组合公司、经历专业筛选；同一账号跨端使用；重复投币请求不重复记账；管理人员能定位举报对象。；输出：用户—权限表、范围清单、目标与约束。完成标准：每项目标能找到需求和验收场景，范围外功能明确列出。

WBS	具体任务	任务负责人	日期与投入	产物及完成标准
2.1.1.1.5	FS01.5 核对规模和约束	王晨	10/08 0.20 人时 9.15 元	按 52 项功能标识管理，其中 50 项本期、2 项未来；12 项非功能要求。两名成员，课堂本机演示，226.55 人时控制额。；输出：用户—权限表、范围清单、目标与约束。完成标准：每项目标能找到需求和验收场景，范围外功能明确列出。

FS02 研究目前正在使用的系统 2.1.1.2

WBS	具体任务	任务负责人	日期与投入	产物及完成标准
2.1.1.2.1	FS02.1 列出当前渠道	王晨	10/08 0.25 人时 11.44 元	招聘网站提供职位与公司入口；内容平台提供经验；群聊和个人联系用于补充；文档、收藏及网盘保存资料。；输出：现状流程和问题—改进对应表。完成标准：每个改进点有具体信息断点，已有渠道中可复用的能力得到保留。
2.1.1.2.2	FS02.2 保留已有有效能力	王晨	10/08 0.25 人时 11.44 元	保留招聘网站查岗位和外部资料链接；平台不重复建设企业招聘系统、网盘和社交通信服务。；输出：现状流程和问题—改进对应表。完成标准：每个改进点有具体信息断点，已有渠道中可复用的能力得到保留。
2.1.1.2.3	FS02.3 还原当前处理步骤	王晨	10/08 0.25 人时 11.44 元	先看岗位要求，再检索经验、人工判断适用性、分别收藏，剩余问题另找人询问。下图展示数据经过哪些载体。；输出：现状流程和问题—改进对应表。完成标准：每个改进点有具体信息断点，已有渠道中可复用的能力得到保留。
2.1.1.2.4	FS02.4 定位信息断点	王晨	10/08 0.25 人时 11.44 元	经历起点难比较；同专业和同岗位信息分散；评论答复难持续复用；公开联系意愿不清楚。；输出：现状流程和问题—改进对应表。完成标准：每个改进点有具体信息断点，已有渠道中可复用的能力得到保留。

WBS	具体任务	任务负责人	日期与投入	产物及完成标准
2.1.1.2.5	FS02.5 把不足变成改进输入	王晨	10/08 0.25 人时 11.44 元	增加经历背景、岗位与专业筛选、稳定文章链接及评论上下文；联系由作者开关控制。后续走查核对实际使用效果。；输出：现状流程和问题—改进对应表。完成标准：每个改进点有具体信息断点，已有渠道中可复用的能力得到保留。

FS03 导出新系统的高层逻辑模型　2.1.2.1

WBS	具体任务	任务负责人	日期与投入	产物及完成标准
2.1.2.1.1	FS03.1 抽去现状工具名称	王晨	10/09 0.25 人时 11.44 元	将“网站、群聊、网盘”等物理载体抽象为信息检索、适用性比较、经验保存和问题补充。；输出：推导图、系统流程图、上下文 DFD、处理/存储表和字典。完成标准：物理载体图与逻辑数据流图用途分明，编号与需求模型一致。
2.1.2.1.2	FS03.2 定义系统边界	王晨	10/09 0.20 人时 9.15 元	外部实体 E1 用户、E2 社区管理员、E3 运维管理员、E4 邮件服务、E5 受控运行环境；系统为 P0。；输出：推导图、系统流程图、上下文 DFD、处理/存储表和字典。完成标准：物理载体图与逻辑数据流图用途分明，编号与需求模型一致。
2.1.2.1.3	FS03.3 明确输入与输出	王晨	10/09 0.20 人时 9.15 元	以 F01—F10 记录用户、治理、运维、邮件和执行请求及结果，逐一给出方向、名称及数据组成。；输出：推导图、系统流程图、上下文 DFD、处理/存储表和字典。完成标准：物理载体图与逻辑数据流图用途分明，编号与需求模型一致。
2.1.2.1.4	FS03.4 分解主要逻辑处理	王晨	10/09 0.20 人时 9.15 元	P1 身份与权限、P2 经验内容、P3 交流与激励、P4 社区治理、P5 独立运维；分别关联 D1—D6 逻辑存储。；输出：推导图、系统流程图、上下文 DFD、处理/存储表和字典。完成标准：物理载体图与逻辑数据流图用途分明，编号与需求模型一致。

WBS	具体任务	任务负责人	日期与投入	产物及完成标准
2.1.2.1.5	FS03.5 建立字典并检查平衡	王晨	10/09 0.20 人时 9.15 元	父层外部输入输出在下层分配，名称与结构可追踪；原子字段、组合结构和语义约束分别定义。；输出：推导图、系统流程图、上下文 DFD、处理/存储表和字典。完成标准：物理载体图与逻辑数据流图用途分明，编号与需求模型一致。
2.1.2.1.6	FS03.6 推导目标物理实现	王晨	10/09 0.20 人时 9.15 元	在逻辑模型稳定后选择微信原生小程序与独立 Vue 网页、共享 Java 服务、MySQL、文件和独立运维执行器。系统流程图与 DFD 分开绘制。；输出：推导图、系统流程图、上下文 DFD、处理/存储表和字典。完成标准：物理载体图与逻辑数据流图用途分明，编号与需求模型一致。

FS04 进一步定义问题　2.1.2.2

WBS	具体任务	任务负责人	日期与投入	产物及完成标准
2.1.2.2.1	FS04.1 重写核心问题	王晨	10/12 0.20 人时 9.15 元	准备投递和面试的学生难以快速找到与目标岗位、专业和基础相近的亲历经验，并继续围绕内容交流。；输出：修订后的问题陈述、范围和追踪链。完成标准：目标能够通过结果判断；未把实现方式写成用户问题。
2.1.2.2.2	FS04.2 拆开问题与解决手段	王晨	10/12 0.20 人时 9.15 元	问题是经验适用性、可检索和可复用性；“小程序”“投币”是候选手段，不能直接代替问题描述。；输出：修订后的问题陈述、范围和追踪链。完成标准：目标能够通过结果判断；未把实现方式写成用户问题。
2.1.2.2.3	FS04.3 收紧本期范围	王晨	10/12 0.20 人时 9.15 元	招聘投递、咨询担保、付费阅读、考研考公、校园跑腿不纳入；毕业材料认证和微信绑定转后续需求。；输出：修订后的问题陈述、范围和追踪链。完成标准：目标能够通过结果判断；未把实现方式写成用户问题。

WBS	具体任务	任务负责人	日期与投入	产物及完成标准
2.1.2.2.4	FS04.4 补充反例和限制	王晨	10/12 0.20 人时 9.15 元	同专业筛选依据作者分享经历对应的专业；公开邮箱不出现；作者关闭联系入口后不再提供联系方式。；输出：修订后的问题陈述、范围和追踪链。完成标准：目标能够通过结果判断；未把实现方式写成用户问题。
2.1.2.2.5	FS04.5 形成反馈和关闭方式	王晨	10/12 0.20 人时 9.15 元	范围、权限或用户目标有冲突时回到 FS01—FS03；变更进入需求参数与决定表，经双方评审后更新基准。；输出：修订后的问题陈述、范围和追踪链。完成标准：目标能够通过结果判断；未把实现方式写成用户问题。

FS05 导出和评价供选择的解法　2.2.1.1

WBS	具体任务	任务负责人	日期与投入	产物及完成标准
2.2.1.1.1	FS05.1 形成六类解法	刘景浩	10/12 0.25 人时 11.44 元	A 微信原生小程序＋独立 Vue 网页；B 原生微信小程序＋独立网页；C 响应式网页；D 跨平台 App＋网页；E 原生双移动端＋网页；F 现有工具组合。；输出：候选方案表、优缺点、量化评分和成本区间。完成标准：至少两个可比较方案；推荐理由能追溯到共同标准。
2.2.1.1.2	FS05.2 使用同一评价基准	刘景浩	10/12 0.20 人时 9.15 元	按需求覆盖 25%、接触便利 20%、团队能力 20%、周期成本 20%、维护扩展 15%比较，不为某一解法单独改变范围。；输出：候选方案表、优缺点、量化评分和成本区间。完成标准：至少两个可比较方案；推荐理由能追溯到共同标准。
2.2.1.1.3	FS05.3 逐项比较小程序与 App	刘景浩	10/12 0.20 人时 9.15 元	比较进入方式、移动创作、审核发布、设备能力、维护量和双端复用；网页补充桌面长文创作。；输出：候选方案表、优缺点、量化评分和成本区间。完成标准：至少两个可比较方案；推荐理由能追溯到共同标准。

WBS	具体任务	任务负责人	日期与投入	产物及完成标准
2.2.1.1.4	FS05.4 评估成员与工具能力	刘景浩	10/12 0.20 人时 9.15 元	两人协作；WorkBuddy 承担前端辅助，Codex/GPT 辅助后端；学生负责需求、复核、测试及交付，AI 生成不等于完成。；输出：候选方案表、优缺点、量化评分和成本区间。完成标准：至少两个可比较方案；推荐理由能追溯到共同标准。
2.2.1.1.5	FS05.5 换算工作量和人工成本	刘景浩	10/12 0.20 人时 9.15 元	A 按 226.55 人时、45.76 元/人时测算 10366.93 元；其他解法采用相同单价按工作量增减比较，详见第 4 章。；输出：候选方案表、优缺点、量化评分和成本区间。完成标准：至少两个可比较方案；推荐理由能追溯到共同标准。
2.2.1.1.6	FS05.6 计算并解释评分	刘景浩	10/12 0.20 人时 9.15 元	A89、B78、C84、D66、E47、F72 分。评分是本项目约束下的方案判断，附录 D 列出权重、原始分和理由。；输出：候选方案表、优缺点、量化评分和成本区间。完成标准：至少两个可比较方案；推荐理由能追溯到共同标准。

FS06 推荐行动方针　2.2.2.1

WBS	具体任务	任务负责人	日期与投入	产物及完成标准
2.2.2.1.1	FS06.1 明确继续与否	刘景浩	10/13 0.25 人时 11.44 元	建议按限定范围继续推进需求和设计，以微信原生小程序＋独立 Vue 网页共享 Java 后端为推荐方案。；输出：推荐结论、条件、备选和变更入口。完成标准：说明为何继续、选什么、在何种情况下调整。
2.2.2.1.2	FS06.2 给出推荐理由	刘景浩	10/13 0.25 人时 11.44 元	移动入口适合随时阅读和基础创作；网页适合 Markdown 长文；共享身份、内容和治理规则，减少重复实现。；输出：推荐结论、条件、备选和变更入口。完成标准：说明为何继续、选什么、在何种情况下调整。

WBS	具体任务	任务负责人	日期与投入	产物及完成标准
2.2.2.1.3	FS06.3 说明备选方针	刘景浩	10/13 0.25 人时 11.44 元	若发布或双端投入显著超出控制额，保留响应式网页作为缩减方案；须经变更确认，不能直接替换交付范围。；输出：推荐结论、条件、备选和变更入口。完成标准：说明为何继续、选什么、在何种情况下调整。
2.2.2.1.4	FS06.4 定义继续条件	刘景浩	10/13 0.25 人时 11.44 元	需求模型与验收可追踪、跨端编辑不破坏正文、权限拒绝有效、投币一致性及受控恢复有可执行验证方案。；输出：推荐结论、条件、备选和变更入口。完成标准：说明为何继续、选什么、在何种情况下调整。
2.2.2.1.5	FS06.5 定义调整触发点	刘景浩	10/13 0.25 人时 11.44 元	真实用户走查出现关键任务失败、邮箱链路不可用、核心资源超负荷、测试发现阻断风险时，组织评审并修订计划。；输出：推荐结论、条件、备选和变更入口。完成标准：说明为何继续、选什么、在何种情况下调整。

FS07 草拟开发计划书　2.3.1.1

WBS	具体任务	任务负责人	日期与投入	产物及完成标准
2.3.1.1.1	FS07.1 分解交付工作	王晨、刘景浩	10/14 0.25 人时 11.44 元	以 8 个工程工作域、52 个工作包管理；工作包继续分到具体任务、负责人、起止日期、前置与完成标准。；输出：正式项目计划、WBS、周安排、甘特、网络、预算和测试安排。完成标准：同一任务在各文件中的责任、日期和人时一致。
2.3.1.1.2	FS07.2 估算人时与人员分配	王晨、刘景浩	10/14 0.25 人时 11.44 元	项目 226.55 人时：王晨 120.35、刘景浩 106.20；开发、文档、管理和交叉复核均计入，不只计算编程。；输出：正式项目计划、WBS、周安排、甘特、网络、预算和测试安排。完成标准：同一任务在各文件中的责任、日期和人时一致。

WBS	具体任务	任务负责人	日期与投入	产物及完成标准
2.3.1.1.3	FS07.3 建立依赖与排期	王晨、刘景浩	10/14 0.25 人时 11.44 元	使用原生 Project 维护依赖、阶段甘特和工程网络；总日历 64 个工作日，2027 年 1 月 6 日收尾。；输出：正式项目计划、WBS、周安排、甘特、网络、预算和测试安排。完成标准：同一任务在各文件中的责任、日期和人时一致。
2.3.1.1.4	FS07.4 核算成本与资源	王晨、刘景浩	10/14 0.25 人时 11.44 元	人工估算按 45.76 元/人时，总 10366.93 元；复用现有设备，不另列 AI 订阅。资源、风险和管理预留按计划管理。；输出：正式项目计划、WBS、周安排、甘特、网络、预算和测试安排。完成标准：同一任务在各文件中的责任、日期和人时一致。
2.3.1.1.5	FS07.5 细排下一需求阶段	王晨、刘景浩	10/14 0.25 人时 11.44 元	3.6 在 10/28—29 完成范围与三模型；3.7 在 10/30 完成字典及辅助图；3.8 在 11/2 走查；3.9 在 11/3 闭环材料。合计 20 人时。；输出：正式项目计划、WBS、周安排、甘特、网络、预算和测试安排。完成标准：同一任务在各文件中的责任、日期和人时一致。
2.3.1.1.6	FS07.6 安排监督与调整	王晨、刘景浩	10/14 0.25 人时 11.44 元	组长周检查进度、风险和变更；双方评审交接、分支合并与测试证据；课堂意见在后续工作包处理。；输出：正式项目计划、WBS、周安排、甘特、网络、预算和测试安排。完成标准：同一任务在各文件中的责任、日期和人时一致。

FS08 写文档提交审查　2.3.2.1

WBS	具体任务	任务负责人	日期与投入	产物及完成标准

WBS	具体任务	任务负责人	日期与投入	产物及完成标准
2.3.2.1.1	FS08.1 组织完整报告	王晨、刘景浩	10/15 0.25 人时 11.44 元	保留 GB/T 8567—2006 可行性研究报告的正文结构，在第 3.5 节逐步展示八步；项目计划列在材料包前。；输出：可阅读、可追踪、可审查的资料包。完成标准：图表可辨认、页码可定位、关键结论有依据，实际审查决定另行留痕。
2.3.2.1.2	FS08.2 标记版本及输入	王晨、刘景浩	10/15 0.25 人时 11.44 元	报告 V1.4、G04-FAR-20261028-02；引用 70 页需求课件、58 页可行性课件、评审表及现行计划和 SRS。；输出：可阅读、可追踪、可审查的资料包。完成标准：图表可辨认、页码可定位、关键结论有依据，实际审查决定另行留痕。
2.3.2.1.3	FS08.3 核对图文一致	王晨、刘景浩	10/15 0.25 人时 11.44 元	检查 P1—P5、D1—D6、F01—F10、需求编号、当前预算及版本；三模型、字典和案例同用一套数据规则。；输出：可阅读、可追踪、可审查的资料包。完成标准：图表可辨认、页码可定位、关键结论有依据，实际审查决定另行留痕。
2.3.2.1.4	FS08.4 编制审查索引	王晨、刘景浩	10/15 0.25 人时 11.44 元	八步成果导航给出正文页码；课件主题给出图号；计划 16 项与需求 11 项评审分别列位置与材料。；输出：可阅读、可追踪、可审查的资料包。完成标准：图表可辨认、页码可定位、关键结论有依据，实际审查决定另行留痕。
2.3.2.1.5	FS08.5 区分记录与待办	王晨、刘景浩	10/15 0.25 人时 11.44 元	历史会议和评分保留原日期；当前代表用户走查、需求周会和签认由实际参与者完成后填写。；输出：可阅读、可追踪、可审查的资料包。完成标准：图表可辨认、页码可定位、关键结论有依据，实际审查决定另行留痕。

WBS	具体任务	任务负责人	日期与投入	产物及完成标准
2.3.2.1.6	FS08.6 接收决定并闭环	王晨、刘景浩	10/15 0.25 人时 11.44 元	评审意见进入问题单，注明负责人、修改文件、关闭证据和确认日期；影响范围、人时或日期时提交变更并同步计划。；输出：可阅读、可追踪、可审查的资料包。完成标准：图表可辨认、页码可定位、关键结论有依据，实际审查决定另行留痕。

需求分析在项目计划附录 I 继续细化为 44 项任务，覆盖需求获取、综合要求、原型、ER、DFD、字典正则、规范化、STD、辅助图和需求验证。原 3.6—3.9 的 20 人时属于需求阶段工作，不能再与八步 10 人时重复列入估算。

附录 G 需求阶段 11 项评审交接

本表对应需求阶段 11 项评审要求，列出后续成果、责任与证据。计划阶段 16 项对照见附录 A，需求阶段成员评价与用户确认按对应里程碑记录。[13]

评审项	本批材料	责任与执行入口
1 PPT	项目介绍、可行性八步、需求三模型和计划；配套制作提示词	3.9.2；王晨汇总，刘景浩核对
2 阶段成果	可研、需求分析、SRS、模型、字典、原型、计划与索引	3.9.2；双方
3 计划调整	需求修订 3.6—3.9；20 人时；日期与资源沿用当前基线	王晨管理，双方复核
4 会议	真实会议日期、地点/腾讯会议、问题及下周责任；另附模板	M04—M05；实际召开后登记
5 成员评价	历史 10 月 17 日 91.0/90.5 不充作本期评价	3.9；按真实成果双方确认
6 用户类别/代表	读者、作者、社区/运维管理员；需求联系人和代表登记表	3.6.1、3.8；双方
7 原型	14 页可导航线框与关键任务	3.8.1；刘景浩主责
8 用户确认	实际走查反馈、修改和参与者确认	3.8.2；刘景浩组织，双方
9 SRS	52 项 FR 标识、12 项 NFR 与 64 项追踪	3.9.1；王晨主责
10 字典 ER	27 实体 134 字段、组合/正则/语义及三模型	3.6.2、3.7；王晨主责、刘景浩复核
11 配置管理	版本、摘要、Git/GitHub/SourceTree 和提交核查	3.9.2；王晨管理，双方

附录 H 高层数据字典与形式化规则

本附录与当前需求模型共用 P1—P5、D1—D6 及 F01—F10 编号。完整下层数据流、27 实体 134 字段及约束见需求分析配套字典；此处保留可行性研究所需的高层逻辑。

H1 组合定义与记号

记号	含义与示例
+	连接：BusinessResult=status+code+message+traceId+(data)
[A|B]	择一：ContentBlock=[TextBlock|ImageRef|SourceLink]
(A)	可选：(companyId)
n{A}m	重复：1{ContentBlock}表示至少一个内容块

H2 边界数据流

编号	方向	名称	组成
F01	E1→P0	用户业务请求	认证输入+检索条件+创作输入+互动输入+举报反馈
F02	P0→E1	用户业务结果	认证结果+公开文章+受限资料+互动结果+案件回执
F03	E2→P0	治理请求	案件筛选+处置理由+目标
F04	P0→E2	治理结果	案件详情+关联文章评论+处置结果
F05	E3→P0	运维请求	受控操作+目标+二次确认+幂等键
F06	P0→E3	运维结果	状态+脱敏日志+备份清单+执行结果
F07	P0→E4	验证码邮件	投递地址+模板+验证码
F08	E4→P0	邮件回执	请求标识+投递结果
F09	P0→E5	受控执行请求	任务标识+白名单操作+目标+备份清单
F10	E5→P0	运行结果	任务状态+执行日志+校验结果

H3 主要组合结构

结构	定义
ArticleInput	title + jobId + (companyId) + (majorId) + experienceStage + startingPoint + 1{ContentBlock} + expectedRevision

结构	定义
ContentBlock	[TextBlock|ImageRef|SourceLink]
TextBlock	text
ImageRef	mediaId + position + (caption)
SourceLink	url + description
AuthInput	email + password + challengeId + code
InteractionInput	articleId + [CommentInput|ReactionInput|CoinInput|RewardInput|ContactQuery]
CoinInput	amount + requestKey；amount∈{1,2}，累计而非单次额度≤2
CaseInput	kind + targetType + (targetId) + reason + {EvidenceImage}
OpsInput	operation + target + requestKey + (backupId) + confirmation
BusinessResult	status + code + message + traceId + (data)

H4 数据存储

存储	内容
D1 账号认证资料	账号(Account)；个人资料(Profile)；校园认证(Certification)；邮箱校验(EmailChallenge)；校内专业(Major)；登录会话(Session)
D2 经验版本与文件	经验文章(Article)；正文版本(ArticleVersion)；图片资料(Media)；正文图片引用(MediaRef)；岗位(Job)；公司(Company)
D3 评论认可收藏	评论回复(Comment)；认可收藏(Reaction)
D4 奖励币与贡献	可用币账户(Wallet)；币账本事件(CoinEntry)；作者贡献(Contribution)；荣誉规则(HonorRule)；作者荣誉(HonorAward)；阅读奖励进度(ReadProgress)
D5 举报反馈与处置	举报反馈(Case)；处理动作(ModerationAction)；管理身份(AdminIdentity)；业务通知(Notification)
D6 任务备份与审计	运维任务(OpsJob)；备份清单(Backup)；审计日志(AuditEvent)

H5 加工与规则

处理	输入与输出	关键约束

处理	输入与输出	关键约束
P1 身份与权限	认证凭证/验证码→认证结果和权限	仅校园邮箱注册；邮箱私有；管理角色分别授予
P2 经验内容	检索/创作输入→文章、版本和文件引用	仅公开版本对外读；本人草稿私有；跨端保留内容
P3 交流与激励	互动输入→评论、认可、奖励、账本结果	登录 2 币；阅读 180 秒 1 币且每日最多一次；每人每篇累计最多投 2 币；幂等原子入账
P4 社区治理	举报反馈/处置→案件与治理结果	先发布后管理；关联原文与评论；记录处理人和理由
P5 独立运维	白名单操作→任务/备份/审计结果	社区权限不能运维；危险操作确认；失败可追溯和恢复

H6 原子数据与语义

元素	类型与约束	语义检查
accountId/articleId	正整数标识	真实存在；按权限访问；不以数字合法替代对象校验
amount/balance	整数；amount∈{1,2}，balance≥0	累计投币≤2、禁止自投、不得透支
requestKey	8—64 位字母数字_或-	同用户、业务与键返回同一结果
majorId/companyId	可选分类引用	指向有效分类；专业按经历背景解释
traceId	请求追踪标识	关联脱敏日志，日志不保存密码和验证码

H7 正则规则与边界

字段	正则
校园邮箱	^[A-Za-z0-9._%+-]+@stu\.hzcu\.edu\.cn$
验证码	^[0-9]{6}$
普通数字标识	^[1-9][0-9]{0,18}$
UUID 校验标识	^[0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{12}$
幂等键	^[A-Za-z0-9_-]{8,64}$
业务日期	^\d{4}-\d{2}-\d{2}$

字段	正则
可见状态	^(DRAFT|PUBLIC|WITHDRAWN|HIDDEN)$
运维操作	^(DEPLOY|RESTART|BACKUP|RESTORE)$
资料链接	^https?://[^\s]+$

正则只检查字符形式；日期有效性、引用存在性、认证资格、额度和幂等语义由处理规则补充。需求分析报告第 5 章展示正例、反例与逐层定义。

附录 I 课程方法与成果对照

本表定位课程方法的实际采用位置，模型完整性另由同源图、字典和边界检查核对。

课件主题	具体应用	显著展示位置
2.1 研究任务	比较技术、经济、使用与法律等可行性	第 4、6—10 章
2.2 八步骤	44 项具体分解、输入、结果和完成标准	第 3.5 节；八步骤成果导航
2.3 系统流程图	程序、输入输出、数据库/文件/备份载体及物理数据流	第 5.2.1 节图 5-1
2.4 数据流图	外部实体、逻辑处理、数据流与存储；场景摘图和完整模型索引	第 5.2.2—3 节图 5-2、5-3
2.5 数据字典	流、结构、存储、加工、元素；组合与正则/语义约束	附录 H；需求分析第 5 章
2.6 估算多法比较	WBS226.55 与三点 234.00 人时交叉检查	第 6.1 节、附录 J
2.6 效益方法	时间价值、NPV、回收期、IRR 场景演算	第 6.2 节

附录 J 工作量三点估计与交叉检查

本附录按相同产品范围和全生命周期直接人工进行三点估计。参数根据成果范围、可复用内容和返工情景编制；期望值采用 E = (O + 4M + P) / 6，公式依据见[18]。

成果领域	乐观 O	最可能 M	悲观 P	期望 E
计划与可研	12	16	24	16.67
需求与原型	12	18	28	18.67
设计	22	30	46	31.33
实现与单元验证	40	60	90	61.67
综合验证	16	24	40	25.33
部署交接与收尾	22	30	44	31.00
持续协调与交叉复核	20	28	40	28.67
需求模型补充	16	20	28	20.67

单位均为团队人时。期望值先按完整精度汇总再显示两位小数，成本采用 45.76 元 / 人时；不将显示行的舍入误差带入控制总额。

成果领域	估计覆盖	乐观与悲观依据
计划与可研	范围决策、方案研究、评审材料和一次修订	复用现有材料；悲观情况增加一次选型或材料重做。
需求与原型	四类角色、双端创作及管理异常的需求确认	原型一次形成；悲观情况需多轮用户反馈。
设计	接口、数据、权限、事务及独立恢复方案	共享单体路线；悲观情况重做跨端格式或恢复设计。
实现与单元验证	身份、文章、移动创作、互动币、治理及独立运维	复用现有框架；悲观情况编辑器、幂等或执行器返工。
综合验证	功能、越权、性能、稳定性、恢复及缺陷复测	正常一次回归；悲观情况增加故障定位及第二轮验收。

成果领域	估计覆盖	乐观与悲观依据
部署交接与收尾	冷启动、操作手册、备份交接、汇报与归档	本地课堂环境；悲观情况增加环境重建和归档返工。
持续协调与交叉复核	全周期周会、接口协调、代码和文档交叉审查	周会贯穿周期；悲观情况增加接口协调和修订。

三点估计期望工作量为 234.00 人时、成本 10707.84 元，比 WBS 基准多 7.45 人时、约 3.29%。计划控制基准保持 226.55 人时、10366.93 元，差额用于周检和风险分析；追加投入通过双方确认后同步到 Project 与预算。

O、M、P 分别表示乐观、最可能和悲观场景工作量，结果用于估算敏感性分析。实际投入按工作日志登记，会议、开发、文档和复核分别归类。

会议与用户研究状态（2026 年 11 月 4 日核对）：10 月 31 日双方共同评审文档，阶段综合评分王晨 91.2、刘景浩 91.3。独立任务完成证据未留存；真实用户访谈和原型任务走查尚未开展，原定任务日期不作为实际完成证明。后续按当前 WBS 执行并保存问题、修改和确认记录。
