

城院帮 G04 项目计划 | 可行性八步与需求细化 | Microsoft Project 原生甘特图 | 青色王晨 蓝色刘景浩 紫色共同完成


标识号	名称	计划人时	开始时间	完成时间	前置任务	任务负责人	成本
1	**1 项目计划与评审**	**6人时**	**26/10/8**	**26/10/15**		**按下级分配**	**¥274.56**
2	**1.1 任务分解、排期与资源预算**	**2人时**	**26/10/8**	**26/10/8**		**王晨、刘景浩**	**¥91.52**
3	1.1.1 确认WBS、依赖与提交边界	1人时	26/10/8	26/10/8		王晨、刘景浩	¥45.76
4	1.1.2 建立资源预算与风险安排	1人时	26/10/8	26/10/8	3	王晨、刘景浩	¥45.76
5	**1.2 项目计划内部复核与汇报材料**	**2人时**	**26/10/9**	**26/10/9**		**王晨、刘景浩**	**¥91.52**
6	1.2.1 逐条检查评审要求与计划	1人时	26/10/9	26/10/9	4	王晨、刘景浩	¥45.76
7	1.2.2 确认汇报材料与提交清单	1人时	26/10/9	26/10/9	6	王晨、刘景浩	¥45.76
8	**1.3 项目计划评审反馈与修订**	**2人时**	**26/10/15**	**26/10/15**		**王晨、刘景浩**	**¥91.52**
9	1.3.1 登记课堂计划意见与影响	1人时	26/10/15	26/10/15	7	王晨、刘景浩	¥45.76
10	1.3.2 共同修订排期与计划基线	1人时	26/10/15	26/10/15	9	王晨、刘景浩	¥45.76
11	**2 可行性研究**	**10人时**	**26/10/8**	**26/10/15**		**按下级分配**	**¥457.60**
12	**2.1 关键技术与工具可行性验证**	**4.5人时**	**26/10/8**	**26/10/12**		**王晨**	**¥205.92**
13	**2.1.1 验证双端构建与邮箱条件**	**2.25人时**	**26/10/8**	**26/10/8**		**王晨**	**¥102.96**
14	**2.1.1.1 FS01 复查系统规模和目标**	**1人时**	**26/10/8**	**26/10/8**		**王晨**	**¥45.76**
15	2.1.1.1.1 FS01.1 明确使用者	0.2人时	26/10/8	26/10/8		王晨	¥9.15
16	2.1.1.1.2 FS01.2 限定业务边界	0.2人时	26/10/8	26/10/8	15	王晨	¥9.15
17	2.1.1.1.3 FS01.3 划分访问权限	0.2人时	26/10/8	26/10/8	16	王晨	¥9.15
18	2.1.1.1.4 FS01.4 把目标写成检查项	0.2人时	26/10/8	26/10/8	17	王晨	¥9.15
19	2.1.1.1.5 FS01.5 核对规模和约束	0.2人时	26/10/8	26/10/8	18	王晨	¥9.15
20	**2.1.1.2 FS02 研究目前正在使用的系统**	**1.25人时**	**26/10/8**	**26/10/8**	**14**	**王晨**	**¥57.20**
21	2.1.1.2.1 FS02.1 列出当前渠道	0.25人时	26/10/8	26/10/8	14	王晨	¥11.44
22	2.1.1.2.2 FS02.2 保留已有有效能力	0.25人时	26/10/8	26/10/8	21	王晨	¥11.44
23	2.1.1.2.3 FS02.3 还原当前处理步骤	0.25人时	26/10/8	26/10/8	22	王晨	¥11.44
24	2.1.1.2.4 FS02.4 定位信息断点	0.25人时	26/10/8	26/10/8	23	王晨	¥11.44

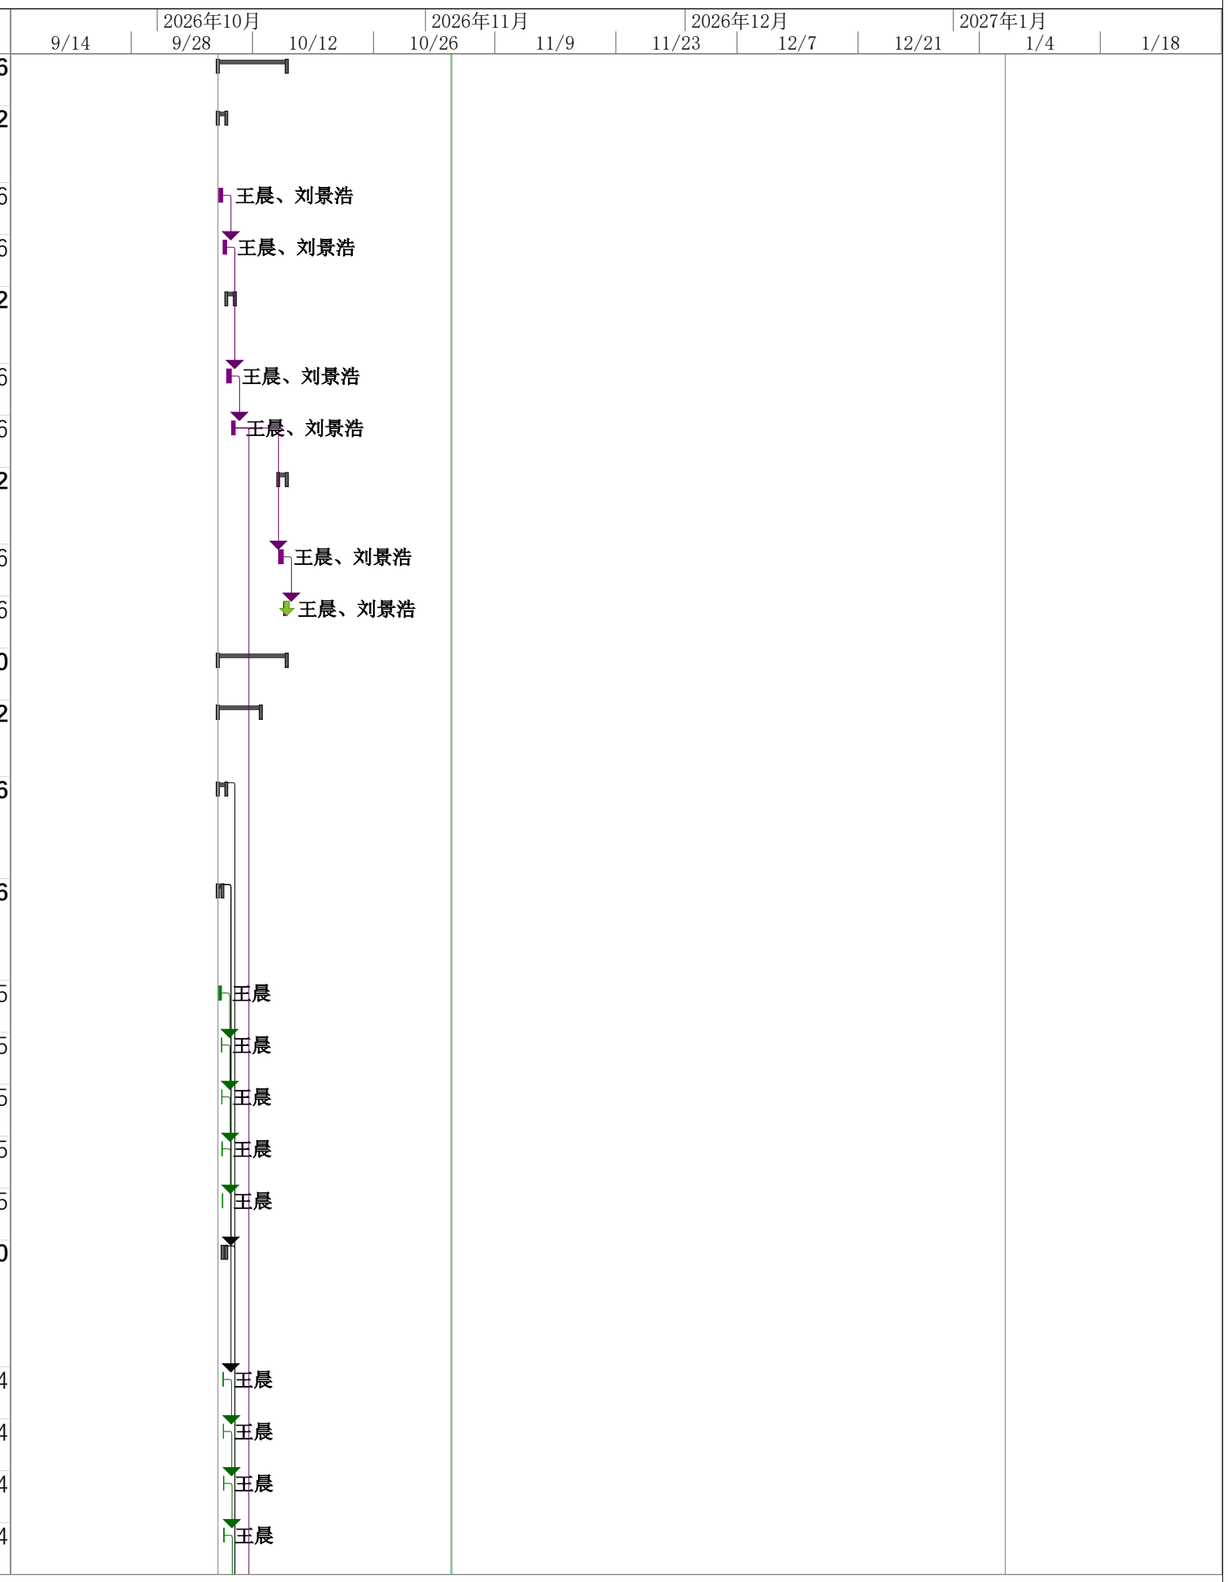


标识号	名称	计划人时	开始时间	完成时间	前置任务	任务负责人	成本
25	2.1.1.2.5 FS02.5 把不足变成改进输入	0.25人时	26/10/8	26/10/8	24	王晨	¥11.44
26	**2.1.2 核查独立运维、存储与恢复路径**	**2.25人时**	**26/10/9**	**26/10/12**	**13**	**王晨**	**¥102.96**
27	**2.1.2.1 FS03 导出新系统的高层逻辑模型**	**1.25人时**	**26/10/9**	**26/10/9**	**20**	**王晨**	**¥57.20**
28	2.1.2.1.1 FS03.1 抽去现状工具名称	0.25人时	26/10/9	26/10/9	20	王晨	¥11.44
29	2.1.2.1.2 FS03.2 定义系统边界	0.2人时	26/10/9	26/10/9	28	王晨	¥9.15
30	2.1.2.1.3 FS03.3 明确输入与输出	0.2人时	26/10/9	26/10/9	29	王晨	¥9.15
31	2.1.2.1.4 FS03.4 分解主要逻辑处理	0.2人时	26/10/9	26/10/9	30	王晨	¥9.15
32	2.1.2.1.5 FS03.5 建立字典并检查平衡	0.2人时	26/10/9	26/10/9	31	王晨	¥9.15
33	2.1.2.1.6 FS03.6 推导目标物理实现	0.2人时	26/10/9	26/10/9	32	王晨	¥9.15
34	**2.1.2.2 FS04 进一步定义问题**	**1人时**	**26/10/12**	**26/10/12**	**27**	**王晨**	**¥45.76**
35	2.1.2.2.1 FS04.1 重写核心问题	0.2人时	26/10/12	26/10/12	27	王晨	¥9.15
36	2.1.2.2.2 FS04.2 拆开问题与解决手段	0.2人时	26/10/12	26/10/12	35	王晨	¥9.15
37	2.1.2.2.3 FS04.3 收紧本期范围	0.2人时	26/10/12	26/10/12	36	王晨	¥9.15
38	2.1.2.2.4 FS04.4 补充反例和限制	0.2人时	26/10/12	26/10/12	37	王晨	¥9.15
39	2.1.2.2.5 FS04.5 形成反馈和关闭方式	0.2人时	26/10/12	26/10/12	38	王晨	¥9.15
40	**2.2 经济、操作及内容供给分析**	**2.5人时**	**26/10/12**	**26/10/13**		**刘景浩**	**¥114.40**
41	**2.2.1 核查工具、设备与现金费用**	**1.25人时**	**26/10/12**	**26/10/12**	**7**	**刘景浩**	**¥57.20**
42	**2.2.1.1 FS05 导出和评价供选择的解法**	**1.25人时**	**26/10/12**	**26/10/12**	**27**	**刘景浩**	**¥57.20**
43	2.2.1.1.1 FS05.1 形成六类解法	0.25人时	26/10/12	26/10/12	27	刘景浩	¥11.44
44	2.2.1.1.2 FS05.2 使用同一评价基准	0.2人时	26/10/12	26/10/12	43	刘景浩	¥9.15
45	2.2.1.1.3 FS05.3 逐项比较小程序与App	0.2人时	26/10/12	26/10/12	44	刘景浩	¥9.15
46	2.2.1.1.4 FS05.4 评估成员与工具能力	0.2人时	26/10/12	26/10/12	45	刘景浩	¥9.15
47	2.2.1.1.5 FS05.5 换算工作量和人工成本	0.2人时	26/10/12	26/10/12	46	刘景浩	¥9.15
48	2.2.1.1.6 FS05.6 计算并解释评分	0.2人时	26/10/12	26/10/12	47	刘景浩	¥9.15
49	**2.2.2 分析资料来源、作者邀请与操作成本**	**1.25人时**	**26/10/13**	**26/10/13**	**41**	**刘景浩**	**¥57.20**
50	**2.2.2.1 FS06 推荐行动方针**	**1.25人时**	**26/10/13**	**26/10/13**	**34,42**	**刘景浩**	**¥57.20**
51	2.2.2.1.1 FS06.1 明确继续与否	0.25人时	26/10/13	26/10/13	34,42	刘景浩	¥11.44
52	2.2.2.1.2 FS06.2 给出推荐理由	0.25人时	26/10/13	26/10/13	51	刘景浩	¥11.44
53	2.2.2.1.3 FS06.3 说明备选方针	0.25人时	26/10/13	26/10/13	52	刘景浩	¥11.44

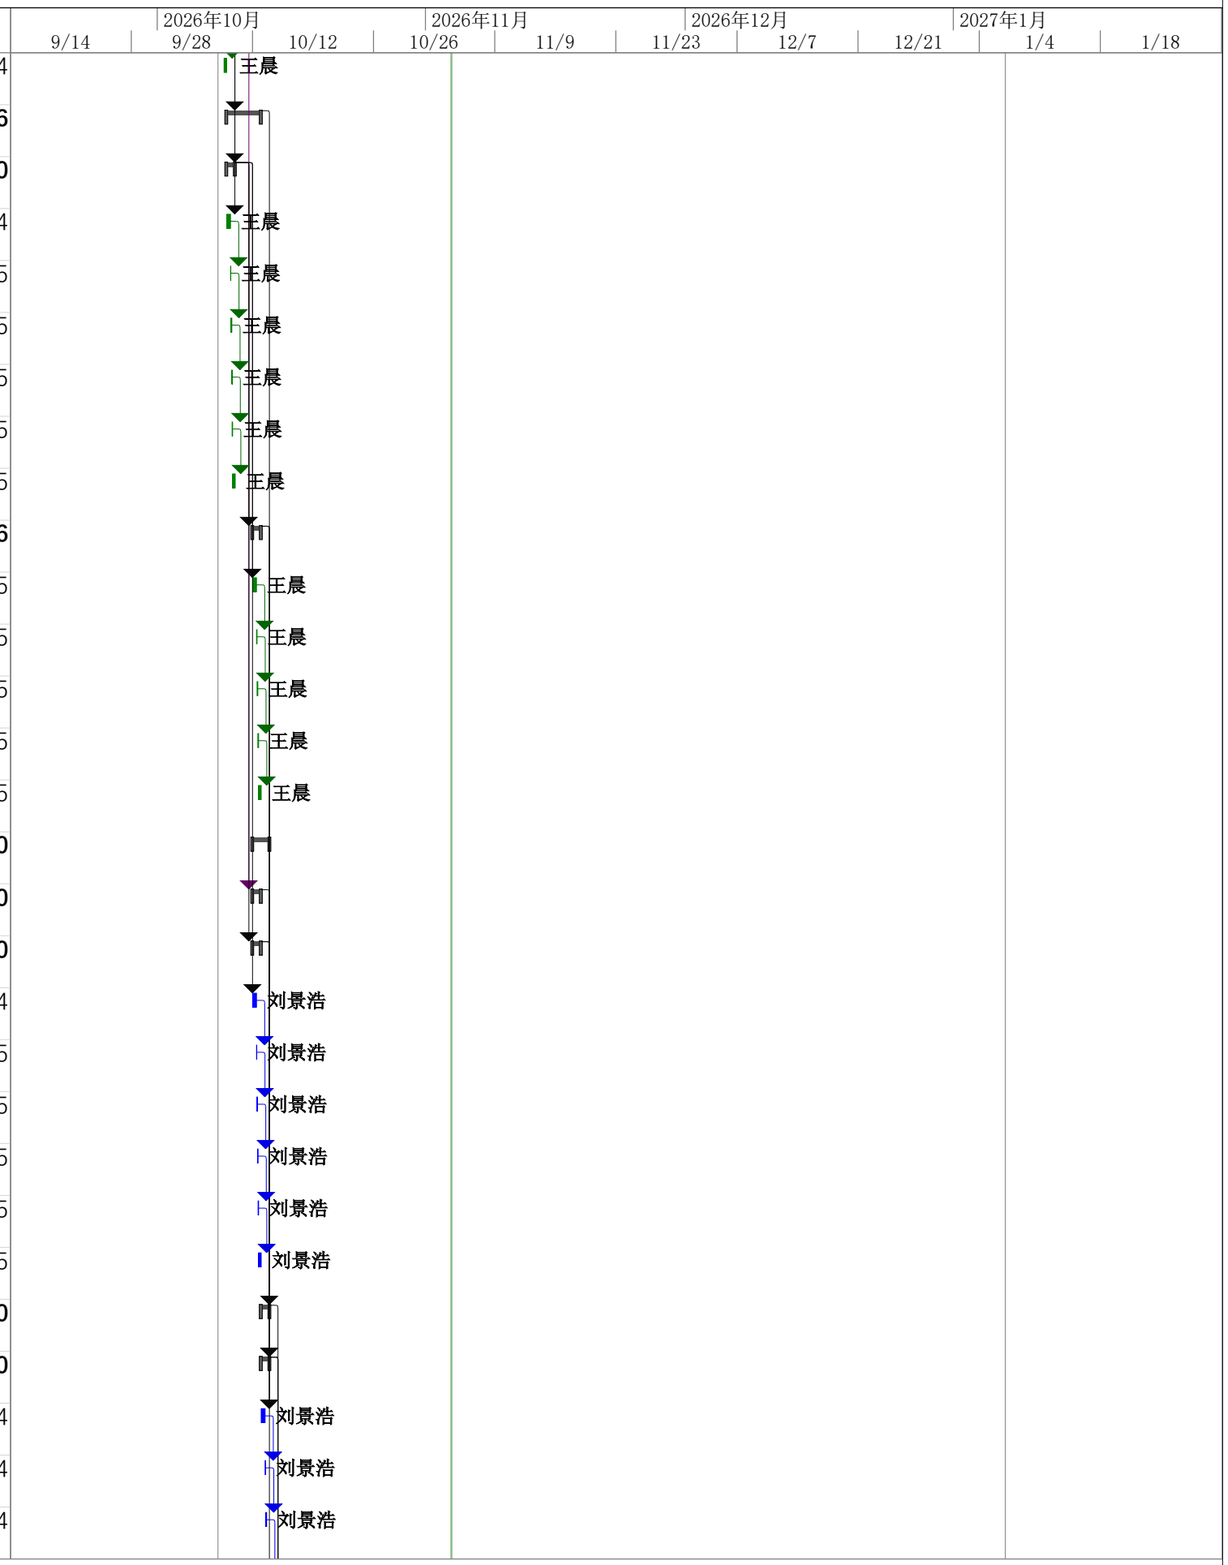


标识号	名称	计划人时	开始时间	完成时间	前置任务	任务负责人	成本
54	2.2.2.1.4 FS06.4 定义继续条件	0.25人时	26/10/13	26/10/13	53	刘景浩	¥11.44
55	2.2.2.1.5 FS06.5 定义调整触发点	0.25人时	26/10/13	26/10/13	54	刘景浩	¥11.44
56	**2.3 可行性报告与内部评审**	**3人时**	**26/10/14**	**26/10/15**		**王晨、刘景浩**	**¥137.28**
57	**2.3.1 双方汇总技术与资源判断**	**1.5人时**	**26/10/14**	**26/10/14**	**26,49**	**王晨、刘景浩**	**¥68.64**
58	**2.3.1.1 FS07 草拟开发计划书**	**1.5人时**	**26/10/14**	**26/10/14**	**50**	**王晨、刘景浩**	**¥68.64**
59	2.3.1.1.1 FS07.1 分解交付工作	0.25人时	26/10/14	26/10/14	50	王晨、刘景浩	¥11.44
60	2.3.1.1.2 FS07.2 估算人时与人员分配	0.25人时	26/10/14	26/10/14	59	王晨、刘景浩	¥11.44
61	2.3.1.1.3 FS07.3 建立依赖与排期	0.25人时	26/10/14	26/10/14	60	王晨、刘景浩	¥11.44
62	2.3.1.1.4 FS07.4 核算成本与资源	0.25人时	26/10/14	26/10/14	61	王晨、刘景浩	¥11.44
63	2.3.1.1.5 FS07.5 细排下一需求阶段	0.25人时	26/10/14	26/10/14	62	王晨、刘景浩	¥11.44
64	2.3.1.1.6 FS07.6 安排监督与调整	0.25人时	26/10/14	26/10/14	63	王晨、刘景浩	¥11.44
65	**2.3.2 共同评审可行性结论与条件**	**1.5人时**	**26/10/15**	**26/10/15**	**57**	**王晨、刘景浩**	**¥68.64**
66	**2.3.2.1 FS08 写文档提交审查**	**1.5人时**	**26/10/15**	**26/10/15**	**58**	**王晨、刘景浩**	**¥68.64**
67	2.3.2.1.1 FS08.1 组织完整报告	0.25人时	26/10/15	26/10/15	58	王晨、刘景浩	¥11.44
68	2.3.2.1.2 FS08.2 标记版本及输入	0.25人时	26/10/15	26/10/15	67	王晨、刘景浩	¥11.44
69	2.3.2.1.3 FS08.3 核对图文一致	0.25人时	26/10/15	26/10/15	68	王晨、刘景浩	¥11.44
70	2.3.2.1.4 FS08.4 编制审查索引	0.25人时	26/10/15	26/10/15	69	王晨、刘景浩	¥11.44
71	2.3.2.1.5 FS08.5 区分记录与待办	0.25人时	26/10/15	26/10/15	70	王晨、刘景浩	¥11.44
72	2.3.2.1.6 FS08.6 接收决定并闭环	0.25人时	26/10/15	26/10/15	71	王晨、刘景浩	¥11.44
73	**3 需求分析**	**37.6人时**	**26/10/16**	**26/11/4**		**按下级分配**	**¥1,72...**
74	**3.1 用户场景、用例与权限边界**	**4人时**	**26/10/16**	**26/10/19**		**王晨、刘景浩**	**¥183.04**
75	**3.1.1 共同核对读者作者与管理场景**	**2人时**	**26/10/16**	**26/10/16**	**65**	**王晨、刘景浩**	**¥91.52**
76	3.1.1.1 RA01 确认用户类别与需求代表	1人时	26/10/16	26/10/16	65	王晨、刘景浩	¥45.76
77	3.1.1.2 RA02 整理需求来源与情景	1人时	26/10/16	26/10/16	76	王晨、刘景浩	¥45.76
78	**3.1.2 确认权限矩阵与核心用例**	**2人时**	**26/10/19**	**26/10/19**	**75**	**王晨、刘景浩**	**¥91.52**
79	3.1.2.1 RA02 描述用例主流程与异常	1人时	26/10/19	26/10/19	75	王晨、刘景浩	¥45.76
80	3.1.2.2 RA01 核对角色权限和边界	1人时	26/10/19	26/10/19	79	王晨、刘景浩	¥45.76
81	**3.2 功能、数据与非功能需求**	**3.2人时**	**26/10/20**	**26/10/21**		**王晨**	**¥146.43**
82	**3.2.1 细化文章交流、激励与治理规则**	**1.6人时**	**26/10/20**	**26/10/20**	**78**	**王晨**	**¥73.22**

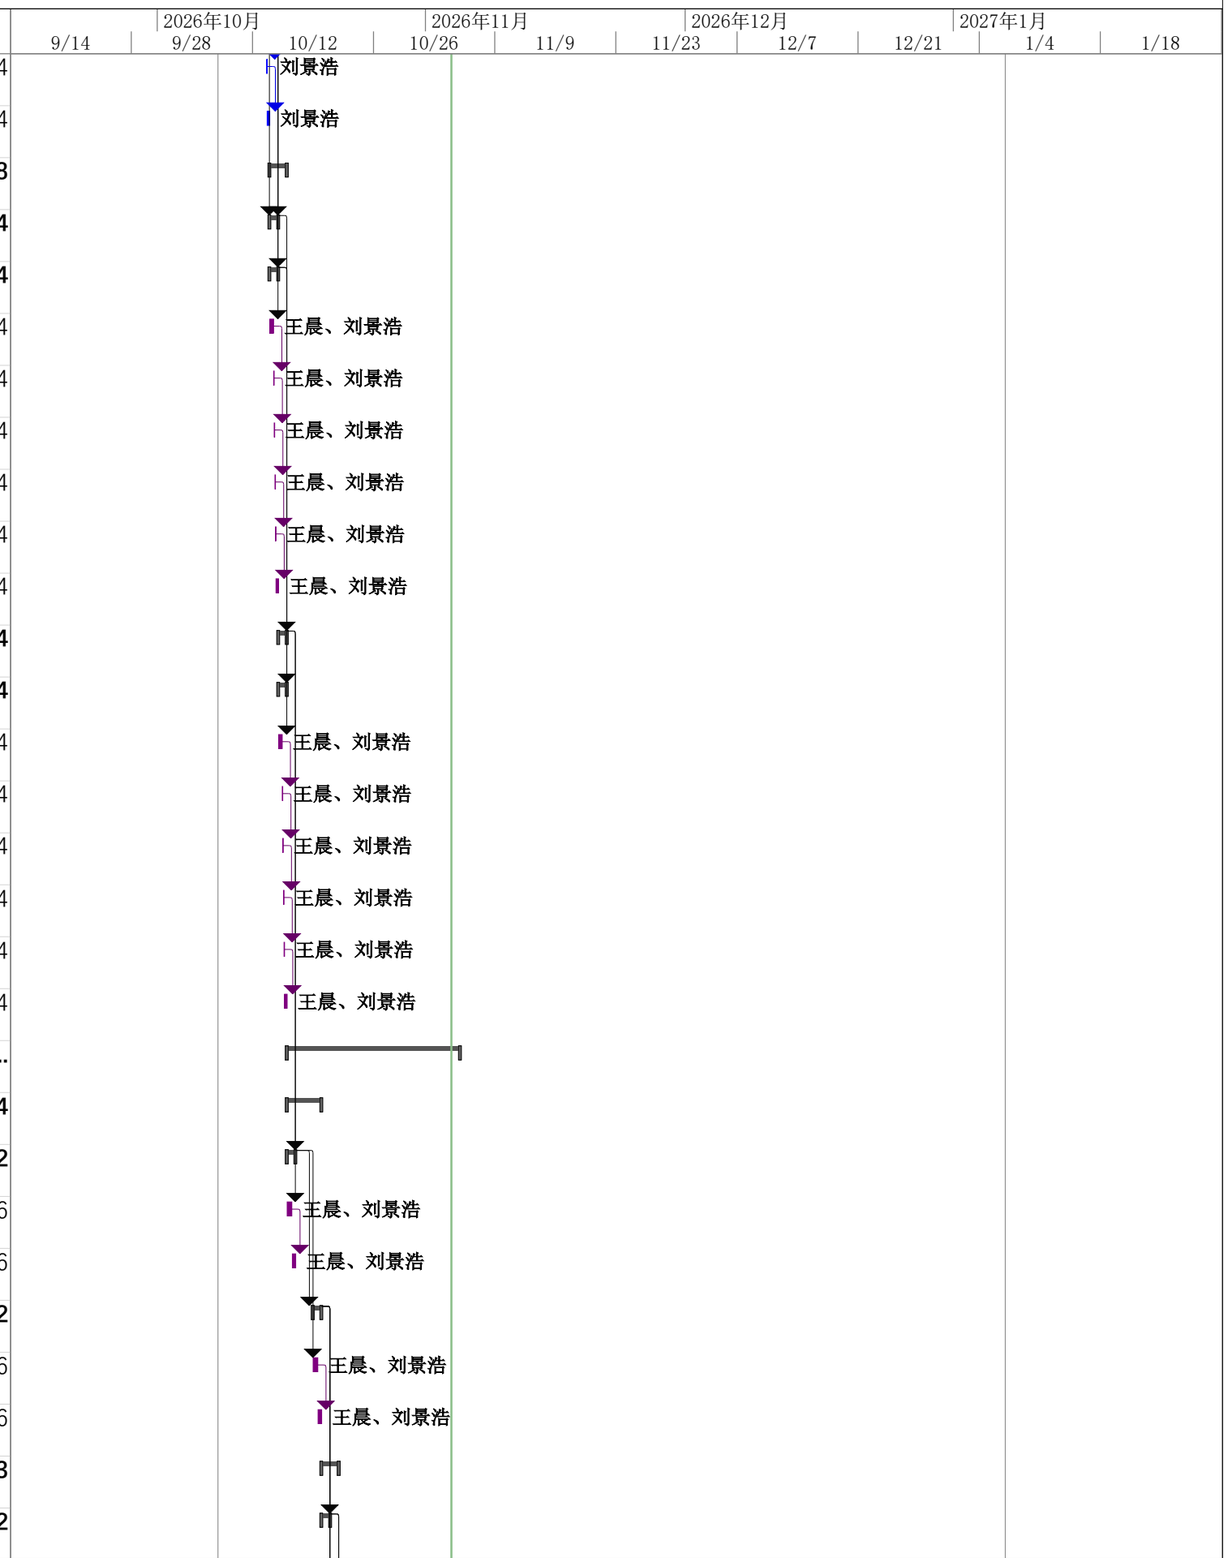


标识号	名称	计划人时	开始时间	完成时间	前置任务	任务负责人	成本
83	3.2.1.1 RA01 拆分功能需求与本期范围	0.8人时	26/10/20	26/10/20	78	王晨	¥36.61
84	3.2.1.2 RA01 明确互动激励与治理规则	0.8人时	26/10/20	26/10/20	83	王晨	¥36.61
85	**3.2.2 定义数据、异常与非功能验收**	**1.6人时**	**26/10/21**	**26/10/21**	**82**	**王晨**	**¥73.22**
86	3.2.2.1 RA01 定义数据和接口约束	0.5人时	26/10/21	26/10/21	82	王晨	¥22.88
87	3.2.2.2 RA01 量化性能可靠性与安全指标	0.6人时	26/10/21	26/10/21	86	王晨	¥27.46
88	3.2.2.3 RA10 定义异常和验收场景	0.5人时	26/10/21	26/10/21	87	王晨	¥22.88
89	**3.3 双端原型与场景核对**	**3.2人时**	**26/10/20**	**26/10/21**		**刘景浩**	**¥146.43**
90	**3.3.1 绘制双端阅读创作原型**	**1.6人时**	**26/10/20**	**26/10/20**	**78**	**刘景浩**	**¥73.22**
91	3.3.1.1 RA03 整理小程序阅读与作者界面	0.8人时	26/10/20	26/10/20	78	刘景浩	¥36.61
92	3.3.1.2 RA03 整理网页创作与阅读线框	0.8人时	26/10/20	26/10/20	91	刘景浩	¥36.61
93	**3.3.2 核对社区和运维管理流程**	**1.6人时**	**26/10/21**	**26/10/21**	**90**	**刘景浩**	**¥73.22**
94	3.3.2.1 RA03 核对社区案件与关联定位	0.8人时	26/10/21	26/10/21	90	刘景浩	¥36.61
95	3.3.2.2 RA03 核对独立运维与执行确认	0.8人时	26/10/21	26/10/21	94	刘景浩	¥36.61
96	**3.4 SRS基线与需求评审材料**	**4人时**	**26/10/22**	**26/10/23**		**王晨、刘景浩**	**¥183.04**
97	**3.4.1 共同汇总SRS与需求追踪**	**2人时**	**26/10/22**	**26/10/22**	**85,93**	**王晨、刘景浩**	**¥91.52**
98	3.4.1.1 RA10 汇总功能非功能与SRS	1人时	26/10/22	26/10/22	85,93	王晨、刘景浩	¥45.76
99	3.4.1.2 RA10 关联追踪编号与输入版本	1人时	26/10/22	26/10/22	98	王晨、刘景浩	¥45.76
100	**3.4.2 内部复核并准备需求汇报**	**2人时**	**26/10/23**	**26/10/23**	**97**	**王晨、刘景浩**	**¥91.52**
101	3.4.2.1 RA10 组织内部需求评审	1人时	26/10/23	26/10/23	97	王晨、刘景浩	¥45.76
102	3.4.2.2 RA10 核对汇报与提交清单	1人时	26/10/23	26/10/23	101	王晨、刘景浩	¥45.76
103	**3.5 需求课堂评审反馈处理**	**3.2人时**	**26/11/4**	**26/11/4**		**刘景浩**	**¥146.43**
104	**3.5.1 记录需求复审意见**	**1.6人时**	**26/11/4**	**26/11/4**	**141**	**刘景浩**	**¥73.22**
105	3.5.1.1 RA10 登记课堂评审问题	0.8人时	26/11/4	26/11/4	141	刘景浩	¥36.61
106	3.5.1.2 RA10 分析范围接口和排期影响	0.8人时	26/11/4	26/11/4	105	刘景浩	¥36.61
107	**3.5.2 修订需求并同步设计影响**	**1.6人时**	**26/11/4**	**26/11/4**	**104**	**刘景浩**	**¥73.22**
108	3.5.2.1 RA10 修订需求与未关闭问题	0.8人时	26/11/4	26/11/4	104	刘景浩	¥36.61
109	3.5.2.2 RA10 向设计交接确认结果	0.8人时	26/11/4	26/11/4	108	刘景浩	¥36.61
110	**3.6 课件核对及三模型骨架**	**6人时**	**26/10/28**	**26/10/29**		**王晨、刘景浩**	**¥274.56**
111	**3.6.1 核对课件评审表、用户及范围**	**3人时**	**26/10/28**	**26/10/28**	**100**	**王晨、刘景浩**	**¥137.28**

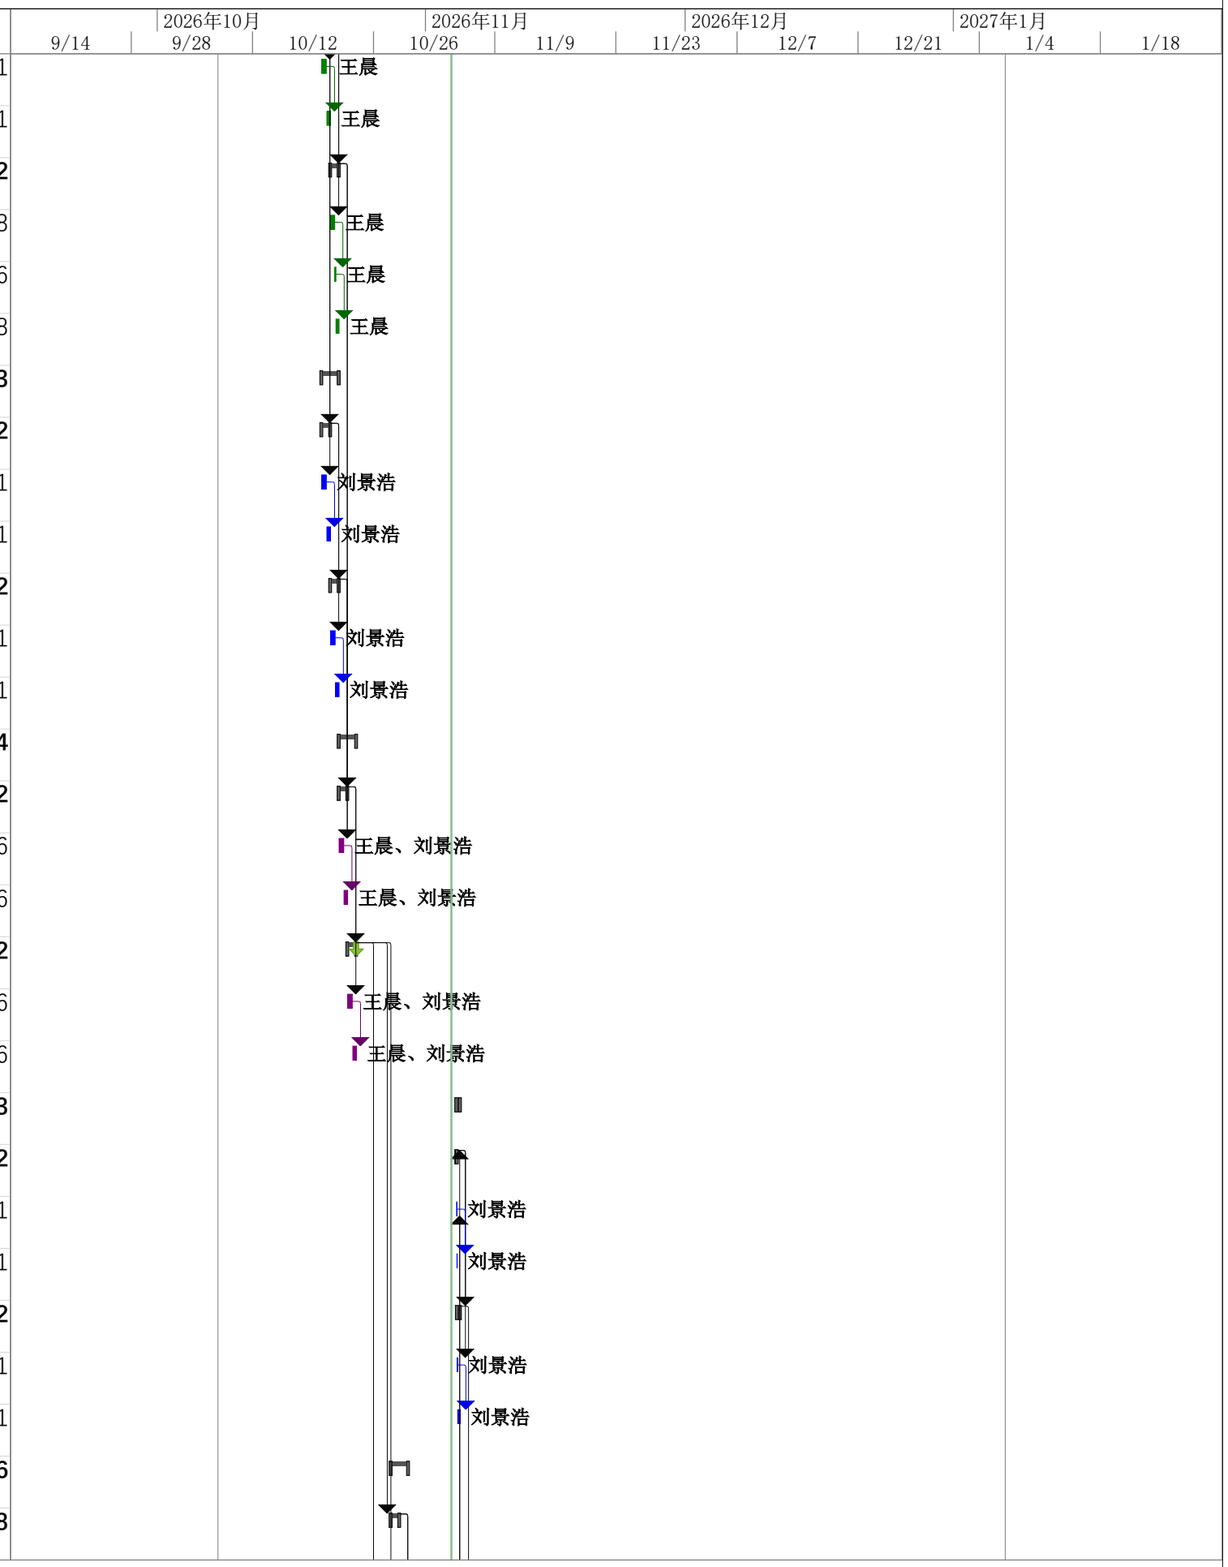


标识号	名称	计划人时	开始时间	完成时间	前置任务	任务负责人	成本
112	3.6.1.1 RA01 核对综合要求与未来范围	1人时	26/10/28	26/10/28	100	王晨、刘景浩	¥45.76
113	3.6.1.2 RA02 核对代表来源及获取方法	1人时	26/10/28	26/10/28	112	王晨、刘景浩	¥45.76
114	3.6.1.3 RA10 建立课件与评审覆盖索引	1人时	26/10/28	26/10/28	113	王晨、刘景浩	¥45.76
115	**3.6.2 建立ER与分层DFD并交叉核对**	**3人时**	**26/10/29**	**26/10/29**	**111**	**王晨、刘景浩**	**¥137.28**
116	3.6.2.1 RA04 建立ER实体属性与基数	1人时	26/10/29	26/10/29	111	王晨、刘景浩	¥45.76
117	3.6.2.2 RA05 建立上下文一级和关键二级DFD	1.25人时	26/10/29	26/10/29	116	王晨、刘景浩	¥57.20
118	3.6.2.3 RA05 核对父子流平衡与边界	0.75人时	26/10/29	26/10/29	117	王晨、刘景浩	¥34.32
119	**3.7 字典规范化及行为辅助模型**	**5人时**	**26/10/30**	**26/10/30**		**王晨、刘景浩**	**¥228.80**
120	**3.7.1 细化数据字典正则及规范化**	**2.5人时**	**26/10/30**	**26/10/30**	**115**	**王晨、刘景浩**	**¥114.40**
121	3.7.1.1 RA06 定义字典结构正则与语义	1人时	26/10/30	26/10/30	115	王晨、刘景浩	¥45.76
122	3.7.1.2 RA07 分析函数依赖及1NF至3NF	1人时	26/10/30	26/10/30	121	王晨、刘景浩	¥45.76
123	3.7.1.3 RA06 核对处理逻辑与反例约束	0.5人时	26/10/30	26/10/30	122	王晨、刘景浩	¥22.88
124	**3.7.2 核对状态转换及辅助图形**	**2.5人时**	**26/10/30**	**26/10/30**	**120**	**王晨、刘景浩**	**¥114.40**
125	3.7.2.1 RA08 绘制STD与状态转换表	1人时	26/10/30	26/10/30	120	王晨、刘景浩	¥45.76
126	3.7.2.2 RA09 绘制层次方框图	0.5人时	26/10/30	26/10/30	125	王晨、刘景浩	¥22.88
127	3.7.2.3 RA09 绘制Warnier图	0.5人时	26/10/30	26/10/30	126	王晨、刘景浩	¥22.88
128	3.7.2.4 RA09 编制IPO与改进IPO	0.5人时	26/10/30	26/10/30	127	王晨、刘景浩	¥22.88
129	**3.8 界面线框与真实用户走查**	**4人时**	**26/11/2**	**26/11/2**		**王晨、刘景浩**	**¥183.04**
130	**3.8.1 准备导航线框与用户代表任务**	**2人时**	**26/11/2**	**26/11/2**	**124**	**王晨、刘景浩**	**¥91.52**
131	3.8.1.1 RA03 整理青绿四页与W01至W14线框	1人时	26/11/2	26/11/2	124	王晨、刘景浩	¥45.76
132	3.8.1.2 RA03 准备代表和任务走查表	1人时	26/11/2	26/11/2	131	王晨、刘景浩	¥45.76
133	**3.8.2 执行代表走查并登记修改与确认**	**2人时**	**26/11/2**	**26/11/2**	**130**	**王晨、刘景浩**	**¥91.52**
134	3.8.2.1 RA03 执行任务并记录原话和问题	1人时	26/11/2	26/11/2	130	王晨、刘景浩	¥45.76
135	3.8.2.2 RA03 修改原型并取得复核确认	1人时	26/11/2	26/11/2	134	王晨、刘景浩	¥45.76
136	**3.9 需求验证追踪与阶段提交**	**5人时**	**26/11/3**	**26/11/3**		**王晨、刘景浩**	**¥228.80**
137	**3.9.1 同步SRS与四维验证及追踪**	**2.5人时**	**26/11/3**	**26/11/3**	**133**	**王晨、刘景浩**	**¥114.40**
138	3.9.1.1 RA10 执行一致完整现实有效检查	1人时	26/11/3	26/11/3	133	王晨、刘景浩	¥45.76
139	3.9.1.2 RA10 核对FR规则模型与验收追踪	1人时	26/11/3	26/11/3	138	王晨、刘景浩	¥45.76
140	3.9.1.3 RA10 形成SRS候选版本与问题表	0.5人时	26/11/3	26/11/3	139	王晨、刘景浩	¥22.88

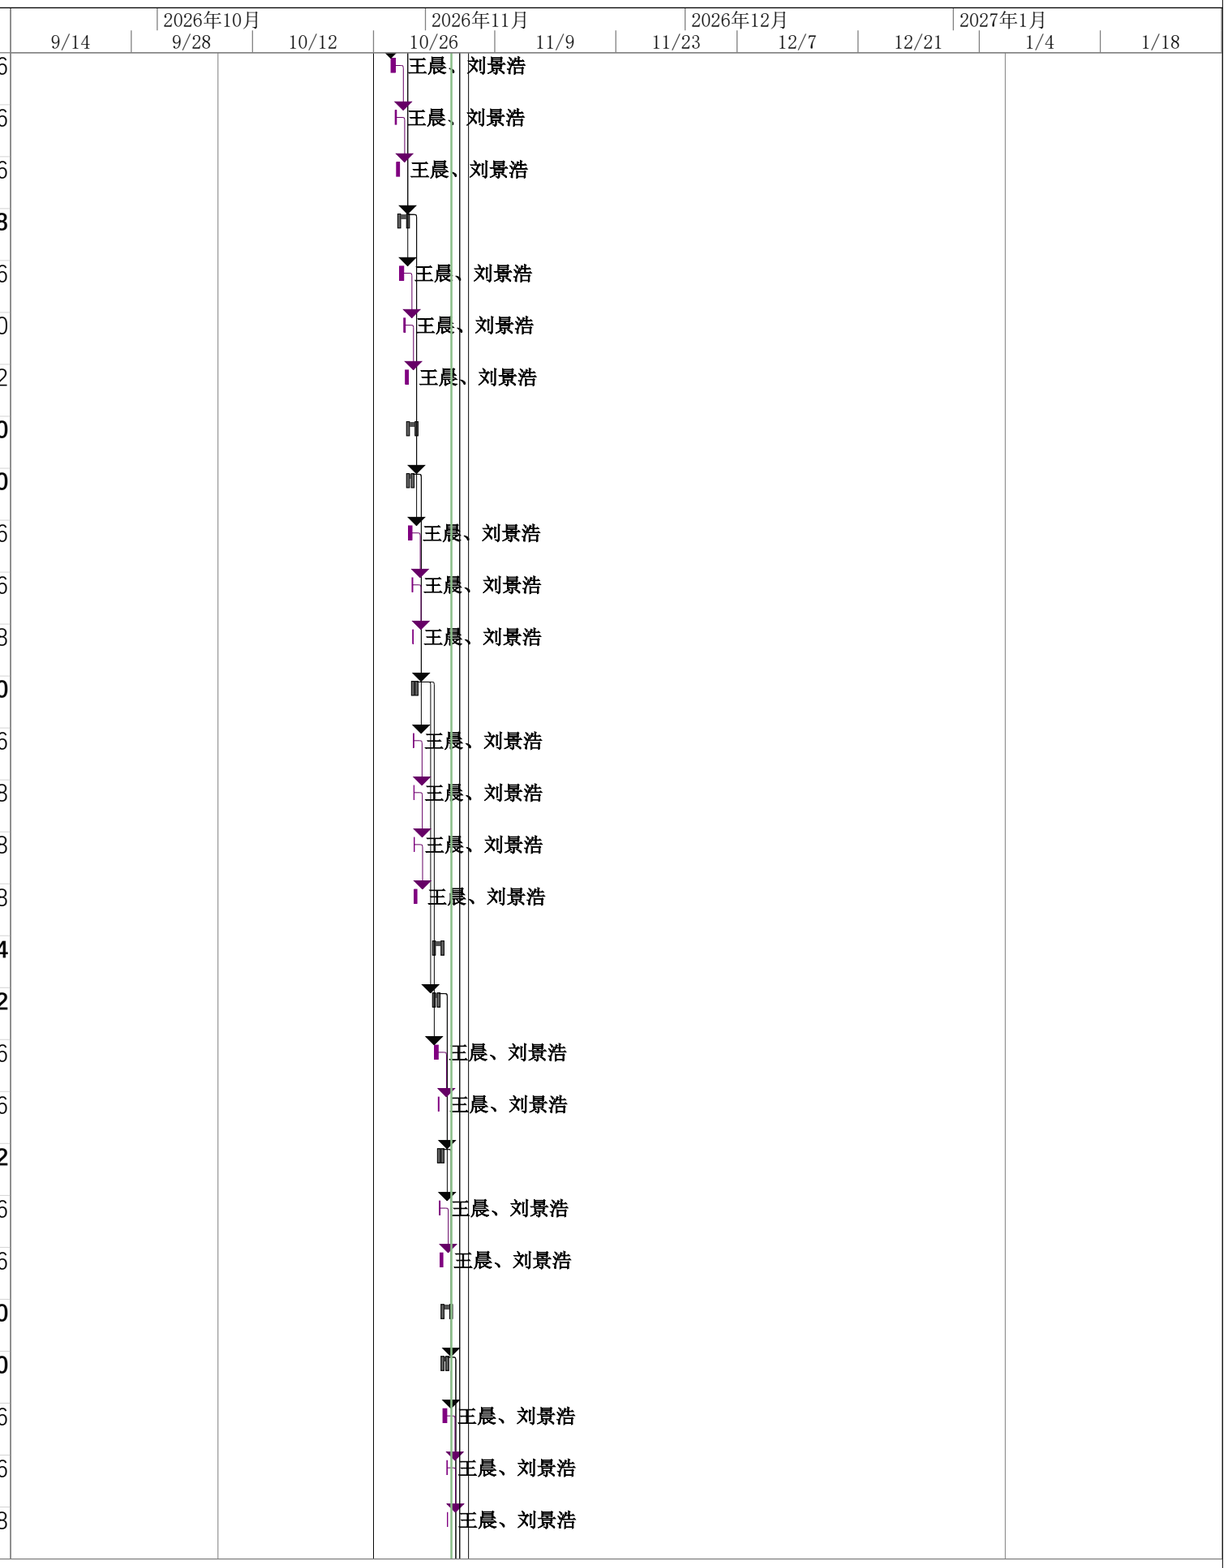


标识号	名称	计划人时	开始时间	完成时间	前置任务	任务负责人	成本
141	**3.9.2 同步计划排期并核对评审提交包**	**2.5人时**	**26/11/3**	**26/11/3**	**137**	**王晨、刘景浩**	**¥114.40**
142	3.9.2.1 RA10 同步计划WBS与排期证据	1人时	26/11/3	26/11/3	137	王晨、刘景浩	¥45.76
143	3.9.2.2 RA10 按两张评审表核对交付包	1人时	26/11/3	26/11/3	142	王晨、刘景浩	¥45.76
144	3.9.2.3 RA10 准备讲稿与排练交接	0.5人时	26/11/3	26/11/3	143	王晨、刘景浩	¥22.88
145	**4 总体与详细设计**	**32.1人时**	**26/10/26**	**26/11/26**		**按下级分配**	**¥1,46...**
146	**4.1 系统架构、接口与数据库设计**	**4.5人时**	**26/10/26**	**26/10/28**		**王晨**	**¥205.92**
147	4.1.1 设计业务模块与接口契约	2.5人时	26/10/26	26/10/26	100	王晨	¥114.40
148	4.1.2 设计数据关系与本机部署边界	2人时	26/10/27	26/10/28	147	王晨	¥91.52
149	**4.2 认证、内容、激励与治理设计**	**4.5人时**	**26/10/29**	**26/10/30**		**王晨**	**¥205.92**
150	4.2.1 细化认证文章与治理状态	2.5人时	26/10/29	26/10/29	148	王晨	¥114.40
151	4.2.2 细化币事务、隐私及异常处理	2人时	26/10/30	26/10/30	150	王晨	¥91.52
152	**4.3 双端浏览与创作详细设计**	**4.5人时**	**26/10/29**	**26/11/2**		**刘景浩**	**¥205.92**
153	4.3.1 设计网页Markdown与移动图文	2.5人时	26/10/29	26/10/29	148	刘景浩	¥114.40
154	4.3.2 设计图片、草稿和跨端编辑流程	2人时	26/10/30	26/11/2	153	刘景浩	¥91.52
155	**4.4 部署、备份与恢复详细设计**	**4.5人时**	**26/11/2**	**26/11/3**		**王晨**	**¥205.92**
156	4.4.1 定义运维接口、鉴权与白名单	2.5人时	26/11/2	26/11/2	151	王晨	¥114.40
157	4.4.2 设计备份一致性、恢复与失败保护	2人时	26/11/3	26/11/3	156	王晨	¥91.52
158	**4.5 内部设计评审与文档基线**	**4.8人时**	**26/11/5**	**26/11/5**		**王晨、刘景浩**	**¥219.65**
159	4.5.1 共同核对总体与详细设计	2.4人时	26/11/5	26/11/5	154,157,16	王晨、刘景浩	¥109.82
160	4.5.2 共同评审并确认内部设计基线	2.4人时	26/11/5	26/11/5	159	王晨、刘景浩	¥109.82
161	**4.6 测试用例设计与数据准备**	**4.5人时**	**26/11/3**	**26/11/3**		**刘景浩**	**¥205.92**
162	4.6.1 编制核心与异常验收用例	2.5人时	26/11/3	26/11/3	154,151	刘景浩	¥114.40
163	4.6.2 准备合成数据和性能脚本方案	2人时	26/11/3	26/11/3	162	刘景浩	¥91.52
164	**4.7 课堂设计反馈与模块调整**	**4.8人时**	**26/11/26**	**26/11/26**		**王晨、刘景浩**	**¥219.65**
165	4.7.1 共同登记课堂设计意见	2.4人时	26/11/26	26/11/26	191,200	王晨、刘景浩	¥109.82
166	4.7.2 分别调整模块并共同复核	2.4人时	26/11/26	26/11/26	165	王晨、刘景浩	¥109.82
167	**5 编码与单元测试**	**58.8人时**	**26/11/6**	**26/11/27**		**按下级分配**	**¥2,69...**
168	**5.1 项目骨架、配置与接口约定**	**1.8人时**	**26/11/6**	**26/11/6**		**王晨**	**¥82.37**
169	5.1.1 搭建模块骨架与环境配置	0.8人时	26/11/6	26/11/6	160	王晨	¥36.61

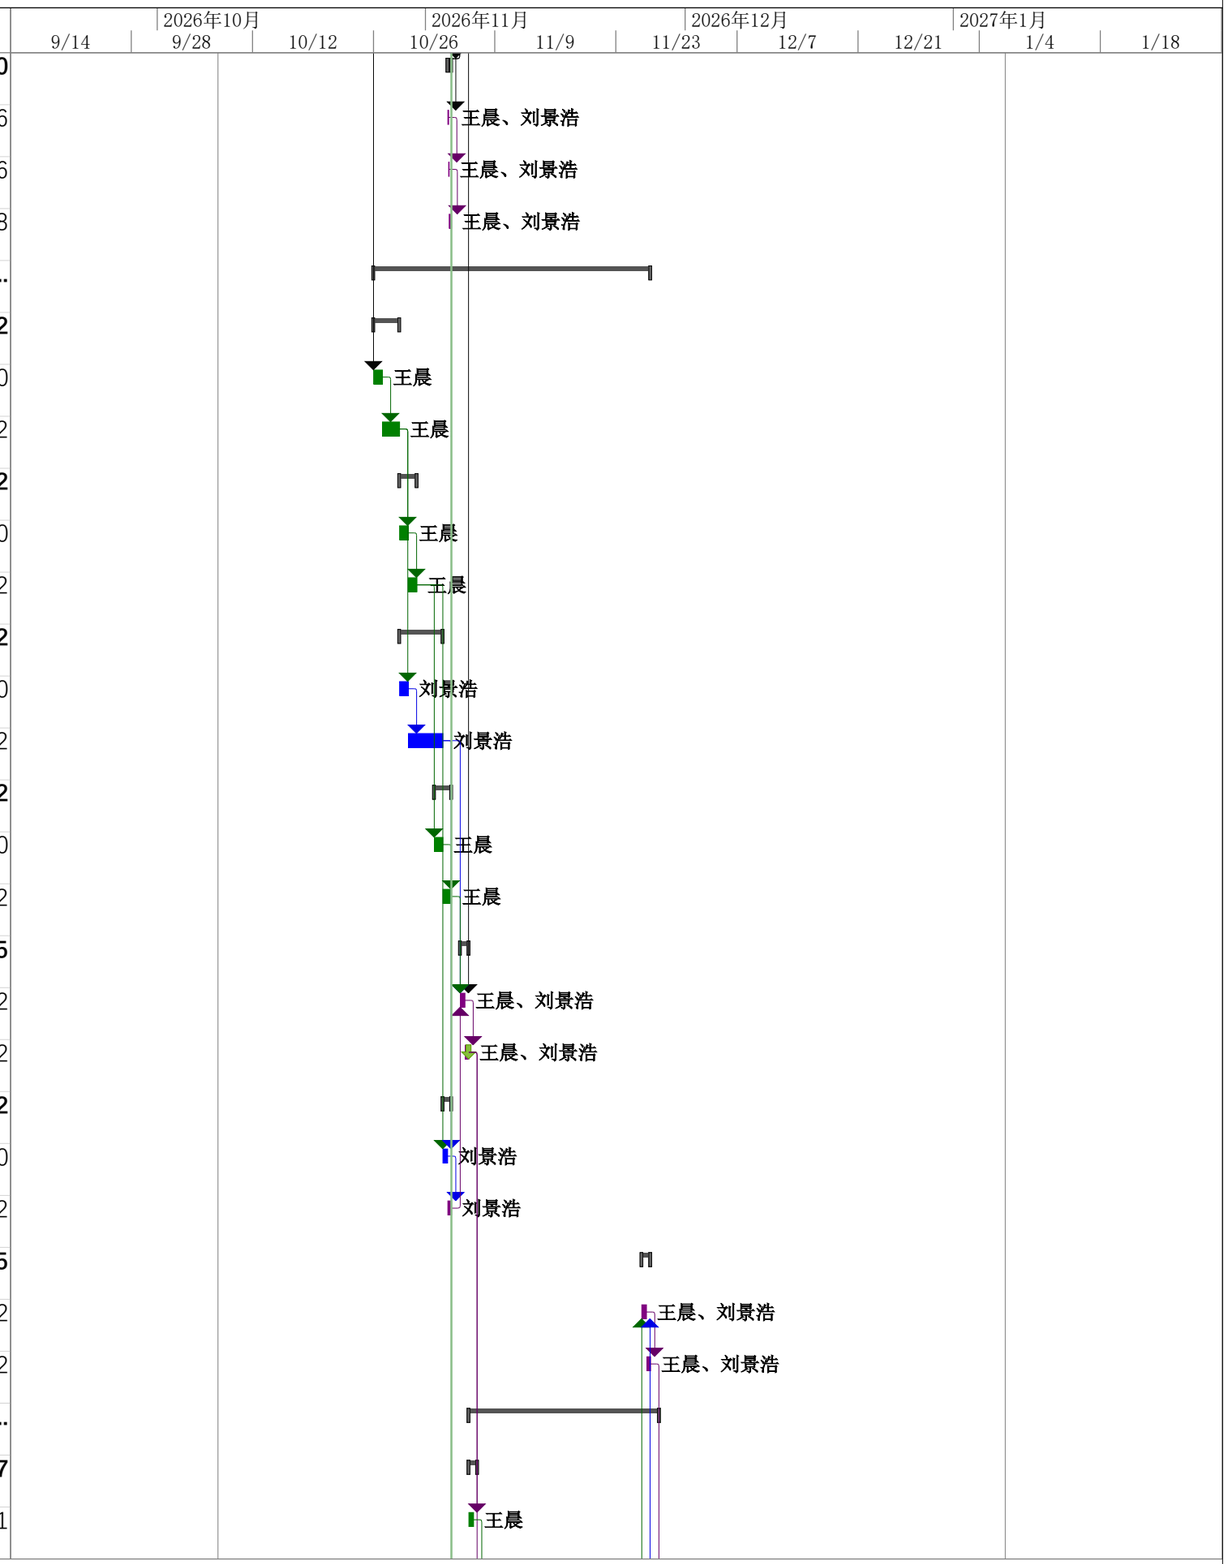


标识号	名称	计划人时	开始时间	完成时间	前置任务	任务负责人	成本
170	5.1.2 核对共享接口和错误格式	1人时	26/11/6	26/11/6	169	王晨	¥45.76
171	**5.2 登录、邮箱与材料认证**	**3人时**	**26/11/9**	**26/11/10**		**王晨**	**¥137.28**
172	5.2.1 实现登录与校园邮箱验证	1.5人时	26/11/9	26/11/9	170	王晨	¥68.64
173	5.2.2 实现材料认证接口和角色限制	1.5人时	26/11/10	26/11/10	172	王晨	¥68.64
174	**5.3 文章存储、岗位检索与筛选接口**	**2人时**	**26/11/11**	**26/11/13**		**王晨**	**¥91.52**
175	5.3.1 实现文章图片、草稿存储接口	1人时	26/11/11	26/11/11	173	王晨	¥45.76
176	5.3.2 实现岗位专业公司筛选与分页	1人时	26/11/12	26/11/13	175	王晨	¥45.76
177	**5.4 小程序与网页阅读页面**	**5.5人时**	**26/11/6**	**26/11/10**		**刘景浩**	**¥251.68**
178	5.4.1 实现双端筛选与阅读界面	3.5人时	26/11/6	26/11/6	160	刘景浩	¥160.16
179	5.4.2 核对游客状态、失败和空结果	2人时	26/11/9	26/11/10	178	刘景浩	¥91.52
180	**5.5 网页Markdown创作与草稿**	**5.5人时**	**26/11/11**	**26/11/13**		**刘景浩**	**¥251.68**
181	5.5.1 实现Markdown、图片和资料链接	3.5人时	26/11/11	26/11/11	179	刘景浩	¥160.16
182	5.5.2 实现预览、保存与草稿恢复	2人时	26/11/12	26/11/13	181	刘景浩	¥91.52
183	**5.6 小程序文字与图片创作**	**5.5人时**	**26/11/16**	**26/11/17**		**王晨**	**¥251.68**
184	5.6.1 实现移动图文编辑和上传	3.5人时	26/11/16	26/11/16	176	王晨	¥160.16
185	5.6.2 实现移动草稿保存及恢复	2人时	26/11/17	26/11/17	184	王晨	¥91.52
186	**5.7 双端草稿、发布与文章管理**	**5.5人时**	**26/11/18**	**26/11/19**		**王晨**	**¥251.68**
187	5.7.1 实现发布、修改、下架和恢复接口	3.5人时	26/11/18	26/11/18	185,182	王晨	¥160.16
188	5.7.2 接通双端作者文章管理	2人时	26/11/19	26/11/19	187	王晨	¥91.52
189	**5.8 评论、点赞、投币、收藏与荣誉**	**5.5人时**	**26/11/20**	**26/11/24**		**王晨**	**¥251.68**
190	5.8.1 实现主页、评论图片及收藏交流	3.5人时	26/11/20	26/11/20	188	王晨	¥160.16
191	5.8.2 实现点赞、领取投币、荣誉排序与通知	2人时	26/11/23	26/11/24	190	王晨	¥91.52
192	**5.9 社区审核、反馈与举报网页**	**5.5人时**	**26/11/16**	**26/11/18**		**刘景浩**	**¥251.68**
193	5.9.1 实现认证审核与举报反馈处理接口	3.5人时	26/11/16	26/11/16	182	刘景浩	¥160.16
194	5.9.2 实现社区管理网页并联调	2人时	26/11/17	26/11/18	193	刘景浩	¥91.52
195	**5.10 独立运维执行与备份服务**	**6.5人时**	**26/11/19**	**26/11/23**		**刘景浩**	**¥297.44**
196	5.10.1 实现独立运维任务执行服务	4人时	26/11/19	26/11/19	194	刘景浩	¥183.04
197	5.10.2 实现部署重启、备份恢复及失败保护	2.5人时	26/11/20	26/11/23	196	刘景浩	¥114.40
198	**5.11 运维网页、状态与操作记录**	**6.5人时**	**26/11/24**	**26/11/25**		**刘景浩**	**¥297.44**

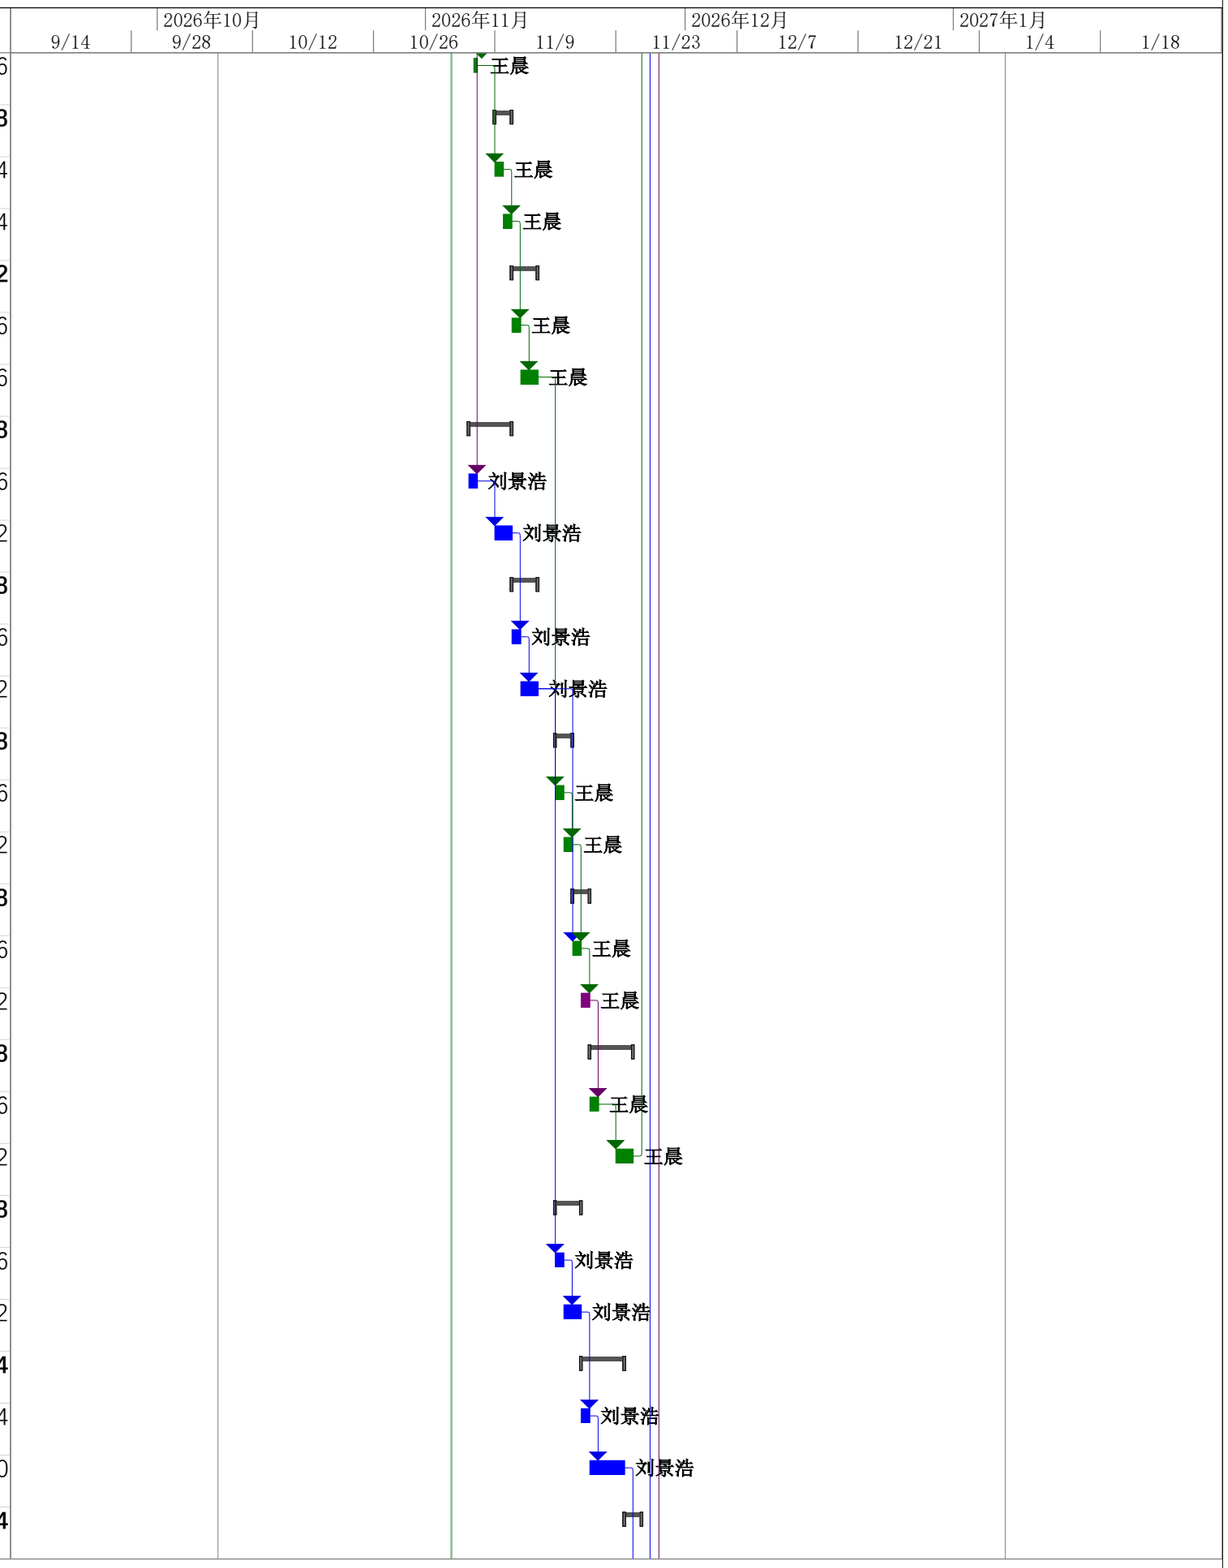


标识号	名称	计划人时	开始时间	完成时间	前置任务	任务负责人	成本
199	5.11.1 实现运维状态、日志和备份列表	4人时	26/11/24	26/11/24	197	刘景浩	¥183.04
200	5.11.2 联调网页部署重启与备份恢复	2.5人时	26/11/25	26/11/25	199	刘景浩	¥114.40
201	**5.12 系统联调、构建与实现基线**	**6人时**	**26/11/27**	**26/11/27**		**王晨、刘景浩**	**¥274.56**
202	5.12.1 双方接通真实接口与跨端链路	3人时	26/11/27	26/11/27	166	王晨、刘景浩	¥137.28
203	5.12.2 构建候选版本并归档实现证据	3人时	26/11/27	26/11/27	202	王晨、刘景浩	¥137.28
204	**6 综合测试**	**22.6人时**	**26/11/30**	**26/12/8**		**按下级分配**	**¥1,03...**
205	**6.1 功能、接口与集成测试**	**2.7人时**	**26/11/30**	**26/12/1**		**刘景浩**	**¥123.55**
206	6.1.1 执行角色及核心业务功能用例	1.2人时	26/11/30	26/11/30	203	刘景浩	¥54.91
207	6.1.2 执行接口、集成和失败场景	1.5人时	26/12/1	26/12/1	206	刘景浩	¥68.64
208	**6.2 性能与负载测试**	**2.7人时**	**26/11/30**	**26/12/1**		**王晨**	**¥123.55**
209	6.2.1 固定环境执行30并发负载	1.2人时	26/11/30	26/11/30	203	王晨	¥54.91
210	6.2.2 分析P95、错误率与资源占用	1.5人时	26/12/1	26/12/1	209	王晨	¥68.64
211	**6.3 压力与稳定性测试**	**2.7人时**	**26/12/2**	**26/12/2**		**王晨**	**¥123.55**
212	6.3.1 执行阶梯压力寻找容量边界	1.2人时	26/12/2	26/12/2	210	王晨	¥54.91
213	6.3.2 执行稳定性与降载恢复	1.5人时	26/12/2	26/12/2	212	王晨	¥68.64
214	**6.4 安全权限与双端兼容测试**	**2.7人时**	**26/12/2**	**26/12/2**		**刘景浩**	**¥123.55**
215	6.4.1 执行越权隐私与危险输入检查	1.2人时	26/12/2	26/12/2	207	刘景浩	¥54.91
216	6.4.2 执行双端浏览编辑与图片兼容	1.5人时	26/12/2	26/12/2	215	刘景浩	¥68.64
217	**6.5 部署、故障与备份恢复验证**	**2.7人时**	**26/12/3**	**26/12/3**		**王晨**	**¥123.55**
218	6.5.1 验证冷启动与网页运维操作	1.2人时	26/12/3	26/12/3	213	王晨	¥54.91
219	6.5.2 验证损坏备份、回退与恢复一致性	1.5人时	26/12/3	26/12/3	218	王晨	¥68.64
220	**6.6 缺陷修复、复测与回归**	**4人时**	**26/12/3**	**26/12/4**		**刘景浩**	**¥183.04**
221	6.6.1 按模块分派缺陷并修复	2.5人时	26/12/3	26/12/3	216,213	王晨、刘景浩	¥114.40
222	6.6.2 交叉复测原场景与相邻流程	1.5人时	26/12/3	26/12/4	221	刘景浩	¥68.64
223	**6.7 测试报告与系统内部验收**	**2.4人时**	**26/12/4**	**26/12/4**		**王晨、刘景浩**	**¥109.82**
224	6.7.1 双方确认测试结论与交付限制	2.4人时	26/12/4	26/12/4	222,219	王晨、刘景浩	¥109.82
225	**6.8 测试报告复核与提交准备**	**2.7人时**	**26/12/7**	**26/12/8**		**王晨**	**¥123.55**
226	6.8.1 复核测试报告与证据链	1.2人时	26/12/7	26/12/7	224	王晨	¥54.91
227	6.8.2 整理课堂测试汇报和已有修订	1.5人时	26/12/8	26/12/8	226	王晨	¥68.64

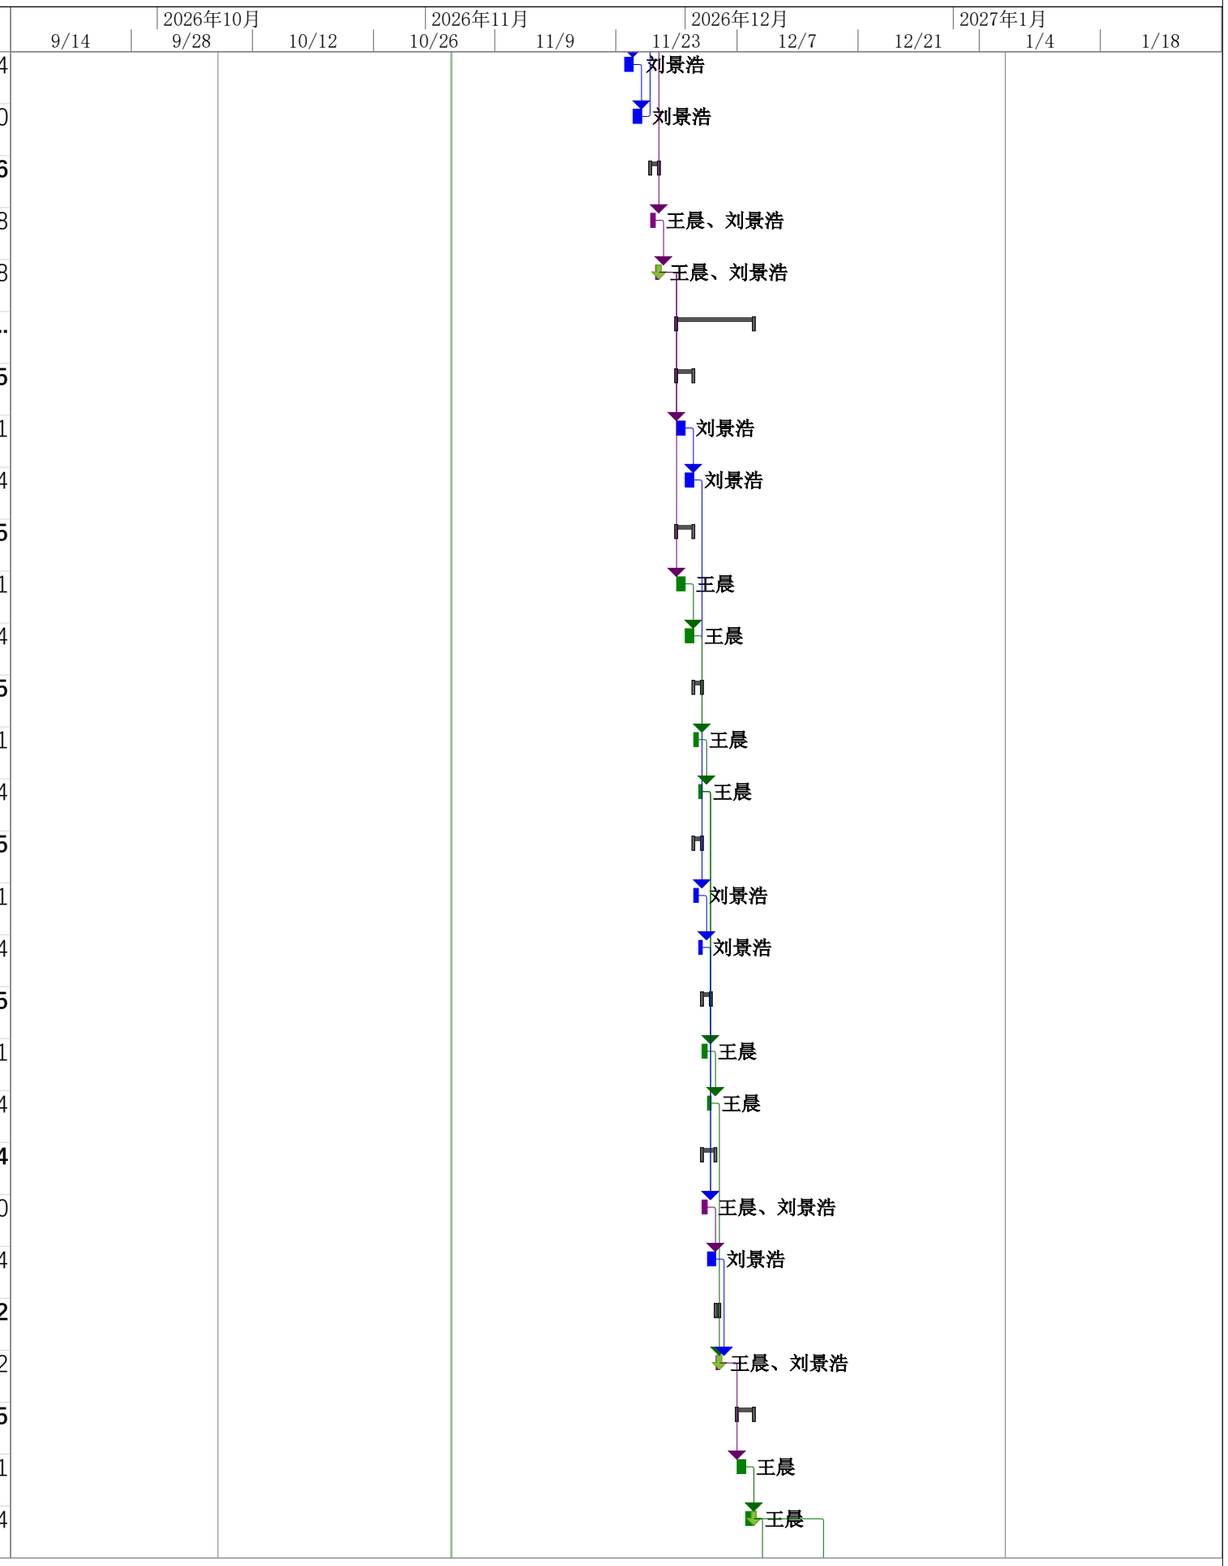


标识号	名称	计划人时	开始时间	完成时间	前置任务	任务负责人	成本
228	**7 部署与维护**	**15人时**	**26/12/9**	**26/12/17**		**按下级分配**	**¥686.40**
229	**7.1 安装包、用户与维护说明**	**3人时**	**26/12/9**	**26/12/10**		**王晨**	**¥137.28**
230	7.1.1 整理安装、用户及管理操作说明	1.5人时	26/12/9	26/12/9	227	王晨	¥68.64
231	7.1.2 整理运维、恢复与故障维护规程	1.5人时	26/12/10	26/12/10	230	王晨	¥68.64
232	**7.2 干净环境启动与课堂演示**	**3人时**	**26/12/11**	**26/12/11**		**王晨**	**¥137.28**
233	7.2.1 在干净配置核对冷启动	1.5人时	26/12/11	26/12/11	231	王晨	¥68.64
234	7.2.2 核对演示数据、认证与外网失败回退	1.5人时	26/12/11	26/12/11	233	王晨	¥68.64
235	**7.3 维护申请与变更演练**	**3人时**	**26/12/14**	**26/12/14**		**刘景浩**	**¥137.28**
236	7.3.1 登记维护申请和影响分析	1.5人时	26/12/14	26/12/14	234	刘景浩	¥68.64
237	7.3.2 执行修改回退及回归演练	1.5人时	26/12/14	26/12/14	236	刘景浩	¥68.64
238	**7.4 运维交接与反馈整改**	**3人时**	**26/12/15**	**26/12/15**		**王晨**	**¥137.28**
239	7.4.1 核对备份、配置与维护资料	1.5人时	26/12/15	26/12/15	237	王晨	¥68.64
240	7.4.2 双方练习操作并确认交接	1.5人时	26/12/15	26/12/15	239	王晨	¥68.64
241	**7.5 课堂测试评审意见处理**	**3人时**	**26/12/17**	**26/12/17**		**刘景浩**	**¥137.28**
242	7.5.1 登记12月16日测试评审意见	1.5人时	26/12/17	26/12/17	227	刘景浩	¥68.64
243	7.5.2 修订报告及相关实现用例	1.5人时	26/12/17	26/12/17	242	刘景浩	¥68.64
244	**8 总结与收尾**	**16.8人时**	**26/12/18**	**27/1/6**		**按下级分配**	**¥768.77**
245	**8.1 项目总结与计划偏差分析**	**3.6人时**	**26/12/18**	**26/12/21**		**王晨、刘景浩**	**¥164.74**
246	8.1.1 共同核对计划实际与阶段成果	1.8人时	26/12/18	26/12/18	240,243	王晨、刘景浩	¥82.37
247	8.1.2 共同总结偏差风险和协作贡献	1.8人时	26/12/21	26/12/21	246	王晨、刘景浩	¥82.37
248	**8.2 总评材料与详细计划附录**	**3人时**	**26/12/22**	**26/12/23**		**王晨**	**¥137.28**
249	8.2.1 整理总评PPT资料和详细周计划	1.5人时	26/12/22	26/12/22	247	王晨	¥68.64
250	8.2.2 核对引用、图表与交付目录	1.5人时	26/12/23	26/12/23	249	王晨	¥68.64
251	**8.3 最终验收与汇报演练**	**3.6人时**	**26/12/24**	**26/12/24**		**王晨、刘景浩**	**¥164.74**
252	8.3.1 共同执行交付清单核查	1.8人时	26/12/24	26/12/24	250	王晨、刘景浩	¥82.37
253	8.3.2 共同预演并确认提交版本	1.8人时	26/12/24	26/12/24	252	王晨、刘景浩	¥82.37
254	**8.4 总评反馈处理与归档**	**3人时**	**26/12/31**	**27/1/4**		**王晨**	**¥137.28**
255	8.4.1 处理总评意见并准备提交基线	1.5人时	26/12/31	26/12/31	253	王晨	¥68.64
256	8.4.2 核对提交后尾项与最终归档	1.5人时	27/1/4	27/1/4	255	王晨	¥68.64

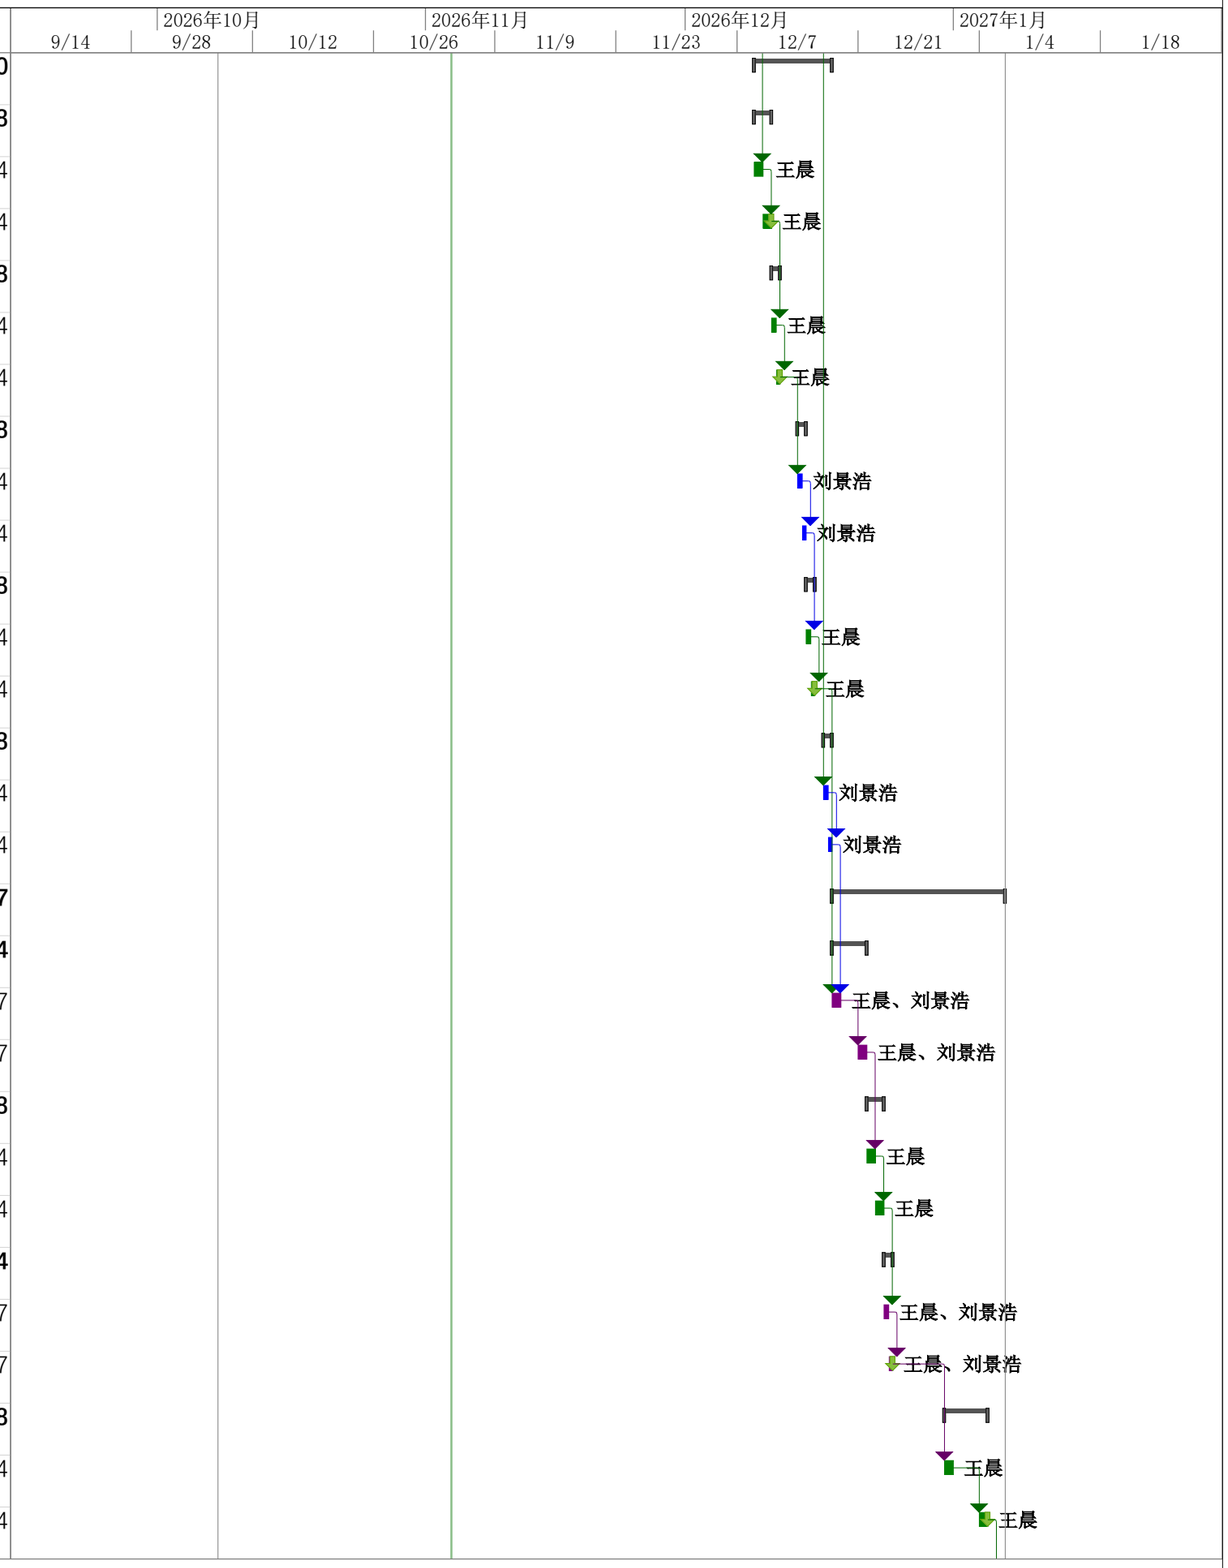


标识号	名称	计划人时	开始时间	完成时间	前置任务	任务负责人	成本
257	**8.5 课程收尾与交付确认**	**3.6人时**	**27/1/6**	**27/1/6**		**王晨、刘景浩**	**¥164.74**
258	8.5.1 共同核对课程收尾材料	1.8人时	27/1/6	27/1/6	256	王晨、刘景浩	¥82.37
259	8.5.2 共同确认交付与后续维护边界	1.8人时	27/1/6	27/1/6	258	王晨、刘景浩	¥82.37
260	**M 持续项目管理与交叉复核**	**27.65人时**	**26/10/8**	**27/1/6**		**按下级分配**	**¥1,26...**
261	M01 周进度风险与评审提交管理	0.85人时	26/10/8	26/10/9		王晨	¥38.90
262	M02 周进度风险与评审提交管理	0.85人时	26/10/12	26/10/16		王晨	¥38.90
263	M03 周进度风险与评审提交管理	0.85人时	26/10/19	26/10/23		王晨	¥38.90
264	M04 周进度风险与评审提交管理	0.85人时	26/10/26	26/10/30		王晨	¥38.90
265	M05 周进度风险与评审提交管理	0.85人时	26/11/2	26/11/6		王晨	¥38.90
266	M06 周进度风险与评审提交管理	0.85人时	26/11/9	26/11/13		王晨	¥38.90
267	M07 周进度风险与评审提交管理	0.85人时	26/11/16	26/11/20		王晨	¥38.90
268	M08 周进度风险与评审提交管理	0.85人时	26/11/23	26/11/27		王晨	¥38.90
269	M09 周进度风险与评审提交管理	0.85人时	26/11/30	26/12/4		王晨	¥38.90
270	M10 周进度风险与评审提交管理	0.85人时	26/12/7	26/12/11		王晨	¥38.90
271	M11 周进度风险与评审提交管理	0.85人时	26/12/14	26/12/18		王晨	¥38.90
272	M12 周进度风险与评审提交管理	0.85人时	26/12/21	26/12/25		王晨	¥38.90
273	M13 周进度风险与评审提交管理	0.85人时	26/12/28	26/12/31		王晨	¥38.90
274	M14 周进度风险与评审提交管理	0.85人时	27/1/4	27/1/6		王晨	¥38.90
275	R2.1 复核与交接 关键技术与工具可行性验证	0.45人时	26/10/8	26/10/12		刘景浩	¥20.59
276	R2.2 复核与交接 经济、操作及内容供给分析	0.45人时	26/10/12	26/10/13		王晨	¥20.59
277	R3.2 复核与交接 功能、数据与非功能需求	0.45人时	26/10/20	26/10/21		刘景浩	¥20.59
278	R3.3 复核与交接 双端原型与场景核对	0.45人时	26/10/20	26/10/21		王晨	¥20.59
279	R3.5 复核与交接 需求课堂评审反馈处理	0.45人时	26/11/4	26/11/4		王晨	¥20.59
280	R4.1 复核与交接 系统架构、接口与数据库设计	0.45人时	26/10/26	26/10/28		刘景浩	¥20.59
281	R4.2 复核与交接 认证、内容、激励与治理设计	0.45人时	26/10/29	26/10/30		刘景浩	¥20.59
282	R4.3 复核与交接 双端浏览与创作详细设计	0.45人时	26/10/29	26/11/2		王晨	¥20.59
283	R4.4 复核与交接 部署、备份与恢复详细设计	0.45人时	26/11/2	26/11/3		刘景浩	¥20.59
284	R4.6 复核与交接 测试用例设计与数据准备	0.45人时	26/11/3	26/11/3		王晨	¥20.59
285	R5.1 复核与交接 项目骨架、配置与接口约定	0.45人时	26/11/6	26/11/6		刘景浩	¥20.59

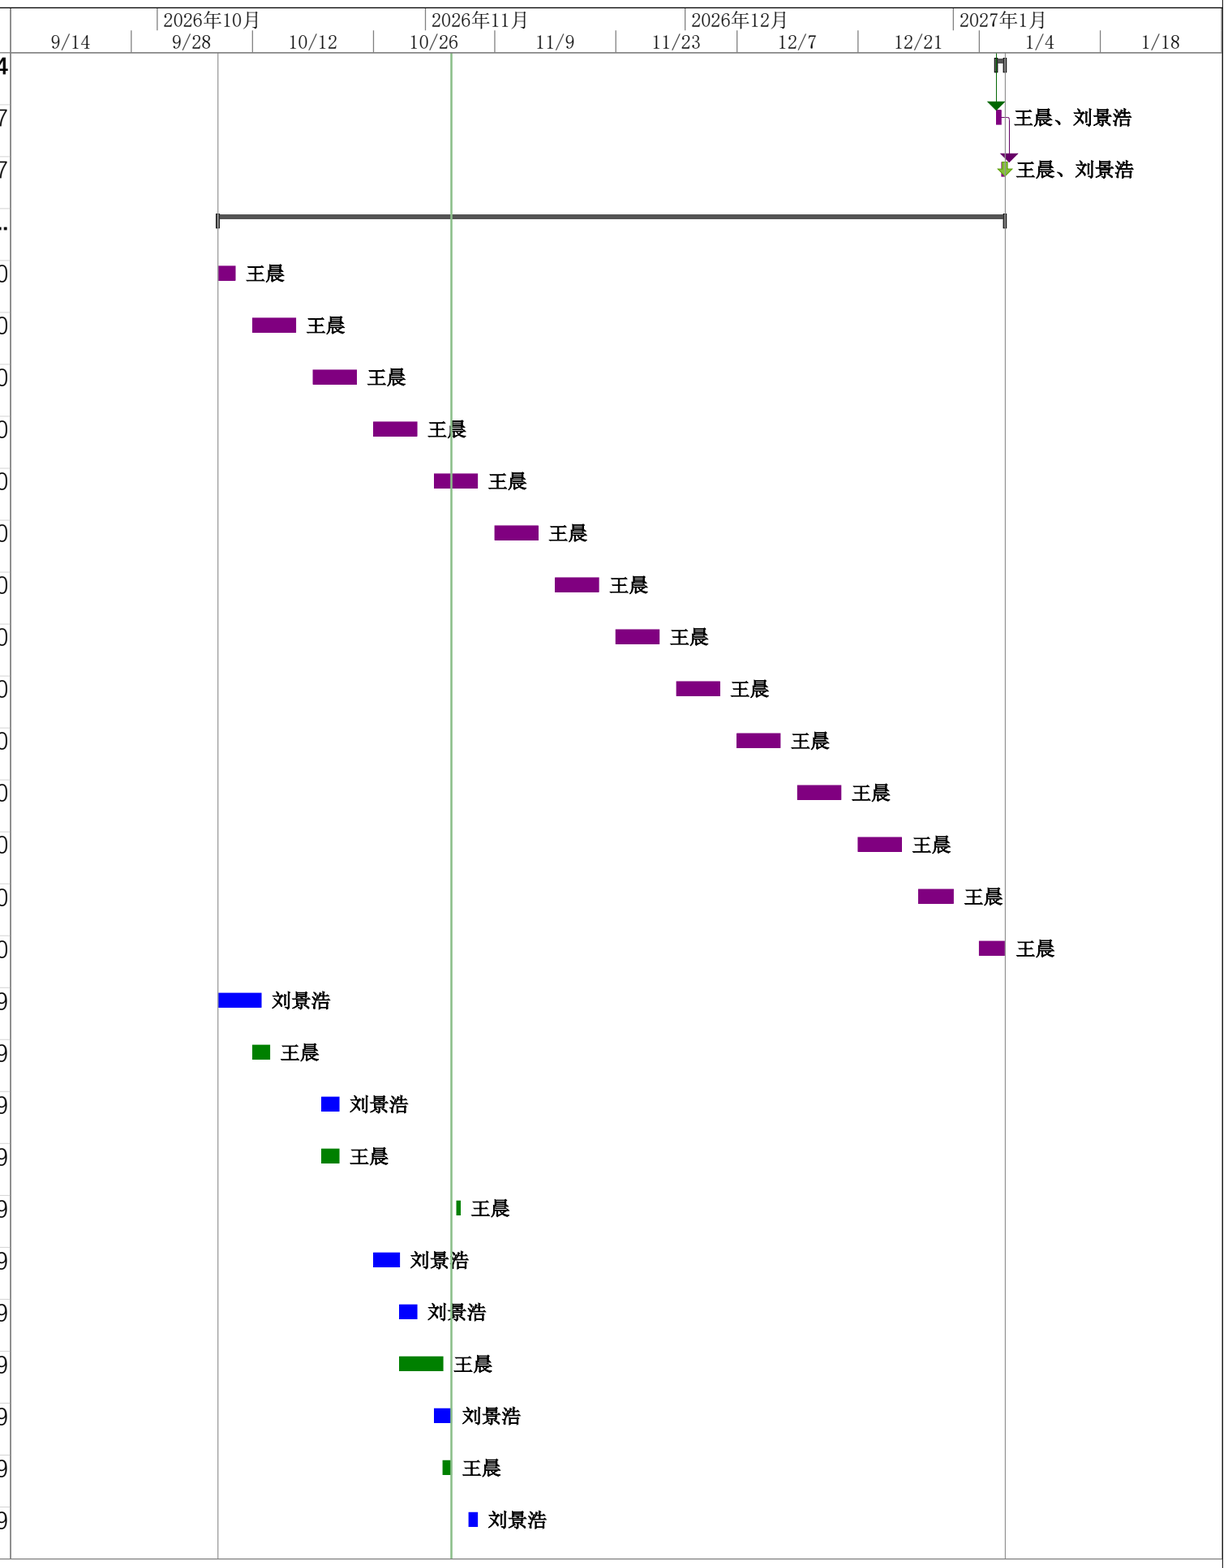

标识号	名称	计划人时	开始时间	完成时间	前置任务	任务负责人	成本
286	R5.2 复核与交接 登录、邮箱与材料认证	0.45人时	26/11/9	26/11/10		刘景浩	¥20.59
287	R5.3 复核与交接 文章存储、岗位检索与筛选接口	0.45人时	26/11/11	26/11/13		刘景浩	¥20.59
288	R5.4 复核与交接 小程序与网页阅读页面	0.45人时	26/11/6	26/11/10		王晨	¥20.59
289	R5.5 复核与交接 网页Markdown创作与草稿	0.45人时	26/11/11	26/11/13		王晨	¥20.59
290	R5.6 复核与交接 小程序文字与图片创作	0.45人时	26/11/16	26/11/17		刘景浩	¥20.59
291	R5.7 复核与交接 双端草稿、发布与文章管理	0.45人时	26/11/18	26/11/19		刘景浩	¥20.59
292	R5.8 复核与交接 评论、点赞、投币、收藏与荣誉	0.45人时	26/11/20	26/11/24		刘景浩	¥20.59
293	R5.9 复核与交接 社区审核、反馈与举报网页	0.45人时	26/11/16	26/11/18		王晨	¥20.59
294	R5.10 复核与交接 独立运维执行与备份服务	0.45人时	26/11/19	26/11/23		王晨	¥20.59
295	R5.11 复核与交接 运维网页、状态与操作记录	0.45人时	26/11/24	26/11/25		王晨	¥20.59
296	R6.1 复核与交接 功能、接口与集成测试	0.45人时	26/11/30	26/12/1		王晨	¥20.59
297	R6.2 复核与交接 性能与负载测试	0.45人时	26/11/30	26/12/1		刘景浩	¥20.59
298	R6.3 复核与交接 压力与稳定性测试	0.45人时	26/12/2	26/12/2		刘景浩	¥20.59
299	R6.4 复核与交接 安全权限与双端兼容测试	0.45人时	26/12/2	26/12/2		王晨	¥20.59
300	R6.5 复核与交接 部署、故障与备份恢复验证	0.45人时	26/12/3	26/12/3		刘景浩	¥20.59
301	R6.6 复核与交接 缺陷修复、复测与回归	0.45人时	26/12/3	26/12/4		王晨	¥20.59
302	R6.8 复核与交接 测试报告复核与提交准备	0.45人时	26/12/7	26/12/8		刘景浩	¥20.59
303	R7.1 复核与交接 安装包、用户与维护说明	0.45人时	26/12/9	26/12/10		刘景浩	¥20.59
304	R7.2 复核与交接 干净环境启动与课堂演示	0.45人时	26/12/11	26/12/11		刘景浩	¥20.59
305	R7.3 复核与交接 维护申请与变更演练	0.45人时	26/12/14	26/12/14		王晨	¥20.59
306	R7.4 复核与交接 运维交接与反馈整改	0.45人时	26/12/15	26/12/15		刘景浩	¥20.59
307	R7.5 复核与交接 课堂测试评审意见处理	0.45人时	26/12/17	26/12/17		王晨	¥20.59
308	R8.2 复核与交接 总评材料与详细计划附录	0.45人时	26/12/22	26/12/23		刘景浩	¥20.59
309	R8.4 复核与交接 总评反馈处理与归档	0.45人时	26/12/31	27/1/4		刘景浩	¥20.59
310	**K 课程里程碑**	**0人时**	**26/10/14**	**27/1/6**		**按下级分配**	**¥0.00**
311	K01 项目计划课堂评审	0人时	26/10/14	26/10/14		按下级分配	¥0.00
312	K02 可行性报告课堂节点	0人时	26/10/21	26/10/21		按下级分配	¥0.00
313	K03 SRS需求课堂评审	0人时	26/10/28	26/10/28		按下级分配	¥0.00
314	K04 SRS修订与需求复审	0人时	26/11/4	26/11/4		按下级分配	¥0.00

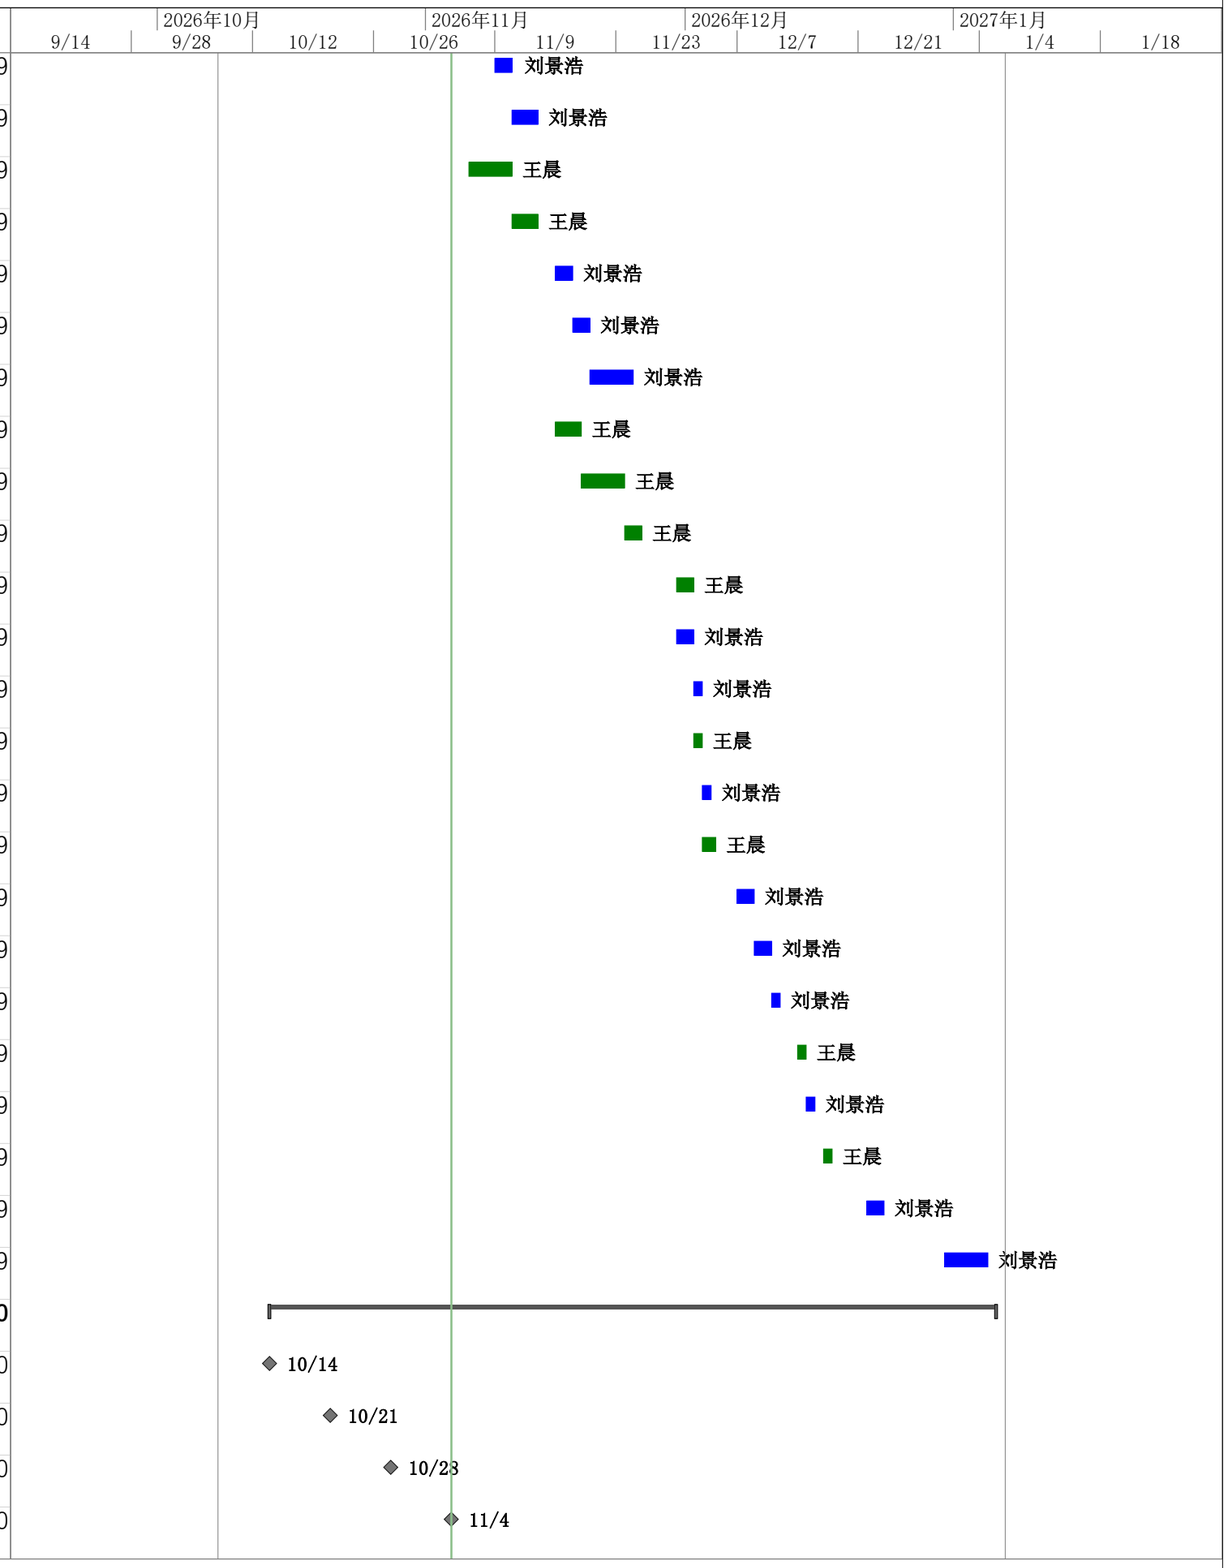

标识号	名称	计划人时	开始时间	完成时间	前置任务	任务负责人	成本
315	K05 总体设计课堂节点	0人时	26/11/11	26/11/11		按下级分配	¥0.00
316	K06 详细设计课堂节点	0人时	26/11/18	26/11/18		按下级分配	¥0.00
317	K07 设计评审与翻转PPT1	0人时	26/11/25	26/11/25		按下级分配	¥0.00
318	K08 代码用例与翻转PPT2	0人时	26/12/2	26/12/2		按下级分配	¥0.00
319	K09 系统测试报告课堂节点	0人时	26/12/9	26/12/9		按下级分配	¥0.00
320	K10 测试报告修订课堂评审	0人时	26/12/16	26/12/16		按下级分配	¥0.00
321	K11 项目总结与总评PPT	0人时	26/12/30	26/12/30		按下级分配	¥0.00
322	K12 课程收尾与交付确认	0人时	27/1/6	27/1/6		按下级分配	¥0.00

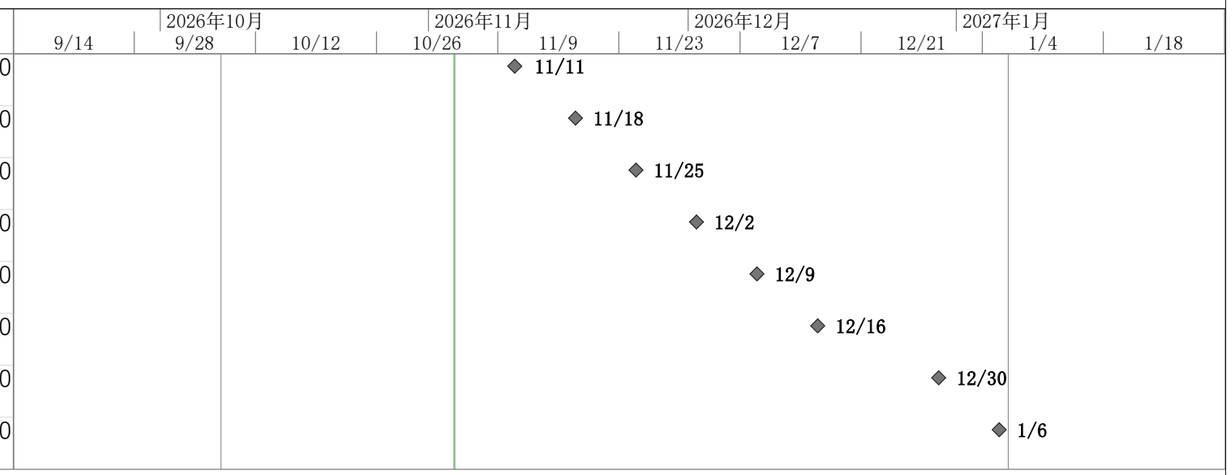

G04 Microsoft Project 资源核查 | 包含管理与复核任务 | 占用参数不代表贡献比例

名称	最大单位	过度分配	基准日历
王晨	**9%**	**是**	**G04课程排期日历**
刘景浩	**9%**	**是**	**G04课程排期日历**
