

城院帮 G04 项目计划 | 可行性八步与需求细化 | Microsoft Project 原生甘特图 | 青色王晨 蓝色刘景浩 紫色共同完成


| 标识号 | 名称 | 计划人时 | 开始时间 | 完成时间 | 前置任务 | 任务负责人 | 成本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **1 项目计划与评审** | **6人时** | **26/10/8** | **26/10/15** | | **按下级分配** | **¥274.56** |
| **2** | **1.1 任务分解、排期与资源预算** | **2人时** | **26/10/8** | **26/10/8** | | **王晨、刘景浩** | **¥91.52** |
| 3 | 1.1.1 确认WBS、依赖与提交边界 | 1人时 | 26/10/8 | 26/10/8 | | 王晨、刘景浩 | ¥45.76 |
| 4 | 1.1.2 建立资源预算与风险安排 | 1人时 | 26/10/8 | 26/10/8 | 3 | 王晨、刘景浩 | ¥45.76 |
| **5** | **1.2 项目计划内部复核与汇报材料** | **2人时** | **26/10/9** | **26/10/9** | | **王晨、刘景浩** | **¥91.52** |
| 6 | 1.2.1 逐条检查评审要求与计划 | 1人时 | 26/10/9 | 26/10/9 | 4 | 王晨、刘景浩 | ¥45.76 |
| 7 | 1.2.2 确认汇报材料与提交清单 | 1人时 | 26/10/9 | 26/10/9 | 6 | 王晨、刘景浩 | ¥45.76 |
| **8** | **1.3 项目计划评审反馈与修订** | **2人时** | **26/10/15** | **26/10/15** | | **王晨、刘景浩** | **¥91.52** |
| 9 | 1.3.1 登记课堂计划意见与影响 | 1人时 | 26/10/15 | 26/10/15 | 7 | 王晨、刘景浩 | ¥45.76 |
| 10 | 1.3.2 共同修订排期与计划基线 | 1人时 | 26/10/15 | 26/10/15 | 9 | 王晨、刘景浩 | ¥45.76 |
| **11** | **2 可行性研究** | **10人时** | **26/10/8** | **26/10/15** | | **按下级分配** | **¥457.60** |
| **12** | **2.1 关键技术与工具可行性验证** | **4.5人时** | **26/10/8** | **26/10/12** | | **王晨** | **¥205.92** |
| **13** | **2.1.1 验证双端构建与邮箱条件** | **2.25人时** | **26/10/8** | **26/10/8** | | **王晨** | **¥102.96** |
| **14** | **2.1.1.1 FS01 复查系统规模和目标** | **1人时** | **26/10/8** | **26/10/8** | | **王晨** | **¥45.76** |
| 15 | 2.1.1.1.1 FS01.1 明确使用者 | 0.2人时 | 26/10/8 | 26/10/8 | | 王晨 | ¥9.15 |
| 16 | 2.1.1.1.2 FS01.2 限定业务边界 | 0.2人时 | 26/10/8 | 26/10/8 | 15 | 王晨 | ¥9.15 |
| 17 | 2.1.1.1.3 FS01.3 划分访问权限 | 0.2人时 | 26/10/8 | 26/10/8 | 16 | 王晨 | ¥9.15 |
| 18 | 2.1.1.1.4 FS01.4 把目标写成检查项 | 0.2人时 | 26/10/8 | 26/10/8 | 17 | 王晨 | ¥9.15 |
| 19 | 2.1.1.1.5 FS01.5 核对规模和约束 | 0.2人时 | 26/10/8 | 26/10/8 | 18 | 王晨 | ¥9.15 |
| **20** | **2.1.1.2 FS02 研究目前正在使用的系统** | **1.25人时** | **26/10/8** | **26/10/8** | **14** | **王晨** | **¥57.20** |
| 21 | 2.1.1.2.1 FS02.1 列出当前渠道 | 0.25人时 | 26/10/8 | 26/10/8 | 14 | 王晨 | ¥11.44 |
| 22 | 2.1.1.2.2 FS02.2 保留已有有效能力 | 0.25人时 | 26/10/8 | 26/10/8 | 21 | 王晨 | ¥11.44 |
| 23 | 2.1.1.2.3 FS02.3 还原当前处理步骤 | 0.25人时 | 26/10/8 | 26/10/8 | 22 | 王晨 | ¥11.44 |
| 24 | 2.1.1.2.4 FS02.4 定位信息断点 | 0.25人时 | 26/10/8 | 26/10/8 | 23 | 王晨 | ¥11.44 |

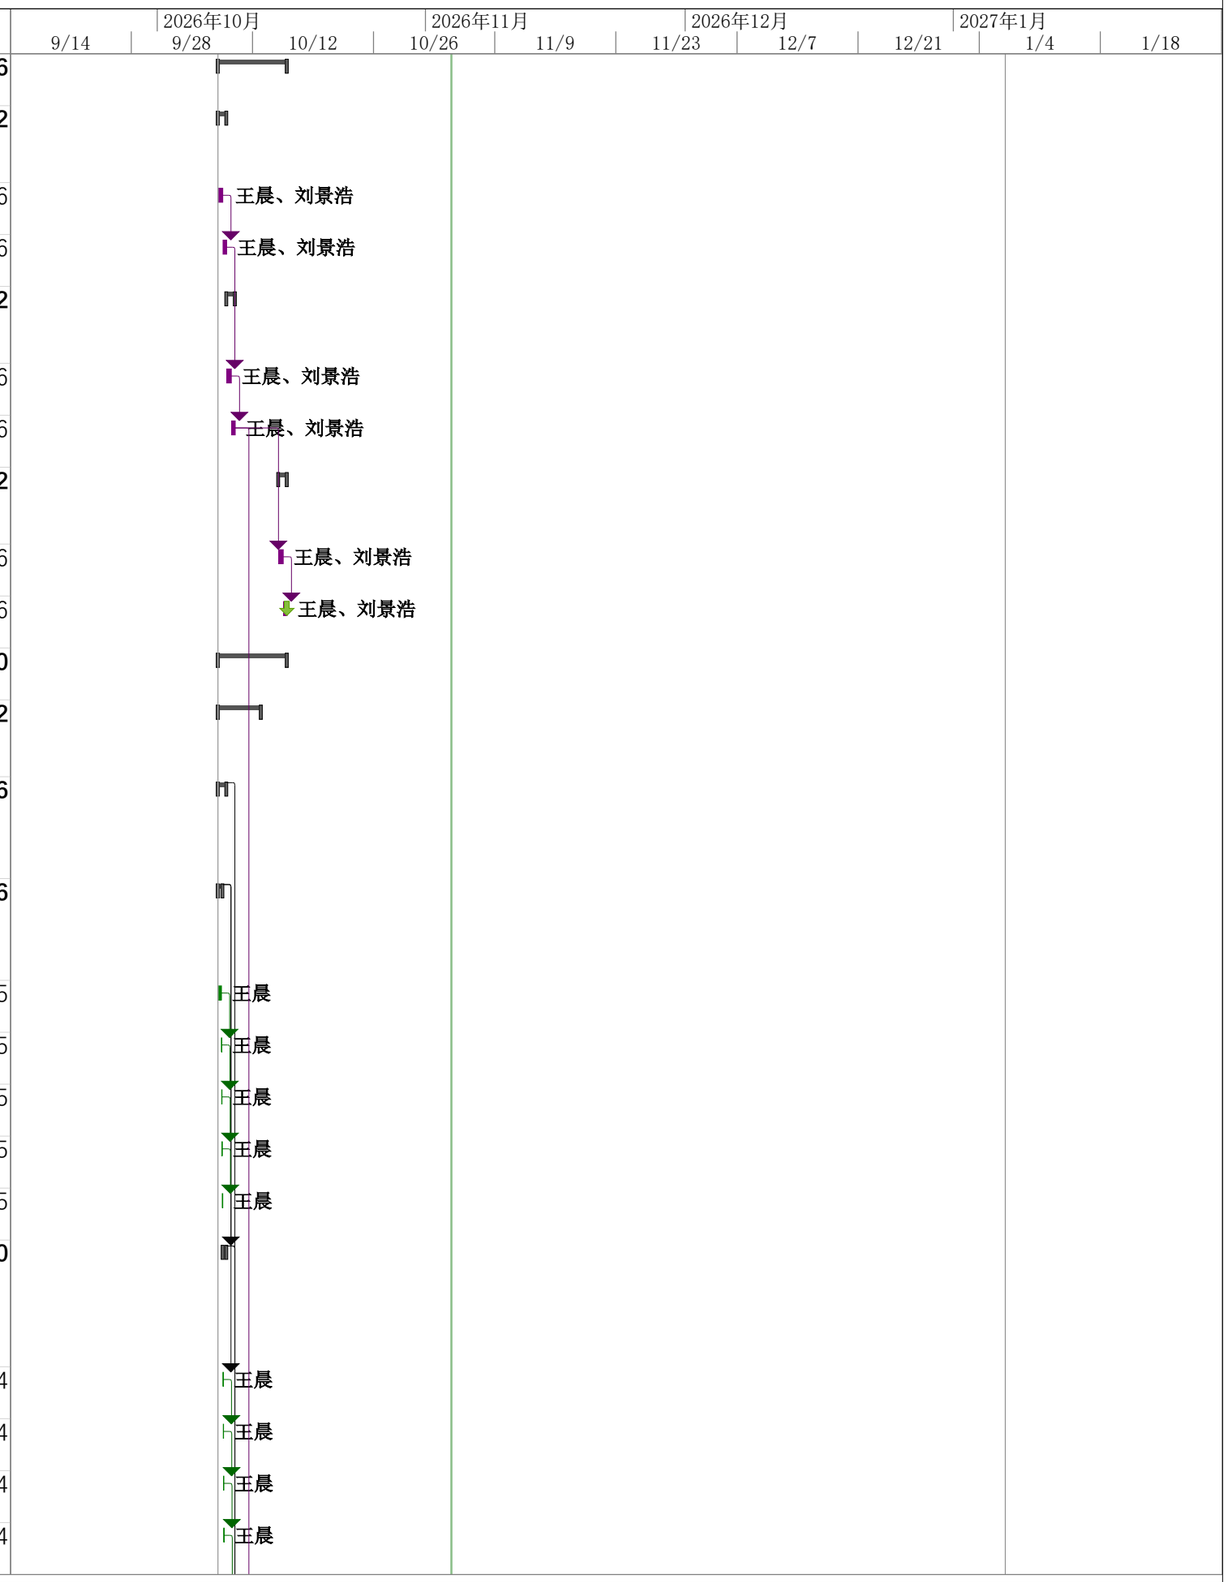


| 标识号 | 名称 | 计划人时 | 开始时间 | 完成时间 | 前置任务 | 任务负责人 | 成本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 2.1.1.2.5 FS02.5 把不足变成改进输入 | 0.25人时 | 26/10/8 | 26/10/8 | 24 | 王晨 | ¥11.44 |
| **26** | **2.1.2 核查独立运维、存储与恢复路径** | **2.25人时** | **26/10/9** | **26/10/12** | **13** | **王晨** | **¥102.96** |
| **27** | **2.1.2.1 FS03 导出新系统的高层逻辑模型** | **1.25人时** | **26/10/9** | **26/10/9** | **20** | **王晨** | **¥57.20** |
| 28 | 2.1.2.1.1 FS03.1 抽去现状工具名称 | 0.25人时 | 26/10/9 | 26/10/9 | 20 | 王晨 | ¥11.44 |
| 29 | 2.1.2.1.2 FS03.2 定义系统边界 | 0.2人时 | 26/10/9 | 26/10/9 | 28 | 王晨 | ¥9.15 |
| 30 | 2.1.2.1.3 FS03.3 明确输入与输出 | 0.2人时 | 26/10/9 | 26/10/9 | 29 | 王晨 | ¥9.15 |
| 31 | 2.1.2.1.4 FS03.4 分解主要逻辑处理 | 0.2人时 | 26/10/9 | 26/10/9 | 30 | 王晨 | ¥9.15 |
| 32 | 2.1.2.1.5 FS03.5 建立字典并检查平衡 | 0.2人时 | 26/10/9 | 26/10/9 | 31 | 王晨 | ¥9.15 |
| 33 | 2.1.2.1.6 FS03.6 推导目标物理实现 | 0.2人时 | 26/10/9 | 26/10/9 | 32 | 王晨 | ¥9.15 |
| **34** | **2.1.2.2 FS04 进一步定义问题** | **1人时** | **26/10/12** | **26/10/12** | **27** | **王晨** | **¥45.76** |
| 35 | 2.1.2.2.1 FS04.1 重写核心问题 | 0.2人时 | 26/10/12 | 26/10/12 | 27 | 王晨 | ¥9.15 |
| 36 | 2.1.2.2.2 FS04.2 拆开问题与解决手段 | 0.2人时 | 26/10/12 | 26/10/12 | 35 | 王晨 | ¥9.15 |
| 37 | 2.1.2.2.3 FS04.3 收紧本期范围 | 0.2人时 | 26/10/12 | 26/10/12 | 36 | 王晨 | ¥9.15 |
| 38 | 2.1.2.2.4 FS04.4 补充反例和限制 | 0.2人时 | 26/10/12 | 26/10/12 | 37 | 王晨 | ¥9.15 |
| 39 | 2.1.2.2.5 FS04.5 形成反馈和关闭方式 | 0.2人时 | 26/10/12 | 26/10/12 | 38 | 王晨 | ¥9.15 |
| **40** | **2.2 经济、操作及内容供给分析** | **2.5人时** | **26/10/12** | **26/10/13** | | **刘景浩** | **¥114.40** |
| **41** | **2.2.1 核查工具、设备与现金费用** | **1.25人时** | **26/10/12** | **26/10/12** | **7** | **刘景浩** | **¥57.20** |
| **42** | **2.2.1.1 FS05 导出和评价供选择的解法** | **1.25人时** | **26/10/12** | **26/10/12** | **27** | **刘景浩** | **¥57.20** |
| 43 | 2.2.1.1.1 FS05.1 形成六类解法 | 0.25人时 | 26/10/12 | 26/10/12 | 27 | 刘景浩 | ¥11.44 |
| 44 | 2.2.1.1.2 FS05.2 使用同一评价基准 | 0.2人时 | 26/10/12 | 26/10/12 | 43 | 刘景浩 | ¥9.15 |
| 45 | 2.2.1.1.3 FS05.3 逐项比较小程序与App | 0.2人时 | 26/10/12 | 26/10/12 | 44 | 刘景浩 | ¥9.15 |
| 46 | 2.2.1.1.4 FS05.4 评估成员与工具能力 | 0.2人时 | 26/10/12 | 26/10/12 | 45 | 刘景浩 | ¥9.15 |
| 47 | 2.2.1.1.5 FS05.5 换算工作量和人工成本 | 0.2人时 | 26/10/12 | 26/10/12 | 46 | 刘景浩 | ¥9.15 |
| 48 | 2.2.1.1.6 FS05.6 计算并解释评分 | 0.2人时 | 26/10/12 | 26/10/12 | 47 | 刘景浩 | ¥9.15 |
| **49** | **2.2.2 分析资料来源、作者邀请与操作成本** | **1.25人时** | **26/10/13** | **26/10/13** | **41** | **刘景浩** | **¥57.20** |
| **50** | **2.2.2.1 FS06 推荐行动方针** | **1.25人时** | **26/10/13** | **26/10/13** | **34,42** | **刘景浩** | **¥57.20** |
| 51 | 2.2.2.1.1 FS06.1 明确继续与否 | 0.25人时 | 26/10/13 | 26/10/13 | 34,42 | 刘景浩 | ¥11.44 |
| 52 | 2.2.2.1.2 FS06.2 给出推荐理由 | 0.25人时 | 26/10/13 | 26/10/13 | 51 | 刘景浩 | ¥11.44 |
| 53 | 2.2.2.1.3 FS06.3 说明备选方针 | 0.25人时 | 26/10/13 | 26/10/13 | 52 | 刘景浩 | ¥11.44 |

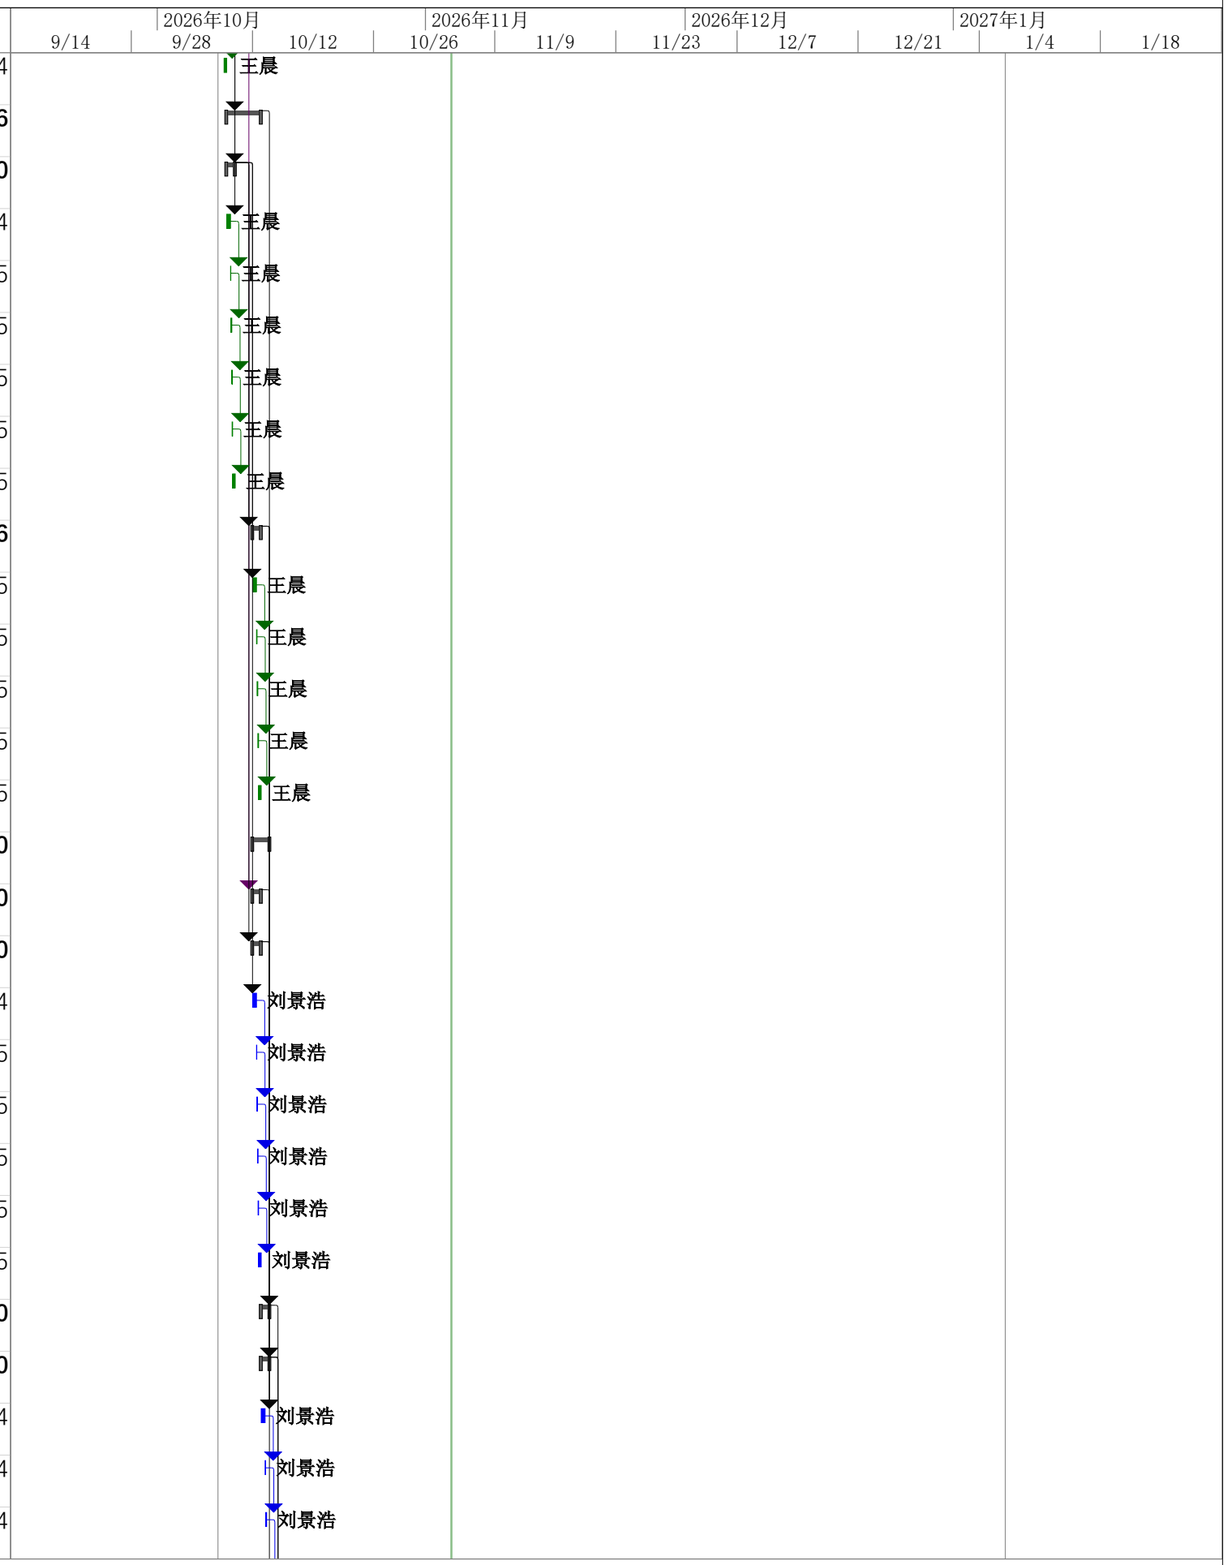


| 标识号 | 名称 | 计划人时 | 开始时间 | 完成时间 | 前置任务 | 任务负责人 | 成本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 2.2.2.1.4 FS06.4 定义继续条件 | 0.25人时 | 26/10/13 | 26/10/13 | 53 | 刘景浩 | ¥11.44 |
| 55 | 2.2.2.1.5 FS06.5 定义调整触发点 | 0.25人时 | 26/10/13 | 26/10/13 | 54 | 刘景浩 | ¥11.44 |
| **56** | **2.3 可行性报告与内部评审** | **3人时** | **26/10/14** | **26/10/15** | | **王晨、刘景浩** | **¥137.28** |
| **57** | **2.3.1 双方汇总技术与资源判断** | **1.5人时** | **26/10/14** | **26/10/14** | **26,49** | **王晨、刘景浩** | **¥68.64** |
| **58** | **2.3.1.1 FS07 草拟开发计划书** | **1.5人时** | **26/10/14** | **26/10/14** | **50** | **王晨、刘景浩** | **¥68.64** |
| 59 | 2.3.1.1.1 FS07.1 分解交付工作 | 0.25人时 | 26/10/14 | 26/10/14 | 50 | 王晨、刘景浩 | ¥11.44 |
| 60 | 2.3.1.1.2 FS07.2 估算人时与人员分配 | 0.25人时 | 26/10/14 | 26/10/14 | 59 | 王晨、刘景浩 | ¥11.44 |
| 61 | 2.3.1.1.3 FS07.3 建立依赖与排期 | 0.25人时 | 26/10/14 | 26/10/14 | 60 | 王晨、刘景浩 | ¥11.44 |
| 62 | 2.3.1.1.4 FS07.4 核算成本与资源 | 0.25人时 | 26/10/14 | 26/10/14 | 61 | 王晨、刘景浩 | ¥11.44 |
| 63 | 2.3.1.1.5 FS07.5 细排下一需求阶段 | 0.25人时 | 26/10/14 | 26/10/14 | 62 | 王晨、刘景浩 | ¥11.44 |
| 64 | 2.3.1.1.6 FS07.6 安排监督与调整 | 0.25人时 | 26/10/14 | 26/10/14 | 63 | 王晨、刘景浩 | ¥11.44 |
| **65** | **2.3.2 共同评审可行性结论与条件** | **1.5人时** | **26/10/15** | **26/10/15** | **57** | **王晨、刘景浩** | **¥68.64** |
| **66** | **2.3.2.1 FS08 写文档提交审查** | **1.5人时** | **26/10/15** | **26/10/15** | **58** | **王晨、刘景浩** | **¥68.64** |
| 67 | 2.3.2.1.1 FS08.1 组织完整报告 | 0.25人时 | 26/10/15 | 26/10/15 | 58 | 王晨、刘景浩 | ¥11.44 |
| 68 | 2.3.2.1.2 FS08.2 标记版本及输入 | 0.25人时 | 26/10/15 | 26/10/15 | 67 | 王晨、刘景浩 | ¥11.44 |
| 69 | 2.3.2.1.3 FS08.3 核对图文一致 | 0.25人时 | 26/10/15 | 26/10/15 | 68 | 王晨、刘景浩 | ¥11.44 |
| 70 | 2.3.2.1.4 FS08.4 编制审查索引 | 0.25人时 | 26/10/15 | 26/10/15 | 69 | 王晨、刘景浩 | ¥11.44 |
| 71 | 2.3.2.1.5 FS08.5 区分记录与待办 | 0.25人时 | 26/10/15 | 26/10/15 | 70 | 王晨、刘景浩 | ¥11.44 |
| 72 | 2.3.2.1.6 FS08.6 接收决定并闭环 | 0.25人时 | 26/10/15 | 26/10/15 | 71 | 王晨、刘景浩 | ¥11.44 |
| **73** | **3 需求分析** | **37.6人时** | **26/10/16** | **26/11/4** | | **按下级分配** | **¥1,72...** |
| **74** | **3.1 用户场景、用例与权限边界** | **4人时** | **26/10/16** | **26/10/19** | | **王晨、刘景浩** | **¥183.04** |
| **75** | **3.1.1 共同核对读者作者与管理场景** | **2人时** | **26/10/16** | **26/10/16** | **65** | **王晨、刘景浩** | **¥91.52** |
| 76 | 3.1.1.1 RA01 确认用户类别与需求代表 | 1人时 | 26/10/16 | 26/10/16 | 65 | 王晨、刘景浩 | ¥45.76 |
| 77 | 3.1.1.2 RA02 整理需求来源与情景 | 1人时 | 26/10/16 | 26/10/16 | 76 | 王晨、刘景浩 | ¥45.76 |
| **78** | **3.1.2 确认权限矩阵与核心用例** | **2人时** | **26/10/19** | **26/10/19** | **75** | **王晨、刘景浩** | **¥91.52** |
| 79 | 3.1.2.1 RA02 描述用例主流程与异常 | 1人时 | 26/10/19 | 26/10/19 | 75 | 王晨、刘景浩 | ¥45.76 |
| 80 | 3.1.2.2 RA01 核对角色权限和边界 | 1人时 | 26/10/19 | 26/10/19 | 79 | 王晨、刘景浩 | ¥45.76 |
| **81** | **3.2 功能、数据与非功能需求** | **3.2人时** | **26/10/20** | **26/10/21** | | **王晨** | **¥146.43** |
| **82** | **3.2.1 细化文章交流、激励与治理规则** | **1.6人时** | **26/10/20** | **26/10/20** | **78** | **王晨** | **¥73.22** |

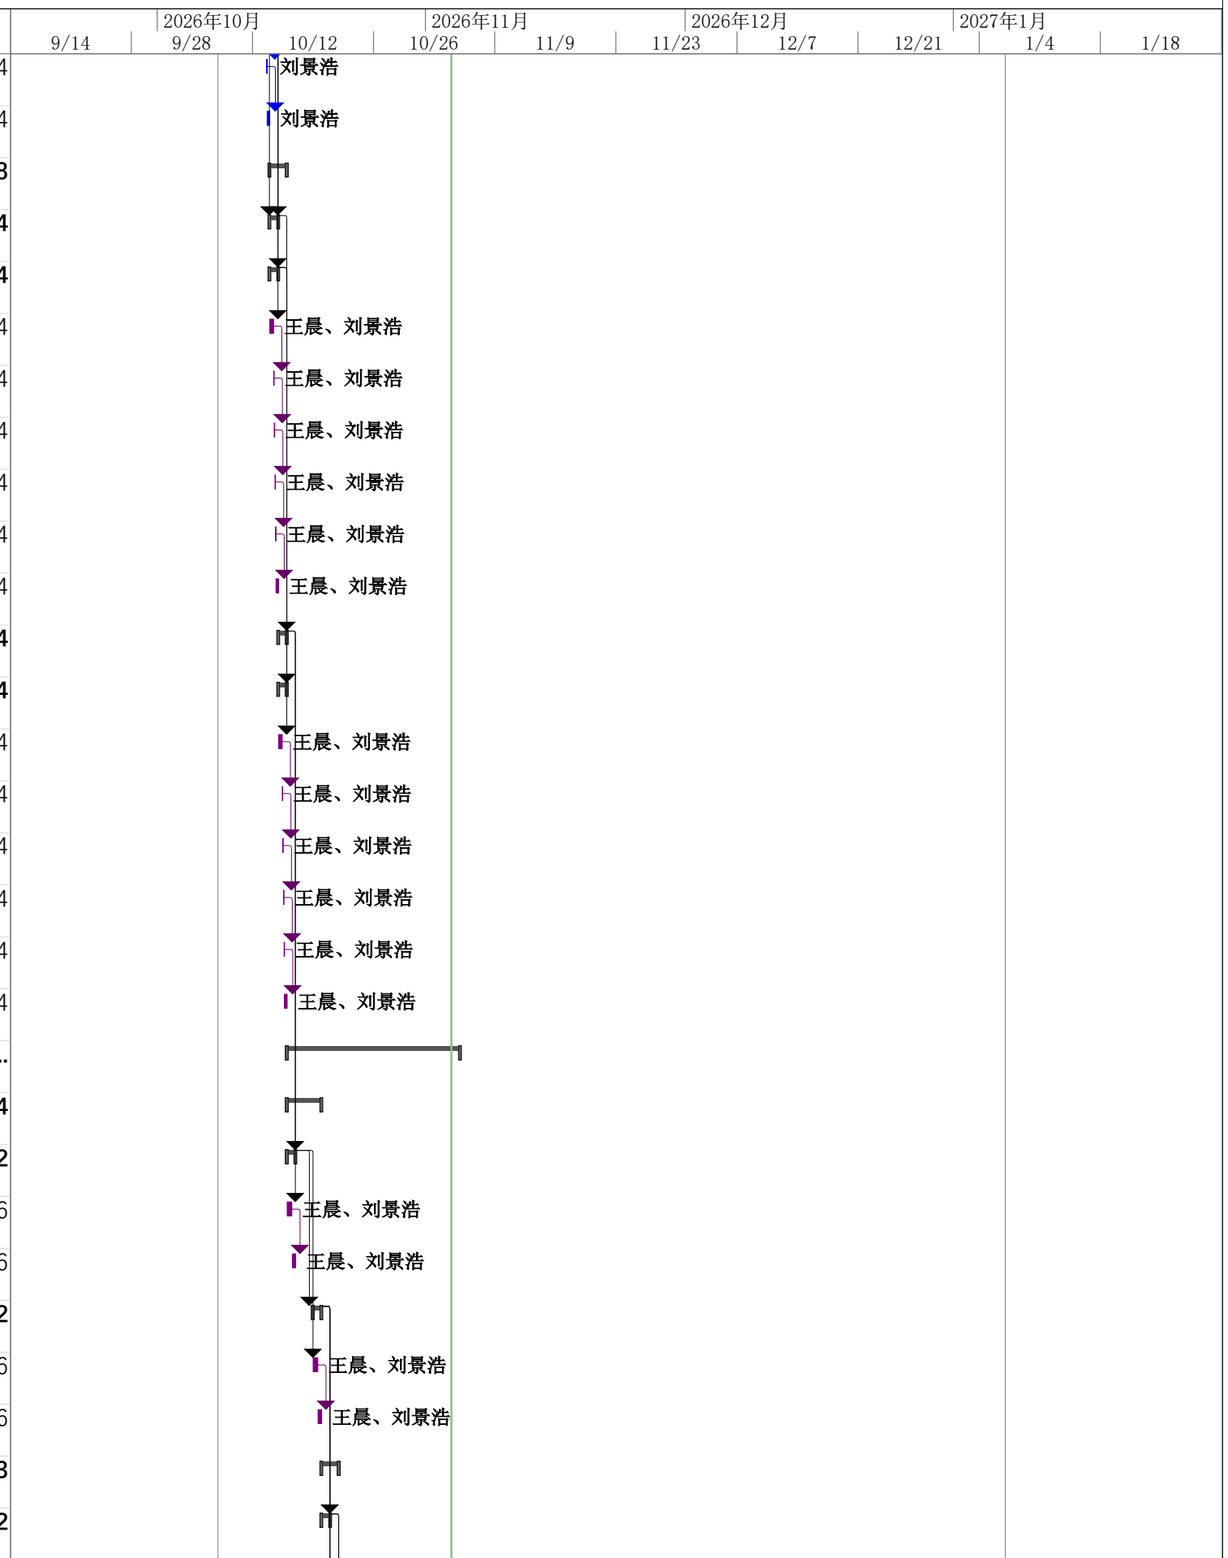


| 标识号 | 名称 | 计划人时 | 开始时间 | 完成时间 | 前置任务 | 任务负责人 | 成本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 3.2.1.1 RA01 拆分功能需求与本期范围 | 0.8人时 | 26/10/20 | 26/10/20 | 78 | 王晨 | ¥36.61 |
| 84 | 3.2.1.2 RA01 明确互动激励与治理规则 | 0.8人时 | 26/10/20 | 26/10/20 | 83 | 王晨 | ¥36.61 |
| **85** | **3.2.2 定义数据、异常与非功能验收** | **1.6人时** | **26/10/21** | **26/10/21** | **82** | **王晨** | **¥73.22** |
| 86 | 3.2.2.1 RA01 定义数据和接口约束 | 0.5人时 | 26/10/21 | 26/10/21 | 82 | 王晨 | ¥22.88 |
| 87 | 3.2.2.2 RA01 量化性能可靠性与安全指标 | 0.6人时 | 26/10/21 | 26/10/21 | 86 | 王晨 | ¥27.46 |
| 88 | 3.2.2.3 RA10 定义异常和验收场景 | 0.5人时 | 26/10/21 | 26/10/21 | 87 | 王晨 | ¥22.88 |
| **89** | **3.3 双端原型与场景核对** | **3.2人时** | **26/10/20** | **26/10/21** | | **刘景浩** | **¥146.43** |
| **90** | **3.3.1 绘制双端阅读创作原型** | **1.6人时** | **26/10/20** | **26/10/20** | **78** | **刘景浩** | **¥73.22** |
| 91 | 3.3.1.1 RA03 整理小程序阅读与作者界面 | 0.8人时 | 26/10/20 | 26/10/20 | 78 | 刘景浩 | ¥36.61 |
| 92 | 3.3.1.2 RA03 整理网页创作与阅读线框 | 0.8人时 | 26/10/20 | 26/10/20 | 91 | 刘景浩 | ¥36.61 |
| **93** | **3.3.2 核对社区和运维管理流程** | **1.6人时** | **26/10/21** | **26/10/21** | **90** | **刘景浩** | **¥73.22** |
| 94 | 3.3.2.1 RA03 核对社区案件与关联定位 | 0.8人时 | 26/10/21 | 26/10/21 | 90 | 刘景浩 | ¥36.61 |
| 95 | 3.3.2.2 RA03 核对独立运维与执行确认 | 0.8人时 | 26/10/21 | 26/10/21 | 94 | 刘景浩 | ¥36.61 |
| **96** | **3.4 SRS基线与需求评审材料** | **4人时** | **26/10/22** | **26/10/23** | | **王晨、刘景浩** | **¥183.04** |
| **97** | **3.4.1 共同汇总SRS与需求追踪** | **2人时** | **26/10/22** | **26/10/22** | **85,93** | **王晨、刘景浩** | **¥91.52** |
| 98 | 3.4.1.1 RA10 汇总功能非功能与SRS | 1人时 | 26/10/22 | 26/10/22 | 85,93 | 王晨、刘景浩 | ¥45.76 |
| 99 | 3.4.1.2 RA10 关联追踪编号与输入版本 | 1人时 | 26/10/22 | 26/10/22 | 98 | 王晨、刘景浩 | ¥45.76 |
| **100** | **3.4.2 内部复核并准备需求汇报** | **2人时** | **26/10/23** | **26/10/23** | **97** | **王晨、刘景浩** | **¥91.52** |
| 101 | 3.4.2.1 RA10 组织内部需求评审 | 1人时 | 26/10/23 | 26/10/23 | 97 | 王晨、刘景浩 | ¥45.76 |
| 102 | 3.4.2.2 RA10 核对汇报与提交清单 | 1人时 | 26/10/23 | 26/10/23 | 101 | 王晨、刘景浩 | ¥45.76 |
| **103** | **3.5 需求课堂评审反馈处理** | **3.2人时** | **26/11/4** | **26/11/4** | | **刘景浩** | **¥146.43** |
| **104** | **3.5.1 记录需求复审意见** | **1.6人时** | **26/11/4** | **26/11/4** | **141** | **刘景浩** | **¥73.22** |
| 105 | 3.5.1.1 RA10 登记课堂评审问题 | 0.8人时 | 26/11/4 | 26/11/4 | 141 | 刘景浩 | ¥36.61 |
| 106 | 3.5.1.2 RA10 分析范围接口和排期影响 | 0.8人时 | 26/11/4 | 26/11/4 | 105 | 刘景浩 | ¥36.61 |
| **107** | **3.5.2 修订需求并同步设计影响** | **1.6人时** | **26/11/4** | **26/11/4** | **104** | **刘景浩** | **¥73.22** |
| 108 | 3.5.2.1 RA10 修订需求与未关闭问题 | 0.8人时 | 26/11/4 | 26/11/4 | 104 | 刘景浩 | ¥36.61 |
| 109 | 3.5.2.2 RA10 向设计交接确认结果 | 0.8人时 | 26/11/4 | 26/11/4 | 108 | 刘景浩 | ¥36.61 |
| **110** | **3.6 课件核对及三模型骨架** | **6人时** | **26/10/28** | **26/10/29** | | **王晨、刘景浩** | **¥274.56** |
| **111** | **3.6.1 核对课件评审表、用户及范围** | **3人时** | **26/10/28** | **26/10/28** | **100** | **王晨、刘景浩** | **¥137.28** |

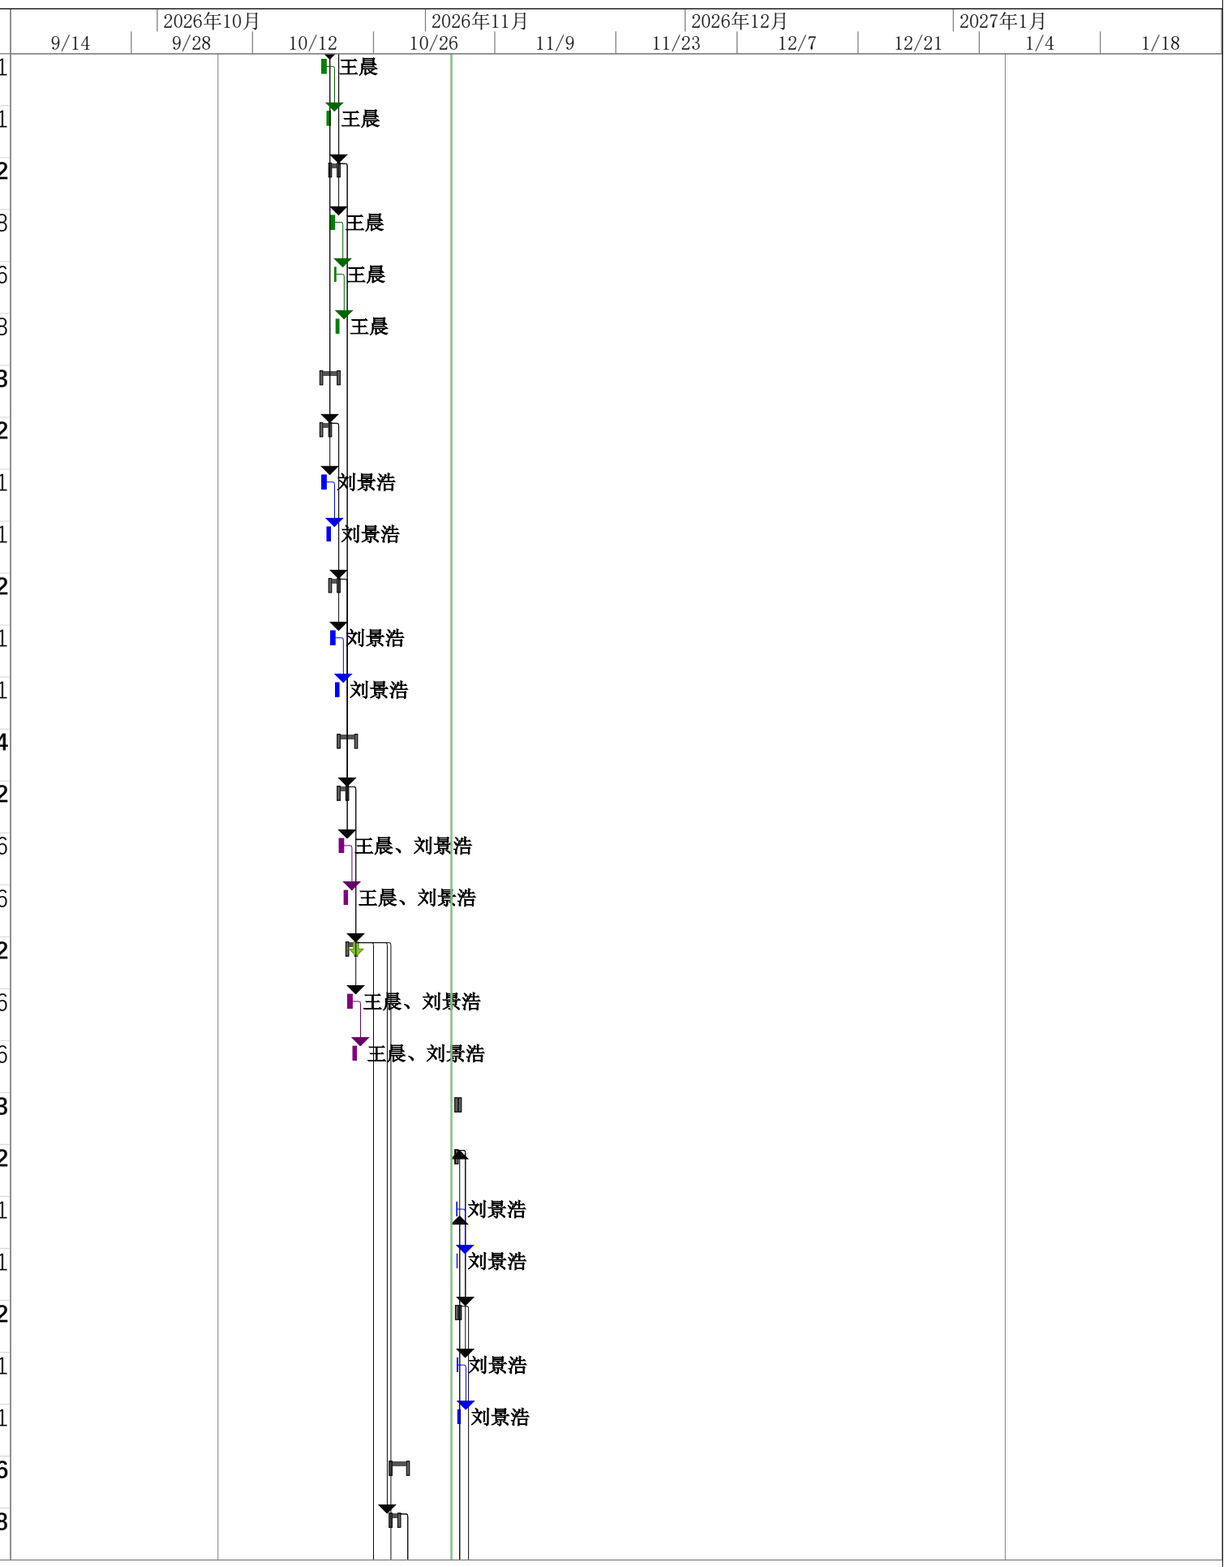


| 标识号 | 名称 | 计划人时 | 开始时间 | 完成时间 | 前置任务 | 任务负责人 | 成本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 3.6.1.1 RA01 核对综合要求与未来范围 | 1人时 | 26/10/28 | 26/10/28 | 100 | 王晨、刘景浩 | ¥45.76 |
| 113 | 3.6.1.2 RA02 核对代表来源及获取方法 | 1人时 | 26/10/28 | 26/10/28 | 112 | 王晨、刘景浩 | ¥45.76 |
| 114 | 3.6.1.3 RA10 建立课件与评审覆盖索引 | 1人时 | 26/10/28 | 26/10/28 | 113 | 王晨、刘景浩 | ¥45.76 |
| **115** | **3.6.2 建立ER与分层DFD并交叉核对** | **3人时** | **26/10/29** | **26/10/29** | **111** | **王晨、刘景浩** | **¥137.28** |
| 116 | 3.6.2.1 RA04 建立ER实体属性与基数 | 1人时 | 26/10/29 | 26/10/29 | 111 | 王晨、刘景浩 | ¥45.76 |
| 117 | 3.6.2.2 RA05 建立上下文一级和关键二级DFD | 1.25人时 | 26/10/29 | 26/10/29 | 116 | 王晨、刘景浩 | ¥57.20 |
| 118 | 3.6.2.3 RA05 核对父子流平衡与边界 | 0.75人时 | 26/10/29 | 26/10/29 | 117 | 王晨、刘景浩 | ¥34.32 |
| **119** | **3.7 字典规范化及行为辅助模型** | **5人时** | **26/10/30** | **26/10/30** | | **王晨、刘景浩** | **¥228.80** |
| **120** | **3.7.1 细化数据字典正则及规范化** | **2.5人时** | **26/10/30** | **26/10/30** | **115** | **王晨、刘景浩** | **¥114.40** |
| 121 | 3.7.1.1 RA06 定义字典结构正则与语义 | 1人时 | 26/10/30 | 26/10/30 | 115 | 王晨、刘景浩 | ¥45.76 |
| 122 | 3.7.1.2 RA07 分析函数依赖及1NF至3NF | 1人时 | 26/10/30 | 26/10/30 | 121 | 王晨、刘景浩 | ¥45.76 |
| 123 | 3.7.1.3 RA06 核对处理逻辑与反例约束 | 0.5人时 | 26/10/30 | 26/10/30 | 122 | 王晨、刘景浩 | ¥22.88 |
| **124** | **3.7.2 核对状态转换及辅助图形** | **2.5人时** | **26/10/30** | **26/10/30** | **120** | **王晨、刘景浩** | **¥114.40** |
| 125 | 3.7.2.1 RA08 绘制STD与状态转换表 | 1人时 | 26/10/30 | 26/10/30 | 120 | 王晨、刘景浩 | ¥45.76 |
| 126 | 3.7.2.2 RA09 绘制层次方框图 | 0.5人时 | 26/10/30 | 26/10/30 | 125 | 王晨、刘景浩 | ¥22.88 |
| 127 | 3.7.2.3 RA09 绘制Warnier图 | 0.5人时 | 26/10/30 | 26/10/30 | 126 | 王晨、刘景浩 | ¥22.88 |
| 128 | 3.7.2.4 RA09 编制IPO与改进IPO | 0.5人时 | 26/10/30 | 26/10/30 | 127 | 王晨、刘景浩 | ¥22.88 |
| **129** | **3.8 界面线框与真实用户走查** | **4人时** | **26/11/2** | **26/11/2** | | **王晨、刘景浩** | **¥183.04** |
| **130** | **3.8.1 准备导航线框与用户代表任务** | **2人时** | **26/11/2** | **26/11/2** | **124** | **王晨、刘景浩** | **¥91.52** |
| 131 | 3.8.1.1 RA03 整理青绿四页与W01至W14线框 | 1人时 | 26/11/2 | 26/11/2 | 124 | 王晨、刘景浩 | ¥45.76 |
| 132 | 3.8.1.2 RA03 准备代表和任务走查表 | 1人时 | 26/11/2 | 26/11/2 | 131 | 王晨、刘景浩 | ¥45.76 |
| **133** | **3.8.2 执行代表走查并登记修改与确认** | **2人时** | **26/11/2** | **26/11/2** | **130** | **王晨、刘景浩** | **¥91.52** |
| 134 | 3.8.2.1 RA03 执行任务并记录原话和问题 | 1人时 | 26/11/2 | 26/11/2 | 130 | 王晨、刘景浩 | ¥45.76 |
| 135 | 3.8.2.2 RA03 修改原型并取得复核确认 | 1人时 | 26/11/2 | 26/11/2 | 134 | 王晨、刘景浩 | ¥45.76 |
| **136** | **3.9 需求验证追踪与阶段提交** | **5人时** | **26/11/3** | **26/11/3** | | **王晨、刘景浩** | **¥228.80** |
| **137** | **3.9.1 同步SRS与四维验证及追踪** | **2.5人时** | **26/11/3** | **26/11/3** | **133** | **王晨、刘景浩** | **¥114.40** |
| 138 | 3.9.1.1 RA10 执行一致完整现实有效检查 | 1人时 | 26/11/3 | 26/11/3 | 133 | 王晨、刘景浩 | ¥45.76 |
| 139 | 3.9.1.2 RA10 核对FR规则模型与验收追踪 | 1人时 | 26/11/3 | 26/11/3 | 138 | 王晨、刘景浩 | ¥45.76 |
| 140 | 3.9.1.3 RA10 形成SRS候选版本与问题表 | 0.5人时 | 26/11/3 | 26/11/3 | 139 | 王晨、刘景浩 | ¥22.88 |

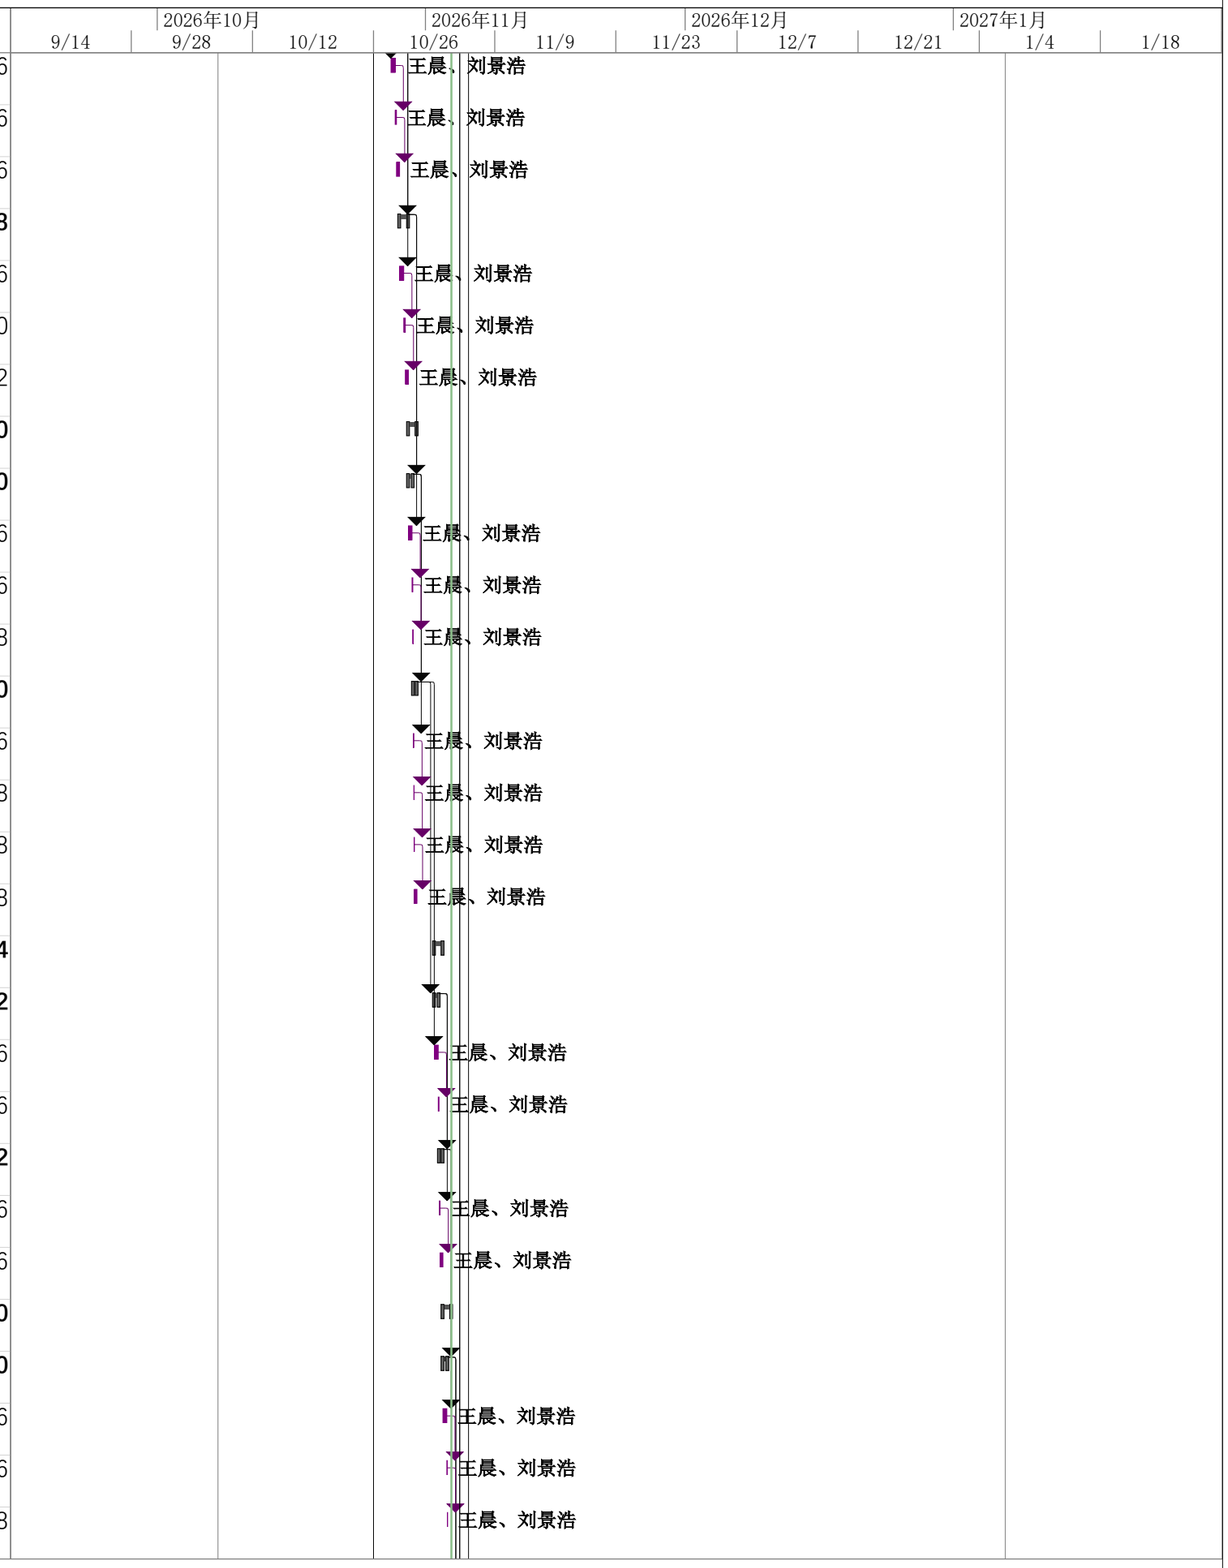


| 标识号 | 名称 | 计划人时 | 开始时间 | 完成时间 | 前置任务 | 任务负责人 | 成本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **141** | **3.9.2 同步计划排期并核对评审提交包** | **2.5人时** | **26/11/3** | **26/11/3** | **137** | **王晨、刘景浩** | **¥114.40** |
| 142 | 3.9.2.1 RA10 同步计划WBS与排期证据 | 1人时 | 26/11/3 | 26/11/3 | 137 | 王晨、刘景浩 | ¥45.76 |
| 143 | 3.9.2.2 RA10 按两张评审表核对交付包 | 1人时 | 26/11/3 | 26/11/3 | 142 | 王晨、刘景浩 | ¥45.76 |
| 144 | 3.9.2.3 RA10 准备讲稿与排练交接 | 0.5人时 | 26/11/3 | 26/11/3 | 143 | 王晨、刘景浩 | ¥22.88 |
| **145** | **4 总体与详细设计** | **32.1人时** | **26/10/26** | **26/11/26** | | **按下级分配** | **¥1,46...** |
| **146** | **4.1 系统架构、接口与数据库设计** | **4.5人时** | **26/10/26** | **26/10/28** | | **王晨** | **¥205.92** |
| 147 | 4.1.1 设计业务模块与接口契约 | 2.5人时 | 26/10/26 | 26/10/26 | 100 | 王晨 | ¥114.40 |
| 148 | 4.1.2 设计数据关系与本机部署边界 | 2人时 | 26/10/27 | 26/10/28 | 147 | 王晨 | ¥91.52 |
| **149** | **4.2 认证、内容、激励与治理设计** | **4.5人时** | **26/10/29** | **26/10/30** | | **王晨** | **¥205.92** |
| 150 | 4.2.1 细化认证文章与治理状态 | 2.5人时 | 26/10/29 | 26/10/29 | 148 | 王晨 | ¥114.40 |
| 151 | 4.2.2 细化币事务、隐私及异常处理 | 2人时 | 26/10/30 | 26/10/30 | 150 | 王晨 | ¥91.52 |
| **152** | **4.3 双端浏览与创作详细设计** | **4.5人时** | **26/10/29** | **26/11/2** | | **刘景浩** | **¥205.92** |
| 153 | 4.3.1 设计网页Markdown与移动图文 | 2.5人时 | 26/10/29 | 26/10/29 | 148 | 刘景浩 | ¥114.40 |
| 154 | 4.3.2 设计图片、草稿和跨端编辑流程 | 2人时 | 26/10/30 | 26/11/2 | 153 | 刘景浩 | ¥91.52 |
| **155** | **4.4 部署、备份与恢复详细设计** | **4.5人时** | **26/11/2** | **26/11/3** | | **王晨** | **¥205.92** |
| 156 | 4.4.1 定义运维接口、鉴权与白名单 | 2.5人时 | 26/11/2 | 26/11/2 | 151 | 王晨 | ¥114.40 |
| 157 | 4.4.2 设计备份一致性、恢复与失败保护 | 2人时 | 26/11/3 | 26/11/3 | 156 | 王晨 | ¥91.52 |
| **158** | **4.5 内部设计评审与文档基线** | **4.8人时** | **26/11/5** | **26/11/5** | | **王晨、刘景浩** | **¥219.65** |
| 159 | 4.5.1 共同核对总体与详细设计 | 2.4人时 | 26/11/5 | 26/11/5 | 154,157,16 | 王晨、刘景浩 | ¥109.82 |
| 160 | 4.5.2 共同评审并确认内部设计基线 | 2.4人时 | 26/11/5 | 26/11/5 | 159 | 王晨、刘景浩 | ¥109.82 |
| **161** | **4.6 测试用例设计与数据准备** | **4.5人时** | **26/11/3** | **26/11/3** | | **刘景浩** | **¥205.92** |
| 162 | 4.6.1 编制核心与异常验收用例 | 2.5人时 | 26/11/3 | 26/11/3 | 154,151 | 刘景浩 | ¥114.40 |
| 163 | 4.6.2 准备合成数据和性能脚本方案 | 2人时 | 26/11/3 | 26/11/3 | 162 | 刘景浩 | ¥91.52 |
| **164** | **4.7 课堂设计反馈与模块调整** | **4.8人时** | **26/11/26** | **26/11/26** | | **王晨、刘景浩** | **¥219.65** |
| 165 | 4.7.1 共同登记课堂设计意见 | 2.4人时 | 26/11/26 | 26/11/26 | 191,200 | 王晨、刘景浩 | ¥109.82 |
| 166 | 4.7.2 分别调整模块并共同复核 | 2.4人时 | 26/11/26 | 26/11/26 | 165 | 王晨、刘景浩 | ¥109.82 |
| **167** | **5 编码与单元测试** | **58.8人时** | **26/11/6** | **26/11/27** | | **按下级分配** | **¥2,69...** |
| **168** | **5.1 项目骨架、配置与接口约定** | **1.8人时** | **26/11/6** | **26/11/6** | | **王晨** | **¥82.37** |
| 169 | 5.1.1 搭建模块骨架与环境配置 | 0.8人时 | 26/11/6 | 26/11/6 | 160 | 王晨 | ¥36.61 |

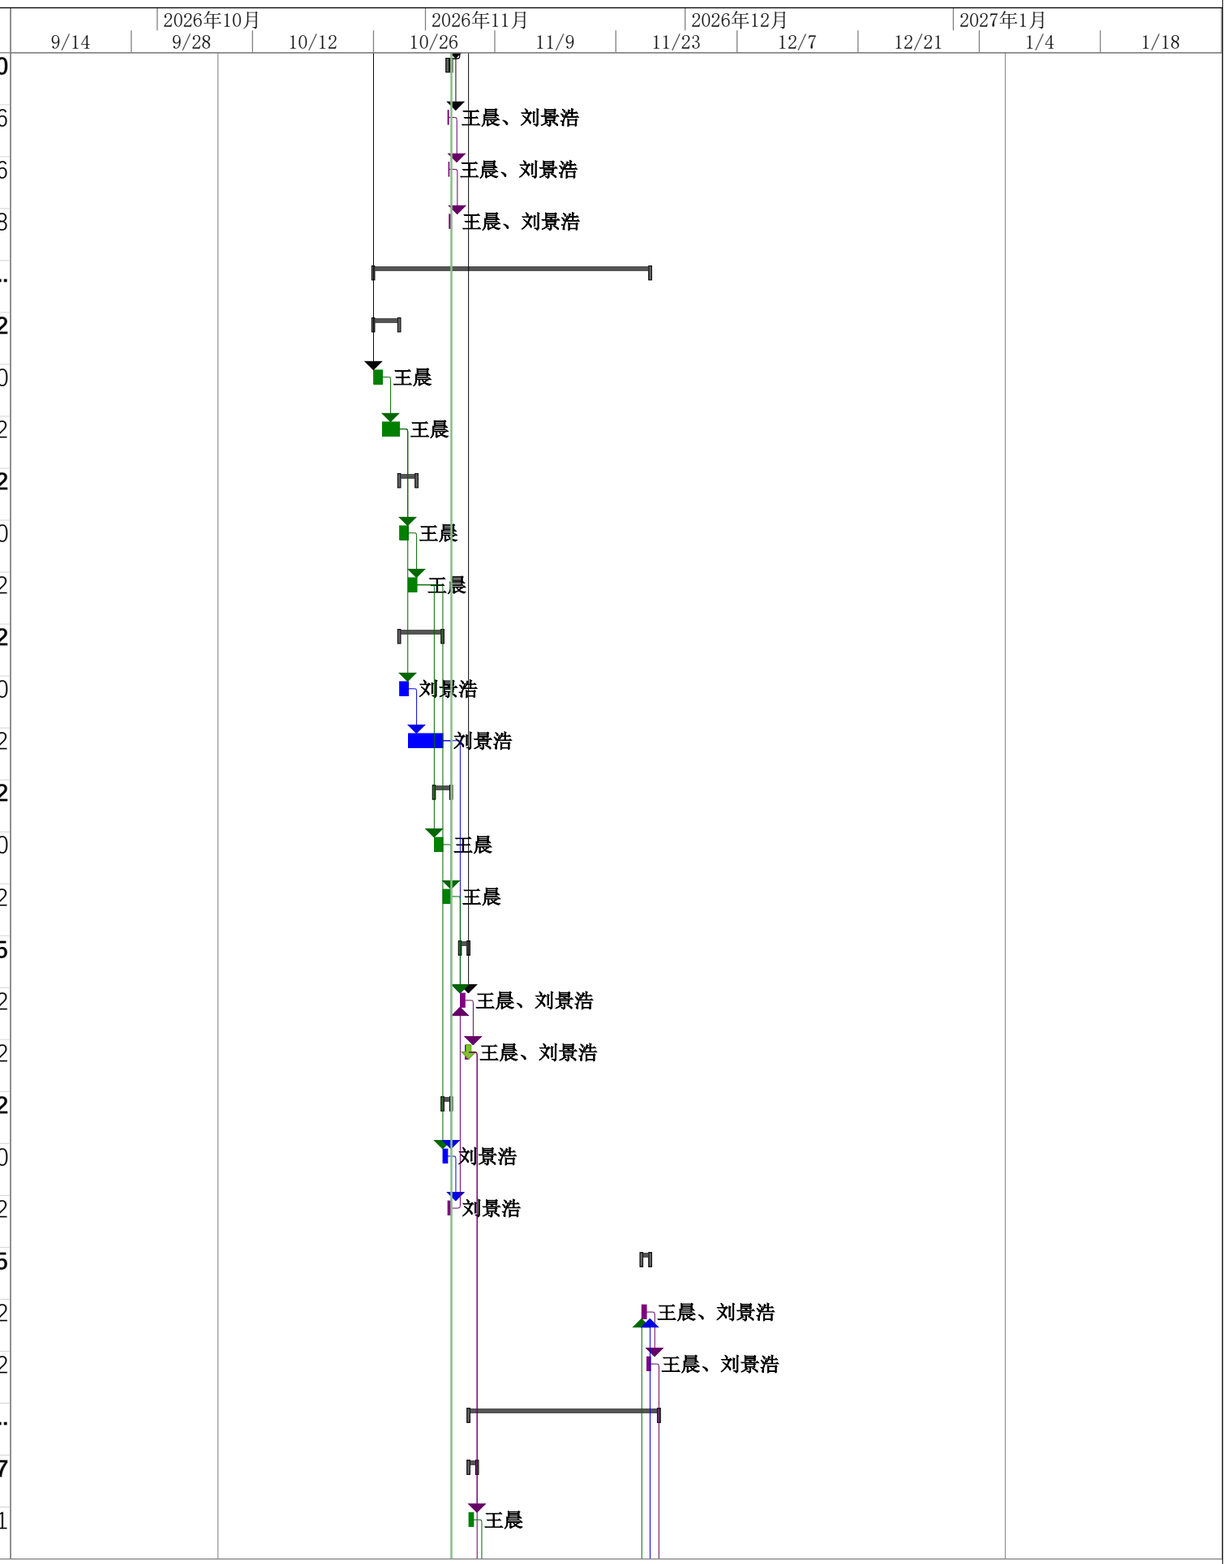


| 标识号 | 名称 | 计划人时 | 开始时间 | 完成时间 | 前置任务 | 任务负责人 | 成本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170 | 5.1.2 核对共享接口和错误格式 | 1人时 | 26/11/6 | 26/11/6 | 169 | 王晨 | ¥45.76 |
| **171** | **5.2 登录、邮箱与材料认证** | **3人时** | **26/11/9** | **26/11/10** | | **王晨** | **¥137.28** |
| 172 | 5.2.1 实现登录与校园邮箱验证 | 1.5人时 | 26/11/9 | 26/11/9 | 170 | 王晨 | ¥68.64 |
| 173 | 5.2.2 实现材料认证接口和角色限制 | 1.5人时 | 26/11/10 | 26/11/10 | 172 | 王晨 | ¥68.64 |
| **174** | **5.3 文章存储、岗位检索与筛选接口** | **2人时** | **26/11/11** | **26/11/13** | | **王晨** | **¥91.52** |
| 175 | 5.3.1 实现文章图片、草稿存储接口 | 1人时 | 26/11/11 | 26/11/11 | 173 | 王晨 | ¥45.76 |
| 176 | 5.3.2 实现岗位专业公司筛选与分页 | 1人时 | 26/11/12 | 26/11/13 | 175 | 王晨 | ¥45.76 |
| **177** | **5.4 小程序与网页阅读页面** | **5.5人时** | **26/11/6** | **26/11/10** | | **刘景浩** | **¥251.68** |
| 178 | 5.4.1 实现双端筛选与阅读界面 | 3.5人时 | 26/11/6 | 26/11/6 | 160 | 刘景浩 | ¥160.16 |
| 179 | 5.4.2 核对游客状态、失败和空结果 | 2人时 | 26/11/9 | 26/11/10 | 178 | 刘景浩 | ¥91.52 |
| **180** | **5.5 网页Markdown创作与草稿** | **5.5人时** | **26/11/11** | **26/11/13** | | **刘景浩** | **¥251.68** |
| 181 | 5.5.1 实现Markdown、图片和资料链接 | 3.5人时 | 26/11/11 | 26/11/11 | 179 | 刘景浩 | ¥160.16 |
| 182 | 5.5.2 实现预览、保存与草稿恢复 | 2人时 | 26/11/12 | 26/11/13 | 181 | 刘景浩 | ¥91.52 |
| **183** | **5.6 小程序文字与图片创作** | **5.5人时** | **26/11/16** | **26/11/17** | | **王晨** | **¥251.68** |
| 184 | 5.6.1 实现移动图文编辑和上传 | 3.5人时 | 26/11/16 | 26/11/16 | 176 | 王晨 | ¥160.16 |
| 185 | 5.6.2 实现移动草稿保存及恢复 | 2人时 | 26/11/17 | 26/11/17 | 184 | 王晨 | ¥91.52 |
| **186** | **5.7 双端草稿、发布与文章管理** | **5.5人时** | **26/11/18** | **26/11/19** | | **王晨** | **¥251.68** |
| 187 | 5.7.1 实现发布、修改、下架和恢复接口 | 3.5人时 | 26/11/18 | 26/11/18 | 185,182 | 王晨 | ¥160.16 |
| 188 | 5.7.2 接通双端作者文章管理 | 2人时 | 26/11/19 | 26/11/19 | 187 | 王晨 | ¥91.52 |
| **189** | **5.8 评论、点赞、投币、收藏与荣誉** | **5.5人时** | **26/11/20** | **26/11/24** | | **王晨** | **¥251.68** |
| 190 | 5.8.1 实现主页、评论图片及收藏交流 | 3.5人时 | 26/11/20 | 26/11/20 | 188 | 王晨 | ¥160.16 |
| 191 | 5.8.2 实现点赞、领取投币、荣誉排序与通知 | 2人时 | 26/11/23 | 26/11/24 | 190 | 王晨 | ¥91.52 |
| **192** | **5.9 社区审核、反馈与举报网页** | **5.5人时** | **26/11/16** | **26/11/18** | | **刘景浩** | **¥251.68** |
| 193 | 5.9.1 实现认证审核与举报反馈处理接口 | 3.5人时 | 26/11/16 | 26/11/16 | 182 | 刘景浩 | ¥160.16 |
| 194 | 5.9.2 实现社区管理网页并联调 | 2人时 | 26/11/17 | 26/11/18 | 193 | 刘景浩 | ¥91.52 |
| **195** | **5.10 独立运维执行与备份服务** | **6.5人时** | **26/11/19** | **26/11/23** | | **刘景浩** | **¥297.44** |
| 196 | 5.10.1 实现独立运维任务执行服务 | 4人时 | 26/11/19 | 26/11/19 | 194 | 刘景浩 | ¥183.04 |
| 197 | 5.10.2 实现部署重启、备份恢复及失败保护 | 2.5人时 | 26/11/20 | 26/11/23 | 196 | 刘景浩 | ¥114.40 |
| **198** | **5.11 运维网页、状态与操作记录** | **6.5人时** | **26/11/24** | **26/11/25** | | **刘景浩** | **¥297.44** |

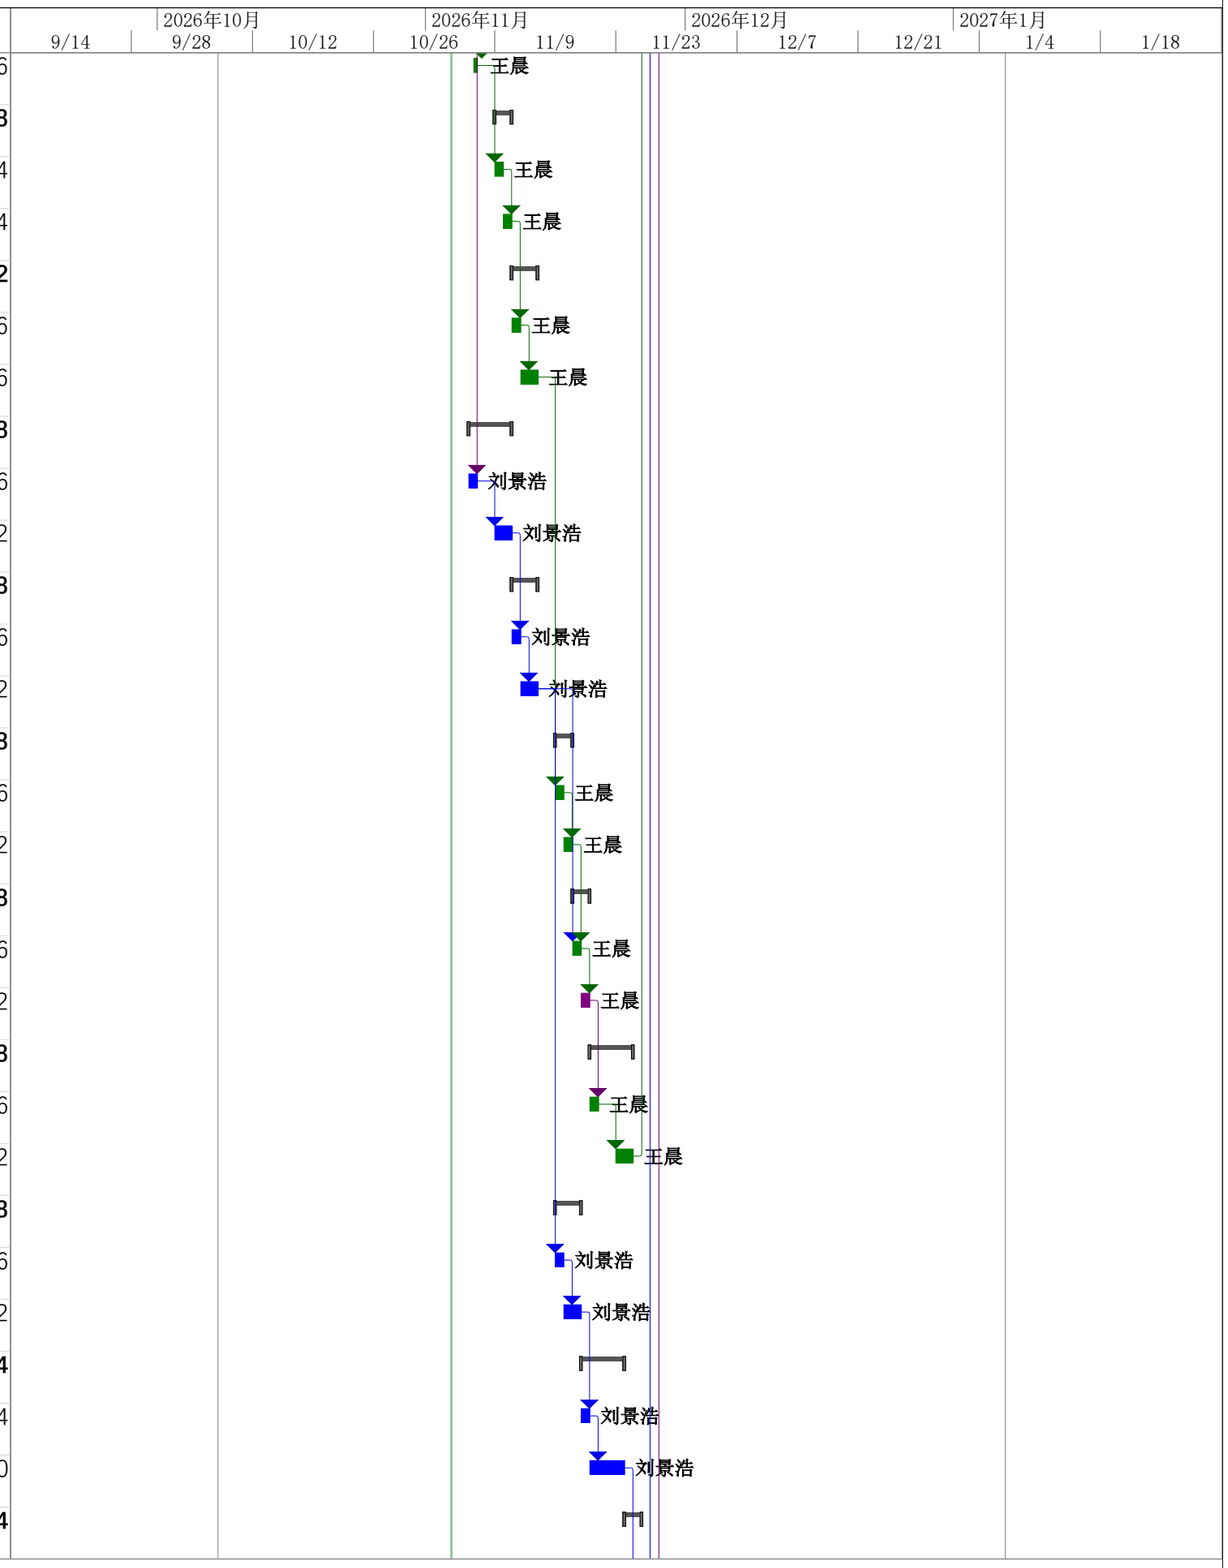


| 标识号 | 名称 | 计划人时 | 开始时间 | 完成时间 | 前置任务 | 任务负责人 | 成本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199 | 5.11.1 实现运维状态、日志和备份列表 | 4人时 | 26/11/24 | 26/11/24 | 197 | 刘景浩 | ¥183.04 |
| 200 | 5.11.2 联调网页部署重启与备份恢复 | 2.5人时 | 26/11/25 | 26/11/25 | 199 | 刘景浩 | ¥114.40 |
| **201** | **5.12 系统联调、构建与实现基线** | **6人时** | **26/11/27** | **26/11/27** | | **王晨、刘景浩** | **¥274.56** |
| 202 | 5.12.1 双方接通真实接口与跨端链路 | 3人时 | 26/11/27 | 26/11/27 | 166 | 王晨、刘景浩 | ¥137.28 |
| 203 | 5.12.2 构建候选版本并归档实现证据 | 3人时 | 26/11/27 | 26/11/27 | 202 | 王晨、刘景浩 | ¥137.28 |
| **204** | **6 综合测试** | **22.6人时** | **26/11/30** | **26/12/8** | | **按下级分配** | **¥1,03...** |
| **205** | **6.1 功能、接口与集成测试** | **2.7人时** | **26/11/30** | **26/12/1** | | **刘景浩** | **¥123.55** |
| 206 | 6.1.1 执行角色及核心业务功能用例 | 1.2人时 | 26/11/30 | 26/11/30 | 203 | 刘景浩 | ¥54.91 |
| 207 | 6.1.2 执行接口、集成和失败场景 | 1.5人时 | 26/12/1 | 26/12/1 | 206 | 刘景浩 | ¥68.64 |
| **208** | **6.2 性能与负载测试** | **2.7人时** | **26/11/30** | **26/12/1** | | **王晨** | **¥123.55** |
| 209 | 6.2.1 固定环境执行30并发负载 | 1.2人时 | 26/11/30 | 26/11/30 | 203 | 王晨 | ¥54.91 |
| 210 | 6.2.2 分析P95、错误率与资源占用 | 1.5人时 | 26/12/1 | 26/12/1 | 209 | 王晨 | ¥68.64 |
| **211** | **6.3 压力与稳定性测试** | **2.7人时** | **26/12/2** | **26/12/2** | | **王晨** | **¥123.55** |
| 212 | 6.3.1 执行阶梯压力寻找容量边界 | 1.2人时 | 26/12/2 | 26/12/2 | 210 | 王晨 | ¥54.91 |
| 213 | 6.3.2 执行稳定性与降载恢复 | 1.5人时 | 26/12/2 | 26/12/2 | 212 | 王晨 | ¥68.64 |
| **214** | **6.4 安全权限与双端兼容测试** | **2.7人时** | **26/12/2** | **26/12/2** | | **刘景浩** | **¥123.55** |
| 215 | 6.4.1 执行越权隐私与危险输入检查 | 1.2人时 | 26/12/2 | 26/12/2 | 207 | 刘景浩 | ¥54.91 |
| 216 | 6.4.2 执行双端浏览编辑与图片兼容 | 1.5人时 | 26/12/2 | 26/12/2 | 215 | 刘景浩 | ¥68.64 |
| **217** | **6.5 部署、故障与备份恢复验证** | **2.7人时** | **26/12/3** | **26/12/3** | | **王晨** | **¥123.55** |
| 218 | 6.5.1 验证冷启动与网页运维操作 | 1.2人时 | 26/12/3 | 26/12/3 | 213 | 王晨 | ¥54.91 |
| 219 | 6.5.2 验证损坏备份、回退与恢复一致性 | 1.5人时 | 26/12/3 | 26/12/3 | 218 | 王晨 | ¥68.64 |
| **220** | **6.6 缺陷修复、复测与回归** | **4人时** | **26/12/3** | **26/12/4** | | **刘景浩** | **¥183.04** |
| 221 | 6.6.1 按模块分派缺陷并修复 | 2.5人时 | 26/12/3 | 26/12/3 | 216,213 | 王晨、刘景浩 | ¥114.40 |
| 222 | 6.6.2 交叉复测原场景与相邻流程 | 1.5人时 | 26/12/3 | 26/12/4 | 221 | 刘景浩 | ¥68.64 |
| **223** | **6.7 测试报告与系统内部验收** | **2.4人时** | **26/12/4** | **26/12/4** | | **王晨、刘景浩** | **¥109.82** |
| 224 | 6.7.1 双方确认测试结论与交付限制 | 2.4人时 | 26/12/4 | 26/12/4 | 222,219 | 王晨、刘景浩 | ¥109.82 |
| **225** | **6.8 测试报告复核与提交准备** | **2.7人时** | **26/12/7** | **26/12/8** | | **王晨** | **¥123.55** |
| 226 | 6.8.1 复核测试报告与证据链 | 1.2人时 | 26/12/7 | 26/12/7 | 224 | 王晨 | ¥54.91 |
| 227 | 6.8.2 整理课堂测试汇报和已有修订 | 1.5人时 | 26/12/8 | 26/12/8 | 226 | 王晨 | ¥68.64 |

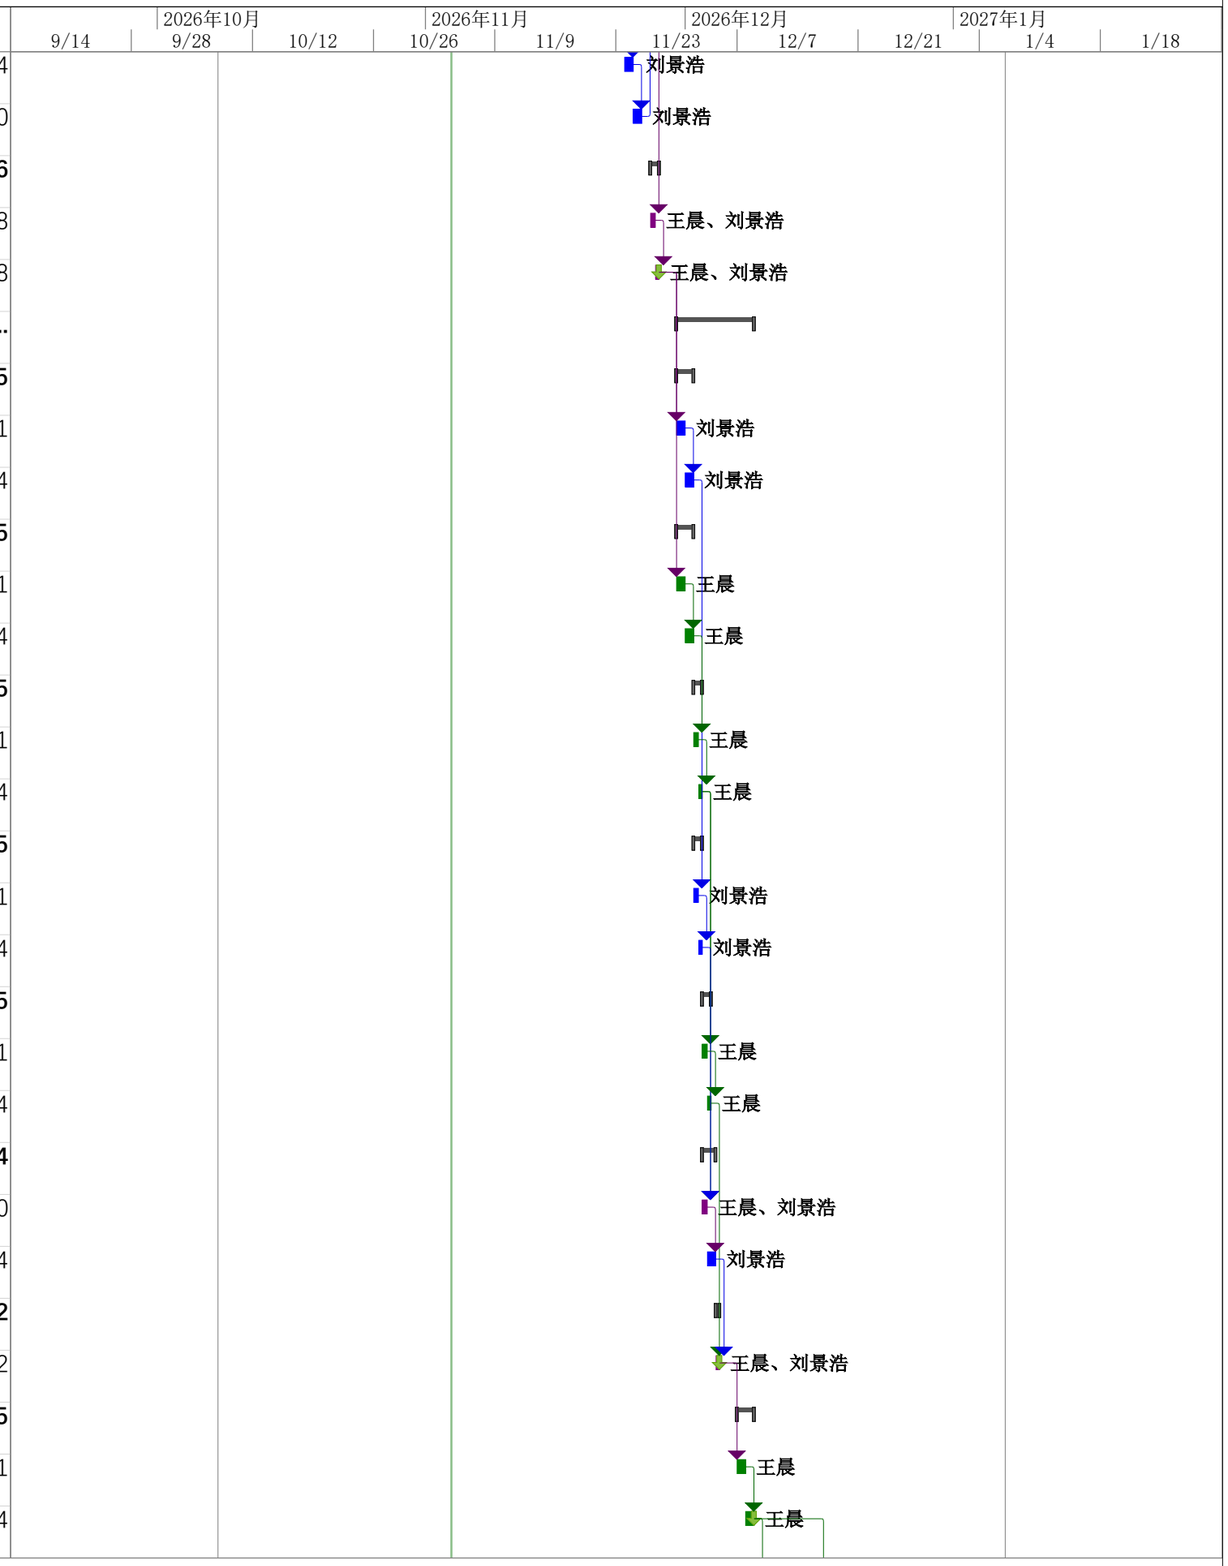


| 标识号 | 名称 | 计划人时 | 开始时间 | 完成时间 | 前置任务 | 任务负责人 | 成本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **228** | **7 部署与维护** | **15人时** | **26/12/9** | **26/12/17** | | **按下级分配** | **¥686.40** |
| **229** | **7.1 安装包、用户与维护说明** | **3人时** | **26/12/9** | **26/12/10** | | **王晨** | **¥137.28** |
| 230 | 7.1.1 整理安装、用户及管理操作说明 | 1.5人时 | 26/12/9 | 26/12/9 | 227 | 王晨 | ¥68.64 |
| 231 | 7.1.2 整理运维、恢复与故障维护规程 | 1.5人时 | 26/12/10 | 26/12/10 | 230 | 王晨 | ¥68.64 |
| **232** | **7.2 干净环境启动与课堂演示** | **3人时** | **26/12/11** | **26/12/11** | | **王晨** | **¥137.28** |
| 233 | 7.2.1 在干净配置核对冷启动 | 1.5人时 | 26/12/11 | 26/12/11 | 231 | 王晨 | ¥68.64 |
| 234 | 7.2.2 核对演示数据、认证与外网失败回退 | 1.5人时 | 26/12/11 | 26/12/11 | 233 | 王晨 | ¥68.64 |
| **235** | **7.3 维护申请与变更演练** | **3人时** | **26/12/14** | **26/12/14** | | **刘景浩** | **¥137.28** |
| 236 | 7.3.1 登记维护申请和影响分析 | 1.5人时 | 26/12/14 | 26/12/14 | 234 | 刘景浩 | ¥68.64 |
| 237 | 7.3.2 执行修改回退及回归演练 | 1.5人时 | 26/12/14 | 26/12/14 | 236 | 刘景浩 | ¥68.64 |
| **238** | **7.4 运维交接与反馈整改** | **3人时** | **26/12/15** | **26/12/15** | | **王晨** | **¥137.28** |
| 239 | 7.4.1 核对备份、配置与维护资料 | 1.5人时 | 26/12/15 | 26/12/15 | 237 | 王晨 | ¥68.64 |
| 240 | 7.4.2 双方练习操作并确认交接 | 1.5人时 | 26/12/15 | 26/12/15 | 239 | 王晨 | ¥68.64 |
| **241** | **7.5 课堂测试评审意见处理** | **3人时** | **26/12/17** | **26/12/17** | | **刘景浩** | **¥137.28** |
| 242 | 7.5.1 登记12月16日测试评审意见 | 1.5人时 | 26/12/17 | 26/12/17 | 227 | 刘景浩 | ¥68.64 |
| 243 | 7.5.2 修订报告及相关实现用例 | 1.5人时 | 26/12/17 | 26/12/17 | 242 | 刘景浩 | ¥68.64 |
| **244** | **8 总结与收尾** | **16.8人时** | **26/12/18** | **27/1/6** | | **按下级分配** | **¥768.77** |
| **245** | **8.1 项目总结与计划偏差分析** | **3.6人时** | **26/12/18** | **26/12/21** | | **王晨、刘景浩** | **¥164.74** |
| 246 | 8.1.1 共同核对计划实际与阶段成果 | 1.8人时 | 26/12/18 | 26/12/18 | 240,243 | 王晨、刘景浩 | ¥82.37 |
| 247 | 8.1.2 共同总结偏差风险和协作贡献 | 1.8人时 | 26/12/21 | 26/12/21 | 246 | 王晨、刘景浩 | ¥82.37 |
| **248** | **8.2 总评材料与详细计划附录** | **3人时** | **26/12/22** | **26/12/23** | | **王晨** | **¥137.28** |
| 249 | 8.2.1 整理总评PPT资料和详细周计划 | 1.5人时 | 26/12/22 | 26/12/22 | 247 | 王晨 | ¥68.64 |
| 250 | 8.2.2 核对引用、图表与交付目录 | 1.5人时 | 26/12/23 | 26/12/23 | 249 | 王晨 | ¥68.64 |
| **251** | **8.3 最终验收与汇报演练** | **3.6人时** | **26/12/24** | **26/12/24** | | **王晨、刘景浩** | **¥164.74** |
| 252 | 8.3.1 共同执行交付清单核查 | 1.8人时 | 26/12/24 | 26/12/24 | 250 | 王晨、刘景浩 | ¥82.37 |
| 253 | 8.3.2 共同预演并确认提交版本 | 1.8人时 | 26/12/24 | 26/12/24 | 252 | 王晨、刘景浩 | ¥82.37 |
| **254** | **8.4 总评反馈处理与归档** | **3人时** | **26/12/31** | **27/1/4** | | **王晨** | **¥137.28** |
| 255 | 8.4.1 处理总评意见并准备提交基线 | 1.5人时 | 26/12/31 | 26/12/31 | 253 | 王晨 | ¥68.64 |
| 256 | 8.4.2 核对提交后尾项与最终归档 | 1.5人时 | 27/1/4 | 27/1/4 | 255 | 王晨 | ¥68.64 |

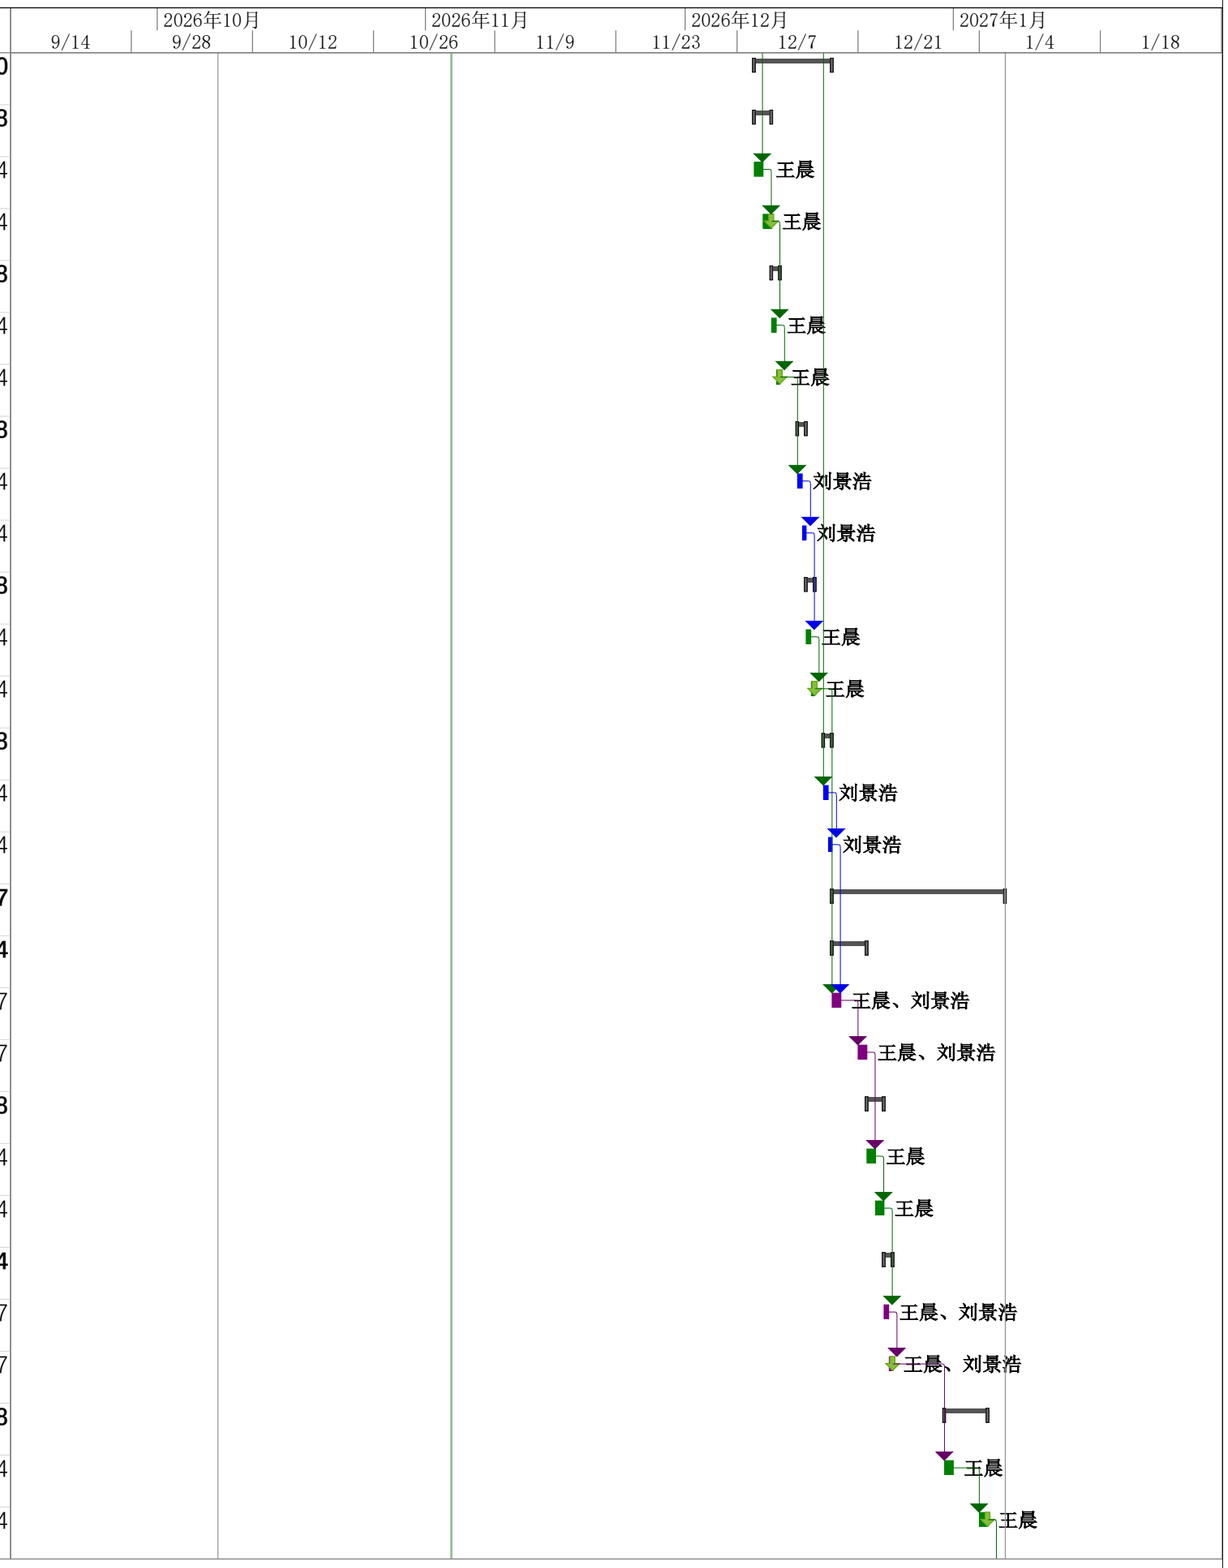

| 标识号 | 名称 | 计划人时 | 开始时间 | 完成时间 | 前置任务 | 任务负责人 | 成本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **257** | **8.5 课程收尾与交付确认** | **3.6人时** | **27/1/6** | **27/1/6** | | **王晨、刘景浩** | **¥164.74** |
| 258 | 8.5.1 共同核对课程收尾材料 | 1.8人时 | 27/1/6 | 27/1/6 | 256 | 王晨、刘景浩 | ¥82.37 |
| 259 | 8.5.2 共同确认交付与后续维护边界 | 1.8人时 | 27/1/6 | 27/1/6 | 258 | 王晨、刘景浩 | ¥82.37 |
| **260** | **M 持续项目管理与交叉复核** | **27.65人时** | **26/10/8** | **27/1/6** | | **按下级分配** | **¥1,26...** |
| 261 | M01 周进度风险与评审提交管理 | 0.85人时 | 26/10/8 | 26/10/9 | | 王晨 | ¥38.90 |
| 262 | M02 周进度风险与评审提交管理 | 0.85人时 | 26/10/12 | 26/10/16 | | 王晨 | ¥38.90 |
| 263 | M03 周进度风险与评审提交管理 | 0.85人时 | 26/10/19 | 26/10/23 | | 王晨 | ¥38.90 |
| 264 | M04 周进度风险与评审提交管理 | 0.85人时 | 26/10/26 | 26/10/30 | | 王晨 | ¥38.90 |
| 265 | M05 周进度风险与评审提交管理 | 0.85人时 | 26/11/2 | 26/11/6 | | 王晨 | ¥38.90 |
| 266 | M06 周进度风险与评审提交管理 | 0.85人时 | 26/11/9 | 26/11/13 | | 王晨 | ¥38.90 |
| 267 | M07 周进度风险与评审提交管理 | 0.85人时 | 26/11/16 | 26/11/20 | | 王晨 | ¥38.90 |
| 268 | M08 周进度风险与评审提交管理 | 0.85人时 | 26/11/23 | 26/11/27 | | 王晨 | ¥38.90 |
| 269 | M09 周进度风险与评审提交管理 | 0.85人时 | 26/11/30 | 26/12/4 | | 王晨 | ¥38.90 |
| 270 | M10 周进度风险与评审提交管理 | 0.85人时 | 26/12/7 | 26/12/11 | | 王晨 | ¥38.90 |
| 271 | M11 周进度风险与评审提交管理 | 0.85人时 | 26/12/14 | 26/12/18 | | 王晨 | ¥38.90 |
| 272 | M12 周进度风险与评审提交管理 | 0.85人时 | 26/12/21 | 26/12/25 | | 王晨 | ¥38.90 |
| 273 | M13 周进度风险与评审提交管理 | 0.85人时 | 26/12/28 | 26/12/31 | | 王晨 | ¥38.90 |
| 274 | M14 周进度风险与评审提交管理 | 0.85人时 | 27/1/4 | 27/1/6 | | 王晨 | ¥38.90 |
| 275 | R2.1 复核与交接 关键技术与工具可行性验证 | 0.45人时 | 26/10/8 | 26/10/12 | | 刘景浩 | ¥20.59 |
| 276 | R2.2 复核与交接 经济、操作及内容供给分析 | 0.45人时 | 26/10/12 | 26/10/13 | | 王晨 | ¥20.59 |
| 277 | R3.2 复核与交接 功能、数据与非功能需求 | 0.45人时 | 26/10/20 | 26/10/21 | | 刘景浩 | ¥20.59 |
| 278 | R3.3 复核与交接 双端原型与场景核对 | 0.45人时 | 26/10/20 | 26/10/21 | | 王晨 | ¥20.59 |
| 279 | R3.5 复核与交接 需求课堂评审反馈处理 | 0.45人时 | 26/11/4 | 26/11/4 | | 王晨 | ¥20.59 |
| 280 | R4.1 复核与交接 系统架构、接口与数据库设计 | 0.45人时 | 26/10/26 | 26/10/28 | | 刘景浩 | ¥20.59 |
| 281 | R4.2 复核与交接 认证、内容、激励与治理设计 | 0.45人时 | 26/10/29 | 26/10/30 | | 刘景浩 | ¥20.59 |
| 282 | R4.3 复核与交接 双端浏览与创作详细设计 | 0.45人时 | 26/10/29 | 26/11/2 | | 王晨 | ¥20.59 |
| 283 | R4.4 复核与交接 部署、备份与恢复详细设计 | 0.45人时 | 26/11/2 | 26/11/3 | | 刘景浩 | ¥20.59 |
| 284 | R4.6 复核与交接 测试用例设计与数据准备 | 0.45人时 | 26/11/3 | 26/11/3 | | 王晨 | ¥20.59 |
| 285 | R5.1 复核与交接 项目骨架、配置与接口约定 | 0.45人时 | 26/11/6 | 26/11/6 | | 刘景浩 | ¥20.59 |

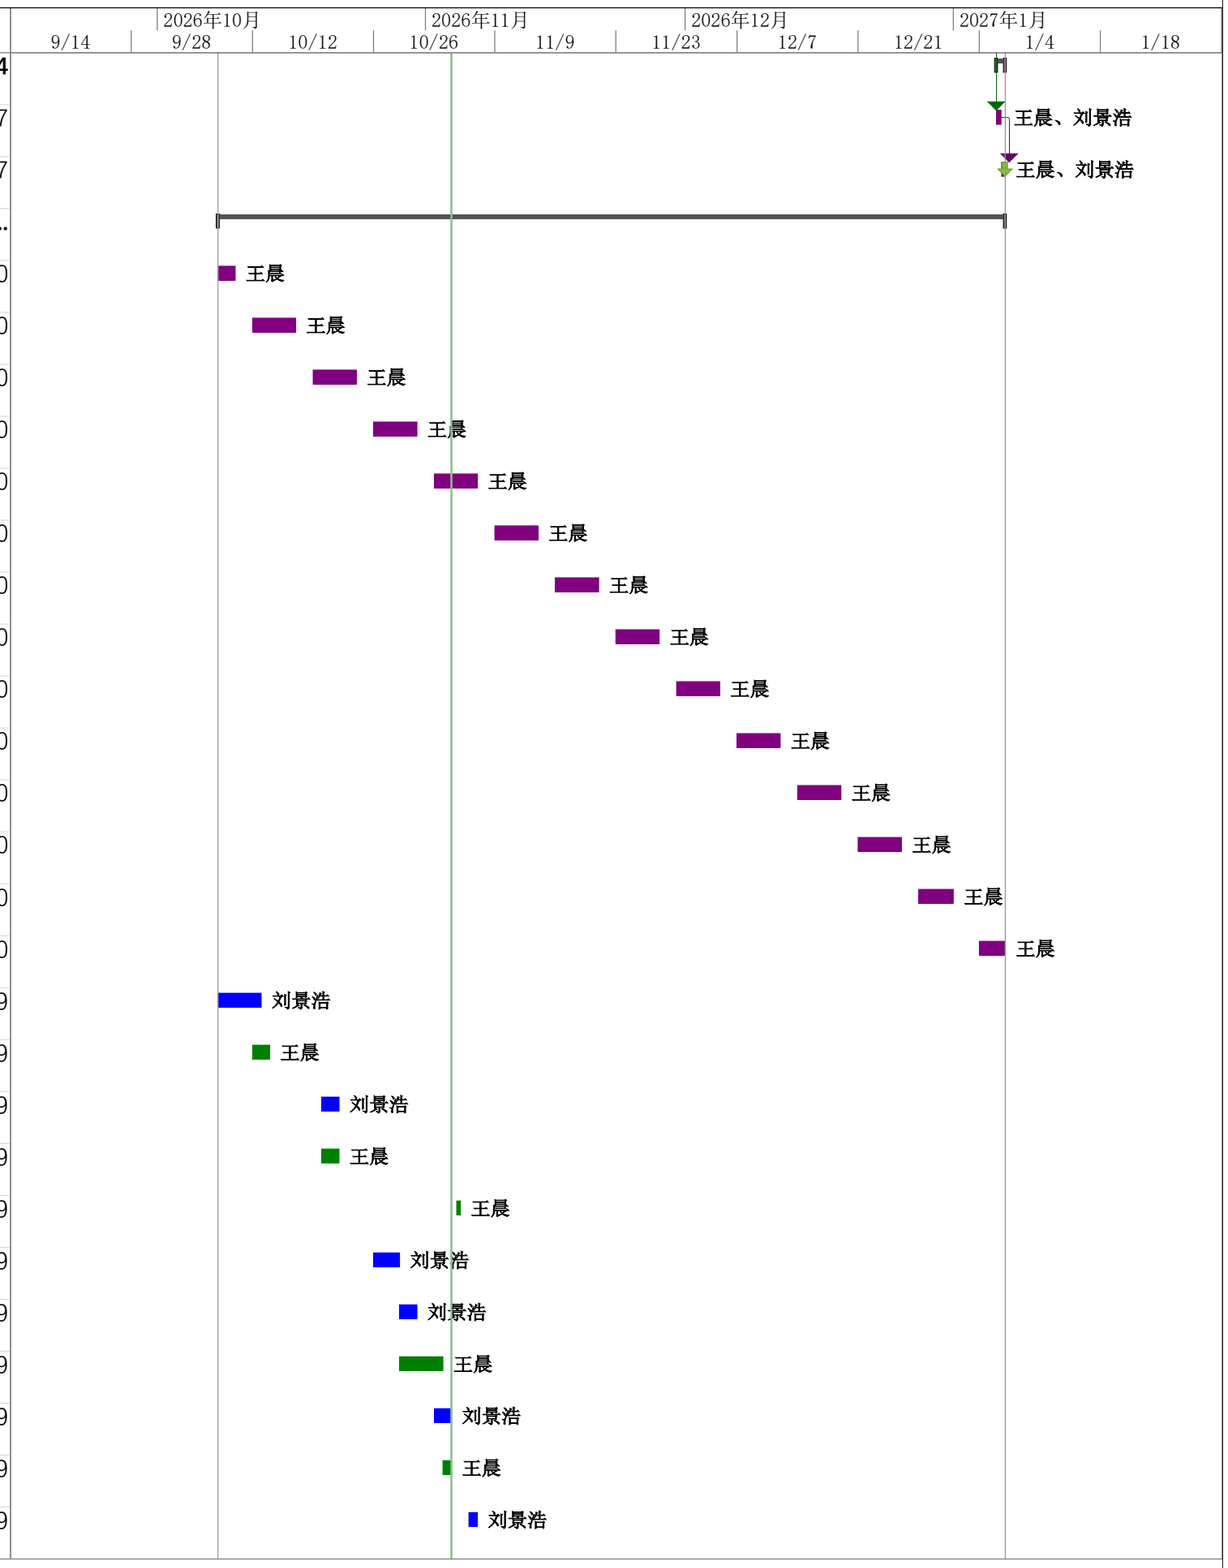

| 标识号 | 名称 | 计划人时 | 开始时间 | 完成时间 | 前置任务 | 任务负责人 | 成本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 286 | R5.2 复核与交接 登录、邮箱与材料认证 | 0.45人时 | 26/11/9 | 26/11/10 | | 刘景浩 | ¥20.59 |
| 287 | R5.3 复核与交接 文章存储、岗位检索与筛选接口 | 0.45人时 | 26/11/11 | 26/11/13 | | 刘景浩 | ¥20.59 |
| 288 | R5.4 复核与交接 小程序与网页阅读页面 | 0.45人时 | 26/11/6 | 26/11/10 | | 王晨 | ¥20.59 |
| 289 | R5.5 复核与交接 网页Markdown创作与草稿 | 0.45人时 | 26/11/11 | 26/11/13 | | 王晨 | ¥20.59 |
| 290 | R5.6 复核与交接 小程序文字与图片创作 | 0.45人时 | 26/11/16 | 26/11/17 | | 刘景浩 | ¥20.59 |
| 291 | R5.7 复核与交接 双端草稿、发布与文章管理 | 0.45人时 | 26/11/18 | 26/11/19 | | 刘景浩 | ¥20.59 |
| 292 | R5.8 复核与交接 评论、点赞、投币、收藏与荣誉 | 0.45人时 | 26/11/20 | 26/11/24 | | 刘景浩 | ¥20.59 |
| 293 | R5.9 复核与交接 社区审核、反馈与举报网页 | 0.45人时 | 26/11/16 | 26/11/18 | | 王晨 | ¥20.59 |
| 294 | R5.10 复核与交接 独立运维执行与备份服务 | 0.45人时 | 26/11/19 | 26/11/23 | | 王晨 | ¥20.59 |
| 295 | R5.11 复核与交接 运维网页、状态与操作记录 | 0.45人时 | 26/11/24 | 26/11/25 | | 王晨 | ¥20.59 |
| 296 | R6.1 复核与交接 功能、接口与集成测试 | 0.45人时 | 26/11/30 | 26/12/1 | | 王晨 | ¥20.59 |
| 297 | R6.2 复核与交接 性能与负载测试 | 0.45人时 | 26/11/30 | 26/12/1 | | 刘景浩 | ¥20.59 |
| 298 | R6.3 复核与交接 压力与稳定性测试 | 0.45人时 | 26/12/2 | 26/12/2 | | 刘景浩 | ¥20.59 |
| 299 | R6.4 复核与交接 安全权限与双端兼容测试 | 0.45人时 | 26/12/2 | 26/12/2 | | 王晨 | ¥20.59 |
| 300 | R6.5 复核与交接 部署、故障与备份恢复验证 | 0.45人时 | 26/12/3 | 26/12/3 | | 刘景浩 | ¥20.59 |
| 301 | R6.6 复核与交接 缺陷修复、复测与回归 | 0.45人时 | 26/12/3 | 26/12/4 | | 王晨 | ¥20.59 |
| 302 | R6.8 复核与交接 测试报告复核与提交准备 | 0.45人时 | 26/12/7 | 26/12/8 | | 刘景浩 | ¥20.59 |
| 303 | R7.1 复核与交接 安装包、用户与维护说明 | 0.45人时 | 26/12/9 | 26/12/10 | | 刘景浩 | ¥20.59 |
| 304 | R7.2 复核与交接 干净环境启动与课堂演示 | 0.45人时 | 26/12/11 | 26/12/11 | | 刘景浩 | ¥20.59 |
| 305 | R7.3 复核与交接 维护申请与变更演练 | 0.45人时 | 26/12/14 | 26/12/14 | | 王晨 | ¥20.59 |
| 306 | R7.4 复核与交接 运维交接与反馈整改 | 0.45人时 | 26/12/15 | 26/12/15 | | 刘景浩 | ¥20.59 |
| 307 | R7.5 复核与交接 课堂测试评审意见处理 | 0.45人时 | 26/12/17 | 26/12/17 | | 王晨 | ¥20.59 |
| 308 | R8.2 复核与交接 总评材料与详细计划附录 | 0.45人时 | 26/12/22 | 26/12/23 | | 刘景浩 | ¥20.59 |
| 309 | R8.4 复核与交接 总评反馈处理与归档 | 0.45人时 | 26/12/31 | 27/1/4 | | 刘景浩 | ¥20.59 |
| **310** | **K 课程里程碑** | **0人时** | **26/10/14** | **27/1/6** | | **按下级分配** | **¥0.00** |
| 311 | K01 项目计划课堂评审 | 0人时 | 26/10/14 | 26/10/14 | | 按下级分配 | ¥0.00 |
| 312 | K02 可行性报告课堂节点 | 0人时 | 26/10/21 | 26/10/21 | | 按下级分配 | ¥0.00 |
| 313 | K03 SRS需求课堂评审 | 0人时 | 26/10/28 | 26/10/28 | | 按下级分配 | ¥0.00 |
| 314 | K04 SRS修订与需求复审 | 0人时 | 26/11/4 | 26/11/4 | | 按下级分配 | ¥0.00 |

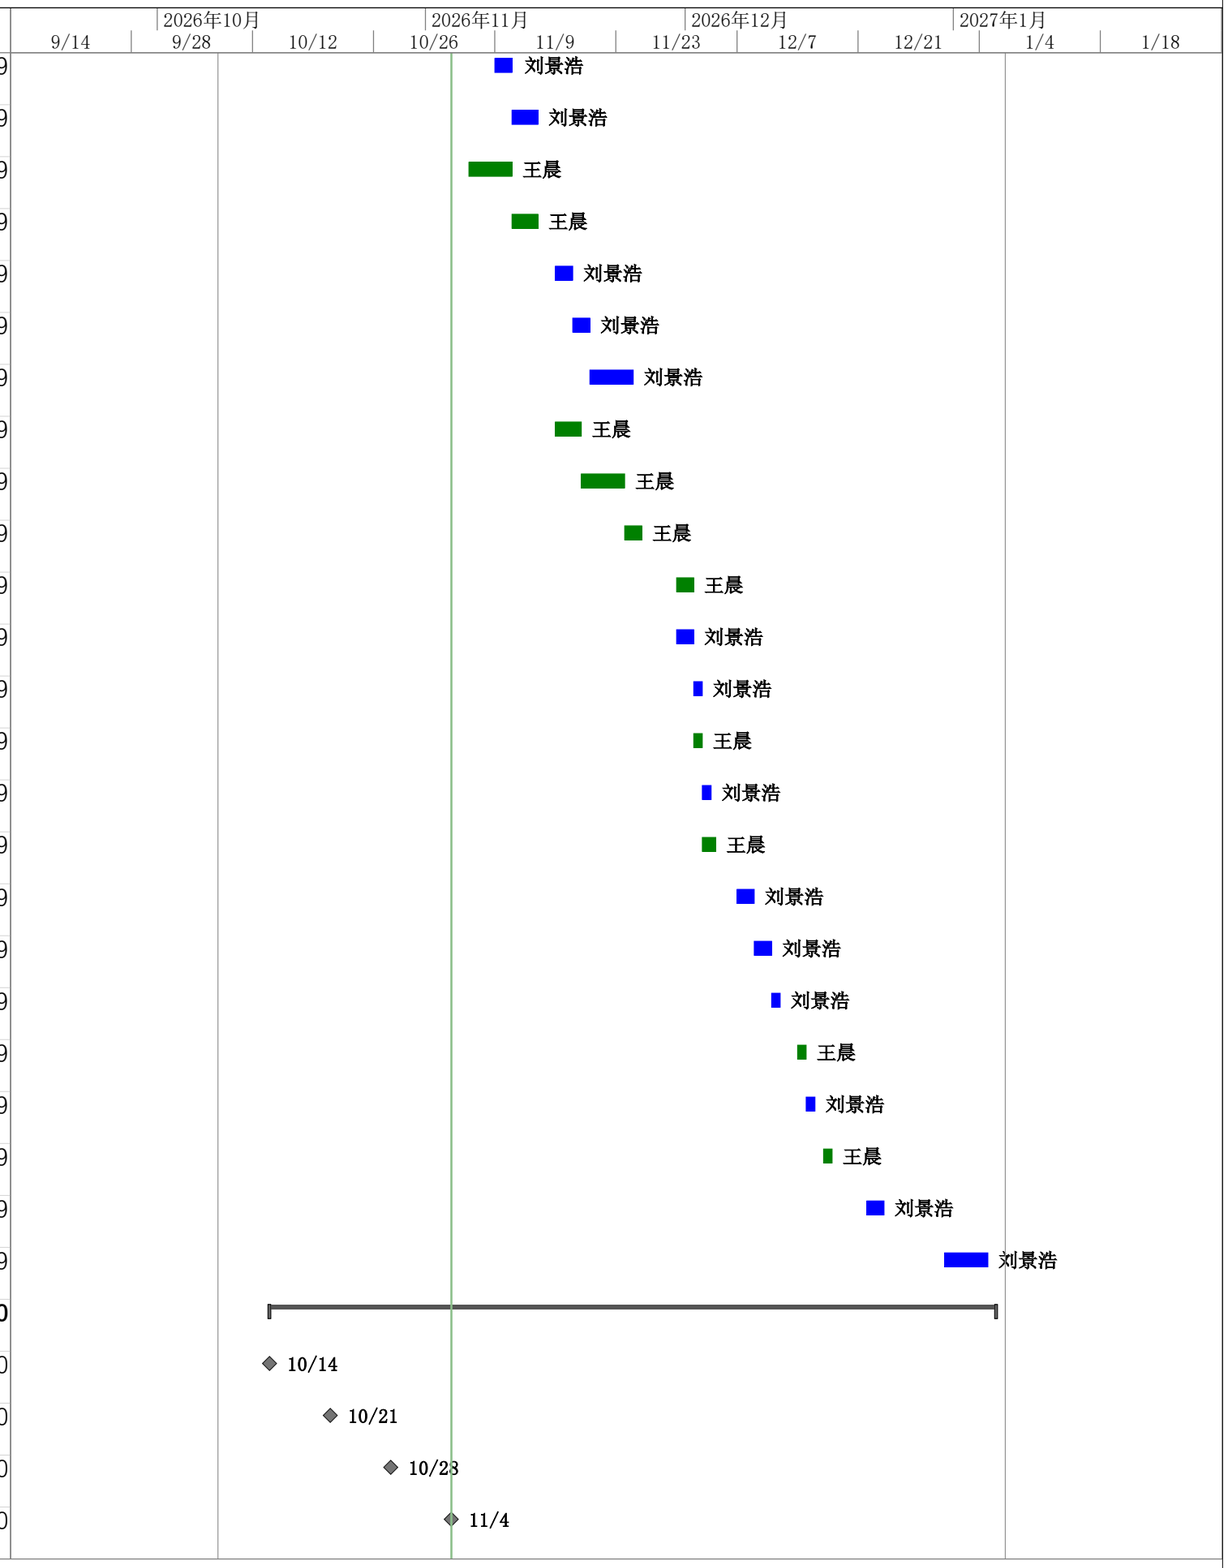

| 标识号 | 名称 | 计划人时 | 开始时间 | 完成时间 | 前置任务 | 任务负责人 | 成本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 315 | K05 总体设计课堂节点 | 0人时 | 26/11/11 | 26/11/11 | | 按下级分配 | ¥0.00 |
| 316 | K06 详细设计课堂节点 | 0人时 | 26/11/18 | 26/11/18 | | 按下级分配 | ¥0.00 |
| 317 | K07 设计评审与翻转PPT1 | 0人时 | 26/11/25 | 26/11/25 | | 按下级分配 | ¥0.00 |
| 318 | K08 代码用例与翻转PPT2 | 0人时 | 26/12/2 | 26/12/2 | | 按下级分配 | ¥0.00 |
| 319 | K09 系统测试报告课堂节点 | 0人时 | 26/12/9 | 26/12/9 | | 按下级分配 | ¥0.00 |
| 320 | K10 测试报告修订课堂评审 | 0人时 | 26/12/16 | 26/12/16 | | 按下级分配 | ¥0.00 |
| 321 | K11 项目总结与总评PPT | 0人时 | 26/12/30 | 26/12/30 | | 按下级分配 | ¥0.00 |
| 322 | K12 课程收尾与交付确认 | 0人时 | 27/1/6 | 27/1/6 | | 按下级分配 | ¥0.00 |

