
# 项目进度甘特总览

10月8日至1月6日　人时为投入，条带为日期跨度

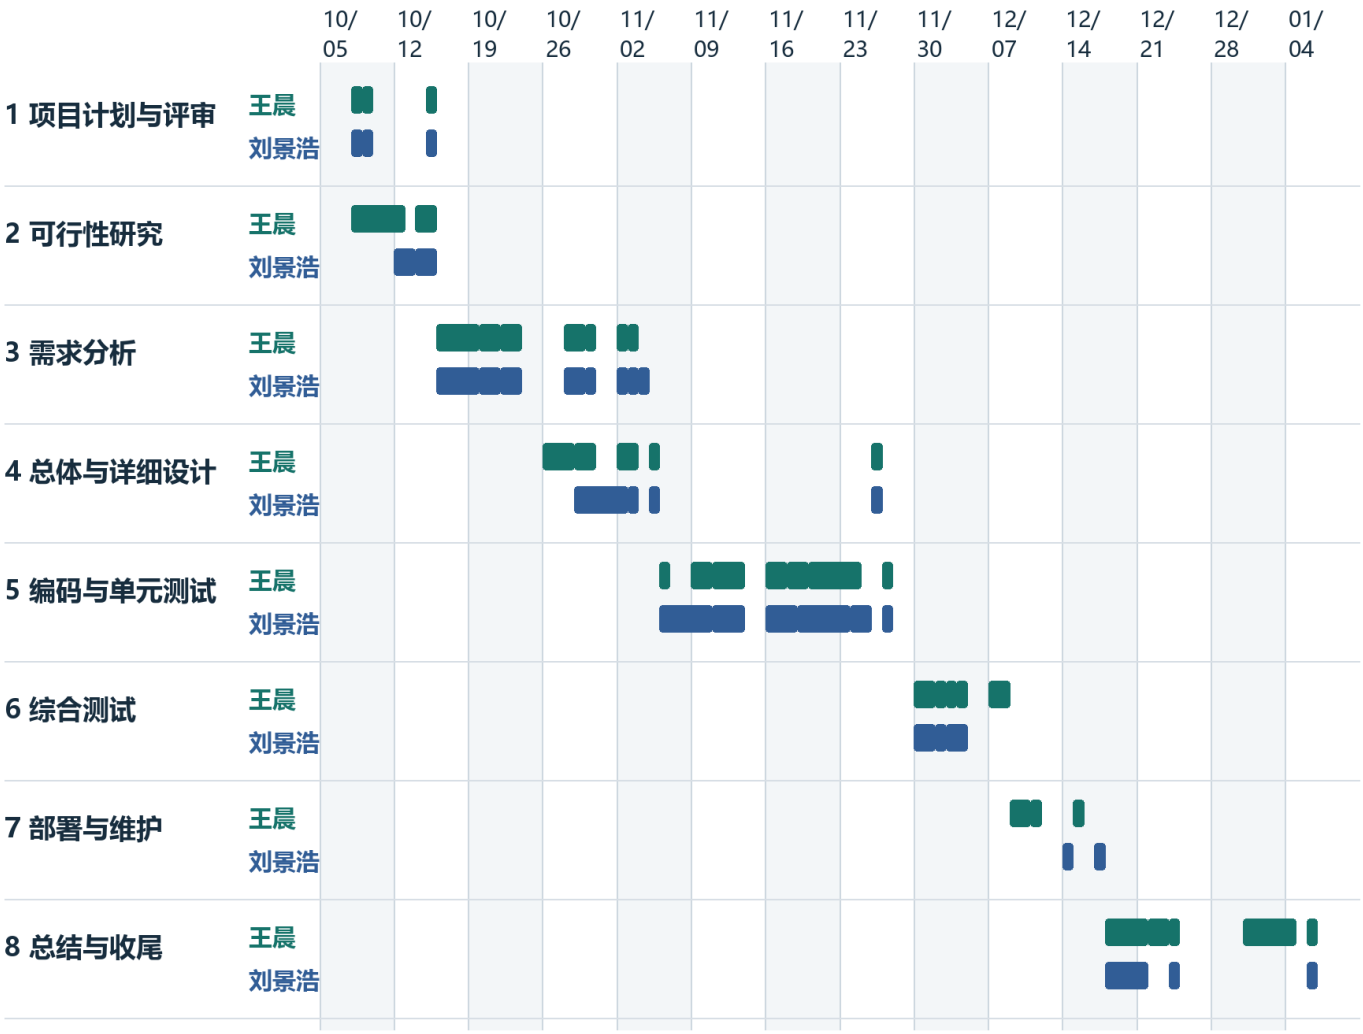


**王晨 120.35人时**

**刘景浩 106.20人时**


团队226.55人时　工资单价45.76元/人时

项目人工预算10366.93元　不代表实际发薪


图示为阶段与成员参与区间；同阶段可并行，管理与复核单列。

具体任务人时、成本及依赖见原生MPP和详细甘特附件。


## 计划与可行性

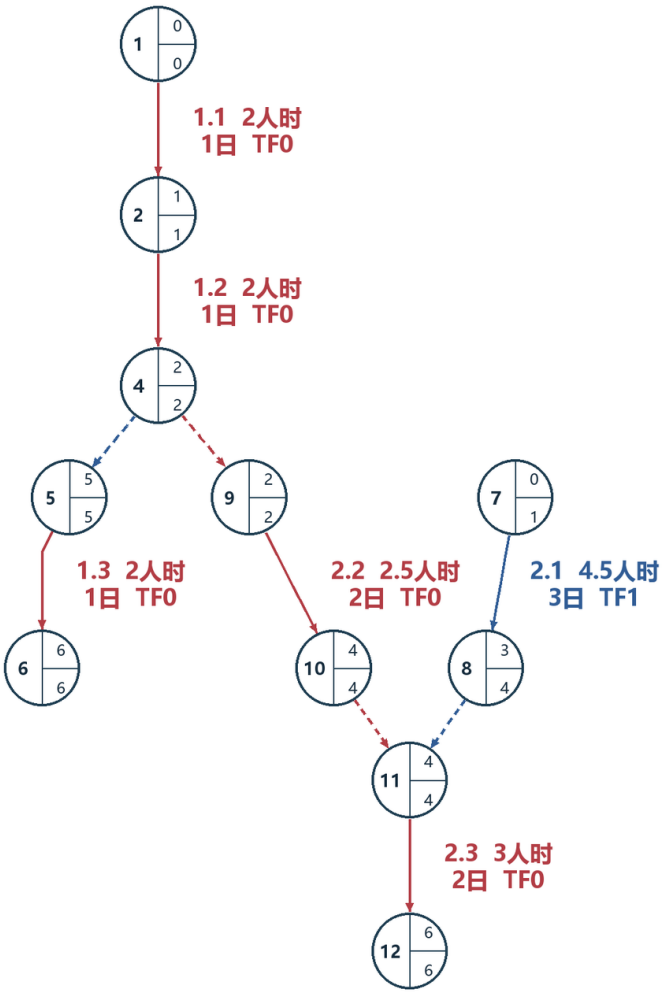



## 需求与复审

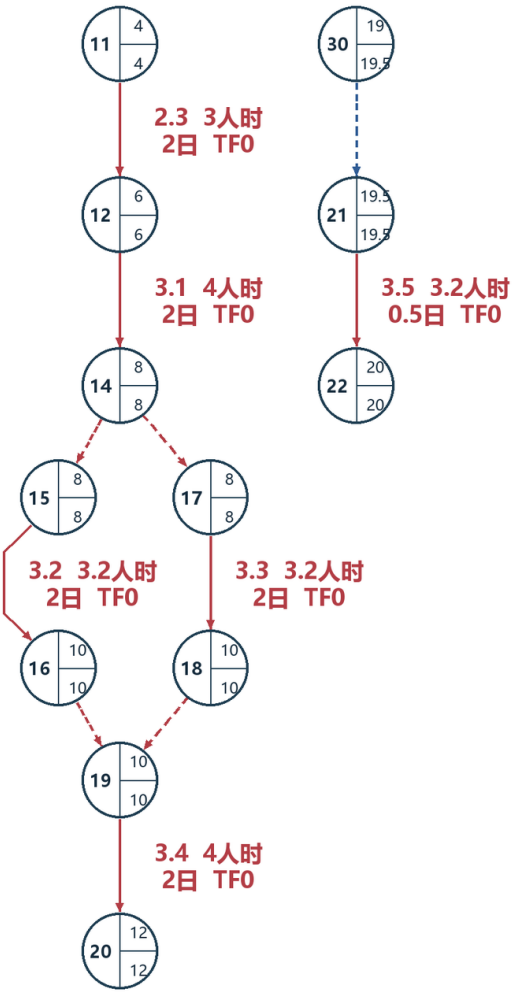


需求模型修订

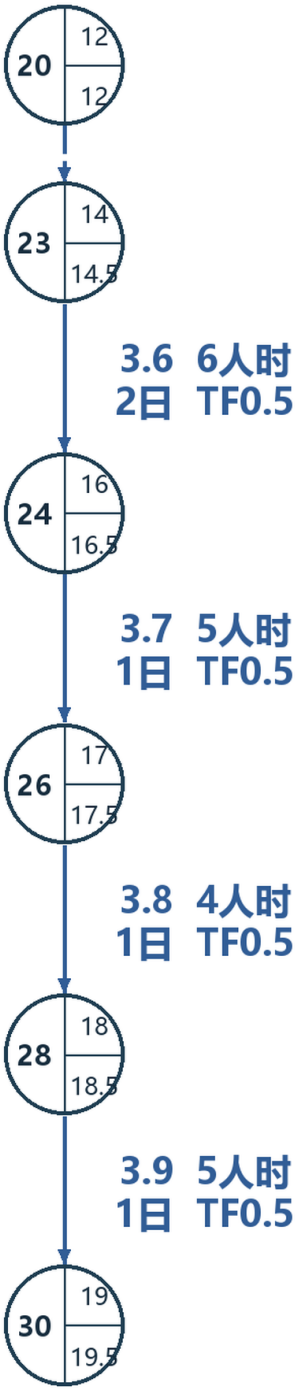
20
12
12
23
14
14.5
3.6 6人时
2日 TF0.5
24
16
16.5
3.7 5人时
1日 TF0.5
26
17
17.5
3.8 4人时
1日 TF0.5
28
18
18.5
3.9 5人时
1日 TF0.5
30
19
19.5


总体与详细设计

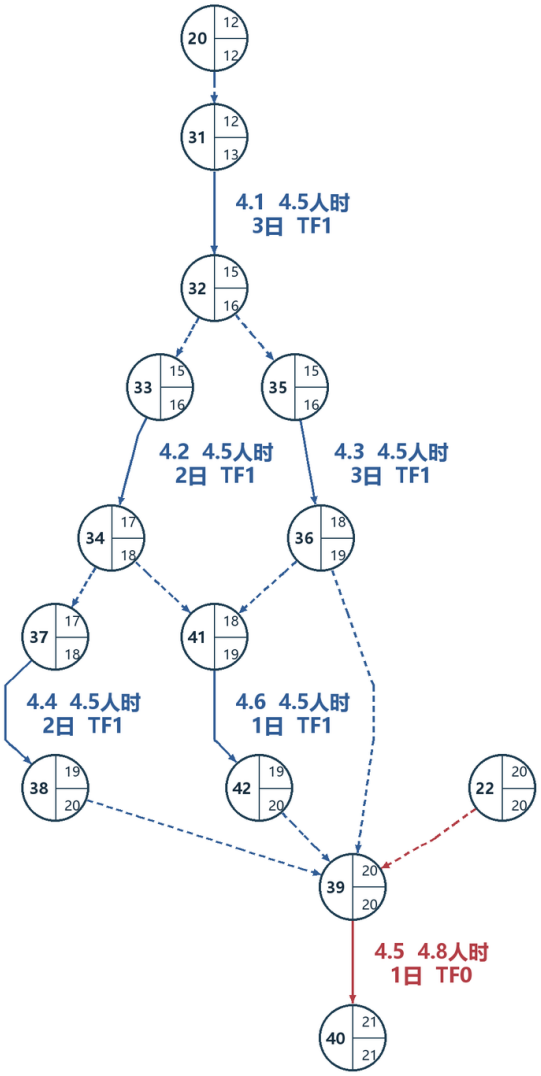



基础与网页

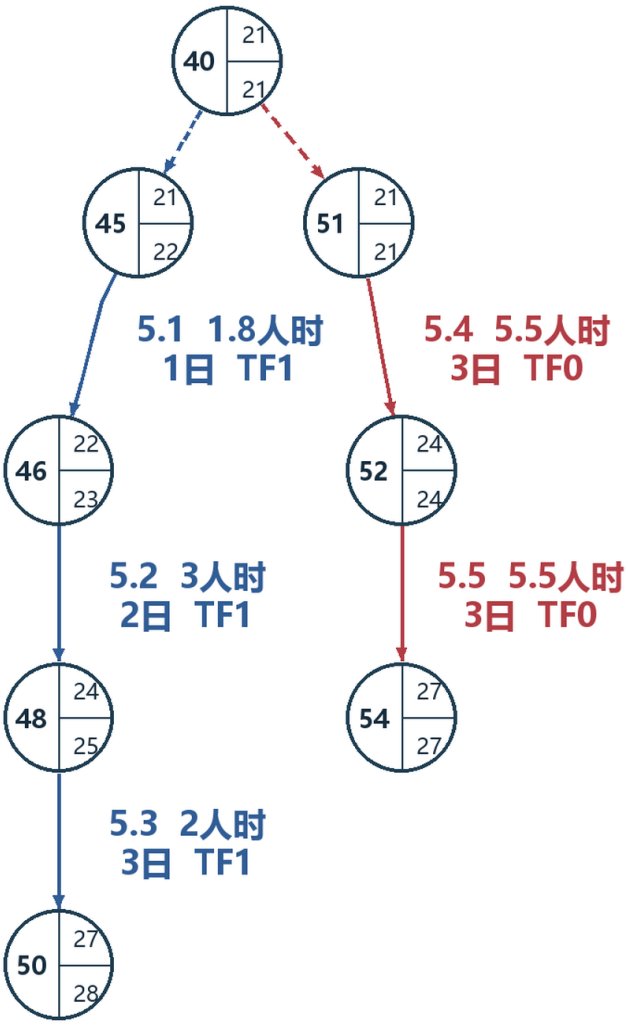


## 业务与运维

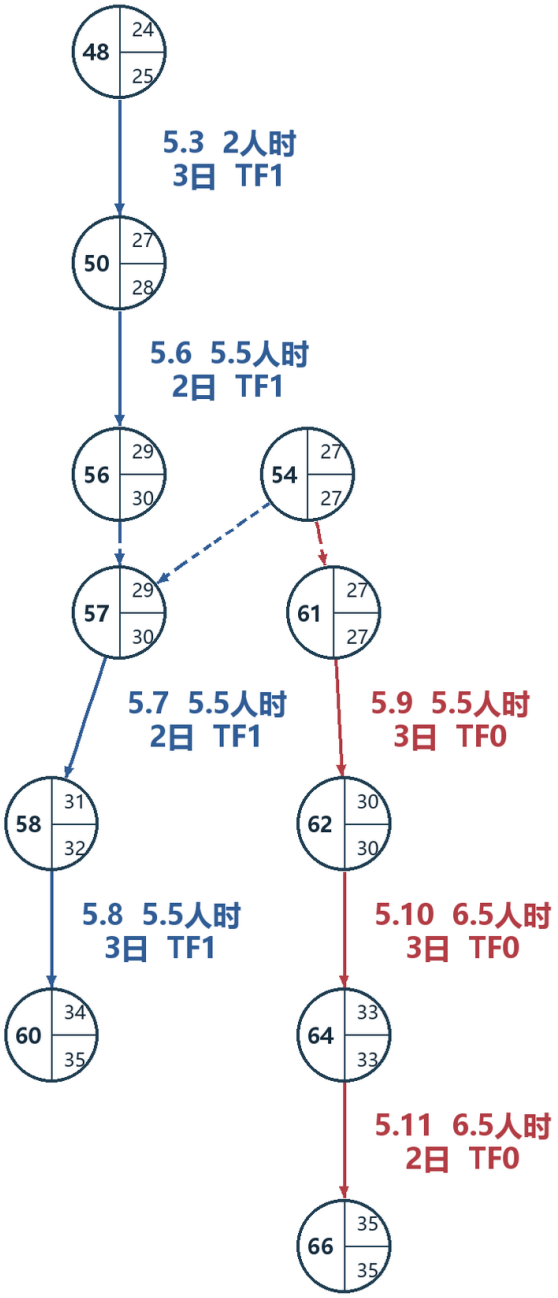

48 24 25
5.3 2人时
3日 TF1
50 27 28
5.6 5.5人时
2日 TF1
56 29 30
54 27 27
57 29 30
61 27 27
5.7 5.5人时
2日 TF1
5.9 5.5人时
3日 TF0
58 31 32
62 30 30
5.8 5.5人时
3日 TF1
5.10 6.5人时
3日 TF0
60 34 35
64 33 33
5.11 6.5人时
2日 TF0
66 35 35

## 联调与性能

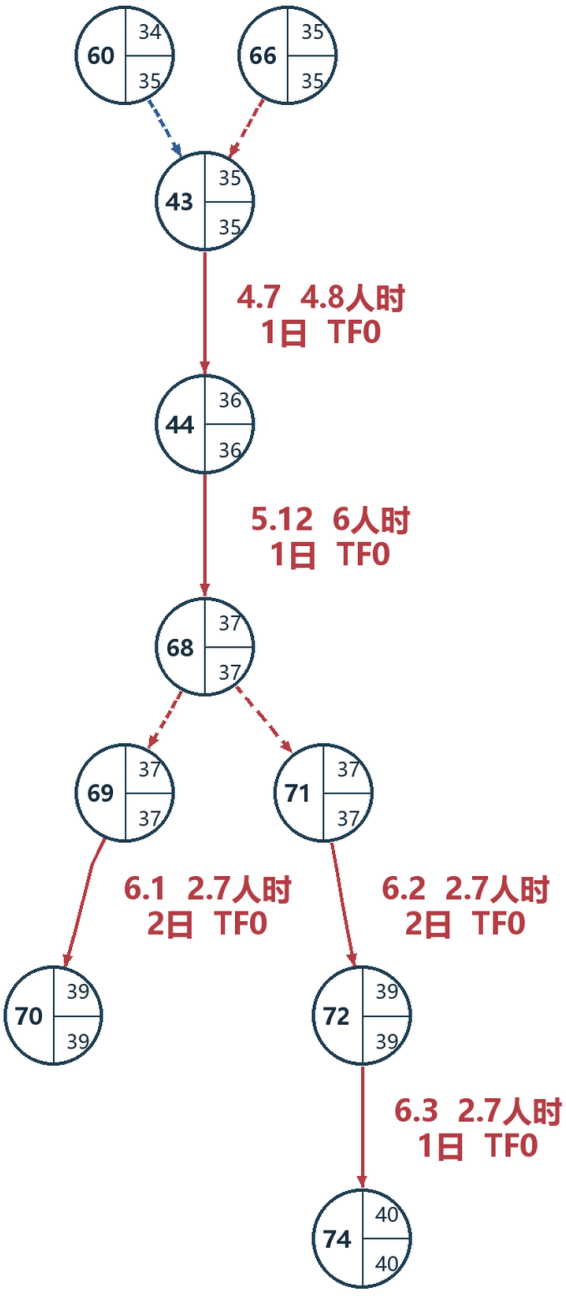
60 34 35
66 35 35
43 35 35
4.7 4.8人时
1日 TF0
44 36 36
5.12 6人时
1日 TF0
68 37 37
69 37 37
71 37 37
6.1 2.7人时
2日 TF0
6.2 2.7人时
2日 TF0
70 39 39
72 39 39
6.3 2.7人时
1日 TF0
74 40 40

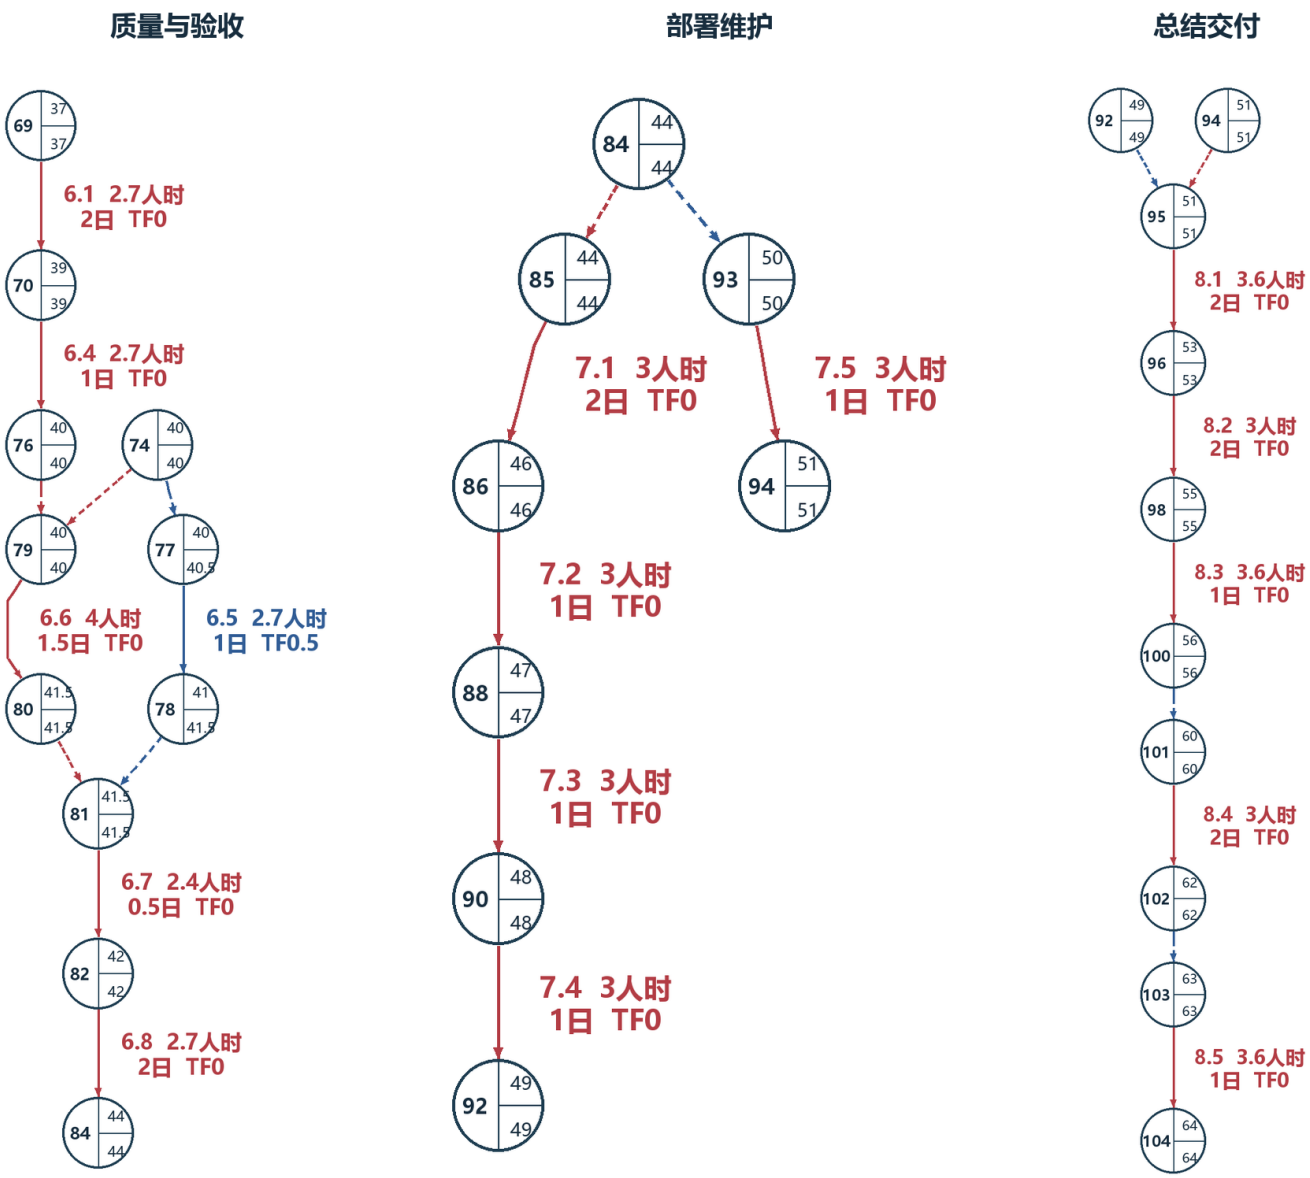
质量与验收
69 37 37
6.1 2.7人时
2日 TF0
70 39 39
6.4 2.7人时
1日 TF0
76 40 40
74 40 40
79 40 40
77 40 40.5
6.6 4人时
1.5日 TF0
6.5 2.7人时
1日 TF0.5
80 41.5 41.5
78 41 41.5
81 41.5 41.5
6.7 2.4人时
0.5日 TF0
82 42 42
6.8 2.7人时
2日 TF0
84 44 44
部署维护
84 44 44
85 44 44
93 50 50
7.1 3人时
2日 TF0
7.5 3人时
1日 TF0
86 46 46
94 51 51
7.2 3人时
1日 TF0
88 47 47
7.3 3人时
1日 TF0
90 48 48
7.4 3人时
1日 TF0
92 49 49
总结交付
92 49 49
94 51 51
95 51 51
8.1 3.6人时
2日 TF0
96 53 53
8.2 3人时
2日 TF0
98 55 55
8.3 3.6人时
1日 TF0
100 56 56
101 60 60
8.4 3人时
2日 TF0
102 62 62
103 63 63
8.5 3.6人时
1日 TF0
104 64 64

## 系统结构与课堂部署边界

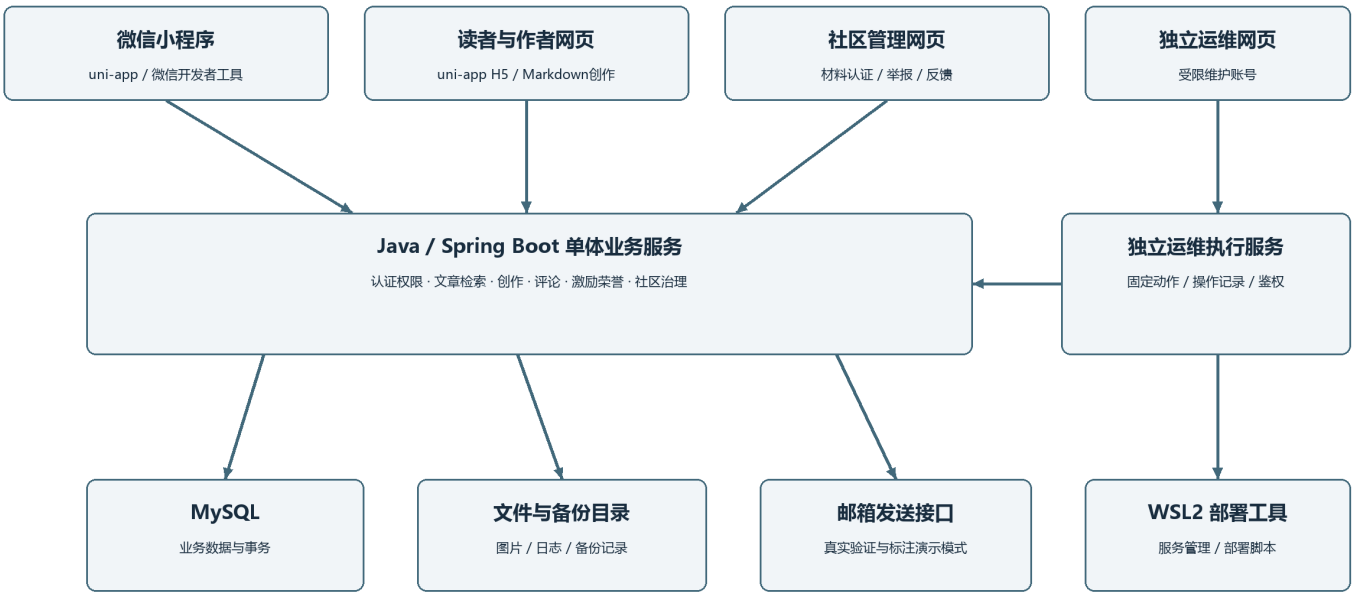


**正式验收：王晨电脑上的 Windows + WSL2 本地环境；浏览器及开发者工具访问本地接口。**

腾讯云2核2GB仅作可选补充验证；运维执行器与业务服务隔离，业务重启不关闭运维入口。
